

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 6**  
**Dirección Provincial Cañar**

**PROYECTO: K017** MTOP- Construcción de la carretera El Tambo-Ingapirca-Honorato Vasquez de 25 Km de longitud, ubicado e la provincia del Cañar

Líder del Proyecto:	Amaya Castro, Francisco Xavier (famaya@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	EL TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VAZQUEZ-CANAR 25 KM, Provincia - Cañar, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Dután Sanango, Italo Medardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.860.4755	TIR:	12.68 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	856,621.61
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	26,999,862.03
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	06/08/2012 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	05/11/2018	Fecha de Fin Base:	27/06/2014
Modificado por:	Dután Sanango, Italo Medardo	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2018

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL TAMBO - INGAPIRCA - HONORATO VAZQUEZ DE 25 KM DE LONGITUD

CONTRATISTA: FOPECA S.A.

SERVICIO: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Zona de influencia al contar con una vía a nivel de capa asfáltica e incrementar el turismo al complejo arqueológico de Ingapirca.

LINEA BASE: A lo largo del proyecto, Las viviendas están concentradas en las cercanías de los centros comunales y otras dispersas. Para la construcción de las viviendas se usa principalmente el cemento, ladrillo, bloque, techos de eternit, ardex, teja vidriada de fibra plástica. Las casas son de variados modelos y colores, en algunos casos modelos adoptados de las ciudades con espacios de parqueaderos, corredores amplios.

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la capacidad de circulación en la vía, imagen y seguridad, de las poblaciones que se encuentran en la vía con la dotación de infraestructura vial en buen estado y el consiguiente aumento del turismo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- 1.1Obras Preliminares terminadas.
- 1.2Terracería realizada
- 1.3Drenajes concluidos
- 1.4Calzada construida.
- 1.5Señalización realizada.
- 1.6 Obras de manejo ambiental realizadas.
- 1.7Estabilización de sitios críticos efectuados.

MONTO DEL CONTRATO : 16`411.689,45

**Beneficios Cualitativos**


Los beneficios de está obra están incluncados en dos Cantones importantes y Turisticos de la Provincia del Cañar, y el incremento a la zona Arqueologica del pais y del mundo.

<b>Tipo de Beneficiario</b>
Nacional e Internacional
<b>Restricciones</b>
Plazo: El plazo del proyecto para la construcción es de 555 días y para el mantenimiento es de 4 años. Costo: El valor requerido para la ejecución del Proyecto es de USD\$ 21.091.039,20. Alcance: Se espera contar con 27 km de vía a nivel de carpeta asfáltica beneficiando así al Turismo de la Provincia del Cañar. Recursos: Se cuenta con Equipos Camineros para obras civiles, así como personal idóneo de la Empresa FOPECA S.A, así como su control se realizará con equipo de laboratorio de suelos y personal técnico de la Consultora CEVACONSULT.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 98.80 %  
Fecha de Inicio: 06/08/2012      Fecha de Fin: 31/12/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

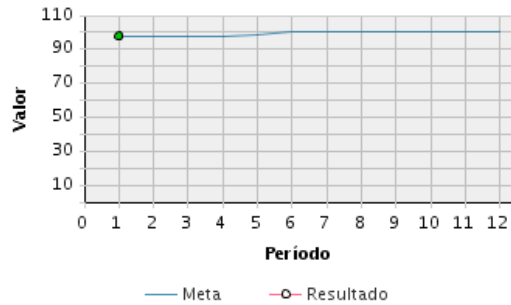

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	98 %	98 %	98 %	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	98 %											
Estado												

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>OCTUBRE 2018</b></p> <p>La comisión de recepción definitiva del proyecto, se encuentra revisando la información relacionada con el Proyecto, a fin de poder emitir su criterio previo a la firma del acta de recepción definitiva. El proyecto no ha sido incluido en el Plan Anual de Inversiones del año 2018, se han realizado insistencias para la inclusión del Proyecto.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/11/2018 - 03:32 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2018</b></p> <p>Con fecha 04septiembre de 2018, se nombra la comisión de recepción de recepción definitiva definitiva del proyecto, por lo que el 21 de septiembre de 2018 se realiza la inspección en capo del Proyecto. El proyecto no ha sido incluido en el Plan Anual de Inversiones del año 2018, se han realizado insistencias para la inclusión del Proyecto.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/10/2018 - 08:37 AM
<p><b>AGOSTO 2018</b></p> <p>Con fecha 13 de junio de 2018, se termina la etapa de mantenimiento, la Contratista ha solicitado la recepción definitiva del proyecto, por lo que se ha solicitado a la Subsecretaría Regional 6 se nombre a la comisión de recepción definitiva. El proyecto no ha sido incluido en el Plan Anual de Inversiones del año 2018, se han realizado insistencias para la inclusión del Proyecto.</p>	Buestan Toral, José Remigio	05/09/2018 - 11:58 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JULIO 2018</b></p> <p>Con fecha 13 de junio de 2018, se termina la etapa de mantenimiento, la Contratista ha solicitado la recepción definitiva del proyecto, por lo que se ha solicitado a la Subsecretaría Regional 6 se nombre a la comisión de recepción definitiva. El proyecto no ha sido incluido en el Plan Anual de Inversiones del año 2018, se han realizado insistencias para la inclusión del Proyecto.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	03/08/2018 - 09:45 AM
<p><b>JUNIO 2018</b></p> <p>Con fecha 13 de junio de 2018, se termina la etapa de mantenimiento, la Contratista ha solicitado la recepción definitiva del proyecto. El proyecto no ha sido incluido en el Plan Anual de Inversiones del año 2018, se han enviado los documentos y se ha solicitado la inclusión del Proyecto, la misma que se encuentra en trámite</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/07/2018 - 09:40 AM
<p><b>MAYO 2018</b></p> <p>El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, mediante la limpieza de alcantarillas, roza a mano, sellado de fisuras con asfalto y limpieza de cunetas. El proyecto no ha sido incluido en el Plan Anual de Inversiones del año 2018, se han enviado los documentos y se ha solicitado la inclusión del Proyecto, la misma que se encuentra en trámite.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/06/2018 - 02:35 PM
<p><b>ABRIL 2018</b></p> <p>El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, mediante la limpieza de alcantarillas, roza a mano, sellado de fisuras con asfalto y limpieza de cunetas. El proyecto no ha sido incluido en el Plan Anual de Inversiones del año 2018, se han enviado los documentos y se ha solicitado la inclusión del Proyecto, la misma que se encuentra en trámite.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/05/2018 - 08:52 AM
<p><b>MARZO 2018</b></p> <p>El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, mediante la limpieza de alcantarillas, roza a mano, sellado de fisuras con asfalto y limpieza de cunetas. El proyecto no ha sido incluido en el Plan Anual de Inversiones del año 2018, se han enviado los documentos y se ha solicitado la inclusión del Proyecto.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/04/2018 - 11:33 AM
<p><b>Febrero 2018</b></p> <p>El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, mediante la limpieza de alcantarillas, roza a mano sellado de fisuras con asfalto y limpieza de cunetas. El proyecto no ha sido incluido en el Plan Anual de Inversiones del año 2018, se está realizando las correcciones a los documentos para solicitar inclusión del Proyecto.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	21/03/2018 - 04:02 PM
<p><b>Enero 2018</b></p> <p>El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, mediante la limpieza de alcantarillas, roza a mano sellado de fisuras con asfalto y limpieza de cunetas. La Dirección Distrital ha solicitado a la subsecretaría Zonal 6, proceda la realización de los Términos de Referencia para la contratación del estudio en el formato solicitado en el acuerdo 102, la misma que esta siendo revisada por la Coordinación de Estudios.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	21/03/2018 - 04:01 PM
<p><b>DICIEMBRE 2017</b></p> <p>El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, mediante la limpieza de alcantarillas, roza a mano sellado de fisuras con asfalto y limpieza de cunetas. La Dirección Distrital ha solicitado a la subsecretaría Zonal 6, proceda la realización de los Términos de Referencia para la contratación del estudio en el formato solicitado en el acuerdo 102, la misma que esta siendo revisada por la Coordinación de Estudios.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/01/2018 - 10:37 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2017</b></p> <p>El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, mediante la limpieza de alcantarillas, roza a mano sellado de fisuras con asfalto y limpieza de cunetas. La Dirección Distrital ha solicitado a la subsecretaría Zonal 6, proceda la realización de los Términos de Referencia para la contratación del estudio en el formato solicitado en el acuerdo 102.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/12/2017 - 05:05 PM
<p><b>OCTUBRE 2017</b></p> <p>El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, mediante la reparación de cunetas con hormigón y sellado de fisuras con asfalto y limpieza de cunetas.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 10:05 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La Dirección Distrital ha solicitado a la subsecretaría Zonal 6, proceda la realización de los Términos de Referencia para la contratación del estudio.		
SEPTIEMBRE 2017  El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, mediante la reparación de cunetas con hormigón y sellado de fisuras con asfalto y limpieza de cunetas. En el PAI 2017 se ha incluido un monto de 575000 para intervenir en el km 8+100, la Dirección Distrital ha solicitado a la subsecretaría Zonal 6, proceda con el diseño y cantidades de obra de acuerdo a las recomendaciones emitidas por los Especialistas, los mismos que indican que es necesario la contratación del estudio puesto que no se cuenta con el equipo ni personal para realizar ensayos de Geofísica, perforaciones, ensayos de corte directo y triaxiales.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/10/2017 - 10:11 AM
AGOSTO 2017  El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, mediante la reparación de cunetas con hormigón y sellado de fisuras con asfalto y limpieza de cunetas. En el PAI 2017 se ha incluido un monto de 575000 para intervenir en el km 8+100, la Dirección Distrital ha solicitado a la subsecretaría Zonal 6, proceda con el diseño y cantidades de obra de acuerdo a las recomendaciones emitidas por los Especialistas.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/09/2017 - 11:02 AM
JULIO 2017  El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, mediante la reparación de cunetas con hormigón y sellado de fisuras con asfalto y limpieza de cunetas. En el PAI 2017 se ha incluido un monto de 575000 para intervenir en el km 8+100, la misma que esta siendo revisada por los Especialistas de la Subsecretaría.	García González, Mariana Alexandra	04/08/2017 - 04:49 PM
JUNIO 2017  El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, mediante la reparación de cunetas con hormigón y sellado de fisuras con asfalto y limpieza de cunetas. En el PAI 2017 se ha incluido un monto de 575000 para intervenir en el km 8+100, la misma que esta siendo analizada por la fiscalización del proyecto..	García González, Mariana Alexandra	04/07/2017 - 08:05 AM
MAYO2017  La Constructora realiza mantenimiento rutinario en la vía Tambo Ingapirca, mediante la limpieza de cunetas, derrumbes y roza a mano. Se realiza un mantenimiento constante en el km 8+100, el mismo que se encuentra dentro de un azona de falla geológica. En el PAI 2017, se ha incluido un monto de 575000 para intervenir en el km 8+100.	Guillen Luna, Andrés Ismael	01/06/2017 - 10:33 AM
Abril 2017  La Constructora realiza mantenimiento rutinario en la vía Tambo Ingapirca, mediante la limpieza de cunetas, derrumbes y roza a mano. Se realiza un mantenimiento constante en el km 8+100, el mismo que se encuentra dentro de un azona de falla geológica. En el PAI 2017, se ha incluido un monto de 575000 para intervenir en el km 8+100.	García González, Mariana Alexandra	04/05/2017 - 05:27 PM
MARZO 2017  La compañía contratista FOPECA S.A. esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarilas, roza a mano , sellado de fusuras, además, se está dando mantenimiento constante al sitio critico del Km 8+100. En el Km 5 hasta el km 9, limpieza de derrumbes Se ha presentado un hundimiento de la calzada en el Km 13+440, se esta señalizando y monitoreando hasta realizar el trabajo correspondiente. se incluyeron al pai 2017 un monto aproximado de 575.000 USD para atender los sitios criticos	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 11:28 AM
FEBRERO 2017  La compañía contratista FOPECA S.A. esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarilas, roza a mano , sellado de fusuras, además, se está dando mantenimiento constante al sitio critico del Km 8+100. Se ha presentado un hundimiento de la calzada en el Km 13+440, se esta señalizando y monitoreando hasta realizar el trabajo correspondiente.	Guillen Luna, Andrés Ismael	03/03/2017 - 11:27 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
se incluyeron al pai 2017 un monto aproximado de 575.000 USD para atender los sitios criticos		
<p><b>ENERO 2017</b></p> <p>La compañía contratista FOPECA S.A. esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarilas, roza a mano ,además, se está dando mantenimiento constante al sitio critico del Km 8+100. Se ha presentado un hundimiento de la calzada en el Km 13+440, se esta señalizando y monitoreando hasta realizar el trabajo correspondiente. Ser realizan trabajos de desobstruccion de Alcantarillas en el Km 9+000</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	03/02/2017 - 10:42 AM
<p><b>DICIEMBRE2016</b></p> <p>La compañía contratista FOPECA S.A. esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarilas, roza a mano ,además, se está dando mantenimiento constante al sitio critico del Km 8+100. Se ha presentado un hundimiento de la calzada en el Km 13+440, se esta señalizando y monitoreando hasta realizar el trabajo correspondiente</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/01/2017 - 06:34 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2016</b></p> <p>La compañía contratista FOPECA S.A. esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarilas, roza a mano ,además, se está dando mantenimiento constante al sitio critico del Km 8+100. Se ha presentado un hundimiento de la calzada en el Km 13+440, se esta señalizando y monitoreando hasta realizar el trabajo correspondiente</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/12/2016 - 10:26 AM
<p><b>OCTUBRE 2016</b></p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la via en todo largo de la via, se esta dando mantenimiento constante al sitio critico del Km 8+000. Se ha presentado un hundimiento de la calzada en el Km 13+400, se esta señalizando y dando mantenimiento hasta realizar el arreglo</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/11/2016 - 06:00 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2016</b></p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la via en todo largo de la via, se esta dando mantenimiento constante al sitio critico del Km 8+000. Se ha presentado un hundimiento de la calzada en el Km 13+400, se esta señalizando y dando mantenimiento hasta realizar el arreglo</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/10/2016 - 07:10 PM
<p><b>AGOSTO 1016:</b></p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la via en todo largo de la via, se esta dando mantenimiento constante al sitio critico del Km 8+000. Se ha presentado un hundimiento de la calzada en el Km 13+400, se esta señalizando y dando mantenimiento hasta realizar el arreglo</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/09/2016 - 06:32 PM
<p><b>JULIO 2016:</b></p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la via en todo llargo de la via, se esta dando mantenimiento constante al sitio critico del Km 8+000. Se ha presentado un hundimiento de la calzada en el Km 13+400, se esta señalizando y dando mantenimiento hasta realizar el arreglo</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	03/08/2016 - 09:52 AM
<p><b>JUNIO 2016:</b></p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la via en todo llargo de la via, se esta dando mantenimiento constante al</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/07/2016 - 12:07 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>sitio crítico del Km 8+000. Se ha presentado un hundimiento de la calzada en el Km 13+400, se esta señalizando y dando mantenimiento hasta realizar el arreglo.</p>		
<p>MAYO 2016:</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la via en todo llargo de la via, se esta dando mantenimiento constante al sitio crítico del Km 8+000. Se ha presentado un hundimiento de la calzada en el Km 13+400, se esta señalizando y dando mantenimiento hasta realizar el arreglo.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>05/06/2016 - 05:07 PM</p>
<p>ABRIL 2016:</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la via en todo llargo de la via, se esta dando mantenimiento constante al sitio crítico del Km 8+000.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>02/05/2016 - 02:44 PM</p>
<p>MARZO 2016:</p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la via en todo llargo de la via, se esta dando mantenimiento constante a la sitio crítico del Km 8+000.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>04/04/2016 - 08:09 PM</p>
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la via en todo llargo de la via, tambien se esta realizando la reposicion de balizas, se esta dando mantenimiento constante a la falle del Km 8+000.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>04/03/2016 - 12:06 PM</p>
<p>ENERO 2016:</p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la via en todo llargo de la via, tambien se esta realizando la reposicion de balizas.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>05/02/2016 - 10:17 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la via en todo llargo de la via.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>05/01/2016 - 07:41 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la via en todo llargo de la via. Se da mantenimiento permanente al sitio crítico en el Km 8+000.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>07/12/2015 - 10:04 AM</p>
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la via en todo llargo de la via. El sitio crítico en el Km 8+000 se ha mantenido estable en este periodo .</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>04/11/2015 - 09:54 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la via con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la via en todo llargo de la via. Se esta realizando el arreglo permanente del sitio crítico en el Km 8+000 .</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>07/10/2015 - 03:59 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>AGOSTO 2015</b></p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la vía con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la vía en todo llargo de la vía. Se esta realizando el arreglo del sitio critico en el Km 8+000 en donde se ha producido un asentamiento.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>07/09/2015 - 10:13 AM</p>
<p><b>JULIO 2015</b></p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la vía con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la vía en todo llargo de la vía. Tambien esta realizando sellado de fisuras y Bacheo en el Km 8+000 en donde se ha producido un asentamiento.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>06/08/2015 - 08:17 AM</p>
<p><b>JUNIO 2015</b></p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la vía con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la vía en todo llargo de la vía. Tambien esta realizando el sellado de fisuras en la calzada en Km 18+000 al 20+000.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>07/07/2015 - 02:23 PM</p>
<p><b>MAYO 2015</b></p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la vía con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la vía. Tambien esta realizando el sellado de fisuras en la calzada.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>07/06/2015 - 09:45 PM</p>
<p><b>ABRIL 2015</b></p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la vía con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la vía.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>07/05/2015 - 07:59 AM</p>
<p><b>MARZO 2015</b></p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la vía con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la vía.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>07/04/2015 - 11:45 AM</p>
<p><b>FEBRERO 2015</b></p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la vía con limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de la vía.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>09/03/2015 - 09:16 AM</p>
<p><b>ENERO 2015</b></p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la vía con limpieza de la vía.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>06/02/2015 - 01:56 PM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2014</b></p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la vía con limpieza de la vía y reparaciones menores.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>06/01/2015 - 10:35 AM</p>
<p><b>NOVIEMBRE 2014</b></p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la vía con limpieza de la vía y reparaciones menores, tambien se esta realizando el sello de fisuras.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>05/12/2014 - 02:26 PM</p>
<p><b>OCTUBRE 2014</b></p> <p>La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la vía con limpieza de la vía y reparaciones menores.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>10/11/2014 - 08:21 AM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2014</b></p> <p>La obra se encuentra prestando servicio ala comunidad, La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la vía con limpieza de la vía y reparaciones menores.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>06/10/2014 - 11:37 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JULIO 2014</b></p> <p>La obra se encuentra concluida, esta prestando servicio a la comunidad, Se realizo el Acta de Recepcion Provisional de la obra. La compañía constructora esta realizando el mantenimiento de la via.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2014 - 09:48 PM
<p><b>JUNIO 2014</b></p> <p>La obra se encuentra concluida, esta prestando servicio a la comunidad, esta en tramite la legalizacion del Acta de Recepcion Provisional.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/07/2014 - 10:04 PM
<p><b>MAYO 2014</b></p> <p>Esta legalizado el contrato complementario, Se termino de colocar el asfalto en la parroquia Honorato Vazquez. Se esta señalizando la via</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/06/2014 - 03:54 PM
<p><b>ABRIL 2014</b></p> <p>Se esta asfaltando la via en el sector de la parroquia Honorato Vazquez y realizando la construccion de bordillos y cunetas. Se esta realizando el mejoramiento del suelo en el sector critico en Ingapirca.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/05/2014 - 01:17 PM
<p><b>MARZO 2014</b></p> <p>Se termino de realizar el alcantarillado en la parroquia Honorato Vazquez y terminando la construccion de bordillos y cunetas. Se esta colocando asfalto desde la entrada a Honorato Vazquez al centro de la parroquia.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2014 - 09:56 AM
<p><b>FEBRERO 2014 (complemento)</b></p> <p>Se esta realizando el alcantarillado en la parroquia Honorato Vazquez y terminando la construccion de bordillos y cunetas. El contrato complementario, esta aprobado.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	14/03/2014 - 12:28 PM
<p><b>FEBRERO 2014</b></p> <p>La obra se encuentra paralizada se encuentra en tramite el contrato complementario para terminar la obra</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/03/2014 - 09:00 AM
<p><b>ENERO 2014</b></p> <p>La obra se encuentra paralizada se encuentra en tramite el contrato complementario para terminar la obra</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/02/2014 - 08:51 AM
<p><b>DICIEMBRE 2013</b></p> <p>la rehabilitación de la Carretera se encuentra según lo establecido en el cronograma de trabajo aprobado por fiscalización, continua la construccion de obras menores.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/02/2014 - 08:50 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2013</b></p> <p>la rehabilitación de la Carretera se encuentra según lo establecido en el cronograma de trabajo aprobado por fiscalización, continua la construccion de obras menores, se ha terminado la construccion del puente sobre el rio San Pedro .</p>	Calle Bravo, Oscar Leonardo	06/12/2013 - 02:33 PM
<p><b>OCTUBRE 2013</b></p> <p>la rehabilitación de la Carretera se encuentra según lo establecido en el cronograma de trabajo aprobado por fiscalización, continua la construccion de obras menores, colocacion de asfalto en el tramo Honorato Vazquez-Ingapirca- El Tambo, movimiento de tierras en el tramo Ingapirca-Tambo y continua la construccion del puente sobre el rio San Pedro . Se ha tendido asfalto en el tramo San Pedro- Ingapirca-El Tambo.</p>	Tintin Cevallos, Edgar Abelino	06/11/2013 - 03:03 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2013</b></p>	Tintin Cevallos, Edgar Abelino	06/11/2013 - 03:01 PM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>la rehabilitación de la Carretera se encuentra según lo establecido en el cronograma de trabajo aprobado por fiscalización, continua la construcción de obras menores, colocacion de asfalto en el tramo Honorato Vazquez-Ingapirca, movimiento de tierras en el tramo Ingapirca-Tambo y continua la construcción del puente sobre el rio San Pedro . Se ha tendido asfalto desde Honorato Vazquez hacia San Pedro.</p> <p>AGOSTO 2013</p> <p>La rehabilitación de la Carretera se encuentra según lo establecido en el cronograma de trabajo aprobado por fiscalización, continua la construcción de obras menores, colocacion de base en el tramo Honorato Vazquez-Ingapirca, movimiento de tierras en el tramo Ingapirca-Tambo y continua la construcción del puente sobre el rio San Pedro . A partir del 10 de agosto se inicia el tendido de carpeta asfaltica en el sector de Honorato Vasquéz,</p>		
<p>JULIO 2013</p> <p>La rehabilitación de la Carretera se encuentra según lo establecido en el cronograma de trabajo aprobado por fiscalización, continua la construcción de obras menores, colocacion de base en el tramo Honorato Vazquez-Ingapirca, movimiento de tierras en el tramo Ingapirca-Tambo y continua la construcción del puente sobre el rio San Pedro .</p>	Tintin Cevallos, Edgar Abelino	05/08/2013 - 11:18 AM
<p>JUNIO 2013</p> <p>La rehabilitación de la Carretera se encuentra según lo establecido en el cronograma de trabajo aprobado por fiscalización, continua la construcción de obras menores, colocacion de base en el tramo Honorato Vazquez-Ingapirca, movimiento de tierras en el tramo Ingapirca-Tambo y continua la construcción del puente sobre el rio San Pedro .</p>	Calle Bravo, Oscar Leonardo	05/07/2013 - 08:28 AM
<p>MAYO 2013</p> <p>La rehabilitación de la Carretera se encuentra según lo establecido en el cronograma de trabajo aprobado por fiscalización, ademas continua la construcción de obras menores, colocacion de base en el tramo Honorato Vazquez-Ingapirca, construcción de estribos en el puente del rio San Pedro.</p>	Calle Bravo, Oscar Leonardo	05/07/2013 - 08:25 AM
<p>ABRIL</p> <p>La rehabilitación de la Carretera se encuentra según lo establecido en el cronograma de trabajo establecido y aprobado por está fiscalización, hasta el momento se viene ejecutando cortes laterales a nivel de subrasante, charlas de concientización, Limpieza de Alcantarillas</p>	Calle Bravo, Oscar Leonardo	12/05/2013 - 09:54 AM

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falla gelógica ha provocado puntos críticos en la vía.	05/11/2018	Ivan Patricio Chaca Álvarez	10	10	1	0/1

*Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1*

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Recursos.</b> Falta de recursos CAUSARÍA el retraso del mantenimiento de la vía	05/04/2018	Ivan Patricio Chaca Álvarez	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Cañar > Cañar

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Inicio del proceso de contratacion, realizado	1-Solicitud de Información	06/08/2012		06/08/2013		Sí	2.0
2	PLANEACION: Entrega del anticipo, realizado	4-Inicio de Trabajo	16/11/2012		16/11/2012		Sí	2.0
3	PLANEACION: Firma del contrato, realizado	3-Adjudicación	16/11/2012		16/11/2012		Sí	2.0
4	EJECUCION: Calzada Realizada e n un 25% de la carretera el Tambo-Ingapirca-Honorato Vazquez, realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	8.0
5	EJECUCION: Infraestructura en el puente sobre el rio San Pedro, realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	8.0
6	EJECUCION. Superestructura en el puente sobre el rio San Pedro, realizado	5-Entregables Intermedios	27/09/2013		27/11/2013		Sí	8.0
7	EJECUCION: Calzada en un 50% de la carretera el Tambo-Ingapirca-Honorato Vazquez, realizado	5-Entregables Intermedios	27/09/2013		27/09/2013		Sí	8.0
8	EJECUCION: Calzada en un 75% de la carretera el Tambo-Ingapirca-Honorato Vazquez, realizado	5-Entregables Intermedios	27/09/2013		27/10/2013		Sí	9.0
9	EJECUCION. Movimiento de tierras, ejecutado	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		30/12/2013		Sí	9.0
10	EJECUCION: Calzada en un 100% de la carretera el Tambo-Ingapirca-Honorato Vazquez, realizado	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		27/06/2014		Sí	7.0
11	EJECUCION: Drenaje en la carretera El Tambo-Ingapirca-Honorato Vazquez, realizado	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		30/12/2013		Sí	7.0
12	EJECUCION: Muros de contencion, realizados	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		27/06/2014		Sí	7.0
13	EJECUCION: Señalización de la carretera El Tambo-Ingapirca-Honorato Vazquez, realizada	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		27/06/2014		Sí	7.0
14	CIERRE: Recepcion Provisional de la obra, concluida	9-Entregables Formales	27/12/2013		31/07/2014		Sí	8.0
15	EJECUCION: Mantenimiento a satisfaccion del MTOP en el primer cuatrimestre del año 2014.	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		31/12/2014		Sí	0.5
16	EJECUCION: Mantenimiento a satisfaccion del MTOP en el segundo cuatrimestre del año 2014.	5-Entregables Intermedios	29/09/2014		29/09/2014		Sí	0.5

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
17	EJECUCION: Mantenimiento a satisfaccion del MTOP en el tercer cuatrimestre del año 2014.	5-Entregables Intermedios	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.5
18	EJECUCION: Mantenimiento a satisfaccion del MTOP en el primer cuatrimestre del año 2015.	5-Entregables Intermedios	29/05/2015		29/05/2015		Sí	0.5
19	EJECUCION: Mantenimiento a satisfaccion del MTOP en el segundo cuatrimestre del año 2015.	5-Entregables Intermedios	28/08/2015		28/08/2015		Sí	0.5
20	EJECUCION: Mantenimiento a satisfaccion del MTOP en el tercer cuatrimestre del año 2015.	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.5
21	EJECUCION: Mantenimiento a satisfaccion del MTOP en el primer cuatrimestre del año 2016.	5-Entregables Intermedios	30/05/2016		30/05/2016		Sí	0.5
22	EJECUCION: Mantenimiento a satisfaccion del MTOP en el segundo cuatrimestre del año 2016.	5-Entregables Intermedios	29/09/2016		29/09/2016		Sí	0.5
23	EJECUCION: Mantenimiento a satisfaccion del MTOP en el tercer cuatrimestre del año 2016.	5-Entregables Intermedios	30/01/2017		30/01/2017		Sí	0.5
24	EJECUCION: Mantenimiento a satisfaccion del MTOP en el primer cuatrimestre del año 2017.	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		04/07/2017		Sí	0.5
25	EJECUCION: Mantenimiento a satisfaccion del MTOP en el segundo cuatrimestre del año 2017.	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		05/09/2017		Sí	0.5
26	EJECUCION: Mantenimiento a satisfaccion del MTOP en el segundo cuatrimestre del año 2017.	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		31/01/2018		Sí	0.5
27	CIERRE: liquidación economica de la obra realizada.	5-Entregables Intermedios	30/05/2018	30/11/2018			No	1.0
28	COMPLETADO: Recepcion definitiva de la obra incluida la etapa de mantenimiento, entregada	9-Entregables Formales	30/06/2018	31/12/2018			No	1.0


**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Vía con problemas de fisuras y hundimientos.	Quishpi Vélez, Luis Manuel	{PR} - Provincia - CAÑAR	31/08/2017
2	Supervisión Positiva: Obra terminada- Trabajos de Mantenimiento	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	30/04/2017
3	Supervisión Positiva - Trabajos de mantenimiento	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/02/2017
4	Supervisión Negativa.- Trizaduras y hundimientos en diferentes partes de calzada.	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	27/12/2016

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
5	Supervisión Positiva -Recorrido de la vía para verificar su estado para su mantenimiento respectivo	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/08/2016
6	Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza y mantenimiento	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/06/2016
7	Supervisión Positiva - Trabajos de mantenimiento en sectores con fallas geológicas	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/04/2016
8	Supervisión Positiva- proyecto terminado en un 100%	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/02/2016
9	Supervisión Positiva- Se realizan los respectivos mantenimientos	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/11/2015
10	Supervisión Positiva vía terminada - en funcionamiento	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/09/2015
11	Supervisión Positiva- Trabajos de mantenimiento en sitios críticos.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/08/2015
12	Supervisión Positiva vía terminada - en funcionamiento	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/07/2015
13	Proyecto terminado y en perfecto estado	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/05/2015
14	Proyecto terminado y en funcionamiento	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/02/2015
15	Verificación de la terminación del Proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	20/10/2014
16	Proyecto cumplido	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	17/07/2014
17	Colocación de Calzada	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2014
18	Recorrido con la comunidad para constatar los trabajos y avance del proyecto	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	08/04/2014
19	Construcción de aceras y bordillos	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/12/2013
20	Proyecto se encuentra en curso	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	29/07/2013
21	Colocación de la carpeta asfáltica.	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	10/10/2013
22	Colocación de la carpeta asfáltica	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	10/09/2013
23	Proyecto se encuentra en curso	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	17/06/2013
24	Ampliación de la vía	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	03/05/2013
25	Ensanchamiento der la vía construcción de muros	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	12/04/2013
26	BERTHA MOLINA LOYOLA	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	05/02/2013

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de obra		100.00 %	1	1	01/01/2013	Octubre


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	6,268,848.16
Estimado Al Fin Del Proyecto:	26,999,862.03 **
Costo Total:	25,500,000.00
Total Devengado:	26,279,862.03
% Costo Total Devengado:	103.06 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 103.06 %

**Perfil Económico 2018**

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	17,969,933.77	720,000.00	0.00	18,689,933.77
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	26,667,998.05	0.00	0.00	26,667,998.05
Ppto. Comprometido	26,347,510.79	0.00	0.00	26,347,510.79
Planeado - Codificado (2018)		720,000.00		
Programado a Devengar	25,973,893.71	720,000.00	0.00	26,693,893.71
Ppto. Devengado	26,279,862.03	0.00	0.00	26,279,862.03
Pagado Real	25,521,617.72	0.00	0.00	25,521,617.72
Estimado a fin de año	* 26,279,862.03	0.00	0.00	26,279,862.03
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-305,968.32	720,000.00	0.00	414,031.68
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 101.18 %	0.00 %	0.00 %	98.45 %
Ppto. Codificado 998	6,788,931.77	0.00	0.00	6,788,931.77
Ppto. Devengado 998	6,788,931.73	0.00	0.00	6,788,931.73

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018**

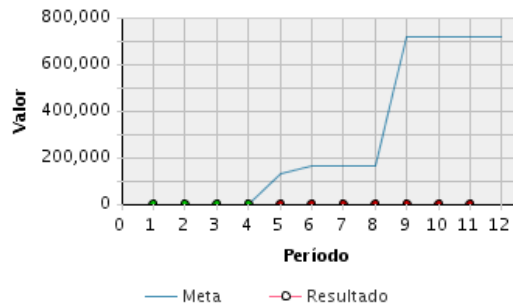

**Presupuesto Mensual 2018**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	128,674.66	0.00	128,674.66	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	32,945.00	0.00	161,619.66	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	161,619.66	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	161,619.66	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	558,380.34	0.00	720,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Nov	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Dic	0.00		720,000.00				
<b>Total</b>	<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. (Mejorar e incrementar la señalización horizontal y vertical en toda RVE. Identificando puntos críticos)
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
15	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		TAMBO-INGAPIRCAL(SEPTIEMBRE).pdf	08/10/2013
2	A1-Informe sitop Julio 2014	C1-Inf-sitop-julio-04.pdf	05/08/2014
3	A2- Informe sitop agosto 2014	C2-Inf-sitop-agosto-04.pdf	08/09/2014
4	A3-Informe-sitop-septiembre-2014	C3-Inf-sitop-septiembre-04.pdf	06/10/2014
5	A4- Informe sitop octubre 2014	C4-Inf-sitop-octubre-04.pdf	10/11/2014
6	A5-inf-sitop-noviembre-04	C5-Inf-sitop-noviembre-04.pdf	05/12/2014
7	A6-Inf-sitop-dic-04	C6-Inf-sitop-dic-04.pdf	06/01/2015
8	A7-Inf-sitop-ene-05	C7-Inf-sitop-ene-05.pdf	06/02/2015
9	A8-Informe-sitop-febrero-2015	C8-Inf-sitop-feb-05-T-I-HV.pdf	09/03/2015
10	A9-Inf-sitop-marzo-2015	C9-Inf-sitop-marzo-2015-T-I-HV.pdf	07/04/2015
11	Acta de Recepcion Provicional	Acta_de_Recepcion_Provicional.pdf	28/12/2016
12	B1-Inf-sitop-abr-2015	C9-Inf-sitop-abr-05-T-I-H-V.pdf	08/05/2015
13	B2 Informe Sitop mayo 05	inf-sitop-mayo-05-T-Ingapirca-HV.pdf	08/06/2015
14	B3-Informe sitop junio-05	Informe-junio-05_ Tambo-I.pdf	07/07/2015
15	B4-CONTRATO-PRINCIPAL	Contrato_original.pdf	08/07/2015
16	B5-Informe-sitop-julio-T-I-H-V	B5-Inf-sitop-julio-05-T-I-H-V.pdf	07/08/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
17	B6-OFICIO DICTAMEN DE PRIORIDAD SEMPLADES	SENPLADES-SGPBV-2014-0087-OF-DICTAMEN_FAVORABLE-TAMBO-ING.pdf	08/08/2015
18	B7-CUADRO DE DICTAMEN DE PRIORIDAD	cuadro_dictamen_favorable_-_mto-TAMBO-INGAPIRCA.pdf	08/08/2015
19	B8-Informe-sitop-agosto-05	Inf-sitop-Tambo-Ingapirca-Agos-05.pdf	07/09/2015
20	B9-Informe-sitop-septiembre-05-T-I-HV	B9-Informe.sitop-T-I-HV-Septiembre-05.pdf	07/10/2015
21	C1-Informe-sitop-octubre-05-T-I-HV	C1-Inf-sitop-oct-05-T-I-HV.pdf	05/11/2015
22	C2-Inf-sitop-Nov-05-T-I-HV	construccion_Tambo_Ingapirca.pdf	07/12/2015
23	C3-Inf-sitop-dic-T-I-HV	C3-Inf-sitop-dic-T-I-HV.pdf	06/01/2016
24	C4-Inf-sitop-ene-06-T-I-HV	C4-Inf-sitop-ene-06T-I-HV.pdf	05/02/2016
25	C5-Informe-sitop-feb-06-Tambo-Ingapirca	C5-Inf-sitop-feb-06-T-I-HV.pdf	04/03/2016
26	C6-Informe-sitop-mar-06-T-I-HV	C6-Inf-sitop-mar-06-T-I-HV.pdf	04/04/2016
27	C7-Inf-sitop-abril-06-T-I-HV	C7-Inf-sitop-abril-06-T-I-HV.pdf	04/05/2016
28	C8-Inf-sitop`-mayo-06-T-I-HV	C8-Inf-sitop-mayo-04-T-I-HV.pdf	05/06/2016
29	C9-Inf-sitop-junio-06-T-I-HV	C9-Inf-sitop-junio-T-I-HV.pdf	04/07/2016
30	CEDULA-REPORTE 2012	REPORTE_2012.pdf	30/12/2016
31	CEDULA-REPORTE 2013	REPORTE_2013.pdf	30/12/2016
32	CEDULA-REPORTE 2014	REPORTE_2014.pdf	30/12/2016
33	CEDULA-REPORTE 2016	REPORTE_2016.pdf	30/12/2016
34	Contrato-complementario	Contrato-Complementario.pdf	12/05/2014
35	Cédula presupuestaria mes de Julio 2017	CEDULA_JULIO_TAMBO_INGAPIRCA.pdf	04/08/2017
36	CÉDULA REPORTE 2017	REPORTE_2017.pdf	05/04/2018
37	D1-Inf.sitop.julio-06-T-I-HV	D1-Inf-sitop-julio-06-T-I-HV.pdf	03/08/2016
38	D2 informe sitop agosto	tambo_ingapirca.pdf	05/09/2016
39	D3 Informe sitop tambo ingapirca septiembre 2016	tambo_ingapirca.pdf	04/10/2016
40	D4 informe sitop tambo ingapirca octubre	tambo_ingapirca.pdf	05/11/2016
41	D5 Informe Sitop Tambo Ingapirca Noviembre 2016	Tambo_Ingapierca_Honorato_Vázquez.pdf	05/12/2016
42	D5_informe_sitop_Dic_2016_Tambo_Ingapirca	tambo_ingapirca.pdf	06/01/2017
43	D6_Inform. SITOP_ENERO_2017_Tambo_Ingapirca_Honorato_Vazquez	Tambo_Ingapirca_Honorato_Vazquez.pdf	03/02/2017
44	D7_INFORME SITOP TAMBO_INGAPIRCA FEB 2017	Tambo_Ingapirca_Honorato_Vazquez.pdf	03/03/2017
45	D8 INFORME SITOP TAMBI INGAPIRCA MARZO 2017	TAMBO_INGAPIRCA.pdf	05/04/2017
46	D9: INFORME SITOP TAMBO INGAPIRCA ABRIL 2017	Informe_ejecutivo_tambo_abril_2017.pdf	04/05/2017
47	Diagnósticos geológico para estudio de estabilización 8+100	MTOP-SUBZ6-2018-19-ME.pdf	23/03/2018
48	E1_INFORME SITOP MAYO TAMBO_INGAPIRCA	TAMBO_INGAPIRCA_HONORATO_VAZQUEZ.pdf	02/06/2017
49	Entrega de información del sitio crítico ubicado en el kilómetro 8+100	MTOP-DDCA-2018-1137-ME(informe_8+100_para_daniel_comision_tambo_recepcion).pdf	05/11/2018
50	Informe de trámite declaratoria de emergencia	MTOP-DDCA-2018-400-ME.pdf	05/06/2018
51	Informe ejecutivo Abril 2013	A4.pdf	22/11/2013
52	Informe ejecutivo Agosto 2013	A8.pdf	22/11/2013
53	Informe ejecutivo Enero 2013	A1.pdf	22/11/2013
54	Informe ejecutivo Febrero 2013	A2.pdf	22/11/2013
55	Informe ejecutivo Julio 2013	A7.pdf	22/11/2013
56	Informe ejecutivo Junio 2013	A6.pdf	22/11/2013
57	Informe ejecutivo Marzo 2013	A3.pdf	22/11/2013
58	Informe ejecutivo Mayo 2013	A5.pdf	22/11/2013
59	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVO_TAMBO.pdf	05/09/2017
60	Informe Ejecutivo mes de Diciembre del 2013	B3.pdf	05/03/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
61	Informe Ejecutivo mes de Enero del 2014	B4.pdf	05/03/2014
62	Informe ejecutivo mes de junio 2017	informe_tambo.pdf	04/07/2017
63	Informe ejecutivo Septiembre 2013	A9.pdf	22/11/2013
64	Informe Ejecutivo Sitop Noviembre 2013	B2.pdf	06/01/2014
65	Informe ejecutivo Sitop Octubre 2013	B1.pdf	29/11/2013
66	Informe Febrero 2014 Sitop	B5-Inf-feb-04-Sitop.pdf	14/03/2014
67	Informe referente a la falta de pago de planillas	MTOP-DDCA-2018-115-ME-1.pdf	23/03/2018
68	Informe sitop abril 2014	B7-Inf-Abr-04-Sitop.pdf	09/06/2014
69	Informe sitop junio 2014	B9-Inf-junio-04-sitop.pdf	09/07/2014
70	Informe sitop marzo 2014	B6-Inf-mar-04-Sitop.pdf	09/06/2014
71	Informe sitop mayo 2014	B8-Inf-May-04-Sitop.pdf	09/06/2014
72	Insistencia a Especialistas para entrega de diseños	MTOP-CON_CAN-2017-178-ME.pdf	05/10/2017
73	iNSISTENCIA INCLUSIÓN PAI 2018	insistencia_inclusion_PAI.pdf	03/08/2018
74	Mantenimiento 18	Mantenimiento_18.pdf	28/12/2016
75	Mantenimiento 19	Mantenimiento_19.pdf	28/12/2016
76	Mantenimiento 20	Mantenimiento_20.pdf	28/12/2016
77	Mantenimiento 21	Mantenimiento_21.pdf	28/12/2016
78	Mantenimiento 22	Mantenimiento_22.pdf	28/12/2016
79	Mantenimiento 23	Mantenimiento_23.pdf	28/12/2016
80	Mantenimiento 24	Mantenimiento_24.pdf	28/12/2016
81	Mantenimiento 25	Mantenimiento_25.pdf	28/12/2016
82	Mantenimiento 26	Mantenimiento_26.pdf	28/12/2016
83	Mantenimiento 27	Mantenimiento_27.pdf	28/12/2016
84	Mantenimiento 28	Mantenimiento_28.pdf	28/12/2016
85	Mantenimiento 29	Mantenimiento_29.pdf	28/12/2016
86	Oficio enviado a la Subsecretaría solicitando los Términos de referencia	Solicitud_de_TDRs.pdf	04/12/2017
87	Oficio INCP solicitando atención técnica a la vía	MTOP-DDCA-2018-21-EXT.pdf	23/03/2018
88	Oficio respuesta Especialista en Geotecnia	MTOP-EITZ6-2017-287-ME.pdf	05/10/2017
89	Oficio solicitando designación de miembros para la recepción definitiva.	OFICIO_SOLICITUD_MIEMBROS_RECEPCION.pdf	05/07/2018
90	Oficio solicitando designación de miembros para la recepción definitiva.	oficio_desig_recep_tambo_ingaç.pdf	05/10/2018
91	Oficio solicitud de Términos de Referencia	MTOP-DDCA-2017-973-ME.pdf	01/11/2017
92	Oficio solicitud declaratoria	MTOP-DDCA-2018-325-ME.pdf	04/05/2018
93	Orden de Cambio 01	Orden_de_Cambio_01.pdf	28/12/2016
94	Orden de Cambio 02	Orden_de_Cambio_02.pdf	28/12/2016
95	Perfil técnico y presupuesto referencial para los "TRABAJOS EMERGENTES KM 8+100	MTOP-SUBZ6-2018-1065-ME.pdf	05/09/2018
96	Planilla de mantenimiento Nro. 36	Planilla_36.pdf	04/07/2017
97	Planilla de mantenimiento Nro. 37	SABANA_FOPECA_TAMBO_INGAPIRCA.pdf	04/08/2017
98	Planilla de mantenimiento Nro. 38	Planilla_38.pdf	05/09/2017
99	Planilla de mantenimiento Nro. 40	Sabana+_Reajuste_PI_-_40_Tambo_Ingapirca.pdf	01/11/2017
100	Planilla de mantenimiento Nro. 41	Planilla_mantenimiento_N41_FOPECA.pdf	04/12/2017
101	Planilla de mantenimiento Nro. 42	Planilla_Fopeca_42.pdf	05/01/2018
102	Planilla de mantenimiento Nro. 43	PLANILLA_N°_43.pdf	23/03/2018
103	Planilla de mantenimiento Nro. 44	PLANILLA_N°_44.pdf	23/03/2018
104	Planilla de mantenimiento Nro. 45	PLANILLA_N°_45.pdf	23/03/2018
105	Planilla de mantenimiento Nro. 46	PLANILLA_N°_46.pdf	05/04/2018
106	Reajuste del Anticipo	Reajuste_del_Anticipo.pdf	28/12/2016



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
107	Recomendación Especialistas.	MTOP-EITZ6-2017-245-ME.pdf	04/08/2017
108	Resolución de declaratoria de Emergencia Cantonal de sitios críticos	resolucio	04/05/2018
109	SOLICITANDO APOYO PARA NOMBRAR COMISION	oficio_nombrar_comision.pdf	03/08/2018
110	TDR para contratar estudios sitios críticos 8 y 13	tdrs_tambo-ingapirca-h.vazques.pdf	04/05/2018

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Chaca Álvarez, Ivan Patricio	Titular	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	ichaca@mtop.gob.ec	023974600
Chaca Álvarez, Ivan Patricio	Lider de proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	ichaca@mtop.gob.ec	023974600
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
62426_1.jpg	11/02/2016
