

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 4**  
**Dirección Provincial Manabí**

**PROYECTO: K084 MTOP - Proyecto de reconstrucción de obras por el terremoto 2016 - Manabí**

Líder del Proyecto:	Tarabo Mieles, Tyron Xavier (ttarabo@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Programas Relacionados:	Provincia - Manabí, PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016
Titular:	Macias Fuentes, Alberto Fabrizzio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.381287	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	117,786,959.23
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/05/2016 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	05/12/2018	Fecha de Fin Base:	30/12/2016
Modificado por:	Tarabo Mieles, Tyron Xavier	Fecha del siguiente Hito:	01/02/2018

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Reconstrucción de obras de Infraestructura afectadas por el terremoto 16A-2016:  
 - Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.- Demoliciones en varios cantones de la provincia de Manabí.  
 -Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.  
 -Construcción puente Jama.  
 - Fiscalización Construcción puente Jama.  
 -Rehabilitación de la carretera: km. 8(Bahía) - Bahía de 8 km de longitud; provincia de Manabí.  
 - Fiscalización Rehabilitación de la carretera: km. 8(Bahía) - Bahía de 8 km de longitud; provincia de Manabí.  
 -Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.  
 -Construcción de plataformas en varios cantones de la provincia de Manabí..

**Beneficios Cualitativos**

Mejorar el desplazamiento y comunicación entre los Cantones de la Provincia de Manabí y contribuir con la reconstrucción de edificaciones publicas.

**Tipo de Beneficiario**

Población de Manabí en general


**Restricciones**

Tiempo.- Duración de estado de exepción (15/12/2016).

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 02/05/2016 Fecha de Fin: 31/12/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

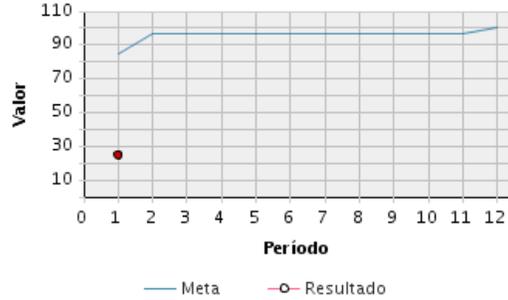

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	85 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	100 %
	Avance real acumulado											
	25 %											
Estado												

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, con Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME y Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME, ambos de fecha 29 de Noviembre de 2018, suscrito por el Subsecretario Zonal 4 Ing. Iván Ganchozo solicita aval de obra y fiscalización respectivamente para el financiamiento del contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - Los trabajos de mitigación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al presente reporte se encuentra en espera de asignación de recursos, por la reducción de presupuesto que el MEF efectuó en el mes de julio, los cuales fueron solicitados mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba), contrato complementario de fiscalización en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez. Con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, con Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-196-ME de fecha 6 de agosto de 2018 suscrito por el Ing. Stewar Durán en calidad de administrador de contrato, dirigido al Ing. Diofre Alcívar Subsecretario Zonal 4, informa que mediante Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF dirigido al Contratista de la obra se aprueba la suspensión de plazo de la ejecución de los trabajos hasta que el proyecto se reactive económicamente, ya que hasta la fecha no se ha cancelado las planillas en trámite del 10 a la 17, el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se solicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, cuenta con acta de recepción provisional, se encuentra en período de prueba (a la fecha aún el acta de recepción</p>	Tarabo Mieles, Tyron Xavier	05/12/2018 - 10:34 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>definitiva se encuentra en trámite en vista e que el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se solicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p>		
<p>OCTUBRE 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 9 de septiembre del 2018 se suspenden los trabajos, la suspensión se levantará toda vez que se suscriban los actos administrativos en trámite. Adicionalmente se tramita suscripcion de complementario de consultoria para la fiscalizacion por un valor total de 234.254,70. MAS IVA. Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, se solicita recursos para los contratos complementarios.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la via Manta - Los trabajos de mitgación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al pressnte reporte se enuentra en espera de asignación de recursos, por la reducción de presupuesto que el MEF efectuó en el mes de julio, los cuales fueron solicitados mediante Memotando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba), contrato complementario de fiscalizacion en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados mediante Memotando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, con Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-196-ME de fecha 6 de agosto de 2018 suscritopor el Ing. Stewar Durán en calidad de adminstrador de contrato, dirigido al Ing. Diofre Alcívar Subsecretario Zonal 4, informa que mediantr Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF dirigido al Contratista de la obra se aprueba la suspensión de plazo de la ejecución de los trabajos hasta que el proyecto se reactive económicamente, ya que hasta la fecha no se ha cancelado las planillas en trámite de l 10 a la 17, el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el ecurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se olicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-rabajos concluidos, cuenta con acta de recepción provisional, se encuentra en período de prueba (a la fecha aún el acta de recepción definitiva se encuentra en trámite en vista e que el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se olicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>05/11/2018 - 09:47 AM</p>
<p>Septiembre 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 9 de septiembre del 2018 se suspenden los trabajos, la suspensión se levantará toda vez que se suscriban los actos administrativos en trámite. Adicionalmente se tramita suscripcion de complementario de consultoria para la fiscalizacion por un valor total de 234.254,70. MAS IVA.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la via Manta - San Mateo de 9 km de longitud.- Proyecto concluido en octubre de 2017 y se econtraba en tramite de recepcion provisional de la obra; sin embargo con fecha 5 de diciembre 2017 se presentaron fallas en los taludes del proyecto por el sismo del 3 de diciembre de 2017, ante lo cual la contratista efectuó a su costo las remediaciones inmediatas, que permitieron dar transitabilidad a la vía. Con Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-182-ME de fecha 10 de julio 2018, la supervisión de estudios zonal 4 , valida la alternativa de remediación definitiva al proyecto, misma que fue presentada por la fiscalización contratada Esta intervencion tiene un costo de 1'714213,50 MAS IVA, trabajos que incluidos los servicios de fiscalización alcanzan un total de 1'804.552,55 mas iva, resultando un monto total requerido incluido iva de 2</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>04/10/2018 - 08:10 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>’021.098,86 USD. Al presente se encuentra en espera de asignación de recursos para continuar con el trámite respectivo de la ejecución de los trabajos de remediación inmediata.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Con fecha 21 de mayo del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician trabajos mismos que debían ser culminados el 10 de junio del 2018. Sin embargo con la suscripción de la orden de cambio # 3 al proyecto a través del cual se legaliza un incremento contractual a la ejecución de obras por un valor de 1 ’899.006,93 USD mas iva , se autoriza la implementación de 90 días adicionales que extienden la fecha de terminación de los trabajos para el 08-09-2018, los trabajos a la presente fecha se encuentran concluidos, por lo que el proyecto entra en período de prueba (6meses); previo a la suscripción del acta de recepción definitiva.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con orden de cambio No. 4 de fecha 07 de febrero de 2018, se legaliza el incremento del plazo contractual en 90 días, contados a partir del 09 de Junio 2018, por lo que la fecha para la terminación de los trabajos se la estableció para el 08 de Septiembre de 2018; sin embargo con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, en vista de que a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-Trabajos finalizados y recibido provisionalmente, se encuentran pendientes de cancelar las planillas 9-10-11 de obra y fiscalización a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF</p>		
<p>Agosto 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 8 de junio del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician los trabajos , toda vez que se suscribe contrato complementario por 3’003.265,33 USD MAS IVA, otorgando además un plazo de ejecución de 90 días contados a partir del reinicio de los trabajos; esto es hasta el 6-09-2018. Adicionalmente se tramita suscripción de complementario de consultoría para la fiscalización por un valor total de 234.254,70. MAS IVA.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.- Proyecto concluido en octubre de 2017 y se encontraba en trámite de recepción provisional de la obra; sin embargo con fecha 5 de diciembre 2017 se presentaron fallas en los taludes del proyecto por el sismo del 3 de diciembre de 2017, ante lo cual la contratista efectuó a su costo las remediaciones inmediatas, que permitieron dar transitabilidad a la vía. Con Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-182-ME de fecha 10 de julio 2018, la supervisión de estudios zonal 4 , valida la alternativa de remediación definitiva al proyecto, misma que fue presentada por la fiscalización contratada Esta intervención tiene un costo de 1’714213,50 MAS IVA, trabajos que incluidos los servicios de fiscalización alcanzan un total de 1’804.552,55 mas iva, resultando un monto total requerido incluido iva de 2 ’021.098,86 USD. Al presente se encuentra en espera de asignación de recursos para continuar con el trámite respectivo de la ejecución de los trabajos de remediación inmediata.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Con fecha 21 de mayo del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician trabajos mismos que debían ser culminados el 10 de junio del 2018. Sin embargo con la suscripción de la orden de cambio # 3 al proyecto a través del cual se legaliza un incremento contractual a la ejecución de obras por un valor de 1 ’899.006,93 USD mas iva , se autoriza la implementación de 90 días adicionales que extienden la fecha de terminación de los trabajos para el 08-09-2018 y a la fecha se tramita el incremento de 118.118,23 USD mas iva para los trabajos de fiscalización complementarios, los mismos que se encuentran en espera de asignación de recursos.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con orden de cambio No. 4 de fecha 07 de febrero de 2018, se legaliza el incremento del plazo contractual en 90 días, contados a partir del 09 de Junio 2018, por lo que la fecha para la terminación de los trabajos se la estableció para el 08 de Septiembre de 2018; sin embargo con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, en vista de que a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>05/09/2018 - 11:28 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-Trabajos finalizados y recibido provisionalmente, se encuentran pendientes de cancelar las planillas 9-10-11 de obra y fiscalización a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p>		
<p>JULIO 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 8 de junio del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician los trabajos , toda vez que se suscribe contrato complementario por 3'003.265,33 USD MAS IVA, otorgando además un plazo de ejecución de 90 días contados a partir del reinicio de los trabajos; esto es hasta el 6-09-2018. Adicionalmente se tramita suscripción de complementario de consultoría para la fiscalización por un valor total de 234.254,70. MAS IVA.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.- Proyecto concluido en octubre de 2017 y se encontraba en trámite de recepción provisional de la obra; sin embargo con fecha 5 de diciembre 2017 se presentaron fallas en los taludes del proyecto por el sismo del 3 de diciembre de 2017, ante lo cual la contratista efectuó a su costo las remediaciones inmediatas, que permitieron dar transitabilidad a la vía. Con Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-182-ME de fecha 10 de julio 2018, la supervisión de estudios zonal 4 , valida la alternativa de remediación definitiva al proyecto, misma que fue presentada por la fiscalización contratada Esta intervención tiene un costo de 1'714.213,50 MAS IVA, trabajos que incluidos los servicios de fiscalización alcanzan un total de 1'804.552,55 mas iva, resultando un monto total requerido incluido iva de 2'021.098,86 USD.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Con fecha 21 de mayo del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician trabajos mismos que debían ser culminados el 10 de junio del 2018. Sin embargo con la suscripción de la orden de cambio # 3 al proyecto a través del cual se legaliza un incremento contractual a la ejecución de obras por un valor de 1'899.006,93 USD mas iva , se autoriza la implementación de 90 días adicionales que extienden la fecha de terminación de los trabajos para el 08-09-2018 y a la fecha se tramita el incremento de 118.118,23 USD mas iva para los trabajos de fiscalización complementarios.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con orden de cambio No. 4 de fecha 07 de febrero de 2018, se legaliza el incremento del plazo contractual en 90 días, contados a partir del 09 de Junio 2018, por lo que la fecha para la terminación de los trabajos se la estableció para el 08 de Septiembre de 2018; sin embargo con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, en vista de que a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-Trabajos finalizados y recibido provisionalmente, se encuentran pendientes de cancelar las planillas 9-10-11 de obra y fiscalización</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>06/08/2018 - 06:35 PM</p>
<p>Junio 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:12 PM</p>
<p>Mayo 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:12 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Abril 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</li> </ul>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:11 PM</p>
<p>Marzo 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</li> </ul>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:10 PM</p>
<p>Febrero 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</li> </ul>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:10 PM</p>
<p>Enero 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</li> </ul>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:09 PM</p>
<p>Diciembre 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</li> </ul>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:09 PM</p>
<p>Noviembre 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</li> </ul>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:09 PM</p>
<p>Octubre 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</li> </ul>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>14/11/2017 - 03:02 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Septiembre 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona En el mes de mayo se continúa con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</li> </ul>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>14/11/2017 - 03:02 PM</p>
<p>Agosto 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de mayo se continúa con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</li> </ul>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>14/11/2017 - 03:01 PM</p>
<p>Julio 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de mayo se continúa con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</li> </ul>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>14/11/2017 - 03:01 PM</p>
<p>Junio 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de mayo se continúa con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</li> </ul>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>14/11/2017 - 03:01 PM</p>
<p>Mayo 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de mayo se continúa con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</li> </ul>	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>08/06/2017 - 10:15 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Abril 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de abril se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</li> </ul>	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>08/06/2017 - 10:14 AM</p>
<p>Marzo 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de marzo se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</li> </ul>	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>11/04/2017 - 02:30 PM</p>
<p>Febrero 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de febrero se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</li> </ul>	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>11/04/2017 - 02:29 PM</p>
<p>Enero 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de enero se continua con los trabajos de reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</li> </ul>	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>11/04/2017 - 02:26 PM</p>
<p>Diciembre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de noviembre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</li> </ul>	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>11/04/2017 - 02:25 PM</p>
<p>Noviembre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p>	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>08/12/2016 - 08:57 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En el mes de noviembre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</li> </ul>		
<p>Octubre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de octubre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</li> </ul>	Vera Vera, José Ricardo	08/12/2016 - 08:56 AM
<p>Septiembre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de septiembre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</li> </ul>	Vera Vera, José Ricardo	08/12/2016 - 08:55 AM
<p>Agosto 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de julio se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, contrata la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</li> </ul>	Vera Vera, José Ricardo	08/12/2016 - 08:52 AM
<p>Julio 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de julio se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.</p>	Vera Vera, José Ricardo	08/12/2016 - 08:48 AM
<p>Junio 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de junio se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.</p>	Vera Vera, José Ricardo	08/12/2016 - 08:42 AM
<p>Mayo 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p>	Vera Vera, José Ricardo	08/12/2016 - 08:42 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
En el mes de mayo se inicia la construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción.		

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>2- NACIONAL. Ambiental.</b> El malo temporal por lluvias CAUSARÍA que se retrasen las obras de reconstrucción.	05/07/2018	Tyron Xavier Tarabo Mieles	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Construcción de Plataformas en el cantón Jaramijó.	5-Entregables Intermedios	29/10/2016		29/10/2016		Sí	2.0
2	EJECUCIÓN: Construcción de Plataformas en el cantón Chone.	5-Entregables Intermedios	15/11/2016		15/11/2016		Sí	3.0
3	EJECUCIÓN: Construcción de Plataformas en el cantón Jaramijó.	5-Entregables Intermedios	25/11/2016		25/11/2016		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: Construcción de Plataformas en el cantón Rocafuerte.	5-Entregables Intermedios	25/11/2016		28/11/2016		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo- San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.	5-Entregables Intermedios	05/03/2017	21/12/2018			No	10.0
6	EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.	5-Entregables Intermedios	06/03/2017	21/12/2018			No	10.0
7	EJECUCIÓN: Contrato 3- Construcción puente Jama.	5-Entregables Intermedios	09/04/2017		29/01/2018		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Contrato 4- Fiscalización Construcción puente Jama.	5-Entregables Intermedios	09/04/2017	21/12/2018			No	10.0
9	EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5-Entregables Intermedios	09/05/2017	21/12/2018			No	10.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
10	EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5-Entregables Intermedios	09/05/2017	21/12/2018		▼	No	10.0
11	EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.	5-Entregables Intermedios	15/09/2017	21/12/2018		▼	No	10.0
12	CIERRE: Liquidación de contratos Reconstrucción de infraestructura vial en las zonas afectadas por el terremoto, contrato 1,2,3,4,5.	5-Entregables Intermedios	01/02/2018	01/02/2018		▼	No	7.0
13	CIERRE: Actas provisionales de contratos Reconstrucción de infraestructura vial en las zonas afectadas por el terremoto, contrato 1,2,3,4,5.	5-Entregables Intermedios	21/02/2018	21/02/2018		▼	No	5.0
14	CIERRE: Actas definitivas de contratos Reconstrucción de infraestructura vial en las zonas afectadas por el terremoto, contrato 1,2,3,4,5.	5-Entregables Intermedios	21/12/2018	21/12/2018		▼	No	3.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de informes técnicos de control de obra.		100.00 %	1	1	01/01/2017	Ene-Jun


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	117,786,959.23 **
Costo Total:	244,516,825.20
Total Devengado:	117,786,959.23
% Costo Total Devengado:	48.17 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 48.17 %

**Perfil Económico 2018**

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	116,018,821.65	0.00	0.00	<b>116,018,821.65</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Codificado	244,516,825.22	0.00	0.00	<b>244,516,825.22</b>
Ppto. Comprometido	177,173,230.42	0.00	0.00	<b>177,173,230.42</b>
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	116,018,820.65	0.00	0.00	<b>116,018,820.65</b>
Ppto. Devengado	117,786,959.23	0.00	0.00	<b>117,786,959.23</b>
Pagado Real	108,704,578.32	0.00	0.00	<b>108,704,578.32</b>
Estimado a fin de año	* 117,786,959.23	0.00	0.00	<b>117,786,959.23</b>
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-1,768,138.58	0.00	0.00	<b>-1,768,138.58</b>
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 101.52 %	0.00 %	0.00 %	<b>101.52 %</b>
Ppto. Codificado 998	12,557,087.19	0.00	0.00	<b>12,557,087.19</b>
Ppto. Devengado 998	11,955,338.58	0.00	0.00	<b>11,955,338.58</b>

\* Ppto. Devengado

**OBJETIVOS ALINEADOS**

**Objetivos Operativos**

17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
18	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
19	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
20	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	7_ACCESO_BAHIA_FISCA_03-09-2018-041754.pdf	05/09/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
2	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	7ACCESO_BAHIA_FISCA_02-10-2018-042643.pdf	04/10/2018
3	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	7_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	05/11/2018
4	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	05/12/2018
5	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	7_ACCESO_BAHIA_FISCA_02-08-2018-045904.pdf	06/08/2018
6	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_TERREMOTO_OBRA_03-09-2018-054138.pdf	05/09/2018
7	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	8MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_TERREMOTO_OBRA_02-10-2018-042807.pdf	04/10/2018
8	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf	05/11/2018
9	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MEMORANDOS_SUSPENSIÓN_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA.pdf	05/11/2018
10	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Memorando_Nro._MTOB-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terremoto.pdf	05/11/2018
11	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf	05/12/2018
12	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MEMORANDO_NRO._MTOB-SUBZ4-2018-1540-ME.pdf	05/12/2018
13	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MEMORANDO_NRO._MTOB-SUBZ4-2018-1541-ME.pdf	05/12/2018
14	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_1.pdf	05/12/2018
15	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_2.pdf	05/12/2018
16	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_3.pdf	05/12/2018
17	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_4.pdf	05/12/2018
18	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_TERREMOTO_OBRA_02-08-2018-091831.pdf	06/08/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	HITO 13 CIERRE: ACTA DE RECEPCIÓN PROVICIONAL PUENTE JAMA PARTE 1	ACTA_PROVISIONAL_PTE._JAMA_1.pdf	06/08/2018
20	HITO 13 CIERRE: ACTA DE RECEPCIÓN PROVICIONAL PUENTE JAMA PARTE 2	ACTA_PROVISIONAL_PTE._JAMA_2.pdf	06/08/2018
21	HITO 1: Plataformas Cantón Jaramijó: Contrato y sabanas de planillas 1 y 2.	Contrato_y_sabanas_planillas..rar	29/11/2016
22	HITO 2: Plataformas Cantón Chone: Contrato y sabanas de planillas 1 a 7.	Contratos_y_sabanas_de_plataforma_Chone_(1).pdf	01/12/2016
23	HITO 4: Plataformas Cantón Rocafuerte: Contrato y sabanas de planillas 1 a 4, Danzarín, Valdes.	Contratos_y_sabanas_de_plataforma_Rocafuerte.pdf	28/11/2016
24	HITO 4: Plataformas Cantón Rocafuerte: Contrato y sabanas de planillas Higuierón.	Sabana_y_planilla_Higuierón..rar	01/12/2016
25	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf	05/12/2018
26	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	3SAN_PLACIDO_-_PICHINCHA_OBA_TERREMOTO__02-10-2018-041753.pdf	04/10/2018
27	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	3SAN_PLACIDO_-_PICHINCHA_FISCA_TERREMOTO__02-10-2018-041838.pdf	04/10/2018
28	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	3_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf	05/11/2018
29	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	Memorando_Nro._MTOPI-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terremoto.pdf	05/11/2018
30	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS EN EJECUCIÓN	3_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_TERREMOTO_OBRA_03-08-2018-063332.pdf	06/08/2018
31	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS EN EJECUCIÓN	3_SAN_PLACIDO_TERRRMOTO_OBRA_03-09-2018-040955.pdf	05/09/2018
32	HITO 5 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.	Contrato_1__planilla_1..rar	29/11/2016
33	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA_03-09-2018-041134.pdf	05/09/2018
34	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA__02-10-2018-041934.pdf	04/10/2018
35	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4MANTA_-_SAN_MATEO_FISCA_02-10-2018-042021.pdf	04/10/2018
36	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	05/11/2018
37	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Memorando_Nro._MTOPI-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terremoto.pdf	05/11/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
38	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MANTA_-SAN_MATEO_OBRA.pdf	05/12/2018
39	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4_MANTA_- _SAN_MATEO_OBRA_02-08-2018-045539.pdf	06/08/2018
40	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	PUENTE_JAMA_OBRA.pdf	05/12/2018
41	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_OBRA_03-09-2018-040301.pdf	05/09/2018
42	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf	05/11/2018
43	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	Memorando_Nro._MTOF-DF-2018-870- ME_Confirmación_Desembolso_Crédito_Chino_Jama_y_Bahia.pdf	05/11/2018
44	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	Memorando_Nro._MTOF-SUBZ4-2018-1384- ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terremoto.pdf	05/11/2018
45	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA RESPALDO DE TRABAJOS EJECUTADOS	1_PUENTE_JAMA_OBRA_02-08-2018-045225.pdf	06/08/2018
46	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA RESPALDO DE TRABAJOS EJECUTADOS	1PUENE_JAMA_OBRA_02-10-2018-041211.pdf	04/10/2018
47	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_FISCA_03-09-2018-040352.pdf	05/09/2018
48	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1PUENE_JAMA_FISCA_02-10-2018-041257.pdf	04/10/2018
49	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf	05/11/2018
50	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	PUENTE_JAMA_FISCA.pdf	05/12/2018
51	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_FISCA_02-08-2018-045305.pdf	06/08/2018
52	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA OFICIO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS	7_PRONUNCIAMIENTO_SUSPENSION_ACCESO_BAHIA	<del>06/08/2018</del> -060017.pdf
53	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	7_ACCESO_BAHIA_OBRA_02-08-2018-045819.pdf	06/08/2018
54	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	7_ACCESO_BAHIA_OBRA_03-09-2018-041710.pdf	05/09/2018
55	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	7ACCESO_BAHIA_OBRA_02-10-2018-042602.pdf	04/10/2018
56	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	7_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	05/11/2018
57	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Memorando_Nro._MTOF-SUBZ4-2018-1384- ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terremoto.pdf	05/11/2018
58	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Memorando_Nro._MTOF-DF-2018-870- ME_Confirmación_Desembolso_Crédito_Chino_Jama_y_Bahia.pdf	05/11/2018
59	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	05/12/2018

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Alcívar Arauz, Diofre Leonel	Patrocinador ejecutivo.	Subsecretario Zonal 4	dalcivar@mtop.gob.ec	
Tarabo Mieles, Tyron Xavier	Lider del proyecto.	Coordinador de Infraestructura	ttarabo@mtop.gob.ec	023974600
