

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Cotopaxi

PROYECTO: K018 MTOP- Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo, Provincia de Cotopaxi de 9.75 Km. de Longitud

Líder del Proyecto:	Flores Fernández, César Aníbal (cfloresf@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gamboa López, Enma Katherine	Programas Relacionados:	Provincia - Cotopaxi, REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM. DE LONGITUD, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Morales Borja, Marcelo Rene	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.12
CUP:	175200000.0000.375366	TIR:	13.88 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	1,143.58
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,768,629.99
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	25/02/2013 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	05/06/2019	Fecha de Fin Base:	22/05/2015
Modificado por:	Flores Fernández, César Aníbal	Fecha del siguiente Hito:	30/03/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolla en una zona montañosa con una longitud aproximada de 9.75 Km, caracterizado por la presencia de un camino vecinal que comienza justamente donde concluye la intersección de la Panamericana Sur de Salcedo y el Paso Lateral Latacunga de la arteria vial E-35 del Tramo Jambelí - Latacunga Ambato integra plenamente al desarrollo vial, su trazado se dirige por el sector de San Francisco, hacia la zona oriental donde se encuentra la vía de acceso al Oriente (Salcedo-Tena), conectándose más adelante con el sector de Rumipamba Central, para finalmente cerrar el anillo uniéndonos al norte de la Panamericana que nos conduce a Latacunga.

PRODUCTO: Mejorar las condiciones actuales de las vías perimetrales que conforman el anillo vial de salcedo, mediante la colocación de carpeta asfáltica, con el propósito de lograr el des congestionamiento vehicular de la zona céntrica de la ciudad de Salcedo y contribuir al ordenamiento territorial, por lo tanto con su implementación se contribuye a la transformación de la matriz productiva.

OBJETIVO GENERAL: #Mejorar las condiciones actuales de las vías perimetrales que conforman el anillo vial de salcedo, mediante la colocación de carpeta asfáltica, con el propósito de lograr el des congestionamiento vehicular de la zona céntrica de la ciudad de Salcedo y contribuir al ordenamiento territorial, por lo tanto con su implementación se contribuye a la transformación de la matriz productiva.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Implementar obras de infraestructura vial que permita mejorar las condiciones actuales de las vías, mediante la colocación de carpeta asfáltica para optimizar las condiciones de circulación vehicular.
- Ejecutar las obras de seguridad vial y señalización, que permita la circulación vehicular en condiciones óptimas.
- Mitigar los impactos que produce la implementación del proyecto, mediante la aplicación del Plan de Manejo Ambiental.
- Realizar el monitoreo en la etapa de implementación del proyecto que permita garantizar la eficacia y eficiencia de su ejecución.

LINEA BASE: Las vías Perimetrales de la ciudad de Salcedo, que conforman el "Anillo Vial del Cantón Salcedo" se encuentran en estado natural o empedradas muy deteriorado, sobre un tipo de terreno montañoso, la mayor parte de la vía no tiene cunetas, no cuenta con obras de drenaje, los alineamientos horizontales y verticales son aceptables, y su estado es malo.

La infraestructura vial existente tiene las siguientes características:

- Capa de Rodadura: Natural y empedrado.
- Ancho de la vía: 6.00 m de ancho.
- Longitud de la vía: 10,00 Km, de los cuales 7 Km existentes.
- Estado de la vía: Malo.
- Tipo de vía: Camino Vecinal.
- Tipo de terreno: Montañoso.

DATOS GENERALES

Descripción

- Carriles de circulación La vía cuenta con un 1 carril de circulación.
- Cunetas No existentes.
- Alcantarillas 7 Km. Construidos.
- Señalización inexistente

TIPO DE BENEFICIARIOS:

Beneficios Cualitativos

Por efecto de:la construcción de esta obra se tiene

- Ahorro en los costos de operación de vehículos
- Disminución del tiempo de desplazamiento
- revaloración de predios agrícolas
- aumento del turismos,
- a mejorar las condiciones de vida de la población de influencia del proyecto.
- Seguridad vial
- Ordenamiento territorial del espacio comprendido entre la vía existente y el trazado del anillo vial

Tipo de Beneficiario

Población asentada a lo largo del anillo vial (Salcedo)
 Población agrícola, ganadera y turística
 Población local y nacional

Desde el punto de vista de análisis de los beneficiarios del proyecto, clasificados de acuerdo al nivel de requerimiento en Directos e Indirectos, considerando a los primeros a los demanda efectiva del proyecto son de las parroquias de San Miguel y Milliquindil (Santa Ana), que según el Censo INEC del año 2010, corresponden a 38.518 habitantes,y a los indirectos a la diferencia de estos con respecto a la población de referencia del proyecto. son 19.698 habitantes


Restricciones

TIEMPO: La construcción de la obra tenfrá una duración de 39 meses,
 COSTO: El proyecto tendrá un costo total de \$ 134499.177,96
 CALIDAD: El producto final a veces no se puede cumplir al 100%, por la mala calidad de material (asfalto).
 RECURSOS: La falta de disponibilidad de recursos financieros para la ejecución del proyecto
 RIESGOS: La falta de estudios completos conlleva a no cumplir el tiempo de ejecución del proyecto y su costo podrá elevarse
 ALCANCE: El cantón Salcedo presenta un congestionamiento vehicular de gran magnitud por el paso del transporte que diariamente se moviliza desde las provincias del Oriente ecuatoriano, Chimborazo y Tungurahua hacia la capital de la República, motivo que decidió que el gobierno nacional disponga la construcción de una vía alterna que permita la movilización de todo el transporte por un paso lateral que brinda la facilidades de seguridades técnicas para descongestionar el tráfico en el cantón Salcedo.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------------------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 92.64 %
Fecha de Inicio: 25/02/2013 **Fecha de Fin:** 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	97 %	99 %	100 %
	Avance real acumulado											
	68 %											
Estado												

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO . 2019 El proyecto se encuentra paralizado, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, mediante Acuerdo 19, del 31 de mayo 2019, Aprueba el proyecto, El Director Distrital de Cotopaxi mediante Memorando Nro. MTOP-DDCO-2019-993-ME de 30 de mayo 2019, solicita reforma entre proyectos y realizar la modificación del POA 2019, a fin de optimizar los recursos y asignar al proyecto</p>	Flores Fernández, César Aníbal	05/06/2019 - 12:35 PM
<p>ABRIL 2019 -Mediante Memorando Nro. MTOP-DDCO-2019-715-ME, de 12 de abril de 2019, se adjunta los requisitos de forma que se continúe con los actos administrativos (Acuerdo de aprobación del proyecto) para que se obtenga la aprobación del mismo en vial del tramo comprendido entre el Anillo Vial de Salcedo Absc. 8+700 A Belisario Quevedo, (tramo San Pedro de Guanaylin hasta Belisario Quevedo de la RED ESTATAL E374).</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	05/05/2019 - 08:16 PM
<p>MARZO 2019 - Mediante Oficio Nro. MTOP-DDCO-19-159-OF, se realiza la suspensión temporal parcial de los trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo vial de Salcedo de 9.5 Km., de longitud ubicado en la provincia de Cotopaxi, hasta realizar los tramites necesarios para efectuar el empate Absc. 8+700 del Anillo Vial Salcedo a Belisario Quevedo en una longitud de 2.40 Km., en el contrato de la Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo mediante un contrato complementario y al no disponer de todos los elementos para su implementación es necesario mantener el plazo vigente en el contrato principal y considerando que el plazo vence el 30 de marzo del 2019 según contrato complementario N° 2, hasta cuando se disponga de la declaratoria de Utilidad Pública del proyecto y la certificación de la partida presupuestaria, recomienda la suspensión del proyecto.</p> <p>- Mediante Memorando Nro. MTOP-DDCO-2019-540-ME, la Abg. Victoria Zambonino - Analista Jurídico Provincial, dice: "... Una vez revisada la documentación de sustento, emitida por la unidades encargadas de la fiscalización, supervisión y administración de la obra y de conformidad con la normativa legal citada, la Asesoría Jurídica considera que es legal y procedente la suspensión del plazo de los trabajos del proyecto "Rehabilitación del Anillo Vial Salcedo."</p> <p>- Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0377-ME, la Ing. Enma Katherine Gamboa López - Subsecretaria Zonal 3, Encargada indica: "... De acuerdo a la Guía Metodológica GPR, un proyecto está en estado Congelado cuando necesita ser aplazado por cualquier motivo y se espera que se reanude en un futuro. En el caso particular de este proyecto cumple con dicha condición en virtud de que, con base a la documentación referida debe cumplir con la declaratoria de utilidad pública de los bienes inmuebles afectados por los trabajos de empate desde la ABSC. 8+700 del Anillo Vial de Saldedo (San Pedro de Guanaylin) hasta Belisario Quevedo para poder continuar con la ejecución de la obras previstas para su conclusión y posterior liquidación y cierre; situación por la que se justifica el cambio de fase de Ejecución a Congelado".</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	02/04/2019 - 03:28 PM
<p>Febrero 2019 Se continua con la construcción del muro acceso al puente compadre Huayco, muros de gaviones</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	01/03/2019 - 03:19 PM
<p>Enero 2019 Se terminó la construcción de los puentes sobre las quebradas Langaza y compadre Huayco, se inició con las actividades para la construcción del muro acceso al puente compadre Huayco</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	05/02/2019 - 07:55 AM
<p>Diciembre 2018 La contratista inicia los trabajos el 01 de diciembre de 2018, se tramita la planilla No. 46</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	04/01/2019 - 09:02 AM
<p>Noviembre 2018 El 30 de noviembre del 2018, se firma el Contrato complementario No.2, con el objeto de terminar con todos los trabajos desde la Absc. 0+00 a 8+700, incluye puentes sobre las quebradas Langaza y Compadre Huayco y muros</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	05/12/2018 - 10:06 AM
<p>Octubre/2018 El 30 de noviembre del 2018, se firma el Contrato complementario No.2, con el objeto de terminar con todos los trabajos desde la Absc. 0+00 a 8+700, incluye puentes sobre las quebradas Langaza y Compadre Huayco y muros</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	05/12/2018 - 10:02 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Octubre/2018 la obra continua paralizada temporalmente, La Patrocinadora Ejecutiva del proyecto se encuentra gestionando actos administrativos, previo a la firma del contrato complementario No. 2, con el proposito de que el proyecto se culmine</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	05/11/2018 - 11:55 AM
<p>Septiembre 2018 la obra continua paralizada temporalmente, La Patrocinadora Ejecutiva del proyecto se encuentra gestionando actos administrativos, previo a la firma del contrato complementario No. 2, con el proposito de que el proyecto se culmine</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	04/10/2018 - 09:42 AM
<p>Agosto 2018 la obra continua paralizada temporalmente, La Patrocinadora Ejecutiva del proyecto se encuentra gestionando actos administrativos, previo a la firma del contrato complementario No. 2, con el proposito de que el proyecto se culmine</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	05/09/2018 - 08:58 PM
<p>Julio 2018 la obra continua paralizada temporalmente, La Patrocinadora Ejecutiva del proyecto se encuentra gestionando actos administrativos, previo a la firma del contrato complementario No. 2, con el proposito de que el proyecto se CIERRE. A la fecha el MTOP, se encuentra a la espera de que el Ministerio de Economía y Finanzas restituya los fondos para la culminación del proyecto, se solicitará que el proyecto pase de fase de "EJECUCIÓN a "CONGELADO"</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	03/08/2018 - 12:56 PM
<p>JUNIO/2018 La obra se encuentra suspendida temporalmente, nos encontramos realizando los actos administrativos correspondientes para la firma de un contrato complementario para la terminación el proyecto</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	05/07/2018 - 08:13 AM
<p>Mayo/2018, la obra se encuentra paralizada a partir del 19 de abril de 2018, hasta tener una respuesta positiva de la solicitud 451</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	05/06/2018 - 08:11 AM
<p>ABRIL 2018: SITUACIÓN ACTUAL La empresa IMBAVIAL E.P. responsable de la obra; en la actualidad se encuentra trabajando en la construcción de los puentes sobre las quebradas Langaza y Compadre Huayco</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	31/05/2018 - 08:19 AM
<p>Enero - Marzo 2018: mediante - Memorando Nro. MTOP-DDCO-2018-31-ME, Enero 04, 2018, se me designa como fiscalizador y mediante Memorando Nro. MTOP-DDCO_2018-141-ME como lider del proyecto La empresa IMBAVIAL E.P. responsable de la obra; en la actualidad se encuentra trabajando en la construcción de los puentes sobre las quebradas Langaza y Compadre Huayco</p>	Villamarin Navarro, José	13/04/2018 - 10:05 AM
<p>Diciembre 2017.- Se firma contrato complementario para el reinicio de los trabajos en el Anillo Vial, con fecha 24 de Octubre, y se da orden de reinicio de los mismos, específicamente con la construcción de los puentes</p>	Meza, Orlando	01/01/2018 - 09:47 PM
<p>Noviembre 2017.- Se firma contrato complementario para el reinicio de los trabajos en el Anillo Vial, con fecha 24 de Octubre, y se da orden de reinicio de los mismos, específicamente con la construcción de los puentes</p>	Meza, Orlando	05/12/2017 - 04:04 PM
<p>Octubre 2017.- Se firma contrato complementario para el reinicio de los trabajos en el Anillo Vial, con fecha 24 de Octubre, y se da orden de reinicio de los mismos, específicamente con la construcción de los puentes</p>	Meza, Orlando	01/11/2017 - 10:28 AM
<p>Sept 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, los mismos que hasta la presente fecha continúan paralizados</p>	Meza, Orlando	05/10/2017 - 09:13 AM
<p>Julio 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, los mismos que hasta la presente fecha continúan paralizados</p>	Meza, Orlando	02/08/2017 - 03:41 PM
<p>Junio 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, los mismos que hasta la presente fecha continúan paralizados</p>	Meza, Orlando	05/07/2017 - 11:16 AM
<p>Mayo 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, los mismos que hasta la presente fecha continúan paralizados</p>	Meza, Orlando	02/06/2017 - 11:57 AM
<p>Abril 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, los mismos que hasta la presente fecha continúan paralizados</p>	Meza, Orlando	05/05/2017 - 10:10 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, los mismos que hasta la presente fecha continúan paralizados	Meza, Orlando	04/05/2017 - 04:24 PM
Marzo 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, los mismos que hasta la presente fecha continúan paralizados	Meza, Orlando	04/04/2017 - 04:49 PM
Febrero 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud	Meza, Orlando	02/03/2017 - 04:33 PM
Enero 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud	Meza, Orlando	01/02/2017 - 02:45 PM
Noviembre 2016.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud	Meza, Orlando	02/12/2016 - 01:54 PM
Octubre 2016.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud	Meza, Orlando	07/11/2016 - 08:59 AM
Septiembre 2016.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud	Meza, Orlando	30/09/2016 - 11:57 AM
Agosto 2016.- se realizan trabajos de movimiento de tierra en el sector Langaza, se continúa con la fundición de aceras y bordillos, la poca colaboración del GAD Cantonal en la reubicación de las tuberías existentes en la vía impiden el cumplimiento de la obra de acuerdo a cronograma , Plazo de contrato segun orden de cambio N° 4 culminó el 23 de Agosto del 2016, se solicita reunión de la Comisión Especial 451 para solicitar ampliación del plazo	Meza, Orlando	05/09/2016 - 10:19 PM
Julio 2016.- se realizan trabajos de movimiento de tierra en el sector Langaza, se continúa con la fundición de aceras y bordillos, la poca colaboración del GAD Cantonal en la reubicación de las tuberías existentes en la vía impiden el cumplimiento de la obra de acuerdo a cronograma ,	Meza, Orlando	02/08/2016 - 10:30 PM
Junio 2016.- se realizan trabajos de movimiento de tierra en el sector Langaza, se continúa con la fundición de aceras y bordillos, la poca colaboración del GAD Cantonal en la reubicación de las tuberías existentes en la vía impiden el cumplimiento de la obra de acuerdo a cronograma Meza, Orlando 05/07/2016 - 03:38 PM	Meza, Orlando	05/07/2016 - 03:41 PM
Mayo 2016.- se realizan trabajos de movimiento de tierra en el sector Langaza, se continúa con la fundición de aceras y bordillos, la poca colaboración del GAD Cantonal en la reubicación de las tuberías existentes en la vía impiden el cumplimiento de la obra de acuerdo a cronograma	Meza, Orlando	05/07/2016 - 03:38 PM
bril 2016 .- Se presentan lluvias intensas en la zona, se interviene en tramo de Langaza, donde se ejecutan trabajos de movimientos de tierra	Meza, Orlando	03/06/2016 - 11:56 AM
Abril 2016 .- Empresa Imbavial no avanza en ejecución de trabajos, son multiples los llamados de atención, no cumplen disposición 451, solo laboran de lunes a viernes., no existen avances significativos	Meza, Orlando	06/05/2016 - 11:37 AM
No .- Empresa Imbavial no avanza en ejecución de trabajos, son multiples los llamados de atención, no cumplen disposición 451, solo laboran de lunes a viernes., no existen avances significativos	Meza, Orlando	05/05/2016 - 03:01 PM
Marzo.- Empresa Imbavial no avanza en ejecución de trabajos, son multiples los llamados de atención, no cumplen disposición 451, solo laboran de lunes a viernes.	Meza, Orlando	05/05/2016 - 02:56 PM
Febrero2016.- Se concluyó con la construcción de Hormigonado de muro tipo ciclopeo de protección de canal y vía 8+600-8+700 de altura variable; encofrado y Hormigonado de canal de riego 8+700-8+500, se concluyó tubería de canal de acceso 6+675-6+740; construcción de muros, canales y bordillos; se asfaltó desde el km 7+980- 8+700, carril izquierdo ancho 5 metros, km 4+000-4+400 , con fecha 20 de Enero del 2016 se reunió la comisión especial 451, y aprobó la ampliación del plazo para la culminación total de la obra hasta el 23 de Agosto del 2016, y, la entrega total de los estudios a cargo de la Consultora Consulnac, hasta fines del mes de Febrero del 2016	Meza, Orlando	04/03/2016 - 10:03 PM
Enero2016.- Se continúa con la construcción de Hormigonado de muro tipo ciclopeo de protección de canal y vía 8+600-8+700 de altura variable; encofrado y Hormigonado de canal de riego 8+700-8+500, se concluyó tubería de canal de acceso 6+675-6+740; construcción de muros, canales y bordillos; se imprimó desde el km 7+980- 8+700, carril izquierdo ancho 5 metros, colocación y tendido de material de subbase en el km 4+000-4+400	Meza, Orlando	09/02/2016 - 04:45 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2015,- Se continúa con la construcción de Hormigonado de muro tipo ciclopeo de protección de canal y vía 8+450-8+600 de altura variable; encofrado y Hormigonado de canal de riego 8+700-8+900, tubería de canal de acceso 6+675-6+740; construcción de muros, canales y bordillos; tendido de material de base clase 2 desde el km 7+980- 8+700, carril izquierdo ancho 5 metros, colocación y tendido de material de subbase en el km 4+000-4+400	Meza, Orlando	05/01/2016 - 02:07 PM
Noviembre 2015,- Se continúa con la construcción de Hormigonado de muro tipo ciclopeo de protección de canal y vía 8+450-8+600 de altura variable; encofrado y Hormigonado de canal de riego 8+700-8+900, tubería de canal de acceso 6+675-6+740	Meza, Orlando	03/12/2015 - 11:34 AM
Octubre 2015,- Se continúa con la construcción de encofrado, y Hormigonado de muro tipo ciclopeo de protección de canal y vía 8+450-8+600 de altura variable; encofrado y Hormigonado de canal de riego 8+540-8+700, tubería de canal de acceso 6+675-6+740	Meza, Orlando	06/11/2015 - 11:11 AM
Septiembre del 2015. La contratista trabaja en instalación de tubería de agua potable abscisa 2+400, construcción de muro abscisa 5+200 y tendido de base abscisa 6+000 - 6+300.	Meza, Orlando	08/10/2015 - 09:12 AM
Agosto 2015 Se firmo la ampliación de plazo, el mismo que concluye en el mes de Enero del 2016	Meza, Orlando	07/09/2015 - 09:03 AM
Julio 2015 Se firmo la ampliación de plazo, el mismo que concluye en el mes de Enero del 2016	Meza, Orlando	07/09/2015 - 08:58 AM
Junio 2015 Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451, el nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015; por tal motivo se solicitó autorización al señor Subsecretario Regional 3 para la modificación de los hitos, se presentó necesidad de incremento de plazo adicional del contratista hasta el mes de Diciembre del 2015, se ejecutan rubros de Hormigón asfáltico, Hormigón estructural para bordillos	Meza, Orlando	12/08/2015 - 04:46 PM
Junio 2015 Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451, el nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015; por tal motivo se solicitó autorización al señor Subsecretario Regional 3 para la modificación de los hitos, se presentó necesidad de incremento de plazo adicional del contratista hasta el mes de Diciembre del 2015, se ejecutan rubros de Hormigón asfáltico, Hormigón estructural para bordillos	Meza, Orlando	10/07/2015 - 09:56 AM
Mayo 2015 Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451, el nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015; por tal motivo se solicitó autorización al señor Subsecretario Regional 3 para la modificación de los hitos, se presentó necesidad de incremento de plazo adicional de parte del contratista, así como la necesidad de un contrato complementario de la Fiscalización del proyecto, en la actualidad se continúa con la colocación de carpeta asfáltica desde las abscisas 4+000-5+600, se colocaron 405 mts de alcantarilla para el alcantarillado pluvial M	Meza, Orlando	09/06/2015 - 02:12 PM
Abril 2015 Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451, el nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015; por tal motivo se solicitó autorización al señor Subsecretario Regional 3 para la modificación de los hitos, se presentó necesidad de incremento de plazo adicional de parte del contratista, así como la necesidad de un contrato complementario de la Fiscalización del proyecto, en la actualidad se continúa con la colocación de carpeta asfáltica desde las abscisas 4+000-5+600, se colocaron 405 mts de alcantarilla para el alcantarillado pluvial	Meza, Orlando	12/05/2015 - 03:43 PM
Marzo 2015 Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451, el nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015; por tal motivo se solicitó autorización al señor Subsecretario Regional 3 para la modificación de los hitos, se presentó necesidad de incremento de plazo adicional de parte del contratista, así como la necesidad de un contrato complementario de la Fiscalización del proyecto	Meza, Orlando	09/04/2015 - 02:50 PM
Enero 2015 Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451, el nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015; por tal motivo se solicitó autorización al señor Subsecretario Regional 3 para la modificación de los hitos Se asfalta desde la 0+020 hasta la 1+660 todo el ancho Se asfalta desde la 1+880 hasta la 2+200 ancho 5 metros lateral izquierda Se encuentran construidos bordillos internos desde la 0+020 1+660 y 1+880 2+200 2+600 2+800 Se encuentra reconformado y tendiendo la sub base desde la 3+360 3+800	Meza, Orlando	10/02/2015 - 08:59 AM
Diciembre de 2014	Meza, Orlando	07/01/2015 - 02:28 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451, el nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015; por tal motivo se solicitó autorización al señor Subsecretario Regional 3 para la modificación de los hitos</p> <p>Se iniciaron los trabajos de excavación para bordillo, actualmente se encuentran en fundición en el lado derecho 0+500 y lado izquierdo 0+550</p> <p>Se está realizando el último tramo del colector de alcantarillado y se funden los últimos pozos</p> <p>Se imprimó el lado izquierdo desde la 0+020 al 0+390 con 10 metros de ancho para el posterior asfaltado</p> <p>Se están construyendo acometidas al sistema de alcantarillado desde la 7+760 hasta el final del tramo</p>		
<p>Noviembre de 2014</p> <p>Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451</p> <p>El nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015</p> <p>Esta firmado el convenio para el pago de las expropiaciones faltantes, y se comenzo el pago de las mismas</p> <p>Tendido y compactación de base en la abscisa 1+600</p> <p>Construcción de acometidas de alcantarillado y limpieza de pozos de revisión</p>	Meza, Orlando	07/01/2015 - 12:54 PM
<p>Septiembre 2014.- Se realizó la colocación de tubería de alcantarillado</p>	Meza, Orlando	14/10/2014 - 12:52 PM
<p>Agosto 2014.- Se ejecutan trabajos de colocación de Sub-base, base y alcantarillado pluvial, muros de protección y gaviones</p>	Meza, Orlando	05/09/2014 - 12:08 PM
<p>JuLlIO 2014</p> <p>La contratista IMBAVIAL. E.P. se encuentra trasportando material de base , construcción de bordillos y cunetas , en la abscisa 6+000 la contratista esta colocando sub base y continua con la construcción del alcantarillado pluvial .Ademas se han realizado trabajos con Hormigón estructural fc=210 Kg/cm2</p>	Meza, Orlando	07/08/2014 - 11:42 AM
<p>Junio 2014</p> <p>La contratista IMBAVIAL. E.P. se encuentra trasportando material de base , construcción de bordillos y cunetas , en la abscisa 5+000 la contratista esta colocando sub base y continua con la construcción del alcantarillado pluvial .Ademas se han realizado trabajos con Hormigón estructural fc=210 Kg/cm2</p>	Meza, Orlando	01/07/2014 - 03:46 PM
<p>Abril 2014.</p> <p>La fiscalización externa conosco que esta contratada, pero no entra a laborar ,Continua los trabajos el contratista en construcción de bordillos en la abscisa 0+000 a la 1+000 , muro de gaviones . transporte y colocación de sub base y movimiento de tierras .</p>	Flores Fernández, César Aníbal	04/05/2014 - 07:09 PM
<p>Marzo 2014</p> <p>No tenemos Fiscalización , continua los trabajos la contratista en construcción de posos de alcantarillado , colocación de sub base desde la 0+000 a 1+040 .</p>	Flores Fernández, César Aníbal	06/04/2014 - 05:46 PM
<p>Febrero 2014</p> <p>No hay Fiscalización , la contratista trabaja en : excavación sin clasificar , estabilización de taludes , alcantarillado Pluvial ,excavación para estructuras menores y transporte de material excavado a escombrera.</p>	Flores Fernández, César Aníbal	05/03/2014 - 02:10 PM
<p>Enero del 2014.</p> <p>Hasta la presente fecha no se contrata la fiscalización , la contratista trabaja en movimiento de tierras ,excavación y relleno para estructuras menores, construcción de alcantarillado Pluvial. transporte de sub base y base</p>	Flores Fernández, César Aníbal	14/02/2014 - 09:26 AM
<p>Diciembre 2013.</p> <p>No se contrata la fiscalización .</p> <p>La contratista continua con movimiento de tierras , rellenos , cajeras para colocación de material de sub base , el GAD de salcedo continua con las indemnizaciones .</p>	Flores Fernández, César Aníbal	05/02/2014 - 02:56 PM
<p>Noviembre 2013.</p> <p>No se contrata la fiscalización .</p> <p>La contratista trabaja en movimiento de tierras , el GAD de Salcedo esta Atrazado en las Indemnizaciones (144 predios liberados hasta la presente fecha).</p>	Flores Fernández, César Aníbal	05/02/2014 - 02:56 PM
<p>Octubre del 2013.</p> <p>La contratista continua con movimiento de tierra , reparación del alcantarillado existente por el paso de la vía .</p> <p>No se contrata la fiscalización , el GAD de Salcedo continua con las indemnizaciones para que la contratista pueda trabajar con normalidad .</p>	Flores Fernández, César Aníbal	22/11/2013 - 02:21 PM
<p>Septiembre 2013 .</p> <p>Hasta la presente fecha no se contrata la fiscalización, se trabaja en movimiento de tierra y transporte a escombreras y rellenos, el GAD de Salcedo continua con las indemnizaciones.</p>	Flores Fernández, César Aníbal	04/10/2013 - 09:33 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Agosto 2013 La contratista trabaja en Desbroce, desbosque y limpieza, hasta la abscisa 3+000, excavación sin clasificar y transporte a escombrera.	Flores Fernández, César Aníbal	04/09/2013 - 09:48 AM
Julio 2013. La contratista esta trabajando en movimiento de tierra y desalojo	Flores Fernández, César Aníbal	04/09/2013 - 09:48 AM
Junio 2013. El contratista esta realizando el replanteo del proyecto , el GAD de Salcedo se ha comprometido a entregar liberado los terrenos y a dar linea para la colocación de las nuevos sitios donde seran construidos los canales de agua de regadio . En razón de existir una partida presupuestaria es necesario que se contrate la fiscalización inmediatamente y los trabajos continuen con normalidad.	Flores Fernández, César Aníbal	03/07/2013 - 09:21 AM
Mayo 2013. El 22 de mayo fue acreditado el anticipo ala Contratista IMBAVIAL E. P. , y se encuentra replanteando el proyecto	Flores Fernández, César Aníbal	03/07/2013 - 09:21 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de recursos para continuar con el proyecto IMPEDIRÍA la culminación de los trabajos en el tiempo establecido.	17/04/2019	Pedro Vinicio Medina Castillo	70	60	42	0/1

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Costo. Insuficiente recurso económico para pago de planillas CAUSARÍA paralización de los trabajos	17/04/2019	Pedro Vinicio Medina Castillo	70 %	60	42	0/1
5- PROYECTO. * General. Malas condiciones climáticas CAUSARÍA retraso en la culminación de los trabajos	17/04/2019	Pedro Vinicio Medina Castillo	50 %	60	30	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria	9-Entregables Formales	25/02/2013		25/02/2013		Sí	1.0
2	EJECUCIÓN: Terminos de Referencia y Pliegos Aprobados	9-Entregables Formales	14/03/2013		14/03/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	3-Adjudicación	15/03/2013		15/03/2013		Sí	2.0
4	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	3-Adjudicación	15/03/2013		15/03/2013		Sí	8.0
5	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada	9-Entregables Formales	05/04/2013		05/04/2013		Sí	1.0
6	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	4-Inicio de Trabajo	22/05/2013		22/05/2013		Sí	5.0
7	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	4-Inicio de Trabajo	22/05/2013		22/05/2013		Sí	3.0
8	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	4-Inicio de Trabajo	22/05/2013		22/05/2013		Sí	2.0
9	EJECUCION: Replanteo Tramo 1 , ejecutado	5-Entregables Intermedios	01/08/2013		01/08/2013		Sí	2.0
10	EJECUCION: Alcantarillado Pluvial 50%	5-Entregables Intermedios	22/10/2013		31/03/2016		Sí	2.0
11	EJECUCION: Alcantarillado Pluvial 100%	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		30/04/2016		Sí	2.0
12	EJECUCION: Capa rodadura hormigón asfáltico (caliente) 7.5cm 50%	5-Entregables Intermedios	15/05/2014		30/06/2016		Sí	5.0
13	EJECUCION: Excavación y relleno para estructuras menores 50%	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		30/04/2016		Sí	4.0
14	EJECUCION: Sub base y Base 50%	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		30/12/2015		Sí	4.0
15	EJECUCION: Excavación sin clasificar 50%	5-Entregables Intermedios	15/06/2014		30/12/2015		Sí	3.0
16	EJECUCION: Drenaje	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/05/2016		Sí	4.0
17	EJECUCION: Puentes Langaza y Compadre Huayco Construidos	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/01/2019		Sí	4.0
18	EJECUCION: Acabado obra basica	5-Entregables Intermedios	30/08/2014	30/03/2019			No	3.0
19	EJECUCION: Capa rodadura hormigón asfáltico (caliente) 7.5cm 75%	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		10/06/2016		Sí	4.0
20	EJECUCION: Sub base y Base 75%	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		10/06/2016		Sí	3.0
21	EJECUCION: Sub base y Base 100%	5-Entregables Intermedios	30/09/2014	30/03/2019			No	4.0
22	EJECUCION: Excavación sin clasificar 100%	5-Entregables Intermedios	30/10/2014		31/05/2016		Sí	3.0
23	EJECUCION: Capa rodadura hormigón asfáltico (caliente) 7.5cm 100%	5-Entregables Intermedios	31/10/2014	31/03/2019			No	5.0
24	EJECUCION: Excavación y relleno para estructuras menores 100%	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/01/2019		Sí	5.0
25	EJECUCION: Señalización	5-Entregables Intermedios	20/11/2014	31/03/2019			No	5.0
26	EJECUCION: Trabajo Ambientales	5-Entregables Intermedios	20/11/2014	31/03/2019			No	5.0
27	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	9-Entregables Formales	22/11/2014	31/03/2019			No	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
28	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	9-Entregables Formales	22/05/2015	31/03/2019			No	1.5
29	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	22/05/2015	30/09/2019			No	1.0
30	CIERRE: Formatos de cierre/baja según acuerdo 025, elaborados	9-Entregables Formales	18/10/2019	18/10/2019			No	2.0
31	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	25/10/2019	25/10/2019			No	0.5
32	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago, suscrito	9-Entregables Formales	31/10/2019	31/10/2019			No	0.5
33	CIERRE: Información del proyecto en los sistemas GPR, SIPeIP y SITOP actualizada	9-Entregables Formales	08/11/2019	08/11/2019			No	0.5
34	CIERRE: Documentos habilitantes para cierre/baja conforme Instructivo de Cierre/Baja, entregados a la Coordinación General de Planificación	9-Entregables Formales	15/11/2019	15/11/2019			No	0.5
35	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuetarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	22/11/2019	22/11/2019			No	1.0
36	CIERRE: Aprobación del Ministro de Obras Públicas, suscrita	9-Entregables Formales	07/12/2019	07/12/2019			No	0.25
37	CIERRE: Solicitud a Senplades para registro de cierre/baja, suscrita	9-Entregables Formales	25/12/2019	25/12/2019			No	0.25
38	CIERRE: Informe de Cierre de Proyectos (Senplades) aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5


SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	ANILLO VIAL	Gonzalez Jara, Hector Guillermo	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/11/2017
2	ANILLO VIAL	Gonzalez Jara, Hector Guillermo	{PR} - Provincia - COTOPAXI	28/08/2017
3	Anillo vial cantón Salcedo	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	07/07/2017
4	ANILLO VIAL SALCEDO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	11/01/2017
5	ANILLO VIAL SALCEDO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/12/2016
6	ANILLO VIAL SALCEDO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	11/01/2017
7	ANILLO VIAL SALCEDO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/11/2016

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
8	ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/09/2016
9	ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/08/2016
10	ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/04/2016
11	Anillo vial cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi de 9.75 Km de longitud	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/03/2016
12	Anillo vial cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi de 9.75 Km de longitud	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/02/2016
13	Anillo vial cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi de 9.75 Km de longitud	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/01/2016
14	ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/12/2015
15	ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/11/2015
16	Anillo vial cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/10/2015
17	ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	27/08/2015
18	VÍA DEL ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	27/05/2015
19	VÍA DEL ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/06/2015
20	VÍA DEL ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	22/04/2015
21	VÍA DEL ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	25/03/2015
22	VÍA DEL ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	20/02/2015
23	REHABILITACIÓN DEL ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	15/12/2014
24	REHABILITACIÓN DEL ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	22/10/2014
25	ANILLO VÍA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	24/08/2014
26	REHABILITACIÓN DEL ANILLO VIAL DEL CANTÓN SALCEDO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	15/07/2014
27	REHABILITACIÓN DEL ANILLO VIAL DEL CANTÓN SALCEDO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/05/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cumplimiento de avance físico del proyecto.		-	-	-	22/05/2013	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,255,010.83
Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,768,629.99 **
Costo Total:	13,428,319.91
Total Devengado:	7,956,772.42
% Costo Total Devengado:	59.25 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 59.25 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	8,724,220.56	5,612,383.80	0.00	14,336,604.36
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	13,184,004.29	811,857.57	0.00	13,995,861.86
Ppto. Codificado	13,382,229.85	811,857.57	0.00	14,194,087.42
Ppto. Comprometido	11,429,615.71	0.00	0.00	11,429,615.71
Planeado - Codificado (2019)		4,800,526.23		
Programado a Devengar	15,496,079.92	811,857.57	0.00	16,307,937.49
Ppto. Devengado	7,956,772.42	0.00	0.00	7,956,772.42
Pagado Real	6,569,291.51	0.00	0.00	6,569,291.51
Estimado a fin de año	* 7,956,772.42	0.00	0.00	7,956,772.42
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	7,539,307.50	811,857.57	0.00	8,351,165.07
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 51.35 %	0.00 %	0.00 %	48.79 %
Ppto. Codificado 998	3,552,442.56	0.00	0.00	3,552,442.56
Ppto. Devengado 998	1,601,802.11	0.00	0.00	1,601,802.11

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

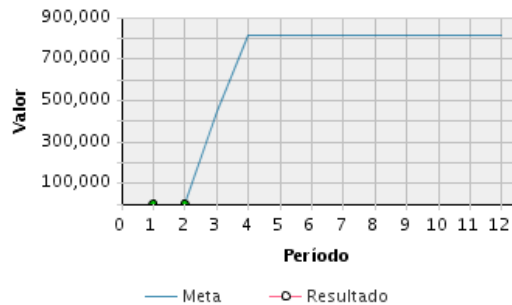

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	450,000.00		450,000.00				
Abr	361,857.57		811,857.57				
May	0.00		811,857.57				
Jun	0.00		811,857.57				
Jul	0.00		811,857.57				
Ago	0.00		811,857.57				
Sep	0.00		811,857.57				
Oct	0.00		811,857.57				
Nov	0.00		811,857.57				
Dic	0.00		811,857.57				
Total	811,857.57	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
14	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
15	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		SECCION_TIPICA_414.jpg	07/06/2013
2		SECCION_TIPICA_420.jpg	02/07/2013
3		DSC00450.JPG	17/07/2013
4		informe__anillo_vial_salcedo.pdf	09/08/2013
5		ANILLO_VIAL_SALCEDO.pdf	30/09/2013
6	A.7 Informe Ejecutivo Anillo Vial Marzo 2015	Informe_Ejecutivo__Anillo_Vial_Marzo_2015.pdf	13/04/2015
7	A07 Informe ejecutivo SITOP Noviembre 2014	A07_Informe_ejecutivo_SITOP_Noviembre_2014.pdf	09/12/2014
8	A1 Hito 1 Archivo Formato Senplades	2015-03-10_08-42-41_ANILLOVIALDESALCEDO_ACTUALIZACIONSENPLADES2015C.DOC	17/03/2015
9	A11 EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	Noviembre_Salcedo.pdf	08/12/2014
10	A12 informe de diciembre 2014	Anillo_Vial_Salcedo.pdf	06/01/2015
11	A12 Informe SITOP Diciembre 2014	A12_Informe_SITOP_Diciembre_2014.pdf	07/01/2015
12	A12-1 trabajos mes de Diciembre 2014	Oficios_2015.docx	06/01/2015
13	A13 Reporte Informe Ejecutivo SITOP Enero 2015	A13_Reporte_Informe_Ejecutivo_SITOP_Enero_2015.pdf	05/02/2015
14	A2 Hito 14 Informe Ejecutivo Diciembre 2018	SITOP_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
15	A3 Hito 14, 15, 18, 20, 22, 23 Contrato Complementario 2	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_2_30_Noviembre_2018.pdf	08/01/2019
16	A4 Hito 14 Resumen Ejecutivo Enero 2019	SITOP_RESUMEN_EJECUTIVO_ENERO_2019.pdf	05/02/2019
17	A4 informe ejecutivo JULIO 2014 SITOP	A4_informe_ejecutivo_SITOP_Julio_2014.pdf	07/08/2014
18	A5 Hito 14 Informe Ejecutivo Febrero 2019	INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2019_compressed.pdf	05/03/2019
19	A5 Resolución Adjudicación Hito 5	image2019-04-18-132903_Resolución_Adjudicación.pdf	01/05/2019
20	A5. Informe ejecutivo SITOP Septiembre 2014	A5_Informe_Ejecutivo_SITOP_Septiembre_2014.pdf	08/10/2014
21	A6 Anexo Informe Ejecutivo Marzo 2019 y documento cambio de fase	Anexo_Informe_Ejecutivo_Marzo_2019.pdf	02/04/2019
22	A6 Informe ejecutivo SITOP Octubre 2014	A6_Informe_ejecutivo_SITOP_Octubre_2014.pdf	17/11/2014
23	A8 Anexo Certificación Presupuestaria Hito 1	image2019-04-18-133007_Certificación_presupuestaria.pdf	01/05/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
24	A9 Terminos de Referencia y Pliegos Aprobados Hito 2	image2019-04-18-132808_Acuerdo_Ministerial_No._030-DM.pdf	01/05/2019
25	Acta de inicio de Trabajos	SECCION_TIPICA_413.jpg	07/06/2013
26	AUTORIZACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ENTRE PROYECTOS	image2018-09-05-200138_AUTORIZACIÓN_MODIFICACIONES ENTRE PROYECTOS	05/09/2018
27	B1 Informe ejecutivo SITOP Abril 2015	B1_Informe_ejecutivo_SITOP_Abril_2015.pdf	12/05/2015
28	B1. Memorando designacion nuevo lider de proyecto	Disposicion_lider_proyecto_MTOP-DDCO-2019-929-ME.pdf	23/05/2019
29	B2 Informe Ejecutivo SITOP Junio 2015	B2_Informe_Ejecutivo_SITOP_Junio_2015.pdf	10/07/2015
30	B3 Informe ejecutivo SITOP julio 2015	B3_Informe_ejecutivo_SITOP_julio_2015.pdf	12/08/2015
31	B4 Informe ejecutivo SITOP agosto 2015	B4_Informe_ejecutivo_SITOP_agosto_2015.pdf	08/10/2015
32	B5 Informe ejecutivo SITOP septiembre 2015	B5_Informe_ejecutivo_SITOP_septiembre_2015.pdf	08/10/2015
33	B6 Informe Ejecutivo SITOP Noviembre 2015	B6_Informe_Ejecutivo_SITOP_Noviembre_2015.pdf	04/12/2015
34	B7 Dictámen de Prioridad	dictamen_senplades_2015__Anillo_vial_Salcedo.pdf	13/11/2015
35	B8 Anexo Informe Ejecutivo Abril 2019 solicitud aprobaición del proyecto	Anexo_resumen_Abril_2019.pdf	02/05/2019
36	B9 Anexo resumen ejecutivo mayo 2019	ANILLO_VIAL_SALCEDO_MAYO_2019.pdf	05/06/2019
37	C1 Informe SITOP Febrero 2017	C1_Informe_SITOP_Febrero_2017.pdf	04/03/2017
38	CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 ANILLO VIAL IMBAVIAL COMPLETO	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_1_ANILLO_VIAL_IMBAVIAL_COMPLETO.pdf	23/02/2018
39	Escombrera	DSC00447.JPG	17/07/2013
40	Expropiaciones realizadas por el GAD de Salcedo hasta Noviembre 2013	SECCION_TIPICA_505.jpg	14/11/2013
41	Informe ejecutivo de Diciembre 2013	ANILLO_VIAL_SALCEDO.pdf	02/01/2014
42	Informe ejecutivo de Febreo 2014	FEBREO_2014.pdf	08/03/2014
43	Informe ejecutivo Sitop abril 2014	A.2_Informe_ejecutivo_SITOP_Abril_2014.pdf	08/05/2014
44	Informe ejecutivo Sitop noviembre 2013	A01_sitop_Anillo_Vial_de_Salcedo_informe_ejecutivo_noviembre_2013.pdf	10/11/2013
45	Informe ejecutivo Sitop septiembre 2013	Informe_Sitop_septiembre_2013.pdf	04/10/2013
46	informe Ejecutivo SITOP Septiembre 2018	informe_Ejecutivo_SITOP_Septiembre_2018.pdf	05/10/2018
47	Informe Rehabilitación Anillo Vial Salcedo Marzo/2018	INFORME_REHABILITACION_ANILLO_VIAL_SALCEDO_MARZO_2018.pdf	13/03/2018
48	Informe SITOP julio 2013	anillo_vial_salcedo_julio_2013.pdf	09/08/2013
49	informe Sitop junio 2014	A3_Informe_ejecutivo_SITOP_Junio_2014.pdf	02/07/2014
50	informe trabajo ejecutados agosto 2018	informe_Agosto_2018_Anillo_vial.pdf	05/09/2018
51	Octubre 2013 abscisa 5+100	DSC01135.JPG	18/10/2013
52	Octubre 2013 Abscisa 3+650	DSC01136.JPG	18/10/2013
53	Oficio MTOP-DDCO-2016-038-A-OF	Oficio_MTOP-DDCO-2016-038-A-OF.pdf	21/04/2017
54	Resumen ejecutivo SITOP mayo 2016	Resumen_Ejecutivo_SITOP_Mayo_2016.pdf	04/06/2016
55	SITOP INFORME EJECUTIVO MES DE JULIO 2018	INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_JULIO_2018.pdf	06/08/2018
56	SITOP INFORME EJECUTIVO MES DE NOVIEMBRE 2018	SITOP_RESUMEN_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2018.pdf	05/12/2018
57	SITOP INFORME EJECUTIVO MES DE OCTUBRE 2018	Informe_Ejecutivo_SITOP_OCUTBRE_2018.pdf	05/11/2018
58	SITOP RESUMEN EJECUTIVO JUNIO 2018	SITOP_RESUMEN_EJECUTIVO_JUNIO_2018.pdf	05/07/2018
59	SOLICTUD DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PROYECTO ANILLO VIAL DE SALCEDO DEL DIRECTOR DISTRITAL	MTOP-DDCO-2018-1205-ME_INSISTENCIA_SOLICTUD_DE_REASIGNACIÓN_DE_RECURSOS_PROYECTO_ANILLO_VIAL_DE_SALCEDO_DEL_DIRECTOR_DISTRITAL	05/08/2018
60	SOLICTUD DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PROYECTO ANILLO VIAL SUBSECRETARIA	MTOP-SUBZ3-2018-0747-ME_INSISTENCIA_DE_SOLICTUD_DE_ASIGNACIÓN_DE_RECURSOS_PROYECTO_ANILLO_VIAL_SUBSECRETARIA	05/08/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Flores Fernández, César Aníbal	Supervisor	Supervisor de Construcciones de Cotopaxi	cfloresf@mtop.gob.ec	023974600
Gamboa López, Enma Katherine	Administrador Regional	Subsecretaria Zonal 3, Encargada	egamboa@mtop.gob.ec	023974600
Ibarra Munizaga, Wagner Ibarra	Analista Financiero	Analista Financiero	wibarra@mtop.gob.ec	
Medina Castillo, Pedro Vinicio	Fiscalizador	Analista de Infraestructura 1	vmedina@mtop.gob.ec	0991560304
Morales Borja, Marcelo Rene	Administrador	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Cotopaxi	mrmorales@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
69758_1.jpg	08/01/2019
