

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 4
Dirección Provincial Manabí

PROYECTO: K084 MTOP - Proyecto de reconstrucción de obras por el terremoto 2016 - Manabí

Líder del Proyecto:	Tarabo Mieles, Tyron Xavier (ttarabo@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Programas Relacionados:	Provincia - Manabí, PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016
Titular:	Macias Fuentes, Alberto Fabrizzio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.381287	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	182,630,124.71
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/05/2016 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	10/06/2019	Fecha de Fin Base:	30/12/2016
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	21/12/2018

DATOS GENERALES

Descripción

Reconstrucción de obras de Infraestructura afectadas por el terremoto 16A-2016:
 - Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.
 - Demoliciones en varios cantones de la provincia de Manabí.
 -Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.
 -Construcción puente Jama.
 -Fiscalización Construcción puente Jama.
 -Reparación de la vía de Acceso a Bahía de Caraquez - canton sucre, provincia de manabi, en las abscisas 0+000 a 6+566 y 0+000 a 6+682
 -Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.
 -Construcción de plataformas en varios cantones de la provincia de Manabí.
 Construcción del Puente Pimpiguasi sobre el Río Chico De 30 M de Longitud Ubicado en La Red Vial Estatal E384, Provincia De Manabí.
 Construcción del Puente Canuto sobre el Río Grande, de 40 m de Longitud ubicada en la Red Vial Estatal E384, de la Provincia de Manabí.
 Adaptabilidad para la Rehabilitación y Reconstrucción de la Infraestructura afectada por el Sismo del 16 de Abril Del 2016, en el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de La Ciudad de Manta, que Incluye la Construcción del Nuevo Terminal de Pasajeros, Torre de Control, Cerramiento Perimetral, Mantenimiento de Pista, Readequación del APP y mobiliario para la edificación.

Beneficios Cualitativos

Mejorar el desplazamiento y comunicación entre los Cantones de la Provincia de Manabí , contribuir con la recostrucción de edificaciones publicas y dotar de infraestructura aeroportuaria de caracter internacional a la provincia de Manabí.

Tipo de Beneficiario

Población de Manabí en general


Restricciones

Tiempo.- Duración de estado de exepción (15/12/2016).

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 67.74 %
 Fecha de Inicio: 02/05/2016 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

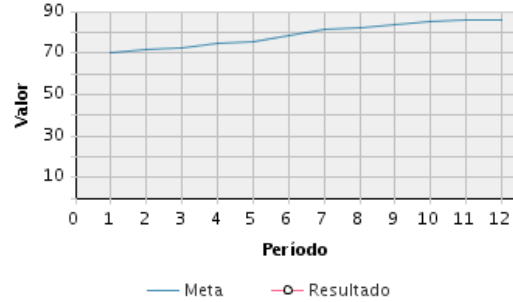

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	70 %	72 %	72 %	74 %	76 %	78 %	82 %	82 %	84 %	85 %	86 %	86 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mayo 2019.</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Trabajos en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo.- Con fecha 20 de Mayo de 2019, se firma contrato complementario para la reparación del Talud afectado por el sismo del 3 de diciembre de 2017, sin embargo aun el proyecto no se encuentra en ejecución en razón de que el inicio de los trabajos es a partir de la entrega del anticipo, el cual se encuentra en trámite.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Proyecto en etapa de mantenimiento, se encuentra en trámite de pago planillas de mantenimiento de la 1 a la 5, y se tramita el pago del convenio de fiscalización, en espera de asignación de recursos para pago</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez.-Trabajos suspendidos, según Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2019-73A-ME, en espera de asignación de recursos para el pago de las planillas pendientes de cancelación.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, en espera de asignación de recursos.</p> <p>-Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta.- Trabajos en ejecución, planillas se encuentran trámite de pago</p> <p>-Puente Pimpiguasí y Puente Canuto: Trabajos en ejecución, planillas se encuentran trámite de pago</p>	Tarabo Mieles, Tyron Xavier	05/06/2019 - 10:47 AM
<p>MARZO 2019.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, ya que se encuentra en trámite de inclusión al PAI 2019 para la solicitud de asignación de recursos para el contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo.- Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-307-ME de fecha 14 de marzo de 2019, suscrito por la Dra. Alexandra Muñoz Coordinadora General de Planificación informa a esta Subsecretaría que el Proyecto de Obras de</p>	Tarabo Mieles, Tyron Xavier	05/04/2019 - 04:07 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril de 2016 ya se encuentra incluido en el PAI 2019, actualmente se tramita la asignación de recursos para continuar con el trámite de la reparación del talud afectado.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Proyecto en etapa de mantenimiento hasta el 12 de noviembre de 2019, con Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-307-ME de fecha 14 de marzo de 2019, suscrito por la Dra. Alexandra Muñoz Coordinadora General de Planificación informa a esta Subsecretaría que el Proyecto de Obras de Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril de 2016 ya se encuentra incluido en el PAI 2019, actualmente se tramita la asignación de recursos .</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez.- Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-307-ME de fecha 14 de marzo de 2019, suscrito por la Dra. Alexandra Muñoz Coordinadora General de Planificación informa a esta Subsecretaría que el Proyecto de Obras de Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril de 2016 ya se encuentra incluido en el PAI 2019, actualmente se tramita la asignación de recursos. Trabajos en ejecución</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, se encuentra en trámite la inclusión al PAI 2019 para la asignación de recurso.</p> <p>-Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta.- Con fecha 23 de Noviembre de 2018, se suscribe el contrato modificatorio al contrato original del 30 de noviembre de 2017 del contrato multimodal de los Proyectos Aeropuerto de Manta, Puente Pimpiguasí y Puente Canuto, el mismo en la cláusula cuarta establece que el inicio y terminación de las obras rige a partir de la fecha de suscripción del contrato modificatorio; es decir desde el 23 de Noviembre de 2018 con un plazo de 608 días calendarios.</p> <p>-Puente Pimpiguasí.- Con fecha 23 de Noviembre de 2018, se suscribe el contrato modificatorio al contrato original del 30 de noviembre de 2017 del contrato multimodal de los Proyectos Aeropuerto de Manta, Puente Pimpiguasí y Puente Canuto, el mismo en la cláusula cuarta establece que el inicio y terminación de las obras rige a partir de la fecha de suscripción del contrato modificatorio; es decir desde el 23 de Noviembre de 2018 con un plazo de 608 días calendarios.</p> <p>-Puente Canuto.- Con fecha 23 de Noviembre de 2018, se suscribe el contrato modificatorio al contrato original del 30 de noviembre de 2017 del contrato multimodal de los Proyectos Aeropuerto de Manta, Puente Pimpiguasí y Puente Canuto, el mismo en la cláusula cuarta establece que el inicio y terminación de las obras rige a partir de la fecha de suscripción del contrato modificatorio; es decir desde el 23 de Noviembre de 2018 con un plazo de 608 días calendarios.</p>		
<p>ENERO 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, ya que se encuentra en trámite de inclusión al PAI 2019 para la solicitud de asignación de recursos para el contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - Los trabajos de mitigación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al presente reporte se encuentra en espera de asignación de recursos, los mismos que fueron solicitados en la inclusión al PAI 2019; el cual al presente reporte se encuentra en trámite.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba) y en etapa de mantenimiento, contrato complementario de fiscalización en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados en la inclusión al PAI 2019, el cual al presente reporte se encuentra en trámite.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez. Al presente reporte los trabajos se encuentran en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>01/03/2019 - 04:09 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, se encuentra en trámite la inclusión al PAI 2019 para la asignación de recursos</p>		
<p>ENERO 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, con Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME y Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME, ambos de fecha 29 de Noviembre de 2018, suscrito por el Subsecretario Zonal 4 Ing. Iván Ganchozo solicita aval de obra y fiscalización respectivamente para el financiamiento del contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - Los trabajos de mitigación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al presente reporte se encuentra en espera de asignación de recursos, los mismos que fueron solicitados en la inclusión al PAI 2019; el cual al presente reporte se encuentra en trámite</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba) y en etapa de mantenimiento, contrato complementario de fiscalización en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados en la inclusión al PAI 2019, el cual al presente reporte se encuentra en trámite.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez. Al presente reporte los trabajos se encuentran en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, se encuentra en trámite la inclusión al PAI 2019 para la asignación de recursos.</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>05/02/2019 - 09:40 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, con Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME y Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME, ambos de fecha 29 de Noviembre de 2018, suscrito por el Subsecretario Zonal 4 Ing. Iván Ganchozo solicita aval de obra y fiscalización respectivamente para el financiamiento del contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - Los trabajos de mitigación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al presente reporte se encuentra en espera de asignación de recursos, por la reducción de presupuesto que el MEF efectuó en el mes de julio, los cuales fueron solicitados mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba), contrato complementario de fiscalización en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez. Con fecha 21 de diciembre de 2018, el Ing. Stewar Durán en calidad de administrador de contrato, informa al contratista que en virtud de que el MEF ha efectuado la cancelación de las planillas pendientes de pago de la 10 a la 14, se reinicien los trabajos, por lo que al presente los trabajos se encuentran en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, cuenta con acta de recepción provisional, se encuentra en período de prueba (a la fecha aún el acta de recepción definitiva se encuentra en trámite en vista e que el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se solicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>04/01/2019 - 02:10 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, con Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME y Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME, ambos de fecha 29 de Noviembre de 2018, suscrito por el Subsecretario Zonal 4 Ing. Iván Ganchozo solicita aval de obra y fiscalización respectivamente para el financiamiento del contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - Los trabajos de mitigación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al presente reporte se encuentra en espera de asignación de recursos, por la reducción de presupuesto que el MEF efectuó en el mes de julio, los cuales fueron solicitados mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba), contrato complementario de fiscalización en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez. Con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, con Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-196-ME de fecha 6 de agosto de 2018 suscrito por el Ing. Stewar Durán en calidad de administrador de contrato, dirigido al Ing. Diofre Alcívar Subsecretario Zonal 4, informa que mediante Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF dirigido al Contratista de la obra se aprueba la suspensión de plazo de la ejecución de los trabajos hasta que el proyecto se reactive económicamente, ya que hasta la fecha no se ha cancelado las planillas en trámite del 10 a la 17, el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se solicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, cuenta con acta de recepción provisional, se encuentra en período de prueba (a la fecha aún el acta de recepción definitiva se encuentra en vista e que el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se solicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>05/12/2018 - 10:34 AM</p>
<p>OCTUBRE 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 9 de septiembre del 2018 se suspenden los trabajos, la suspensión se levantará toda vez que se suscriban los actos administrativos en trámite. Adicionalmente se tramita suscripcion de complementario de consultoria para la fiscalizacion por un valor total de 234.254,70. MAS IVA. Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, se solicita recursos para los contratos complementarios.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la via Manta - Los trabajos de mitgación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al pressnte reporte se enuentra en espera de asignación de recursos, por la reducción de presupuesto que el MEF efectuó en el mes de julio, los cuales fueron solicitados mediante Memotando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba), contrato complementario de fiscalizacion en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados mediante Memotando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>05/11/2018 - 09:47 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>no pago de planillas, con Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-196-ME de fecha 6 de agosto de 2018 suscritopor el Ing. Stewar Durán en calidad de adminstrador de contrato, dirigido al Ing. Díofero Alcívar Subsecretario Zonal 4, informa que mediantr Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF dirigido al Contratista de la obra se aprueba la suspensión de plazo de la ejecuión de los trabajos hasta que el proyecto se reactive económicamente, ya que hasta la fecha no se ha cancelado las planillas en trámite de l 10 a la 17, el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el ecurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se olicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-rabajos concluidos, cuenta con acta de recepción provisional, se encuentra en período de prueba (a la fecha aún el acta de recepción definitiva se encuentra en trámite en vista e que el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se olicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p>		
<p>Septiembre 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 9 de septiembre del 2018 se suspenden los trabajos, la suspensión se levantará toda vez que se suscriban los actos administrativos en trámite. Adicionalmente se tramita suscripcion de complementario de consultoria para la fiscalizacion por un valor total de 234.254,70. MAS IVA.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la via Manta - San Mateo de 9 km de longitud.- Proyecto concluido en octubre de 2017 y se econtraba en tramite de recepcion provisional de la obra; sin embargo con fecha 5 de diciembre 2017 se presentaron fallas en los taludes del proyecto por el sismo del 3 de diciembre de 2017, ante lo cual la contratista efectuó a su costo las remediaciones inmediatas, que permitieron dar transitabilidad a la vía. Con Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-182-ME de fecha 10 de julio 2018, la supervisión de estudios zonal 4 , valida la alternativa de remediación definitiva al proyecto, misma que fue presentada por la fiscalización contratada Esta intervencion tiene un costo de 1'714213,50 MAS IVA, trabajos que incluidos los servicios de fiscalización alcanzan un total de 1'804.552,55 mas iva, resultando un monto total requerido incluido iva de 2'021.098,86 USD. Al presente se encuentra en espera de asignación de recursos para continuar con el trámite respectivo de la ejecución de los trabajos de remedicación inmediata.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Con fecha 21 de mayo del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician trabajos mismos que debían ser culminados el 10 de junio del 2018. Sin embargo con la suscripción de la orden de cambio # 3 al proyecto a traves del cual se legaliza un incremento contractual a la ejecucion de obras por un valor de 1'899.006,93 USD mas iva , se autoriza la implementacion de 90 dias adicionales que extienden la fecha de terminación de los trabajos para el 08-09-2018, los trabajos a la presente fecha se encuentran concluidos, por lo que el proyecto entra en período de prueba (6meses); previo a la suscripción del acta de recepción definitiva.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con orden de cambio No. 4 de fecha 07 de febrero de 2018, se legaliza el incremento del plazo contractual en 90 días, contados a partir del 09 de Junio 2018, por lo que la fecha para la terminación de los trabajos se la estableció para el 08 de Septiembre de 2018; sin embargo con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, en vista de que a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-Trabajos finalizados y recibido provisionalmente, se encuentran pendientes de cancelar las planillas 9-10-11 de obra y fiscalizacion a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>04/10/2018 - 08:10 AM</p>
<p>Agosto 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>05/09/2018 - 11:28 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 8 de junio del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician los trabajos , toda vez que se suscribe contrato complementario por 3'003.265,33 USD MAS IVA, otorgando ademas un plazo de ejecucion de 90 dias contados a partir del reinicio de los trabajos; esto es hasta el 6-09-2018. Adicionalmente se tramita suscripcion de complementario de consultoria para la fiscalizacion por un valor total de 234.254,70. MAS IVA.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la via Manta - San Mateo de 9 km de longitud.- Proyecto concluido en octubre de 2017 y se econtraba en tramite de recepcion provisional de la obra; sin embargo con fecha 5 de diciembre 2017 se presentaron fallas en los taludes del proyecto por el sismo del 3 de diciembre de 2017, ante lo cual la contratista efectuó a su costo las remediaciones inmediatas, que permitieron dar transitabilidad a la vía. Con Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-182-ME de fecha 10 de julio 2018, la supervisión de estudios zonal 4 , valida la alternativa de remediación definitiva al proyecto, misma que fue presentada por la fiscalización contratada Esta intervencion tiene un costo de 1'714213,50 MAS IVA, trabajos que incluidos los servicios de fiscalización alcanzan un total de 1'804.552,55 mas iva, resultando un monto total requerido incluido iva de 2'021.098,86 USD. Al presente se encuentra en espera de asignación de recursos para continuar con el trámite respectivo de la ejecución de los trabajos de remedicación inmediata.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Con fecha 21 de mayo del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician trabajos mismos que debían ser culminados el 10 de junio del 2018. Sin embargo con la suscripcion de la orden de cambio # 3 al proyecto a traves del cual se legaliza un incremento contractual a la ejecucion de obras por un valor de 1'899.006,93 USD mas iva , se autoriza la implementacion de 90 dias adicionales que extienden la fecha de terminación de los trabajos para el 08-09-2018 y a la fecha se tramita el incremento de 118.118,23 USD mas iva para los trabajos de fiscalización complementarios, los mismos que se encuentran en espera de asignación de recursos.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con orden de cambio No. 4 de fecha 07 de febrero de 2018, se legaliza el incremento del plazo contractual en 90 días, contados a partir del 09 de Junio 2018, por lo que la fecha para la terminación de los trabajos se la estableció para el 08 de Septiembre de 2018; sin embargo con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, en vista de que a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-Trabajos finalizados y recibido provisionalmente, se encuentran pendientes de cancelar las planillas 9-10-11 de obra y fiscalizacion a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p>		
<p>JULIO 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 8 de junio del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician los trabajos , toda vez que se suscribe contrato complementario por 3'003.265,33 USD MAS IVA, otorgando ademas un plazo de ejecucion de 90 dias contados a partir del reinicio de los trabajos; esto es hasta el 6-09-2018. Adicionalmente se tramita suscripcion de complementario de consultoria para la fiscalizacion por un valor total de 234.254,70. MAS IVA.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la via Manta - San Mateo de 9 km de longitud.- Proyecto concluido en octubre de 2017 y se econtraba en tramite de recepcion provisional de la obra; sin embargo con fecha 5 de diciembre 2017 se presentaron fallas en los taludes del proyecto por el sismo del 3 de diciembre de 2017, ante lo cual la contratista efectuó a su costo las remediaciones inmediatas, que permitieron dar transitabilidad a la vía. Con Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-182-ME de fecha 10 de julio 2018, la supervisión de estudios zonal 4 , valida la alternativa de remediación definitiva al proyecto, misma que fue presentada por la fiscalización contratada Esta intervencion tiene un costo de 1'714213,50 MAS IVA, trabajos que incluidos los servicios de fiscalización alcanzan un total de 1'804.552,55 mas iva, resultando un monto total requerido incluido iva de 2'021.098,86 USD.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Con fecha 21 de mayo del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician trabajos mismos que debían ser culminados</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>06/08/2018 - 06:35 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>el 10 de junio del 2018. Sin embargo con la suscripción de la orden de cambio # 3 al proyecto a través del cual se legaliza un incremento contractual a la ejecución de obras por un valor de 1'899.006,93 USD más IVA, se autoriza la implementación de 90 días adicionales que extienden la fecha de terminación de los trabajos para el 08-09-2018 y a la fecha se tramita el incremento de 118.118,23 USD más IVA para los trabajos de fiscalización complementarios.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con orden de cambio No. 4 de fecha 07 de febrero de 2018, se legaliza el incremento del plazo contractual en 90 días, contados a partir del 09 de Junio 2018, por lo que la fecha para la terminación de los trabajos se la estableció para el 08 de Septiembre de 2018; sin embargo con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, en vista de que a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-Trabajos finalizados y recibido provisionalmente, se encuentran pendientes de cancelar las planillas 9-10-11 de obra y fiscalización</p>		
<p>Junio 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:12 PM</p>
<p>Mayo 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:12 PM</p>
<p>Abril 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:11 PM</p>
<p>Marzo 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:10 PM</p>
<p>Febrero 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:10 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Enero 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales 	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:09 PM</p>
<p>Diciembre 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales 	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:09 PM</p>
<p>Noviembre 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales 	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:09 PM</p>
<p>Octubre 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales 	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>14/11/2017 - 03:02 PM</p>
<p>Septiembre 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona En el mes de mayo se continúa con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales 	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>14/11/2017 - 03:02 PM</p>
<p>Agosto 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de mayo se continúa con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales 	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>14/11/2017 - 03:01 PM</p>
<p>Julio 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>14/11/2017 - 03:01 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En el mes de mayo se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales 		
<p>Junio 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de mayo se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales 	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>14/11/2017 - 03:01 PM</p>
<p>Mayo 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de mayo se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales. 	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>08/06/2017 - 10:15 AM</p>
<p>Abril 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de abril se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales. 	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>08/06/2017 - 10:14 AM</p>
<p>Marzo 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de marzo se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales. 	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>11/04/2017 - 02:30 PM</p>
<p>Febrero 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p>	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>11/04/2017 - 02:29 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En el mes de febrero se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales. 		
<p>Enero 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de enero se continua con los trabajos de reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales. 	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>11/04/2017 - 02:26 PM</p>
<p>Diciembre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de noviembre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales. 	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>11/04/2017 - 02:25 PM</p>
<p>Noviembre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de noviembre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales. 	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>08/12/2016 - 08:57 AM</p>
<p>Octubre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de octubre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales. 	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>08/12/2016 - 08:56 AM</p>
<p>Septiembre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p>	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>08/12/2016 - 08:55 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En el mes de septiembre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p>		
<p>Agosto 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de julio se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, contrata la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p>	Vera Vera, José Ricardo	08/12/2016 - 08:52 AM
<p>Julio 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de julio se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.</p>	Vera Vera, José Ricardo	08/12/2016 - 08:48 AM
<p>Junio 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de junio se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.</p>	Vera Vera, José Ricardo	08/12/2016 - 08:42 AM
<p>Mayo 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de mayo se inicia la construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción.</p>	Vera Vera, José Ricardo	08/12/2016 - 08:42 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5 Recursos Economico	23/01/2019	Tyron Xavier Tarabo Mieles	10	10	1	1/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>2- NACIONAL. Ambiental. El malo temporal por lluvias CAUSARÍA que se retrasen las obras de reconstrucción.</p>	23/01/2019	Tyron Xavier Tarabo Mieles	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacifico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Declaratoria estado de excepción por sismo 16 de abril 2016, mediante decretos ejecutivos 1001 y 1002 de fechas 17 y 18 de abril 2016	5-Entregables Intermedios	02/05/2016		17/04/2017		Sí	10.0
2	PLANEACION: Postulacion y Priorización de parte de Secretaría Técnica de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de los proyectos a ejecutar.	5-Entregables Intermedios	02/05/2016		22/05/2017		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Demolición y Remoción de escombros de edificaciones afectadas por el sismo 16 A en la provincia de Manabí	5-Entregables Intermedios	03/05/2016		07/01/2018		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: Construcción de Plataformas en varios cantones de la provincia de Manabí	5-Entregables Intermedios	25/11/2016		07/07/2018		Sí	3.0
5	EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí.	5-Entregables Intermedios	03/03/2017		01/07/2017		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.	5-Entregables Intermedios	05/03/2017	21/12/2018			No	10.0
7	EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.	5-Entregables Intermedios	06/03/2017	21/12/2018			No	3.0
8	EJECUCIÓN: Contrato 3- Construcción puente Jama.	5-Entregables Intermedios	09/04/2017		29/01/2018		Sí	4.0
9	EJECUCIÓN: Contrato 4- Fiscalización Construcción puente Jama.	5-Entregables Intermedios	09/04/2017		21/12/2018		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5-Entregables Intermedios	09/05/2017	21/12/2018			No	10.0
11	EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5-Entregables Intermedios	09/05/2017		21/12/2018		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.	5-Entregables Intermedios	15/09/2017	21/12/2018			No	10.0
13	EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes	5-Entregables Intermedios	01/01/2019	31/01/2019			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi							
14	EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/01/2019	31/01/2019		▼	No	0.25
15	EJECUCIÓN: Movimientos de tierra para la construcción de la cimentación de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/02/2019	28/02/2019		▼	No	0.5
16	EJECUCIÓN: Suministro y Fabricación de pilotes apoyo izquierdo para la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/02/2019	28/02/2019		▼	No	0.5
17	EJECUCIÓN: Estructura de Hormigón Armado para la construcción de la cimentación del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/03/2019	31/03/2019		▼	No	0.5
18	EJECUCIÓN: Suministro y Fabricación de pilotes apoyo derecho para la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/03/2019	31/03/2019		▼	No	0.5
19	EJECUCIÓN: Estructura de Hormigón Armado para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/04/2019	30/04/2019		▼	No	1.5
20	EJECUCIÓN: Hincado de pilotes apoyo derecho para la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/04/2019	30/04/2019		▼	No	0.5
21	EJECUCIÓN: Hincado de pilotes apoyo izquierdo para la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/05/2019	31/05/2019		▼	No	0.5
22	EJECUCIÓN: Instalaciones Sanitarias para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/05/2019	31/05/2019		▼	No	0.5
23	EJECUCIÓN: Construcción de Infraestructura de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/06/2019	30/06/2019		▼	No	2.5
24	EJECUCIÓN: Instalaciones Eléctricas para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/06/2019	30/06/2019		▼	No	0.5
25	EJECUCIÓN: Construcción de Superestructura de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/07/2019	31/07/2019		▼	No	2.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
26	EJECUCIÓN: Instalaciones Electronicas para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/07/2019	31/07/2019		▼	No	0.5
27	EJECUCIÓN: Derrocamiento y Retiro de estructuras existentes de antiguos puentes Contrato 9 Pimpiguasi y Contrato 8 Canuto	5-Entregables Intermedios	01/08/2019	31/08/2019		▼	No	0.25
28	EJECUCIÓN: Movimientos de tierra para la construcción de la ampliacion de pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/08/2019	31/08/2019		▼	No	0.5
29	EJECUCIÓN: Construccion de Accesos, Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/09/2019	30/09/2019		▼	No	1.0
30	EJECUCIÓN: Revestimientos de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/09/2019	30/09/2019		▼	No	0.5
31	EJECUCIÓN: Acabados y colocacion de cielo para la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/10/2019	31/10/2019		▼	No	0.5
32	EJECUCIÓN: Construccion de Encauzamientos y Protecciones Hidraulicas de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/10/2019	31/10/2019		▼	No	1.0
33	EJECUCIÓN: Construccion de Sistema Electrico de Iluminación de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/11/2019	30/11/2019		▼	No	0.25
34	EJECUCIÓN: Colocación de Puertas de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/11/2019	30/11/2019		▼	No	0.25
35	EJECUCIÓN: Ejecución de Señaleica Vertical y Horizontal de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/12/2019	31/12/2019		▼	No	0.25
36	EJECUCIÓN: Colocación de Ventanas para la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/12/2019	31/12/2019		▼	No	0.25
37	EJECUCIÓN: Suministro e instalacion de Mobiliario de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/01/2020	31/01/2020		▼	No	0.25
38	EJECUCIÓN: Suministro e instalacion de piezas sanitarias para la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/01/2020	31/01/2020		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
39	EJECUCIÓN: Suministro e instalación de sistema de aclimatación de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/02/2020	29/02/2020		▼	No	0.5
40	EJECUCIÓN: Suministro e instalación de sistema de seguridad aeroportuaria de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/02/2020	29/02/2020		▼	No	0.25
41	EJECUCIÓN: Suministro e instalación de sistema contra incendio de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/03/2020	31/03/2020		▼	No	0.25
42	EJECUCIÓN: Provisión y colocación de material granular de relleno a para la construcción de la ampliación de pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/04/2020	30/04/2020		▼	No	0.25
43	EJECUCIÓN: Suministro e instalación de señalética de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/04/2020	30/04/2020		▼	No	0.25
44	EJECUCIÓN: Provisión y colocación de capas estructurales de conformación de pavimento de la pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/05/2020	31/05/2020		▼	No	0.5
45	EJECUCIÓN: Provisión y colocación de capas de rodadura de la ampliación pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	08/05/2020	31/05/2020		▼	No	0.5
46	EJECUCIÓN: Provisión y colocación de capas de rodadura de la pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/06/2020	30/06/2020		▼	No	0.5
47	EJECUCIÓN: Provisión y colocación de señalética horizontal de la pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/06/2020	30/06/2020		▼	No	0.25
48	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	01/07/2020	31/07/2020		▼	No	1.0
49	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	01/07/2020	31/07/2020		▼	No	1.0
50	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	01/07/2020	31/07/2020		▼	No	1.0
51	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	01/10/2020	31/10/2020		▼	No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
52	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	5-Entregables Intermedios	01/10/2020	31/10/2020		▼	No	2.0
53	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	01/11/2020	30/11/2020		▼	No	1.0
54	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	5-Entregables Intermedios	01/11/2020	30/11/2020		▼	No	1.0
55	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	5-Entregables Intermedios	01/12/2020	31/12/2020		▼	No	1.5
56	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	5-Entregables Intermedios	01/12/2020	31/12/2020		▼	No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de informes técnicos de control de obra.	—	-	-	-	01/01/2017	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	182,630,124.71 **
Costo Total:	244,516,825.20
Total Devengado:	139,630,669.27
% Costo Total Devengado:	57.10 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 57.10 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	116,018,821.65	0.00	0.00	116,018,821.65
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	257,874,665.75	30,141,673.28	0.00	288,016,339.03
Ppto. Comprometido	200,736,736.14	0.00	0.00	200,736,736.14
Planeado - Codificado (2019)		-30,141,673.28		
Programado a Devengar	159,018,276.09	42,999,455.44	0.00	202,017,731.53
Ppto. Devengado	139,630,669.27	0.00	0.00	139,630,669.27
Pagado Real	108,704,578.32	0.00	0.00	108,704,578.32
Estimado a fin de año	* 139,630,669.27	0.00	0.00	139,630,669.27
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	19,387,606.82	42,999,455.44	0.00	62,387,062.26
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 87.81 %	0.00 %	0.00 %	69.12 %
Ppto. Codificado 998	12,557,087.19	0.00	0.00	12,557,087.19
Ppto. Devengado 998	11,955,338.58	0.00	0.00	11,955,338.58

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

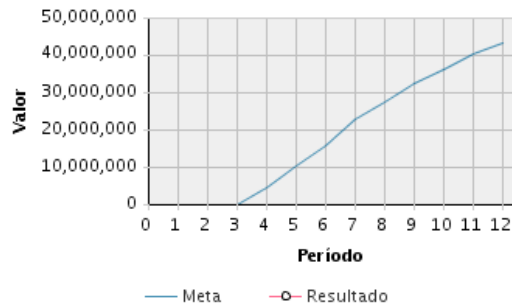

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	4,310,457.16		4,310,457.16				
May	5,827,822.47		10,138,279.63				
Jun	5,394,912.81		15,533,192.44				
Jul	7,043,226.46		22,576,418.90				
Ago	4,577,374.58		27,153,793.48				
Sep	5,085,615.32		32,239,408.80				
Oct	3,766,686.29		36,006,095.09				
Nov	4,338,993.72		40,345,088.81				
Dic	2,654,366.63		42,999,455.44				
Total	42,999,455.44						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
18	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
19	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
20	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE FASE DE EJECUCIÓN A CONGELADO	MTOP-CGP-2019-104-ME_AUTORIZACIÓN_PARA_CAMBIO_DE_FASE.pdf	30/01/2019
2	HITO 10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	01/03/2019
3	HITO 10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	05/06/2019
4	HITO 10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_ACCESO_BAHÍA_-SUSPENSIÓN.pdf	05/06/2019
5	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	7_ACCESO_BAHIA_FISCA_03-09-2018-041754.pdf	05/09/2018
6	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	7ACCESO_BAHIA_FISCA_02-10-2018-042643.pdf	04/10/2018
7	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	7_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	05/11/2018
8	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	05/12/2018
9	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	7_ACCESO_BAHIA_FISCA_02-08-2018-045904.pdf	06/08/2018
10	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	7_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	04/01/2019
11	HITO 10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	7_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	05/02/2019
12	HITO 11 EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía	7_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	05/02/2019
13	HITO 11 EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	01/03/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	HITO 11 EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	05/06/2019
15	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_TERREMOTO_OBRA_03-09-2018-054138.pdf	05/09/2018
16	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	8MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_TERREMOTO_OBRA_02-10-2018-042807.pdf	04/10/2018
17	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf	05/11/2018
18	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MEMORANDOS_SUSPENSIÓN_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA.pdf	05/11/2018
19	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Memorando_Nro._MTOPI-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terremoto.pdf	05/11/2018
20	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf	05/12/2018
21	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MEMORANDO_NRO._MTOPI-SUBZ4-2018-1540-ME.pdf	05/12/2018
22	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MEMORANDO_NRO._MTOPI-SUBZ4-2018-1541-ME.pdf	05/12/2018
23	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_1.pdf	05/12/2018
24	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_2.pdf	05/12/2018
25	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_3.pdf	05/12/2018
26	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_4.pdf	05/12/2018
27	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf	04/01/2019
28	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_TERREMOTO_OBRA_02-08-2018-091831.pdf	06/08/2018
29	HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí	8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf	05/02/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
30	HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí	6_MONTECRISTI_-_JIPIJAPA_OBRA.pdf	01/03/2019
31	HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí	6_MONTECRISTI_-_JIPIJAPA_FISCA.pdf	01/03/2019
32	HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.	6_MONTECRISTI_-_JIPIJAPA_OBRA.pdf	05/06/2019
33	HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.	6_MONTECRISTI_-_JIPIJAPA_FISCA.pdf	05/06/2019
34	HITO 13 CIERRE: ACTA DE RECEPCIÓN PROVICIONAL PUENTE JAMA PARTE 1	ACTA_PROVISIONAL_PTE._JAMA_1.pdf	06/08/2018
35	HITO 13 CIERRE: ACTA DE RECEPCIÓN PROVICIONAL PUENTE JAMA PARTE 2	ACTA_PROVISIONAL_PTE._JAMA_2.pdf	06/08/2018
36	HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	13_PUENTE_CANUTO_OBRA.pdf	06/06/2019
37	HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	14_PUENTE_PIMPIGUISÍ.pdf	06/06/2019
38	HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	11_PUENTE_CANUTO_SOBRE_EL_RÍO_GRANDE.pdf	11/02/2019
39	HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	10_PUENTE_PIMPIGUASI_SOBRE_EL_RÍO_CHICO.pdf	11/02/2019
40	HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	9_PUENTE_CANUTO_OBRA.pdf	01/03/2019
41	HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	8_PUENTE_PIMPIGUASI_OBRA.pdf	01/03/2019
42	HITO 14 EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	9_AEROPUERTO_ELOY_ALFARO_DE_MANTA.pdf	11/02/2019
43	HITO 14 EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	7_AEROPUERTO_DE_MANTA_OBRA.pdf	01/03/2019
44	HITO 14 EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	7_AEROPUERTO_DE_MANTA_OBRA.pdf	06/06/2019
45	HITO 1: Plataformas Cantón Jaramijó: Contrato y sabanas de planillas 1 y 2.	Contrato_y_sabanas_planillas..rar	29/11/2016
46	HITO 2: Plataformas Cantón Chone: Contrato y sabanas de planillas 1 a 7.	Contratos_y_sabanas_de_plataforma_Chone_(1).pdf	01/12/2016
47	HITO 4: Plataformas Cantón Rocafuerte: Contrato y sabanas de planillas 1 a 4, Danzarín, Valdes.	Contratos_y_sabanas_de_plataforma_Rocafuerte.pdf	28/11/2016
48	HITO 4: Plataformas Cantón Rocafuerte: Contrato y sabanas de planillas Higuero.	Sabana_y_planilla_Higuero..rar	01/12/2016
49	HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí	2_HANGAR_OBRA.pdf	05/02/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
50	HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí	1_HANGAR_PROVISIONAL_OBRA.pdf	01/03/2019
51	HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí	1_HANGAR_PROVISIONAL_FISCA.pdf	01/03/2019
52	HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí.	1_HANGAR_OBRA.pdf	05/06/2019
53	HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí.	1_HANGAR_FISCA.pdf	05/06/2019
54	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf	05/12/2018
55	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	3_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf	04/01/2019
56	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	3SAN_PLACIDO_-_PICHINCHA_OBA_TERREMOTO__02-10-2018-041753.pdf	04/10/2018
57	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	3SAN_PLACIDO_-_PICHINCHA_FISCA_TERREMOTO__02-10-2018-041838.pdf	04/10/2018
58	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	3_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf	05/11/2018
59	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	Memorando_Nro._MTOB-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terremoto.pdf	05/11/2018
60	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS EN EJECUCIÓN	3_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_TERREMOTO_OBRA_03-08-2018-063332.pdf	06/08/2018
61	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS EN EJECUCIÓN	3_SAN_PLACIDO_TERRRMOTO_OBRA_03-09-2018-040955.pdf	05/09/2018
62	HITO 5 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.	Contrato_1__planilla_1..rar	29/11/2016
63	HITO 51 CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_PUENTE_SOBRE_EL_RÍO_01_02_2018.pdf	01/02/2018
64	HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí	3_SAN_PLÁCIDO_-_PÍCHINCHA_OBRA.pdf	05/02/2019
65	HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí	2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf	01/03/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
66	HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí	2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_FISCA.pdf	01/03/2019
67	HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.	2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf	05/06/2019
68	HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.	2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_FISCA.pdf	05/06/2019
69	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA_03-09-2018-041134.pdf	05/09/2018
70	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA__02-10-2018-041934.pdf	04/10/2018
71	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4MANTA_-_SAN_MATEO_FISCA_02-10-2018-042021.pdf	04/10/2018
72	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	05/11/2018
73	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Memorando_Nro._MTOB-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terramoto.pdf	05/11/2018
74	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	05/12/2018
75	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA_02-08-2018-045539.pdf	06/08/2018
76	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	04/01/2019
77	HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí	4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	05/02/2019
78	HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí	3_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	01/03/2019
79	HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí	3_MANTA_-_SAN_MATEO_FISCA.pdf	01/03/2019
80	HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.	3_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	05/06/2019
81	HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.	3_MANTA_-_SAN_MATEO_FISCA.pdf	05/06/2019
82	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	PUENTE_JAMA_OBRA.pdf	05/12/2018
83	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf	04/01/2019
84	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_OBRA_03-09-2018-040301.pdf	05/09/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
85	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf	05/11/2018
86	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	Memorando_Nro._MTOF-DP-2018-870-ME_Confirmación_Desembolso_Crédito_Chino_Jama_y_Bahía.pdf	05/11/2018
87	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	Memorando_Nro._MTOF-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terramoto.pdf	05/11/2018
88	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA RESPALDO DE TRABAJOS EJECUTADOS	1_PUENTE_JAMA_OBRA_02-08-2018-045225.pdf	06/08/2018
89	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA RESPALDO DE TRABAJOS EJECUTADOS	1PUENE_JAMA_OBRA_02-10-2018-041211.pdf	04/10/2018
90	HITO 8 EJECUCIÓN: Contrato 3- Construcción puente Jama.	1_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf	05/02/2019
91	HITO 8 EJECUCIÓN: Contrato 3- Construcción puente Jama.	11_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf	05/06/2019
92	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_FISCA_03-09-2018-040352.pdf	05/09/2018
93	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1PUENE_JAMA_FISCA_02-10-2018-041257.pdf	04/10/2018
94	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf	05/11/2018
95	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	PUENTE_JAMA_FISCA.pdf	05/12/2018
96	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf	04/01/2019
97	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_FISCA_02-08-2018-045305.pdf	06/08/2018
98	HITO 9 EJECUCIÓN: Contrato 4- Fiscalización Construcción puente Jama.	1_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf	05/02/2019
99	HITO 9 EJECUCIÓN: Contrato 4- Fiscalización Construcción puente Jama.	11_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf	05/06/2019
100	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA OFICIO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS	7_PRONUNCIAMIENTO_SUSPENSION_ACCESO_BAHIA	06/08/2018 060017.pdf
101	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA OFICIO LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS	7_LEVANTAMIENTO_SUSPENSION_ACCESO_BAHIA.pdf	04/01/2019
102	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	7_ACCESO_BAHIA_OBRA_02-08-2018-045819.pdf	06/08/2018
103	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	7_ACCESO_BAHIA_OBRA_03-09-2018-041710.pdf	05/09/2018
104	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	7ACCESO_BAHIA_OBRA_02-10-2018-042602.pdf	04/10/2018
105	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	7_ACCESO_BAHIA_OBRA.pdf	05/11/2018
106	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Memorando_Nro._MTOF-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terramoto.pdf	05/11/2018
107	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Memorando_Nro._MTOF-DP-2018-870-ME_Confirmación_Desembolso_Crédito_Chino_Jama_y_Bahía.pdf	05/11/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
108	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	05/12/2018
109	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	7_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	04/01/2019
110	SOLICITUD DE CAMBIO DE FASE DE EJECUCION A CONGELADO	MTOP-SUBZ4-2019-0145-ME.pdf	30/01/2019
111	SOLICITUD DE CAMBIO DE FASE DE EJECUCION A CONGELADO	MTOP-SUBSZ4-UIDT-2019-0013-ME.pdf	30/01/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Patrocinador ejecutivo.	Subsecretario Zonal 4	iganchozo@mtop.gob.ec	023974600
Macias Fuentes, Alberto Fabrizzio	Titular	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Manabí	amacias@mtop.gob.ec	023974600
Tarabo Mieles, Tyron Xavier	Lider del proyecto.	Coordinador de Infraestructura	ttarabo@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
112636_1.jpg	23/01/2019
