

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 5
Dirección Provincial Guayas

PROYECTO: K013 MTOP - Rehabilitación y mejoramiento (24 meses), mantenimiento (48meses) carretera de la Vía del Pacífico corredor arterial E-15, Tramo: Santa Elena-Bahía de Caráquez de 255 km

Líder del Proyecto:	Paz Mora, Luis Alfredo (lpaz@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	Programas Relacionados:	MTOP - RUTA DE SPONDYLUS, Provincia - Manabí, Provincia - Santa Elena, Proyectos Emblemáticos, Proyectos Prioritarios PAI, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO -24 MESES- MTTO -48 MESES- CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E-15 , SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Delgado León, Andrés Glen	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.641.3918	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	5	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	159,191,692.59
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	28/09/2008 - 31/07/2019
Fecha de última actualización:	30/07/2019	Fecha de Fin Base:	30/12/2017
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La construcción de este magno proyecto beneficiará a todas las personas que viven a lo largo de la vía Santa Elena - Bahía de Caraquez. Esta vía es parte de la RUTA DEL SPONDILUS. Este importante proyecto beneficia a miles de turistas y sus habitantes que se desplazan por dicha carretera a las diversas playas de la costa ecuatoriana, fortaleciendo así la seguridad vial de los usuarios.

PRODUCTO / SERVICIO:

Mejorar la calidad de servicio y seguridad de la vía existente.

LINEA BASE:

Debido a las malas condiciones que presentaba la vía, se volvía un sacrificio y peligro desplazarse por la misma, que a más de su mala condición era insegura debido a la falta de señalización horizontal y vertical. Ante esta circunstancia el MTOP contrata los estudios y posteriormente la ejecución de los trabajos, a fin de brindar un servicio de calidad a los usuarios, conociendo de antemano el potencial agrícola, ganadero, y turístico de este sector.

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Como objetivo general del proyecto será complementar el desarrollo vial y bienestar para los usuarios de la vía.

Objetivos específicos:

- Que mejore la infraestructura de transporte de la zona.
- Que mejore el turismo en la zona.
- Que se haga la adecuada señalización de las vías de acceso para así mejorar la circulación.
- Que se haga la adecuada señalización de la vía.

OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación y mejoramiento (24 meses), mantenimiento (48meses) carretera de la Vía del Pacífico corredor arterial E-15, Tramo: Santa Elena-Bahía de Caráquez de 255 km

DATOS GENERALES

Descripción

Contratista: Compañía VERDU S.A
 Fiscalizador: Consorcio NYLIC-INDETEC-ICA
 Administrador: Andrés Delgado León
 Supervisor: Ing. Mendoza Cedeño José Eugenio - MTOP - Guayas.
 ID Contrato: 108.

Fecha de Suscripción: 18 de agosto de 2008
 Monto de anticipo:\$ 33,566,512.95
 Fecha de anticipo:16/09/2008

Monto de obra original:\$ 60,031,425.90
 Monto de mantenimiento original:\$ 7,101,600.00
 Monto total original: \$ 67,133,025.90

Plazo de ejecución de la obra:24 meses
 Fecha de inicio de obra:16 de septiembre de 2008
 Fecha de terminación original de la obra:16 de septiembre de 2010

Plazo de mantenimiento: 48 meses
 Fecha de Inicio de mantenimiento: 17 de octubre de 2010
 Fecha de terminación original del mantenimiento:17 de octubre del 2014

Anexos Contractuales:\$ 78,474,262.20
 Ampliación de Plazo:73 meses

Monto de obra vigente\$ 138,505,688.10
 Monto de mantenimiento vigente:\$ 7,101,600.00
 Monto total vigente:\$ 145,607,288.10

Fecha de terminación vigente de la obra:30 de septiembre de 2014
 Fecha de Inicio de mantenimiento vigente: 01 de octubre de 2014
 Fecha de terminación mantenimiento vigente:01 de octubre de 2018

Contrato de obra\$ 60,031,425.90
 Anexos contractuales\$ 78,474,262.20
 Reajustes\$ 6,925,284.41
 IVA\$ 17,451,716.70
 Contrato de fiscalización 1\$ 272,683.98
 Anexos contractuales\$ 190,878.78
 Reajustes\$ 18,542.51
 IVA\$ 57,852.63
 Contrato de fiscalización 1\$ 1,534,423.86
 Anexos contractuales\$ 1,074,096.16
 Reajustes\$ 104,340.80
 IVA\$ 325,543.30
 Costo Total\$ 166,461,051.23

Avance físico:100%

Beneficios Cualitativos

Esta vía interconecta la Provincia de Santa Elena con las Provincias de Manabí, Esmeraldas y el resto de vías estatales que se conectan con la sierra Ecuatoriana, impactando en los rubros de turismo, comercio, pesca artesanal e industrial.

Tipo de Beneficiario

Los pobladores de las localidades que se encuentran ubicadas a lo largo de la ruta Spondylus: sector turístico, comercial, pesquero, artesanal y e industrial


Restricciones

TIEMPO: Terminar el proyecto dentro del tiempo establecido en el contrato.
 COSTO: No excederse del monto presupuestado para el proyecto.
 ALCANCE: Utilizar las canteras o minas según se especifica en los estudios.
 RECURSOS: Utilizar los materiales según las especificaciones técnicas del contrato.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 28/09/2008 Fecha de Fin: 31/07/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

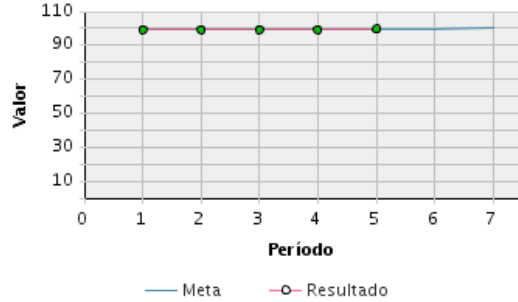

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
	Avance real acumulado											
	99 %	99 %	99 %	99 %	100 %							
Estado												
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2019 : Se realizó la recepción Definitiva, se encuentra en proceso de legalización del Acta.	Paz Mora, Luis Alfredo	02/07/2019 - 10:50 AM
MAYO 2019 : El plazo del contrato se encuentra cumplido, el contratista realiza trabajos previo a la Recepción Definitiva	Paz Mora, Luis Alfredo	03/06/2019 - 03:29 PM
ABRIL 2019 : El plazo del contrato se encuentra cumplido, el contratista solicitó la Recepción Definitiva	Paz Mora, Luis Alfredo	06/05/2019 - 03:13 PM
MARZO 2019 : El plazo del contrato se encuentra cumplido, el contratista solicitó la Recepción Definitiva	Paz Mora, Luis Alfredo	01/04/2019 - 01:01 PM
FEBRERO 2019 : El monto para el mantenimiento se encuentra cubierto, el contratista solicitó la terminación por mutuo acuerdo del contrato, cuyo trámite se encuentra en Departamento Jurídico.	Paz Mora, Luis Alfredo	08/03/2019 - 08:33 AM
ENERO 2019 : El monto para el mantenimiento se encuentra cubierto, el contratista solicitó la terminación por mutuo acuerdo del contrato, cuyo trámite se encuentra en Departamento Jurídico.	Paz Mora, Luis Alfredo	04/02/2019 - 03:29 PM
DICIEMBRE 2018 : El monto para el mantenimiento se encuentra cubierto, el contratista solicitó la terminación por mutuo acuerdo del contrato, cuyo trámite se encuentra en Departamento Jurídico.	Paz Mora, Luis Alfredo	28/12/2018 - 10:22 AM
NOVIEMBRE 2018 : El monto para el mantenimiento se encuentra cubierto, el contratista solicitó la terminación por mutuo acuerdo del contrato, cuyo trámite se encuentra en Departamento Jurídico.	Paz Mora, Luis Alfredo	03/12/2018 - 09:09 AM
OCTUBRE 2018 : El monto para el mantenimiento se encuentra cubierto, el contratista solicitó la terminación por mutuo acuerdo del contrato, cuyo trámite se encuentra en Departamento Jurídico Paz Mora, Luis Alfredo 02/10/2018 - 08:02 AM	Paz Mora, Luis Alfredo	05/11/2018 - 04:22 PM
SEPTIEMBRE 2018 : El monto para el mantenimiento se encuentra cubierto, el contratista solicitó la terminación por mutuo acuerdo del contrato, cuyo trámite se encuentra en Departamento Jurídico	Paz Mora, Luis Alfredo	02/10/2018 - 08:02 AM
AGOSTO 2018 : El monto para el mantenimiento se encuentra cubierto, el contratista solicitó la terminación por mutuo acuerdo del contrato, cuyo trámite se encuentra en Departamento Jurídico	Paz Mora, Luis Alfredo	03/09/2018 - 09:56 AM
JULIO 2018 : El monto para el mantenimiento se encuentra cubierto, el contratista solicitó la terminación por mutuo acuerdo del contrato, cuyo trámite se encuentra en Departamento Jurídico Paz Mora, Luis Alfredo 05/07/2018 - 11:35 AM	Paz Mora, Luis Alfredo	06/08/2018 - 09:22 AM
JUNIO 2018 : El monto para el mantenimiento se encuentra cubierto, el contratista solicitó la terminación por mutuo acuerdo del contrato, cuyo trámite se encuentra en Departamento Jurídico	Paz Mora, Luis Alfredo	05/07/2018 - 11:35 AM
MAYO 2018 : El monto para el mantenimiento se encuentra cubierto, el contratista solicitó la terminación por mutuo acuerdo del contrato, cuyo trámite se encuentra en Departamento Jurídico. Paz Mora, Luis Alfredo 10/05/2018 - 09:56 AM	Paz Mora, Luis Alfredo	01/06/2018 - 09:38 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2018 : El monto para el mantenimiento se encuentra cubierto, el contratista solicitó la terminación por mutuo acuerdo del contrato, cuyo trámite se encuentra en Departamento Jurídico.	Paz Mora, Luis Alfredo	10/05/2018 - 09:56 AM
MARZO 2018 : El monto para el mantenimiento se encuentra cubierto, el contratista ha solicitado la terminación por mutuo acuerdo del contrato, se encuentra trámite en Departamento Jurídico.	Paz Mora, Luis Alfredo	10/04/2018 - 09:43 AM
FEBRERO 2018 : El monto para el mantenimiento se encuentra cubierto, el contratista ha solicitado la terminación por mutuo acuerdo del contrato	Paz Mora, Luis Alfredo	07/03/2018 - 02:03 PM
ENERO 2018 : El monto para el mantenimiento se encuentra cubierto, el contratista va a proceder a realizar el pedido de terminación por mutuo acuerdo del contrato.	Paz Mora, Luis Alfredo	05/02/2018 - 09:43 AM
DICIEMBRE 2017 : Se realizaron trabajos de mantenimiento rutinario; se viene realizando trabajos de bacheo menor y mayor, roza de maleza en zonas laterales de la vía, limpieza de cunetas, alcantarillas en el tramo T de Rocafuerte - Bahía de Caráquez.	Paz Mora, Luis Alfredo	10/01/2018 - 03:42 PM
NOVIEMBRE 2017 : Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario; se viene realizando trabajos de bacheo menor y mayor, roza de maleza en zonas laterales de la vía, limpieza de cunetas, alcantarillas en los tramos , San Vicente - San Pablo, Manta - Y de Crucita y la T de Rocafuerte - Bahía de Caráquez.	Paz Mora, Luis Alfredo	05/12/2017 - 01:02 PM
OCTUBRE 2017 : Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario; se viene realizando trabajos de bacheo menor y mayor, roza de maleza en zonas laterales de la vía, limpieza de cunetas en los tramos Puerto Cayo - San Lorenzo- San Mateo - Manta, San Vicente - San Pablo.	Paz Mora, Luis Alfredo	01/11/2017 - 09:22 AM
SEPTIEMBRE 2017 : Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario; se viene realizando trabajos de bacheo menor y mayor, roza de maleza en zonas laterales de la vía, limpieza de cunetas en los tramos Puerto Cayo - San Lorenzo- San Mateo - Manta	Paz Mora, Luis Alfredo	03/10/2017 - 01:20 PM
AGOSTO 2017 Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario; se viene realizando trabajos de bacheo menor y mayor, roza de maleza en zonas laterales de la vía, limpieza de cunetas, en los tramos Puerto Cayo - Manta, la T de Rocafuerte - Bahía de Caráquez. JULIO 2017; Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario; debido a la fuerte estación invernal se han realizado trabajos emergentes de limpieza de alcantarillas, cunetas, material de derrumbes, además se vienen realizando trabajos de bacheo menor y mayor, en los tramos Puerto Cayo - Manta, la T de Rocafuerte - Bahía de Caráquez. JUNIO 2017; Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario; debido a la fuerte estación invernal se han realizado trabajos emergentes de limpieza de alcantarillas, cunetas, material de derrumbes, además se vienen realizando trabajos de bacheo menor y mayor, en los tramos Puerto Cayo - Manta, la T de Rocafuerte - Bahía de Caráquez.	Paz Mora, Luis Alfredo	08/09/2017 - 04:22 PM
MAYO 2017; Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario; debido a la fuerte estación invernal se han realizado trabajos emergentes de limpieza de alcantarillas, cunetas, material de derrumbes, además se vienen realizando trabajos de bacheo menor y mayor.		
ABRIL 2017; Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario; debido a la fuerte estación invernal se han realizado trabajos emergentes de limpieza de alcantarillas, cunetas, material de derrumbes.	Paz Mora, Luis Alfredo	04/05/2017 - 10:38 AM
MARZO 2017; Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario; debido a la fuerte estación invernal se han realizado trabajos emergentes de limpieza de alcantarillas, cunetas, material de derrumbes.	Paz Mora, Luis Alfredo	07/04/2017 - 04:22 PM
ENERO 2017: La obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se realizó evaluación de las vías en mantenimiento , se programaron los trabajos de mantenimiento bacheo asfáltico, sellado de fisuras, limpieza de cunetas, alcantarilla, roza de vegetación etc. además se coordinó la limpieza de material de derrumbes en algunos sectores, producto de las lluvias Se realizó evaluación y para la construcción de variante en sector La Pile, Los trabajos de mantenimiento se realizan todos los meses.	Paz Mora, Luis Alfredo	06/02/2017 - 11:05 AM
DICIEMBRE 2016: La obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se ejecutaron tareas de bacheo asfáltico, roza de vegetación, limpieza de cunetas y alcantarillas, y sellos de fisuras superficiales. En el sector de Puerto López - Macahilla se realizó la reparación de barrandas de puente lado izquierdo. Se realizó evaluación y presupuesto para la construcción de variante en sector La Pile, por falla geológica de la estructura de la vía. los trabajos de mantenimiento se repiten todos los meses.	Paz Mora, Luis Alfredo	05/01/2017 - 04:56 PM
NOVIEMBRE 2016: Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se ejecutaron tareas de bacheo asfáltico, roza de vegetación, limpieza de cunetas y alcantarillas, y sellos de fisuras superficiales. Estos trabajos se repiten todos los meses.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	05/12/2016 - 09:30 AM
OCTUBRE 2016: Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se ejecutaron tareas de bacheo asfáltico, roza de vegetación, limpieza de cunetas y alcantarillas, y sellos de	Paz Mora, Luis Alfredo	01/11/2016 - 03:58 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
fisuras superficiales. Estos trabajos se repiten todos los meses, hasta concluir con la etapa de mantenimiento Paz Mora, Luis Alfredo 09/09/2016 - 08:40 AM		
SEPTIEMBRE 2016: Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se ejecutaron tareas de bacheo asfáltico, roza de vegetación, limpieza de cunetas y alcantarillas, y sellos de fisuras superficiales. Estos trabajos se repiten todos los meses, hasta concluir con la etapa de mantenimiento Paz Mora,	Paz Mora, Luis Alfredo	01/11/2016 - 03:57 PM
AGOSTO 2016: Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se ejecutaron tareas de bacheo asfáltico, roza de vegetación, limpieza de cunetas y alcantarillas, y sellos de fisuras superficiales. Estos trabajos se repiten todos los meses, hasta concluir con la etapa de mantenimiento Paz Mora, Luis Alfredo 09/09/2016 - 08:40 AM	Paz Mora, Luis Alfredo	09/09/2016 - 08:41 AM
JULIO 2016: Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se ejecutaron tareas de bacheo asfáltico, roza de vegetación, limpieza de cunetas y alcantarillas, y sellos de fisuras superficiales. Estos trabajos se repiten todos los meses, hasta concluir con la etapa de mantenimiento	Paz Mora, Luis Alfredo	09/09/2016 - 08:40 AM
JUNIO 2016: Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se ejecutaron tareas de bacheo asfáltico, roza de vegetación, limpieza de cunetas y alcantarillas, y sellos de fisuras superficiales. Estos trabajos se repiten todos los meses, hasta concluir con la etapa de mantenimiento.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	06/07/2016 - 09:21 AM
MAYO 2016: Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se ejecutaron tareas de bacheo asfáltico, roza de vegetación, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de derrumbes y sellos de fisuras superficiales. Estos trabajos se repiten todos los meses, hasta concluir con la etapa de mantenimiento.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	06/07/2016 - 09:21 AM
ABRIL 2016: Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se ejecutaron tareas de bacheo asfáltico, roza de vegetación, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de derrumbes y sellos de fisuras superficiales. Estos trabajos se repiten todos los meses, hasta concluir con la etapa de mantenimiento.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	06/05/2016 - 11:36 AM
MARZO 2016: Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se ejecutaron tareas de bacheo asfáltico, roza de vegetación, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de derrumbes y sellos de fisuras superficiales. Estos trabajos se repiten todos los meses, hasta concluir con la etapa de mantenimiento.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	06/05/2016 - 11:35 AM
FEBRERO 2016: Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se ejecutaron tareas de bacheo asfáltico, roza de vegetación, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de derrumbes y sellos de fisuras superficiales.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	08/03/2016 - 01:40 PM
ENERO 2016: Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se ejecutaron tareas de bacheo asfáltico, roza de vegetación, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de derrumbes y sellos de fisuras superficiales.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	08/03/2016 - 01:39 PM
DICIEMBRE 2015: Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se ejecutaron tareas de bacheo asfáltico, roza de vegetación, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de derrumbes y sellos de fisuras superficiales.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	08/03/2016 - 01:38 PM
NOVIEMBRE 2015: Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento rutinario, se ejecutaron tareas de bacheo asfáltico, roza de vegetación, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de derrumbes y sellos de fisuras superficiales.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	24/12/2015 - 10:29 AM
OCTUBRE 2015: Proyecto en etapa de mantenimiento, se realizan trabajos de bacheo menor, limpieza de alcantarillas y roza de maleza por toda la vía. HITO 15	Calderón Cañar, Edgar Miguel	24/12/2015 - 10:29 AM
SEPTIEMBRE 2015: Proyecto en etapa de mantenimiento, se realizan trabajos de bacheo menor, limpieza de alcantarillas y roza de maleza por toda la vía. HITO 14	Palacios Pesantes, Daniel	05/11/2015 - 09:08 AM
AGOSTO 2015: Proyecto en etapa de mantenimiento, se realizan trabajos de bacheo menor, limpieza de alcantarillas y roza de maleza por toda la vía.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	07/09/2015 - 01:42 PM
JULIO 2015: Proyecto en etapa de mantenimiento, se realizan trabajos de bacheo menor, limpieza de alcantarillas y roza de maleza por toda la vía.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	12/08/2015 - 05:03 PM
JUNIO 2015: Proyecto en etapa de mantenimiento, se realizan trabajos de bacheo menor, limpieza de alcantarillas y roza de maleza por toda la vía.	Palacios Pesantes, Daniel	03/07/2015 - 12:04 PM
MAYO 2015: Proyecto en etapa de mantenimiento, se realizan trabajos de bacheo menor, limpieza de alcantarillas y roza de maleza por toda la vía. HITO 12.	Palacios Pesantes, Daniel	17/06/2015 - 12:28 PM
ABRIL 2015: Se legaliza el Acta de Entrega Recepción Provisional del último subtramo que se encontraba pendiente de recibir. HITO 11.	Palacios Pesantes, Daniel	12/05/2015 - 02:47 PM
MARZO 2015: En proceso de legalización del Acta Provisional. HITO 11.	Palacios Pesantes, Daniel	06/04/2015 - 11:32 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2015: En proceso de legalización del Acta Provisional. HITO 11.	Palacios Pesantes, Daniel	06/03/2015 - 03:27 PM
ENERO 2015: Los trabajos de rehabilitación son concluidos. En proceso de legalización del Acta Provisional. HITO 11.	Palacios Pesantes, Daniel	10/02/2015 - 11:22 AM
DICIEMBRE 2014: Los trabajos de rehabilitación son concluidos. En proceso de legalización del Acta Provisional. HITO 11.	Palacios Pesantes, Daniel	08/01/2015 - 03:25 PM
NOVIEMBRE 2014: Los trabajos de rehabilitación son concluidos. En proceso de legalización del Acta Provisional. HITO 11.	Palacios Pesantes, Daniel	08/12/2014 - 02:15 PM
OCTUBRE 2014: Los trabajos de rehabilitación son concluidos. En proceso de legalización del Acta Provisional. HITO 11.	Palacios Pesantes, Daniel	06/11/2014 - 04:17 PM
SEPTIEMBRE 2014: Los trabajos de rehabilitación son concluidos. En proceso de legalización del Acta Provisional.	Palacios Pesantes, Daniel	16/10/2014 - 03:56 PM
Agosto 2014: Una vez solucionados los problemas de las expropiaciones en Jaramijó, se continúa con los trabajos en el acceso al puerto. HITO 10	Palacios Pesantes, Daniel	11/09/2014 - 10:06 PM
Julio 2014: Continúan los trabajos de acceso al Puerto Jaramijó. HITO 10	Palacios Pesantes, Daniel	06/08/2014 - 03:09 PM
Junio 2014: Una vez solucionados los problemas de las expropiaciones en Jaramijó, continúan con los trabajos de movimiento de tierra.	Palacios Pesantes, Daniel	14/07/2014 - 04:07 PM
Mayo 2014: Se continúan con los trámites de expropiación en el sector del puerto de Jaramijó a fin de liberar las áreas que se encuentran dentro del trazado del proyecto. HITO 10.	Palacios Pesantes, Daniel	07/06/2014 - 12:27 PM
Abril 2014: Se gestionan los trámites de expropiación en el sector del puerto de Jaramijó a fin de liberar las áreas que se encuentran dentro del trazado del proyecto.	Palacios Pesantes, Daniel	13/05/2014 - 02:23 PM
Marzo 2014: Los trabajos se encuentran acabados en la vía Cruz Verde-Crucita y en Las Cabuyas. En el acceso al puerto Jaramijó, los trabajos se encuentran suspendidos por problemas de expropiación de algunos afectados. HITO 10	Palacios Pesantes, Daniel	13/03/2014 - 06:52 PM
Febrero 2014: Se termina la colocación de la capa de mejoramiento en las Cabuyas	Palacios Pesantes, Daniel	13/03/2014 - 06:51 PM
Enero 2014: Remoción de postes para construcción de paso peatonal en Higueron.	Palacios Pesantes, Daniel	13/03/2014 - 06:51 PM
Diciembre 2013: Se coloca capa de mejoramiento en las Cabuyas.	Palacios Pesantes, Daniel	13/03/2014 - 06:51 PM
Noviembre 2013: Transporte de material de Base y Sub-Base. HITO 10.	Palacios Pesantes, Daniel	09/12/2013 - 08:49 AM
Octubre 2013: Los trabajos se encuentran acabados en la vía Cruz Verde-Crucita; En la variante de las Cabuyas continúan los trabajos de transporte y colocación de material de sub-base y base granular; En el acceso al puerto Jaramijó, los trabajos se encuentran suspendidos por problemas de expropiación de algunos afectados.	Palacios Pesantes, Daniel	06/11/2013 - 08:44 AM
Septiembre 2013: Adicional la orden de cambio se encuentra legalizada por ampliación de plazo por los trabajos de Las Cabuyas y Jaramijó.	Palacios Pesantes, Daniel	01/10/2013 - 02:24 PM
Septiembre 2013: Continúan los trabajos de movimiento de tierra y colocación de sub drenes. En la Cruz Verde-Crucita, se trabaja en la colocación de capa de rodadura e iluminación. En Jaramijó se trabaja en movimiento de tierra así como se hacen las gestiones para la expropiación de las personas afectadas con el nuevo trazado.	Palacios Pesantes, Daniel	01/10/2013 - 02:05 PM
Agosto 2013.- Continúan los trabajos de movimiento de tierra y colocación de alcantarillas en la variante Las Cabuyas; en el tramo Cruz Verde - Crucita se trabaja en la iluminación, construcción de bordillos, aceras y colocación de capas de sub base en la variante de Cerecito. Trabajos en la vía de acceso al puerto pesquero Jaramijó.	Palacios Pesantes, Daniel	13/09/2013 - 09:35 AM
Julio 2013.- Continúan los trabajos de movimiento de tierra y colocación de alcantarillas en la variante Las Cabuyas; en el tramo Cruz Verde - Crucita se trabaja en la iluminación, construcción de bordillos, aceras y colocación de capas de sub base en la variante de Cerecito.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	22/08/2013 - 09:32 AM
Abril-Jun 2013: Continúan los trabajos en la construcción de la variante en el sector de las Cabuyas, en la vía Cruz Verde - Crucita, se trabaja en la colocación de la capa de rodadura, construcción de bordillos y aceras; en el tramo Manta Y de Crucita se colocó el micro pavimento de acuerdo a lo recomendado por el estudio realizado	Mendoza, José	02/07/2013 - 12:36 PM
Marzo 2013: Continúan los trabajos de completamiento de la alcantarilla en el Km. 19-sector Las Coronas-; en el subtramo Cruz Verde-Crucita se trabaja en la construcción de bordillos, aceras e iluminación.	Mendoza, José	02/07/2013 - 12:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Febrero 2013: En el tramo Cruz Verde - Crucita, se trabaja en la colocación de los postes para las luminarias en el parterre central, también se ejecutan trabajos en la variante de Cerecito. En el tramo Y de Rocafuerte - Bahía de Caraquez, sector Las Cabuyas se trabaja en el movimiento de tierra para construcción de la variante "Las Cabuyas".	Calderón Cañar, Edgar Miguel	11/03/2013 - 11:06 AM
Enero 2013: Se continua con los trabajos de colocación de alcantarillas, construcción de cabezales y colocación de capa de rodadura	Calderón Cañar, Edgar Miguel	11/03/2013 - 11:03 AM
Diciembre 2012: Continúan los trabajos de colocación de base granular y sub base en los tramos que se encuentran listos en el tramo Cruz Verde - Crucita y se colocó capa de base asfáltica en una longitud de 4 km.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	07/01/2013 - 12:15 PM
Noviembre 2012: Se continua las expropiaciones en el tramo Cruz Verde - Crucita; además se trabaja en la instalación de nuevas alcantarillas	Calderón Cañar, Edgar Miguel	07/01/2013 - 12:13 PM
Octubre 2012: Continúan los trabajos de las expropiaciones en el tramo Cruz Verde - Crucita; se avanza con el movimiento de tierra en los tramos y áreas liberadas	Calderón Cañar, Edgar Miguel	07/01/2013 - 12:06 PM
Septiembre 2012: Continúan los trabajos de señalización. Agosto 2012: Continúan los trabajos de señalización horizontal y vertical en los tramos "Y" de Rocafuerte-Bahía de Caraquez y Ayampe - San Mateo Julio 2012: Se terminaron los trabajos de las vías alternas en San Pedro y San Pablo, así como los trabajos de los últimos 600 metros del tramo San Vicente San Pablo, incluyendo ciclovía; en el tramo "Y" de Rocafuerte-Bahía de Caraquez, se trabaja en la construcción de alcantarilla sector de las Coronas; en el tramo Cruz Verde-Crucita, los equipos de Jurídico de la Regional 4 y 5, trabajan en los tramites expropiatorios que a la fecha registran un avance del 80%, la Cia Verdu continua con los trabajos de movimiento de tierra, transporte y tendido de mejoramiento, sub base y base, en los tramos liberados; se trabaja en movimiento de tierra en la variante de Cerecito. Junio 2012: Continúan los trabajos de las vías alternas en San Pablo y San Pedro, así como se completan los trabajos en la vía San Vicente San Pablo, en los últimos 600 metros. Mayo 2012: Continúan los trabajos de las vías alternas en San Pablo y San Pedro, además se trabaja en los parqueaderos y conclusión de los trabajos de los últimos 600 mts del tramo San Vicente San Pablo Abril 2012: Continúan los trabajos de vía alterna por San Pablo, con la finalidad de dar un mejor servicio a los turistas; los trabajos de la vía San Vicente San Pablo fueron entregados el 15 de marzo de 2012, de acuerdo a cronograma. Marzo 2012: Referente a los hitos no cumplidos indicados en las observaciones del Señor Gobernador, debo informar que los mismos están dentro de las fechas de ejecución y aún no se cumple la misma. Marzo 2012: Continúan los trabajos de colocación de barandales en el puente sobre el Rio Salado, así como la colocación de mezcla asfáltica en los accesos al puente. Febrero 2012: Continúan los trabajos de señalización horizontal como vertical, en el tramo San Vicente-San Pablo se trabaja en la terminación del puente sobre el Rio Salado. Enero 2012: En el presente período se continúa con el completamiento de la señalización de los tramos de la vía. Diciembre 2011: En el presente período se realizan trabajos en el tramo T de Rocafuerte - Bahía de Caraquez, con la colocación de la capa de rodadura de hormigón asfáltico. Queda pendiente el tramo del sector La cabuya, en las coronas, en la cual existe una falla que la consultora NILYC, está realizando los estudios para la construcción de la variante. Igualmente se trabaja en la colocación de tachas reflectivas, señalización horizontal y vertical en el tramo Santa Elena - Puerto Lopez. Octubre 2011: Se trabaja colocando base granular, imprimación y capa de rodadura en los espaldones del tramo: San Pablo - Libertador Bolívar; así como también en la señalización vertical y colocación de tachas reflectivas en el tramo: Y de ballenita - Manglaralto. Octubre 2011: En el tramo T Rocafuerte - Bahía de Caraquez, sector Las Coronas se trabaja en la colocación de la capa de rodadura, así como en la construcción de las alcantarillas. Octubre 2011: El valor de USD \$ 1'899.582.99 ingresados en el mes de junio del 2011 (presupuesto y Perfil económico), corresponden al acumulado ejecutado a septiembre del 2011 del contrato complementario de la vía San Vicente - San Pablo Septiembre 2011: Los trabajos avanzan normalmente según cronograma El Monto del contrato original + complementario + ordenes de cambio asciende a \$ 105.525.439,00 Se iniciaron los trabajos de vía de acceso al Puerto Artesanal y Pesquero de San Mateo. Se está trabajando en la actualización de los estudios del paso Ceibal - T de Rocafuerte, así como en la falla geológica, sector La Cabuya, de Bahía de Caraquez.	Mendoza, José	25/10/2012 - 05:11 PM

Problemas cerrados: 7, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Puerto López
2	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > La Libertad

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Adjudicación y suscripción de contrato de ejecución, realizado.	3-Adjudicación	25/08/2008		25/08/2008		Sí	0.0
2	EJECUCIÓN: Obra iniciada.	4-Inicio de Trabajo	28/09/2008		28/09/2008		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN: Movimiento de tierra, realizada.	5-Entregables Intermedios	05/04/2011		05/04/2011		Sí	15.0
4	EJECUCIÓN: Bacheo asfáltico, completado.	5-Entregables Intermedios	20/06/2011		20/06/2011		Sí	23.0
5	EJECUCIÓN: Reposición de calzada de hormigón hidráulico, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2011		30/06/2011		Sí	28.8
6	EJECUCIÓN: Colocación de capa de rodadura, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/12/2011		30/12/2011		Sí	8.0
7	EJECUCIÓN: Ejecución de rubros ambientales, finalizado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2012		30/08/2012		Sí	6.0
8	EJECUCIÓN: Señalización, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/08/2012		30/08/2012		Sí	5.5
9	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 1, 25% realizada.	5-Entregables Intermedios	02/10/2012		31/12/2012		Sí	0.1
10	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 1, 50% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/01/2013		30/04/2013		Sí	0.1
11	EJECUCIÓN: Drenaje, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	10/01/2013		10/01/2013		Sí	3.5
12	EJECUCIÓN: Acceso al Puerto Jaramijo, realizado.	5-Entregables Intermedios	13/02/2013		10/09/2014		Sí	4.0
13	CIERRE: Acta Recepción Provisional, recibida.	9-Entregables Formales	14/03/2013		13/03/2015		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 1, 75% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/05/2013		30/09/2013		Sí	0.1
15	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 1, 100% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/10/2013		31/12/2013		Sí	0.1
16	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 2, 25% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/01/2014		31/03/2014		Sí	0.1
17	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 2, 50% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/04/2014		30/06/2014		Sí	0.1
18	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 2, 75% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/07/2014		30/09/2014		Sí	0.1
19	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 2, 100% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/10/2014		31/12/2014		Sí	0.1
20	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 3, 25% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/01/2015		31/03/2015		Sí	0.1
21	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 3, 50% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/04/2015		30/06/2015		Sí	0.1
22	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 3, 75% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/07/2015		30/09/2015		Sí	0.1


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
23	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 3, 100% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/10/2015		31/12/2015		Sí	0.1
24	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 4, 25% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/01/2016		31/03/2016		Sí	0.1
25	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 4, 50% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/04/2016		30/06/2016		Sí	0.1
26	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 4, 75% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/04/2016		30/09/2016		Sí	0.1
27	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 4, 100% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/10/2016		28/01/2017		Sí	0.1
28	CIERRE: Liquidación económica ejecutada.	5-Entregables Intermedios	01/01/2017	31/07/2019			No	0.2
29	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 5, 25% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/01/2017		01/01/2017		Sí	0.1
30	COMPLETADA: Acta Recepción Definitiva, realizada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	01/02/2017	31/07/2019			No	0.2
31	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 5, 50% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/04/2017		01/04/2017		Sí	0.1
32	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 5, 75% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/07/2017		01/07/2017		Sí	0.1
33	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 5, 100% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/10/2017		01/10/2017		Sí	0.1
34	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 6, 25% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/01/2018		01/01/2018		Sí	0.1
35	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 6, 50% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/04/2018		01/04/2018		Sí	0.1
36	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 6, 75% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/07/2018		01/07/2018		Sí	0.1
37	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 6, 100% realizada.	5-Entregables Intermedios	01/10/2018		01/10/2018		Sí	0.1
38	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 7, 25% realizada.	5-Entregables Intermedios	15/12/2018		15/12/2018		Sí	0.1
39	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 7, 50% realizada.	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.1
40	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 7, 75% realizada.	5-Entregables Intermedios	15/05/2019		15/05/2019		Sí	0.1
41	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 7, 100% realizada.	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	31/07/2019			No	0.1

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Proyecto K013 MTOP Rehabilitación y mejoramiento (24 meses), mantenimiento (48 meses) carretera de la Vía del Pacífico corredor arterial E-15	Sabando Elizalde, David Israel	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	29/09/2017
2	Proyecto Proyecto K013 MTOP Rehabilitación y mejoramiento (24 meses), mantenimiento (48 meses) carretera de la Vía del Pacífico corredor arterial E-15	Sabando Elizalde, David Israel	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	29/09/2017
3	SUPERVISION EJECUTIVA Febrero 2017 K013 MTOP - Rehabilitación y mejoramiento (24 meses), mantenimiento (48 meses) carretera de la Vía del Pacífico	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	26/02/2017
4	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	18/06/2015

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Estatal en buen estado		100.00 %	0	1	01/01/2011	Junio


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	42,142,510.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	159,191,692.59 **
Costo Total:	166,461,051.23
Total Devengado:	153,127,541.79
% Costo Total Devengado:	91.99 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 91.99 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	139,701,364.43	8,085,534.39	0.00	147,786,898.82
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	146,286,185.63	6,064,150.79	0.00	152,350,336.42
Ppto. Codificado	156,685,646.78	6,064,150.79	0.00	162,749,797.57
Ppto. Comprometido	31,947,278.80	0.00	0.00	31,947,278.80
Planeado - Codificado (2019)		2,021,383.60		
Programado a Devengar	143,587,193.60	6,064,150.80	0.00	149,651,344.40
Ppto. Devengado	153,127,541.79	0.00	0.00	153,127,541.79
Pagado Real	27,044,618.60	0.00	0.00	27,044,618.60
Estimado a fin de año	* 153,127,541.79	0.00	0.00	153,127,541.79
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-9,540,348.19	6,064,150.80	0.00	-3,476,197.39
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 106.64 %	0.00 %	0.00 %	102.32 %
Ppto. Codificado 998	1,403,082.30	0.00	0.00	1,403,082.30
Ppto. Devengado 998	1,403,082.30	0.00	0.00	1,403,082.30

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

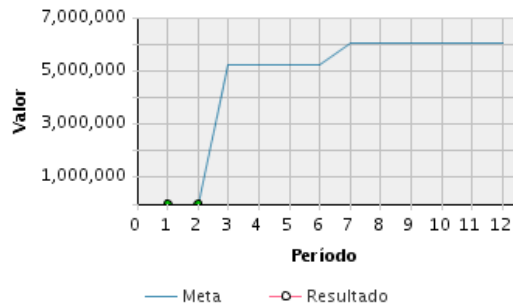

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	5,233,429.18		5,233,429.18				
Abr	0.00		5,233,429.18				
May	0.00		5,233,429.18				
Jun	0.00		5,233,429.18				
Jul	830,721.62		6,064,150.80				
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	6,064,150.80	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
14	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
15	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
16	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo
17	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.
18	Reducir el índice de incumplimiento de las normativas de transporte pesado, MEDIANTE la implementación del sistema de control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	108_Contrato Original.	A.01.pdf	08/12/2013
2	Acta de Entrega Recepción Provisional.	001Acta_de_Entrega_Recepción_Provisional_Subtramo_Santa_Elena-La_Entrada_de_67_KM.pdf	12/05/2015
3	Acta de Entrega Recepción Provisional.	002Acta_de_Entrega_Recepción_Provisional_Subtramo_Santa_Elena-San_Pablo.pdf	12/05/2015
4	Acta de Entrega Recepción Provisional.	003Acta_de_Entrega_Recepción_Provisional_Subtramo_Puerto_Cruz-Y_Crucita.pdf	12/05/2015
5	Acta de Entrega Recepción Provisional.	004Acta_de_Entrega_Recepción_Provisional_(FINAL)_Subtramo_Puerto_Cruz-Bahia_de_Caraquez.pdf	12/05/2015
6	Contrato Complementario No. 1	A.02.pdf	08/12/2013
7	Contrato Complementario No. 2	A.03.pdf	08/12/2013
8	Contrato Complementario No. 3	A.04.pdf	08/12/2013
9	Contrato Complementario No. 4	A.05.pdf	08/12/2013
10	Contrato Complementario No. 5	A.06.pdf	08/12/2013
11	Costo más porcentaje No. 1	C+%_1_Santa_Elena-Bahía_de_Caráquez.pdf	22/05/2015
12	Costo más porcentaje No. 2	C+%_2_Santa_Elena-Bahía_de_Caráquez.pdf	22/05/2015
13	Costo más porcentaje No. 3	C+%_3_Santa_Elena-Bahía_de_Caráquez.pdf	22/05/2015
14	Costo más porcentaje No. 4	C+%_4_Santa_Elena-Bahía_de_Caráquez.pdf	22/05/2015
15	Costo más porcentaje No. 5	C+%_5_Santa_Elena-Bahía_de_Caráquez.pdf	22/05/2015
16	Costo más porcentaje No. 6	C+%_6_Santa_Elena-Bahía_de_Caráquez.pdf	22/05/2015
17	Costo más porcentaje No. 7	C+%_7_Santa_Elena-Bahía_de_Caráquez.pdf	22/05/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	Detalle del proyecto santa Elena-Bahía de Caráquez (grafico). (Excel)	C.01.xls	09/12/2013
19	Fotos puentes: Salado, Cero Alto y corte de bordillo en parterre. (Imagen).	C.02	09/12/2013
20	Informe Ejecutivo SITOP, abril 2011.	B.08.pdf	09/12/2013
21	Informe Ejecutivo SITOP, abril 2012.	B.20.pdf	09/12/2013
22	Informe Ejecutivo SITOP, abril 2013.	B.32.pdf	09/12/2013
23	Informe Ejecutivo SITOP, abril 2014.	B.44.pdf	09/06/2014
24	Informe Ejecutivo SITOP, Abril 2015.	B.56.pdf	05/05/2015
25	Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2011.	B.12.pdf	09/12/2013
26	Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2012.	B.24.pdf	09/12/2013
27	Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2013.	B.36.pdf	09/12/2013
28	Informe Ejecutivo SITOP, Agosto 2014.	B.48.pdf	01/09/2014
29	Informe Ejecutivo SITOP, Agosto 2015.	B.60.pdf	01/09/2015
30	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2010.	B.04.pdf	09/12/2013
31	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2011.	B.16.pdf	09/12/2013
32	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2012.	B.28.pdf	09/12/2013
33	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2013.	B.40.pdf	07/01/2014
34	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2014.	B.52.pdf	08/01/2015
35	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2011.	B.05.pdf	09/12/2013
36	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2012.	B.17.pdf	09/12/2013
37	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2013.	B.29.pdf	09/12/2013
38	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2014.	B.41.pdf	14/03/2014
39	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2015.	B.53.pdf	03/02/2015
40	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2011.	B.06.pdf	09/12/2013
41	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2012.	B.18.pdf	09/12/2013
42	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2013.	B.30.pdf	09/12/2013
43	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2014.	B.42.pdf	14/03/2014
44	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2015.	B.54.pdf	04/03/2015
45	Informe Ejecutivo SITOP, julio 2011.	B.11.pdf	09/12/2013
46	Informe Ejecutivo SITOP, julio 2012.	B.23.pdf	09/12/2013
47	Informe Ejecutivo SITOP, julio 2013.	B.35.pdf	09/12/2013
48	Informe Ejecutivo SITOP, Julio 2014.	B.47.pdf	04/08/2014
49	Informe Ejecutivo SITOP, Julio 2015.	B.59.pdf	05/08/2015
50	Informe Ejecutivo SITOP, junio 2011.	B.10.pdf	09/12/2013
51	Informe Ejecutivo SITOP, junio 2012.	B.22.pdf	09/12/2013
52	Informe Ejecutivo SITOP, junio 2013.	B.34.pdf	09/12/2013
53	Informe Ejecutivo SITOP, Junio 2014.	B.46.pdf	04/07/2014
54	Informe Ejecutivo SITOP, Junio 2015.	B.58.pdf	01/07/2015
55	Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2011.	B.07.pdf	09/12/2013
56	Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2012.	B.19.pdf	09/12/2013
57	Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2013.	B.31.pdf	09/12/2013
58	Informe Ejecutivo SITOP, Marzo 2014.	B.43.pdf	21/04/2014
59	Informe Ejecutivo SITOP, Marzo 2015.	B.55.pdf	10/04/2015
60	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2011.	B.09.pdf	09/12/2013
61	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2012.	B.21.pdf	09/12/2013
62	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2013.	B.33.pdf	09/12/2013
63	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2014.	B.45.pdf	09/06/2014
64	Informe Ejecutivo SITOP, Mayo2015.	B.57.pdf	02/06/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
65	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2010.	B.03.pdf	09/12/2013
66	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2011.	B.15.pdf	09/12/2013
67	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2012.	B.27.pdf	09/12/2013
68	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2013.	B.39.pdf	09/12/2013
69	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2014.	B.51.pdf	03/12/2014
70	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2010.	B.02.pdf	09/12/2013
71	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2011.	B.14.pdf	09/12/2013
72	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2012.	B.26.pdf	09/12/2013
73	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2013.	B.38.pdf	09/12/2013
74	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2014.	B.50.pdf	06/11/2014
75	Informe Ejecutivo SITOP, OCTUBRE 2015.	108_IE_OCTUBRE2015.pdf	05/11/2015
76	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2010.	B.01.pdf	09/12/2013
77	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2011.	B.13.pdf	09/12/2013
78	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2012.	B.25.pdf	09/12/2013
79	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2013.	B.37.pdf	09/12/2013
80	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2014.	B.49.pdf	16/10/2014
81	Informe Ejecutivo SITOP, Septiembre 2015.	B.61pdf.pdf	12/10/2015
82	Informe Ejecutivo SITOP, SEPTIEMBRE 2015.	108_IE_SEPTIEMBRE2015.pdf	05/11/2015
83	Memorando NO. MTOP-CONS-GUA-2018-1006-ME Observaciones GPR	Observaciones_GPR.pdf	09/07/2018
84	MONTO REQUERIDO A INCLUIRSE EN EL PAI 2019	PAI_2019_E_15.pdf	04/09/2018
85	Orden de Cambio No. 1	A.07.pdf	08/12/2013
86	Orden de Cambio No. 10	O.C_10_Santa_Elena-_Bahía_de_Caráquez.pdf	22/05/2015
87	Orden de Cambio No. 11	O.C_11_Santa_Elena-_Bahía_de_Caráquez.pdf	22/05/2015
88	Orden de Cambio No. 12	O.C_12_Santa_Elena-_Bahía_de_Caráquez.pdf	22/05/2015
89	Orden de Cambio No. 13	O.C_13_Santa_Elena-_Bahía_de_Caráquez.pdf	22/05/2015
90	Orden de Cambio No. 2	A.08.pdf	08/12/2013
91	Orden de Cambio No. 3	A.09.pdf	08/12/2013
92	Orden de Cambio No. 4	A.10.pdf	08/12/2013
93	Orden de Cambio No. 5	A.11.pdf	08/12/2013
94	Orden de Cambio No. 7	O.C_7_Santa_Elena-_Bahía_de_Caráquez.pdf	22/05/2015
95	Orden de Cambio No. 8	O.C_8_Santa_Elena-_Bahía_de_Caráquez.pdf	22/05/2015
96	Orden de Cambio No. 9	O.C_9_Santa_Elena-_Bahía_de_Caráquez.pdf	22/05/2015
97	Trabajos limpieza ruta Spondylus y vía San Vicente # San Pablo. (Imagen).	C.03	09/12/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Delgado León, Andrés Glen	Director Distrital de guayas	Director Distrital del Guayas	adelgado@mtop.gob.ec	
Mendoza Cedeno, José Eugenio	Supervisor	Supervisor de Obras de la Dirección Provincial del Guayas	jemendoza@mtop.gob.ec	023974600
Paz Mora, Luis Alfredo	Líder de Proyecto	Administrador Vial - Construcciones Guayas	lpaz@mtop.gob.ec	
Valle Zuñiga, Hugo Arturo	Subsecretario Regional 5	Subsecretario Regional 5	hvalle@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
18066_1.jpg	06/11/2014
