

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 3**  
**Dirección Provincial Tungurahua**

**PROYECTO: K026 MTOP - TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS-PUYO, INCLUYE PASO LATERAL DE MERA Y SHELL**

Líder del Proyecto:	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín (wpulluquitin@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gamboa López, Enma Katherine	Programas Relacionados:	MTOP - MANTA MANAOS, Provincia - Tungurahua, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS-PUYO INCLUYE PASO LATERAL DE MERA Y SHELL
Titular:	González Chávez, Alexandra del Rocío	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.860.7392	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,115,326.41
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista nacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/11/2011 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	05/07/2019	Fecha de Fin Base:	01/11/2013
Modificado por:	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	Fecha del siguiente Hito:	30/09/2019

**DATOS GENERALES**

Descripción
<p>PRODUCTO/SERVICIO: Servicio de consultoría para la elaboración de "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA"</p> <p>LINEA BASE: El proyecto se halla ubicado en las Provincias de Tungurahua y Pastaza.</p> <p>INICIO: Salida de Pelileo (Fin paso lateral de Pelileo), calle Estación Curaray, entrada antiguo basurero y camal  FIN: Redondel de Entrada al Puyo (Inicio Paso Lateral del Puyo)</p> <p>CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA VÍA:  Longitud:78.0 Km.  Tipo de vía:Clase III  Tipo de terreno:Ondulado-Montañoso  Sección transversal2 carriles de 3.65 m.  Ancho de espaldones externos 2 de 1 m. c/u  Ancho de Espaldones internosno dispone  Separador Central (Pintado)no dispone  Tipo de cada de rodaduraPavimento flexible  Ciclo Vía no dispone</p> <p>OBJETIVO GENERAL:  Determinar la conveniencia técnica - económica de construir el carretero con las características funcionales más adecuadas de acuerdo a las Normas de Diseño Geométrico del MTOP, las mismas que serán determinadas en el estudio de la demanda (tráfico vehicular).</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  * Realizar en la etapa preliminar del estudio de ingeniería del proyecto, para lo cual se deberá realizar los estudios básicos de la economía de la región, un análisis de mayor profundidad en la zona de influencia y de aquellos aspectos que directa e indirectamente</p>

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

influyen en el proyecto, en donde el análisis de los datos y las proyecciones de las variables económicas deberán ser realizados a detalle.  
 \* En estos estudios, se analizarán y se proyectarán todos los parámetros económicos del tráfico de carga y pasajeros tales como la población, producción, parque de vehículos, producto bruto regional, turismo etc.  
 \* La finalidad de los estudios es determinar la factibilidad económica, en función de índices de evaluación tales como: Valor Neto Actualizado - (VAN), Razón Beneficio/Costo - (B/C), Tasa Interna de Retorno - (TIR)

**Beneficios Cualitativos**

El tiempo de desplazamiento se reducirá.  
 El comercio va a mejorar en la provincia.  
 Se contribuye con la interconexión provincial y nacional.

**Tipo de Beneficiario**

Beneficiarios directos: 399.926  
 Beneficiarios indirectos: 588.516


**Restricciones**

Tiempo: El estudio tiene una duración de 8 años y se estima concluir a finales de 2019  
 Costo: costo de realización de estudios \$ 1.542.604,00 (incluye estudio prepreliminar y definitivo). No incluye IVA.  
 Calidad: Los estudios a nivel de diseño definitivo que permita la ejecución adecuada de las obras  
 Recursos: Financiamiento de fuente fiscal hasta 2018 y en 2019 financiamiento externo y fiscal  
 Riesgos: Fuertes Lluvias impiden el avance de los Estudios para la carretera Pelileo-Baños-Puyo, Erupcion del Volcán Tungurahua: caída de ceniza y material pirolástico, descenso de lahares, resistencia social, retraso en pago de planillas.  
 Alcance: Las tres etapas de estudios, prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 94.87 %  
 Fecha de Inicio: 01/11/2011      Fecha de Fin: 31/12/2019

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

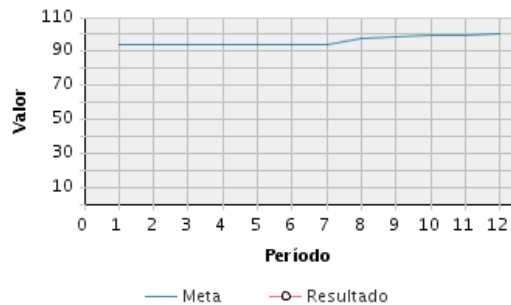

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JUNIO 2019:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El avance general del estudio es el 97%.</li> <li>2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.</li> <li>3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio.</li> <li>4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica - Puente de las Juntas</li> </ol>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>05/07/2019 - 01:36 PM</p>
<p><b>MAYO 2019:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El avance general del estudio es el 97%.</li> <li>2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.</li> <li>3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio.</li> <li>4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica - Puente de las Juntas</li> </ol>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>10/06/2019 - 04:33 PM</p>
<p><b>ABRIL 2019:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El avance general del estudio es el 97%.</li> <li>2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.</li> <li>3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio.</li> <li>4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica - Puente de las Juntas</li> </ol>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>05/06/2019 - 06:21 PM</p>
<p><b>MARZO 2019:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El avance general del estudio es el 97%.</li> <li>2. La Subsecretaría Zonal 03, no dispone hasta la presente fecha del Equipo de Especialistas de Area completos para la Supervisión, Revisión y Aprobación de los Estudios.</li> <li>3. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio.</li> <li>4. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural. e Hidrología - Hidraulica - Puente de las Juntas</li> </ol>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>02/05/2019 - 05:02 PM</p>
<p><b>FEBRERO 2019:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El avance general del estudio es el 97%</li> <li>2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio.</li> <li>3. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural.</li> </ol>	<p>González Chávez, Alexandra del Rocio</p>	<p>01/03/2019 - 12:13 PM</p>
<p><b>ENERO 2019:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El avance general del estudio es el 97%</li> <li>2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada Área para proceder con la liquidacion del estudio.</li> <li>3. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural.</li> </ol>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>05/02/2019 - 04:40 PM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2018:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El avance general del estudio es el 95%</li> <li>2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area para proceder con la liquidacion del estudio.</li> <li>3. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural.</li> </ol>	<p>González Chávez, Alexandra del Rocio</p>	<p>04/01/2019 - 04:49 PM</p>
<p><b>NOVIEMBRE 2018:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El avance general del estudio es el 95%</li> <li>2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area para proceder con la liquidacion del estudio.</li> <li>3. Existe retraso en la revision y aprobación en el área estructural.</li> </ol>	<p>González Chávez, Alexandra del Rocio</p>	<p>04/01/2019 - 04:46 PM</p>
<p><b>OCTUBRE 2018:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El avance general del estudio es el 95%</li> </ol>	<p>González Chávez, Alexandra del Rocio</p>	<p>05/11/2018 - 04:49 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area para proceder con la liquidacion del estudio.		
SEPTIEMBRE 2018: 1. El avance general del estudio es el 95% 2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area para proceder con la liquidacion del estudio.	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/10/2018 - 07:58 PM
AGOSTO 2018: 1. El avance general del estudio es el 94% 2. Se está trabajando en la revisión del producto final por parte de los especialistas de cada area para proceder con la liquidacion del estudio.	Galarza García, Diego Fernando	05/09/2018 - 06:56 PM
JULIO 2018: 1. El avance general del estudio es el 90% 2. Se está trabajando en l aplanilla #2 del contrato complementario #2.	Galarza García, Diego Fernando	02/08/2018 - 10:18 PM
JUNIO 2018:  1. El avance general del estudio es el 85% 2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #9 y se está trabajando en laplanilla #2 del contrato complementario #2.	Galarza García, Diego Fernando	05/07/2018 - 06:07 PM
MAYO 2018:  1. El avance general del estudio es el 82% 2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #9 y se está trabajando en laplanilla #1 del contrato complementario.	Galarza García, Diego Fernando	05/06/2018 - 11:45 AM
ABRIL 2018: 1. El avance general del estudio es el 75% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo. 2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #10	Galarza García, Diego Fernando	04/05/2018 - 05:44 PM
FEBRERO 2018: 1. El avance general del estudio es el 70% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo. 2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #9	Galarza García, Diego Fernando	05/04/2018 - 12:47 PM
FEBRERO 2018: El avance general del estudio es el 55% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo. Se entregó planillas y se iniciará el proceso de pago d elas mismas	Galarza García, Diego Fernando	05/03/2018 - 08:05 PM
ENERO 2018: El avance general del estudio es el 55% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo.	Galarza García, Diego Fernando	28/02/2018 - 06:23 PM
DICIEMBRE 2017: Se ha iniciado los trabajos correspondientes de topografía, se ha firmado un contrato complementario. El avance general del estudio es el 40% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo.	Galarza García, Diego Fernando	05/01/2018 - 05:54 PM
NOVIEMBRE 2017: Se ha iniciado los trabajos correspondientes de topografía, se ha firmado un contrato complementario.	Galarza García, Diego Fernando	05/12/2017 - 04:46 PM
OCTUBRE 2017: Al ser aprobado la ruta no. 04 del paso lateral de Pelileo, se ha iniciado los trabajos correspondientes de topografía, se está gestionando un contrato complementario por parte de la consultora en el mismo que se ajustaran rubros, cantidades y valores con el mismo valor contractual vigente, y se remitirá la correspondiente ampliación de plazo respectiva.	Galarza García, Diego Fernando	01/11/2017 - 02:36 PM
SEPTIEMBRE 2017: Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de ruta del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito, se continua con el rubro ambiental, se ha ingresado un avance del estudio de factibilidad	Valencia Vasconez, Jairo David	05/10/2017 - 07:59 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2017: Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de ruta del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito, se continua con el rubro ambiental, se ha ingresado un avance del estudio de factibilidad</p>	<p>Valencia Vasconez, Jairo David</p>	<p>12/09/2017 - 04:04 PM</p>
<p>JULIO 2017: Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de ruta del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito, se continua con el rubro ambiental, se ha ingresado un avance del estudio de factibilidad</p>	<p>Valencia Vasconez, Jairo David</p>	<p>04/08/2017 - 08:07 PM</p>
<p>JUNIO 2017: Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de ruta del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito</p>	<p>Gamboa López, Enma Katherine</p>	<p>05/07/2017 - 05:35 PM</p>
<p>MAYO 2017: Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto</p>	<p>Gamboa López, Enma Katherine</p>	<p>05/06/2017 - 06:51 PM</p>
<p>ABRIL 2017: Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto</p>	<p>Gamboa López, Enma Katherine</p>	<p>05/05/2017 - 10:29 AM</p>
<p>MARZO 2017: Se procedio con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedio con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto</p>	<p>Gamboa López, Enma Katherine</p>	<p>21/04/2017 - 01:44 PM</p>
<p>FEBRERO 2017: Se publicó el proceso de contatación de los estudios de "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que concluyó con la suscripción de la resolución el 20/02/2017 fecha en la cual se adjudicó el contrato al "Consortio Pelileo - Baños".</p>	<p>Gamboa López, Enma Katherine</p>	<p>21/04/2017 - 01:42 PM</p>
<p>ENERO 2017: Se iincia el proceso de contratación para los estudios de "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se planifica su publicación para el mes de Febrero del 2017</p>	<p>Gamboa López, Enma Katherine</p>	<p>21/04/2017 - 01:35 PM</p>
<p>FEBRERO 2015: Se ha procedido por parte de la Empresa Consultora a entregar el producto final de la Consultoría con sus respectivas copias según contrato, y a la firma del Acta Unica de Recepción del Estudio.</p>	<p>Gamboa López, Enma Katherine</p>	<p>21/04/2017 - 01:35 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO DEL 2015: SE HA NOMBRADO LA COMISION TECNICA PARA LA ELABORACION Y FIRMA DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	24/02/2015 - 02:53 PM
DICIEMBRE DEL 2014: SE HA INFORMADO MEDIANTE QUIPUX AL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DE LA REFERENCIA, EN LO RELACIONADO A LAS APROBACIONES DEL MISMO, SE DEBE AUTORIZAR LA REALIZACION DE LA ELABORACION DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO, A LA VEZ QUE REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISION TECNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	03/02/2015 - 04:14 PM
NOVIEMBRE DEL 2014: LA CONSULTORA HA INGRESADO EL PRODUCTO FINAL DE LA CONSULTORIA ( INFORMES Y PLANOS DEFINITIVOS ), PARA SU REVISION Y APROBACION DE SER EL CASO, A LA VEZ SE HA INGRESADO LA PLANILLA UNICA POR PRODUCTO TERMINADO, Y SE ESTA PREPARANDO LA LIQUIDACION ECONOMICA Y EL BORRADOR DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	09/12/2014 - 04:32 PM
OCTUBRE DEL 2014: LA CONSULTORA HA INGRESADO EL PRODUCTO FINAL DE LA CONSULTORIA ( INFORMES Y PLANOS DEFINITIVOS ), PARA SU REVISION Y APROBACION DE SER EL CASO, A LA VEZ SE HA INGRESADO LA PLANILLA UNICA POR PRODUCTO TERMINADO, Y SE ESTA PREPARANDO LA LIQUIDACION ECONOMICA Y EL BORRADOR DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	10/11/2014 - 05:17 PM
SEPTIEMBRE 2014: SE HA SOLICITADO LA INFORMACION DE SUSTENTO CORRESPONDIENTE A LOS EX-SUPERVISORES DEL PROYECTO, LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2. se ha procedido a prestar atención a Memorando Nro. MTOP-SUBREG3-2014-2725-ME de fecha , Ambato , 22 de septiembre de 2014, y se ha procedido a instalar la reunión a las 10h00 de este mes y día, con la presencia del Ing. Luis Salvador ( Matriz Quito - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ), la Consultora CIEPER representada por el Ing. Luis Vallejo (Director del Proyecto de la Pelileo - Baños - Puyo ) e Ing. Iván Mier, los Ex - Supervisores del proyecto de la referencia por parte del MTOP, Ing. Juan Carlos Hidalgo e Ing. Milton León, y mi persona. Se ha solicitado que los Ex - Supervisores , presenten y justifiquen absolutamente todos los documentos generados en el transcurso de dichas supervisiones, para lo que me permito informar que así se ha procedido, de tal manera que una vez analizada exhaustiva y detalladamente dicha información muy importante para continuar con el proceso de la Supervisión a mi encomendada, se constató entre los presentes que el Proyecto ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES A NIVEL PRE-PRELIMINAR DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS PUYO DE UNA LONGITUD APROXIMADA DE 125 KM UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y PASTAZA, puede continuar con trámite correspondiente, es así que la fecha tope para la presentación del producto final de consultoría (INFORMES Y PLANOS DEFINITIVOS), se estableció para el día Jueves 02 de Octubre del 2014. En el caso de que la empresa consultora no acate dicha disposición, se procederá al cobro de multas correspondientes según contrato de manera irrevocable. Además me cumple también informar que la elaboración del ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO, está en el proceso de elaboración y corrección para trámite correspondiente. Se ha procedido también a elaborar el proceso de la liquidación del proyecto, de lo que se ha definido ya los valores a ser planillados en PLANILLA UNICA que será presentada por el Consultor para proceder a la liquidación definitiva por parte del Departamento financiero del MTOP, a la vez debo informar que también del valor planillado será descontado el valor correspondiente de multas según Memorando Nro. MTOP-CONS_PAZ-2014-121-ME, Siendo aproximadamente las 14h00, se procede a clausurar la reunión, previo hacer incapié en todos los detalles a ser cumplidos y que han sido detallados anteriormente.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	07/10/2014 - 10:49 AM
AGOSTO: SE A NOMBRADO COMO NUEVO SUPERVISOR AL ING. WASHINGTON PULLUQUITIN, LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	26/09/2014 - 03:33 PM
JULIO 2014:LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN -	Pulluquitín Tutasig,	26/09/2014 - 03:32 PM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.	Washington Efraín	
JUNIO 2014: LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	26/09/2014 - 03:32 PM
MAYO 2014: LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	26/09/2014 - 03:31 PM
ABRIL 2014: LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	26/09/2014 - 02:56 PM
FEBRERO 2014: Los estudios en proceso de revisión, corrección y aprobación por parte de los Profesionales de la Subsecretaría Regional 3 , cada quien en su especialidad.	León Jácome, Milton	11/03/2014 - 09:41 AM
ENERO 2014: Los estudios en proceso de revisión, corrección y aprobación por parte de los Profesionales de la Subsecretaría Regional 3 , cada quien en su especialidad.	Guevara Rodriguez, Luis	07/02/2014 - 12:05 PM
NOVIEMBRE: Los estudios en proceso de revisión, observacion, corrección y aprobacion por parte de los Profesionales de la Subsecretaría cada quien en su especialidad.	León Jácome, Milton	29/11/2013 - 10:27 AM
OCTUBRE 2013: Periodo que debe informar el Supervisor de la Provincia de Pasta, ya que entrega documentos del Proyecto a Tungurahua, mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_PAS-2013-148-ME de fecha 12 de Noviembre de 2013.	León Jácome, Milton	29/11/2013 - 10:23 AM
SEPTIEMBRE DEL 2013:  -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	08/10/2013 - 12:10 PM
AGOSTO DEL 2013:  -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	06/09/2013 - 11:53 AM
JULIO DEL 2013:  -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	02/08/2013 - 11:48 AM
JUNIO DEL 2013:  -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	02/08/2013 - 11:48 AM
JUNIO DEL 2013:  -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	09/07/2013 - 09:50 AM
MAYO DEL 2013:  -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	06/06/2013 - 03:27 PM
ABRIL DEL 2013:  -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	10/05/2013 - 04:00 PM
MARZO 2013 - -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	08/04/2013 - 09:29 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2013:</p> <p>- Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaria R3.</p>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	08/04/2013 - 09:29 AM
	Barreno Lombeida, Jorge Washington	06/03/2013 - 04:09 PM
<p>Enero 2013:</p> <p>- Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaria R3.</p>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	14/02/2013 - 09:08 AM
<p>DICIEMBRE 2012:</p> <p>- Revisión de informes finales por parte de técnicos de la dirección Provincial de Pastaza y subsecretaría R3</p>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	14/02/2013 - 09:07 AM
<p>NOVIEMBRE DEL 2012:</p> <p>- Se requiere los informes técnicos de Geotécnica, Geología e Hidrología que se solicitó a la subsecretaría su revisión y aprobación, ya que en la Dirección Provincial de Pastaza no se cuenta con técnicos en el área. Se espera contar con los informes finales y proceder al pago de planillas e informes finales.</p>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	13/12/2012 - 10:46 AM
<p>OCTUBRE 2012:</p> <p>Con OFICIO-CIEPER-PELILEO-BAÑOS-015-2012, la Consultora Cieper presenta los informes de los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERÍA A NIVEL PRE-PRELIMINAR DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS-PUYO DE 125 KM, para su revisión y aprobación.</p> <p>SEPTIEMBRE 2012:</p> <p>Mediante Oficio Nro. MTOP-CONS_PAS-12-12-OF, se le comunica a la Consultora CIEPER; que por no presentar la información completa de los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERÍA A NIVEL PRE-PRELIMINAR DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS-PUYO DE 125 KM, dentro del tiempo contractual y por los retrasos en la entrega de dichos estudios se procederá a las multas respectivas de acuerdo a la Cláusula Décima Segunda del contrato.</p> <p>AGOSTO 2012:</p> <p>Entregan informe final de estudios para revisión. Consultora CIEPER entrega informes incompletos.</p> <p>Junio-Julio 2012:</p> <p>ESTUDIO DE CARTAS TOPOGRAFICAS Y EXPLORACIÓN TERRESTRE, ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DE SELECCIÓN DE RUTA, DISEÑO Y DIBUJO DEL ANTEPROYECTO, ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y IMPACTO AMBIENTAL.</p> <p>Mayo 2012:</p> <p>La contratista realiza el estudio AEREOFOTOGRAFOMETRICO, se espera la presentación del informe por escrito.</p> <p>Abril 2012:</p> <p>Con fecha 2 de abril se firma el contrato con la Consultora CIEPER CIA. Ltda. El contrato se encuentra en ejecución. Con fecha 12 de abril inician trabajos Consultora CIEPER</p> <p>Febrero 2012:</p> <p>Se espera que CIEPER CIA. Ltda. Presente toda la información necesaria para proceder a la firma del contrato.</p> <p>Enero 2012:</p> <p>El 18 de enero se realizó la apertura de ofertas por parte de la comisión técnica y el 28 de enero se adjudicó el proyecto a CIEPER CIA. Ltda.</p> <p>Diciembre 2011:</p> <p>Se publicó en el portal de compras públicas el 27 de diciembre de 2012.</p>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	13/12/2012 - 10:40 AM

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta aprobación de estudio estructural e hidráulico de obras de arte mayor puente de las juntas	05/07/2019	Washington Efraín Pulluquitín Tutasig	50	80	40	0/1

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 1



Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Pastaza > Mera
2	Zona 3 - Centro > Pastaza > Pastaza
3	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Baños de Agua Santa
4	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Patate

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Contratación realizada	1-Solicitud de Información	01/11/2011		01/11/2011		Sí	10.0
2	PLANEACION: Recursos económicos tramitado	1-Solicitud de Información	05/11/2011		05/11/2011		Sí	5.0
3	PLANEACION: Publicación en el portal realizado	1-Solicitud de Información	27/12/2011		27/12/2011		Sí	5.0
4	EJECUCION: Contrato para la elaboración de ESTUDIOS A NIVEL PREPRELIMINAR; adjudicado	3-Adjudicación	27/01/2012		27/01/2012		Sí	4.1
5	EJECUCIÓN: Contrato para la elaboración de ESTUDIOS A NIVEL PREPRELIMINAR firmado	4-Inicio de Trabajo	02/04/2012		02/04/2012		Sí	4.1
6	EJECUCION: Cartas topográficas y exploración terrestre realizado restitución aerofotogramétrica, ancho de 500m, escala 1:5000	5-Entregables Intermedios	05/06/2012		05/06/2012		Sí	4.1
7	EJECUCION: Estudio geológico-geotécnico de selección de ruta Restitución aerofotogramétrica, ancho de 500m, escala 1:5000 Diseño y dibujo del anteproyecto. Estudio de prefactibilidad. Impacto ambiental realizado	5-Entregables Intermedios	05/07/2012		05/07/2012		Sí	4.1
8	EJECUCION: Inspecciones en el campo realizado	5-Entregables Intermedios	09/08/2012		09/08/2012		Sí	4.1
9	EJECUCION: Observaciones efectuadas por los Profesionales de la Subsecretaría Regional 3 a las correcciones de la Consultora realizado.	5-Entregables Intermedios	20/08/2013		20/08/2013		Sí	4.1
10	EJECUCION: Inspecciones de trabajos en el campo realizados	5-Entregables Intermedios	15/09/2014		15/09/2014		Sí	4.1
11	EJECUCIÓN: Informe final de ingeniería entregado	9-Entregables Formales	06/10/2014		06/10/2014		Sí	4.1
12	EJECUCIÓN: Acta de entrega y recepción definitiva del contrato para la elaboración de ESTUDIOS A NIVEL PREPRELIMINAR; entregada	5-Entregables Intermedios	30/10/2014		30/10/2014		Sí	4.1


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	EJECUCIÓN: Liquidación económica del contrato para la elaboración de ESTUDIOS A NIVEL PREPRELIMINAR; pagada	9-Entregables Formales	30/12/2014		30/12/2014		Sí	4.1
14	EJECUCIÓN: Publicación en el portal de compras públicas para la elaboración ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS; realizado	1-Solicitud de Información	23/01/2017		23/01/2017		Sí	4.1
15	EJECUCION: Contrato para la elaboración de ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS; adjudicado	3-Adjudicación	20/02/2017		20/02/2017		Sí	4.1
16	EJECUCIÓN: Contrato para la elaboración de ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS; firmado	4-Inicio de Trabajo	07/03/2017		07/03/2017		Sí	4.1
17	EJECUCION: Estudio de Tráfico aprobado	5-Entregables Intermedios	19/06/2017		19/06/2017		Sí	4.1
18	EJECUCION: Estudio Preliminar Paso Lateral de Pelileo realizado	5-Entregables Intermedios	18/09/2017		18/09/2017		Sí	4.1
19	EJECUCION: Estudio de Ingeniería Definitivo aprobado	5-Entregables Intermedios	15/01/2018	30/09/2019			No	4.1
20	EJECUCION: Ficha y Plan de Manejo Ambiental desarrollado	5-Entregables Intermedios	19/01/2018	30/09/2019			No	4.4
21	CIERRE: Acta de entrega y recepción única del contrato para la elaboración ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS; firmada	9-Entregables Formales	20/02/2018	30/09/2019			No	2.0
22	CIERRE: Liquidación económica del contrato para la elaboración ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS; pagada	9-Entregables Formales	28/02/2018	30/09/2019			No	2.0
23	CIERRE: Formatos de cierre/baja según acuerdo 025, elaborado	9-Entregables Formales	15/08/2019	15/10/2019			No	2.0
24	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago, firmado	9-Entregables Formales	25/08/2019	30/11/2019			No	0.5
25	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, firmado	9-Entregables Formales	25/08/2019	30/11/2019			No	0.5
26	CIERRE: Información del proyecto en los sistemas GPR, SIPeIP y SITOP actualizada	9-Entregables Formales	27/08/2019	30/11/2019			No	0.5

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	CIERRE: Documentos habilitantes para cierre/baja conforme Instructivo de Cierre/Baja, entregados	9-Entregables Formales	30/08/2019	07/12/2019			No	0.5
28	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuetarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar del MEF; emitido	9-Entregables Formales	30/09/2019	15/12/2019			No	1.0
29	CIERRE: Aprobación del Ministro de Obras Públicas, firmado	9-Entregables Formales	10/10/2019	20/12/2019			No	0.25
30	CIERRE: Solicitud a Senplades para registro de cierre/baja, firmada	9-Entregables Formales	15/10/2019	21/12/2019			No	0.25
31	CIERRE: Informe de Cierre de Proyectos (Senplades) aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ESTUDIO		100.00 %	95	95	01/01/2017	Junio


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	127,402.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,115,326.41 **
Costo Total:	177,903.39
Total Devengado:	792,826.41
% Costo Total Devengado:	445.65 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 445.65 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,602,602.40	430,000.00	0.00	3,032,602.40
Ppto. Externo Planeado	623,899.20	0.00	0.00	623,899.20
Ppto. Aprobado Inicial	5,160,775.48	322,500.00	0.00	5,483,275.48
Ppto. Codificado	2,255,464.59	322,500.00	0.00	2,577,964.59
Ppto. Comprometido	1,437,124.16	0.00	0.00	1,437,124.16
Planeado - Codificado (2019)		107,500.00		
Programado a Devengar	1,733,779.98	322,500.00	0.00	2,056,279.98
Ppto. Devengado	792,826.41	0.00	0.00	792,826.41
Pagado Real	644,312.99	0.00	0.00	644,312.99
Estimado a fin de año	* 792,826.41	0.00	0.00	792,826.41
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	940,953.57	322,500.00	0.00	1,263,453.57
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 45.73 %	0.00 %	0.00 %	38.56 %
Ppto. Codificado 998	334,215.18	0.00	0.00	334,215.18
Ppto. Devengado 998	334,215.18	0.00	0.00	334,215.18

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

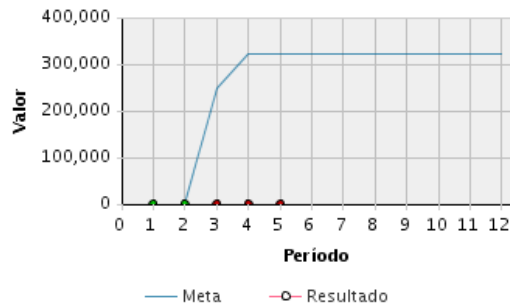

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Abr	72,500.00	0.00	322,500.00	0.00	0.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	322,500.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	0.00		322,500.00				
Jul	0.00		322,500.00				
Ago	0.00		322,500.00				
Sep	0.00		322,500.00				
Oct	0.00		322,500.00				
Nov	0.00		322,500.00				
Dic	0.00		322,500.00				
<b>Total</b>	<b>322,500.00</b>	<b>0.00</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2019.pdf	05/02/2019
2		JUSTIFICACION_FALTA_DE_PAGOS_PELILEO_-_BAÑOS.pdf	05/07/2019
3		MTOP-SUBREG3-2014-2741-ME.pdf	26/09/2014
4		PELILEO_BAÑOS_PUYO_MTOP.pdf	07/10/2014
5		INFORME_EJECUTIVO_-_PELILEO_BAÑOS_PUYO_MTOP-OCTUBRE_DEL_2014.pdf	07/10/2014
6		INFORME_EJECUTIVO_-_PELILEO_BAÑOS_PUYO PRESIDENCI_A-OCTUBRE_DEL_2014.pdf	07/10/2014
7		INFORME_EJECUTIVO_DE_NOVIEMBRE_DEL_2014.pdf	11/12/2014
8		INFORME_EJECUTIVO_DE_DICIEMBRE_DEL_2014.pdf	11/12/2014
9		REPORTE_EJECUTIVO_DE_NOVIEMBRE_DE_2014.pdf	12/12/2014
10		C8_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_DEL_2015.pdf	03/02/2015
11		ACTA_UNICA_DE_RECEPCION_DEL_ESTUDIO_PRE-PRELIMINAR_DE_LA_VIA_PELILEO-BAÑOS-PUYO.pdf	24/02/2015
12		C8_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_DEL_2015.pdf	24/02/2015
13		ENTREGA_DEL_PRODUCTO_TERMINADO_AL_ADMINISTRADOR_DEL_CONTRATO_INCORPORACION_DEL	
14	A-Contrato de Estudios Prepreliminares	Estudios_Prepreliminares.pdf	28/05/2012
15	A1 INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2012.pdf	14/02/2013
16	A2 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2012.pdf	14/02/2013
17	A3 INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2012.pdf	14/02/2013
18	A4 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2012.pdf	14/02/2013
19	A5 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2012	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2012.pdf	14/02/2013
20	A6 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2012	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2012.pdf	14/02/2013
21	A7 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2012	INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2012.pdf	14/02/2013

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
22	A8 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE DEL 2012	INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2012.pdf	14/02/2013
23	B1 INFORME EJECUTIVO ENERO DEL 2013	INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2013.pdf	14/02/2013
24	B2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO DEL 2013	INFORMES_EJECUTIVO_FEBRERO_2013.pdf	06/03/2013
25	B3 INFORME EJECUTIVO MARZO 2013	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2013.pdf	10/05/2013
26	B4 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2013.pdf	10/05/2013
27	B5 INFORME EJECUTIVO MAYO 2013	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2013.pdf	06/06/2013
28	B6 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2013.pdf	10/07/2013
29	B7 INFORME EJECUTIVO JULIO 2013	INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2013.pdf	06/08/2013
30	B8 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2013.pdf	06/09/2013
31	B9 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2013.pdf	08/10/2013
32	B9.1 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	Informe_Ejecutivo_Diciembre_2013_CIEPER.htm	06/01/2014
33	C1 INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	GestionReporteFN-1.txt	06/02/2014
34	C2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	Informe_Ejecutivo_Febrero_2014_CIEPER.pdf	31/03/2014
35	C3 INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	Informe_Ejecutivo_Marzo_2014_CIEPER.pdf	31/03/2014
36	C4 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2014.pdf	30/04/2014
37	C5 Informe Ejecutivo Octubre 2014	Informe_Ejecutivo_Octubre_2014.pdf	05/11/2014
38	C6 Informe ejecutivo Noviembre 2014	REPORTE_EJECUTIVO_DE_NOVIEMBRE_DE_2014.pdf	12/12/2014
39	C7 Informe ejecutivo Diciembre 2014	REPORTE_EJECUTIVO_DE_DICIEMBRE_DE_2014.pdf	12/12/2014
40	C8 AYUDA MEMORIA ABRIL 2017	AYUDA_MEMORIA_SITOP_ABRIL_2017.pdf	05/05/2017
41	C9 AYUDA MEMORIA MAYO 2017	AYUDA_MEMORIA_SITOP_MAYO_2017..pdf	05/06/2017
42	CONTRATO ESTUDIOS PELILEO BAÑOS	CONTRATO_RE-MTOP-SUBZ3-1-2017_Estudios_Ampliacion_4_carriles_Pelileo-Baños_P.L._Pelileo_34_km.pdf	21/04/2017
43	D1 AYUDA MEMORIA JUNIO 2017	AYUDA_MEMORIA_SITOP_JUNIO_2017.pdf	05/07/2017
44	D2 AYUDA MEMORIA JULIO 2017	AYUDA_MEMORIA_SITOP_JULIO_2017.pdf	04/08/2017
45	HITO 2. PLANEACIÓN: DICTAMEN DE PRIORIDAD SENPLADES	DICTAMEN_DE_PRIORIDAD_SENPLADES_-171-2011.pdf	17/06/2019
46	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-AMPLIACION_4_CARRILES_DE_LA_PELILEO_BAÑOS.pdf	05/01/2018
47	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2017	Estudio_para_Ampliacion_4_carriles_Pelileo_Baños.pdf	05/12/2017
48	PRESUPUESTO TÉRMINO DE REFERENCIA	pres.ref._pelileo-puyo.xls	18/06/2019
49	TÉRMINO DE REFERENCIA PARA DICTAMEN PRIORIDAD	2015-06-16_12-21-44_TER.REF.PELILEO-PUYO.doc	18/06/2019

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Gamboa López, Enma Katherine	PATROCINADOR EJECUTIVO	Subsecretaria Zonal 3, Encargada	egamboa@mtop.gob.ec	023974600
González Chávez, Alexandra del Rocío	DIRECTOR PROVINCIAL	Directora Distrital de Transporte y Obras Públicas de Tungurahua, Encargada	pamh120@hotmail.com	0223974798
Parra Cherras, María Gabriela	ANALISTA DE PRESUPUESTO	Analista de Presupuesto	gparra@mtop.gob.ec	
Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	LIDER DEL PROYECTO	Experto Hidraulico	wpulluquitin@mtop.gob.ec	

## FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
30403_1.jpg	06/02/2015
