

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte**  
**Dirección de Construcciones del Transporte**

**PROYECTO: K011 MTOP - Fiscalización de Obra Pública Contratada**

|                                |  |                                 |                         |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Salgado Brasero, Jorge Fernando (fsalgado@mtop.gob.ec) |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Medina Galarza, César Augusto                          | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Altamirano Arias, Fredy Oswaldo                        | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura  | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 175200000.21.4623                                      | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 1  | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Media  | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 629,677.66              |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                       |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |  | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 02/01/2012 - 31/12/2020 |
| Fecha de última actualización: | 05/08/2019   | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2020              |
| Modificado por:                | Altamirano Arias, Fredy Oswaldo                        | Fecha del siguiente Hito:       | 25/03/2019              |


**DATOS GENERALES**

|   |
|---|
| <b>Descripción</b>  |
| Fiscalización de Obra Contratada  |
| <b>Beneficios Cualitativos</b>  |
| Fiscalizar el avance de Obra Contratada con los Proyectos de Infraestructura.<br>Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los contratos |
| <b>Tipo de Beneficiario</b>   |
| Población beneficiaria de los proyectos de infraestructura  |
| <b>Restricciones</b>  |
| Presupuesto asignado<br>Tiempo de ejecución de proyectos<br>Especificaciones técnicas de obras de infraestructura                               |

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**




Transcurrido: 85.18 %  
 Fecha de Inicio: 02/01/2012      Fecha de Fin: 31/12/2020

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

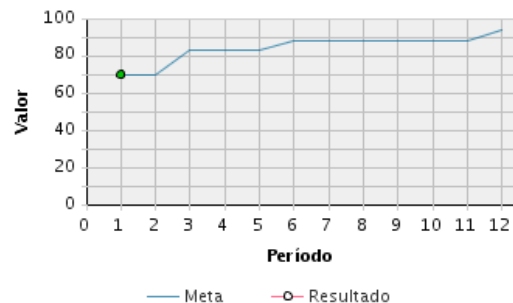

| Porcentaje de Avance |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Año                  | Ene                         | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2019                 | Avance programado acumulado |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Porcentaje de Avance  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año                   | Ene   | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
|                       | 70 %  | 70 % | 83 % | 83 % | 83 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 94 % |
| Avance real acumulado |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                       | 70 %  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Estado                |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>JULIO 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediante oficio No. MTOP-SIT-19-116-OF del 04 julio 2019 el Sr. Subsecretario de Infraestructura del Transporte solicita de manera urgente a la Consultora Española INECO fiscalizadora de la Obra realice las respectivas correcciones indicadas en los planos AS-Built; y una lista de documentación que se indica a fin de cumplir con los requisitos necesarios para proceder con el respectivo trámite de Convenio de Pago.</li> <li>- Mediante oficio No. 1049-INECO-PIFO- PAPALLACTA de fecha 10 de julio de 2019 el Señor Gerente de Proyectos INECO informa que se esta trabajando en los documentos necesarios para generar el convenio de pago, sin embargo, al no tener la Liquidación final, ni el Acta de Recpción del contratista de la obra, estos documentos no pueden ser finalizados.</li> <li>-Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ4-2019-1139-ME de 25 de julio 2019 el señor Subsecretario Zonal 4 (Encargado) solicita al Señor Subsecretario de Infraestructura del Transporte se gestione ante la autoridad respectiva la autorización para obtener el aval correspondiente para la ejecución de recursos dentro del proyecto Fiscalización de Obra Pública Contratada.</li> </ul> <p><b>ACCIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar la insistencia a las observaciones de los planos AS-BUILT y demás documentos necesarios para el trámite del convenio de pago</li> <li>- Hacer seguimiento respectivo a los actos administrativos que ser realizan respecto a los pronunciamientos jurídicos para realizar los pagos respectivos a la Fiscalización del Muelle Internacional de Manta.</li> </ul> | Altamirano Arias, Fredy Oswaldo | 05/08/2019 - 04:29 PM         |
| <p><b>Junio 2019:</b><br/>Causas:<br/>_Se encuentra a la espera del pronunciamiento jurídico para realizar los pagos correspondientes.<br/>- Se solicitó el aval para el Convenio de Pago de la Fiscalización de la Rehabilitación y Reparación del Muelle Internacional #2 en el Puerto de Manta.<br/>- Fiscalización INECO: No se recibe respuesta a las observaciones a los Planos Asbuilt presentados por la contratista para realizar la liquidación y recepción definitiva de la obra y así continuar con el trámite respectivo con respecto al Convenio de Pago de la Fiscalización.<br/>Acciones:<br/>- Realizar la insistencia en la observaciones de los Planos Asbuilt<br/>- Hacer seguimiento respectivo a los Actos Administrativos que se realizan respecto a los pronunciamientos jurídicos para realizar los pagos respectivos a los Muelles marginal e internacional</p>  | Altamirano Arias, Fredy Oswaldo | 05/07/2019 - 03:21 PM         |
| <p><b>Mayo 2019:</b><br/>Causas:<br/>- Se solicitó el aval para el Convenio de Pago de la Fiscalización de la Rehabilitación y Reparación del Muelle Internacional #2 en el Puerto de Manta.<br/>- Fiscalización INECO: No se recibe respuesta a las observaciones a los Planos Asbuilt presentados por la contratista para realizar la liquidación y recepción definitiva de la obra y así continuar con el trámite respectivo con respecto al Convenio de Pago de la Fiscalización.<br/>Acciones:<br/>- Realizar la insistencia en la observaciones de los Planos Asbuilt<br/>- Hacer seguimiento respectivo a los Actos Administrativos que se realizan.</p>  | Altamirano Arias, Fredy Oswaldo | 05/06/2019 - 09:36 AM         |
| <p><b>Abril 2019:</b><br/>Causas:<br/>- Se continúa esperando el pronunciamiento jurídico con respecto a los Muelles Marginal e Internacional en el Puerto de Manta.<br/>- Referente a los trabajos extracontractuales ejecutados por la Cía. SOLEICO, Contratista de la Fiscalización de la Rehabilitación y Reparación de los Muelles Marginales en el Puerto de Manta,</p>  | Altamirano Arias, Fredy Oswaldo | 02/05/2019 - 02:37 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                             | Fecha de última actualización    |
|--|--|----------------------------------|
| <p>al respecto debo manifestarle que el trámite se encuentra en la Coordinación General Jurídica desde el 25 de febrero de 2019, en vista de que se ha pedido pronunciamiento Jurídico para la suscripción del Convenio de Pago por un valor de USD. 45.238,96, correspondiente a los valores a favor de la Fiscalización determinados en el Acta de Negociación suscrita y, que consta en el Acta de Recepción Única y en el Acta de Recepción de los trabajos extracontractuales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se espera contestación con el criterio jurídico mediante el cual se consulta la viabilidad del pago de la fiscalización de los muelles, MTOP-SUBZ4-2019-0409-ME, del 26 de marzo de 2019</li> <li>- Fiscalización INECO: Se hizo observaciones a los Planos Asbuilt presentados por la contratista para realizar la liquidación y recepción definitiva de la obra y así continuar con el trámite respectivo con respecto al Convenio de Pago de la Fiscalización.</li> <li>- Mediante Oficio Nro. MTOP-SIT-18-68-OF del 13 de marzo de 2018 mediante el cual el Subsecretario de Infraestructura del Transporte da a conocer al Gerente de INECO el informe emitido por el Coordinador de Asesoría Jurídica respecto a los pagos pendientes.</li> <li>- En relación al Oficio Anexo Nro.MTOP-SIT-18-132-OF de 26 de junio de 2018 a través del cual la Subsecretaría de Infraestructura del Transporte solicita al Ing. José Pernas-INECO remitir información necesaria para dar continuidad al trámite de Convenio de Pago, cumpliendo con las disposiciones establecidas en el artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas así como en las directrices impartidas por la Coordinación General de Asesoría Jurídica mediante Memorando Nro.MTOP-CGJ-2017-1283-ME de 23 de noviembre de 2017 y alineándose con los requisitos remitidos en su Memorando Nro. MTOP-CGJ-2018-312-ME de 01 de marzo de 2018, para poder efectuar dicho trámite y de esta forma proceder, luego del análisis correspondiente, con el pago del valor adeudado a su Representada, por lo cual me permito recalcar como Administrador del contrato que deben contar con los siguientes documentos a ser proporcionados por su representada: 1.Acta de Entrega Recepción Definitiva del Contratista de Obra 2.La Planilla Única de los trabajos de Fiscalización 3.Informe Final de la Fiscalización 4.Planos "As-Built"La fiscalización realizó el envío de dichos planos a través de Oficio Nro.1033-INECO-PIFO-PAPALLACTA de 22 de enero de 2018 el cual se dió contestación a través los Oficios Nros. MTOP-DCT-18-11-OF de 09/02/2018, MTOP-DCT-18-21-OF de 13/03/2018,MTOP-DCT-18-24-OF de 20/03/2018, MTOP-DCT-18-26-OF de 29/03/2018, MTOP-DCT-18-27-OF de 29/03/2018, MTOP-DCT-18-28-OF de 29/03/2018 y MTOP-DCT-18-55-OF de 18/05/2018 en los cuales se realizaron varias observaciones y se encuentra a la espera de que estos hayan sido subsanados. 5.Acta de Recepción Definitiva del Contrato de FiscalizaciónEn razón de lo expuesto, se solicita con el carácter de urgente a la CONSULTORA ESPAÑOLA INECO-Fiscalizadora de la obra, realice las respectivas correcciones indicadas en los planos AS-BUILT y envíe toda documentación indicada anteriormente.</li> </ul> <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar la insistencia en la observaciones de los Planos Asbuilt</li> <li>- Hacer seguimiento respectivo a los Actos Administrativos que se realizan.</li> </ul> |  |                                  |
| <p>Marzo 2019:<br/>Causas: .Referente a los trabajos extracontractuales ejecutados por la Cía. SOLEICO, Contratista de la Fiscalización de la Rehabilitación y Reparación de los Muelles Marginales en el Puerto de Manta, al respecto debo manifestarle que el trámite se encuentra en la Coordinación General Jurídica desde el 25 de febrero de 2019, en vista de que se ha pedido pronunciamiento Jurídico para la suscripción del Convenio de Pago por un valor de USD. 45.238,96, correspondiente a los valores a favor de la Fiscalización determinados en el Acta de Negociación suscrita y, que consta en el Acta de Recepción Única y en el Acta de Recepción de los trabajos extracontractuales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Se espera contestación con el criterio jurídico mediante el cual se consulta la viabilidad del pago de la fiscalización de los muelles, MTOP-SUBZ4-2019-0409-ME, del 26 de marzo de 2019</li> <li>.Fiscalización INECO; Se hizo observaciones a los Planos Asbuilt presentados por la contratista para realizar la liquidación y recepción definitiva de la obra y así continuar con el trámite respectivo con respecto al Convenio de Pago de la Fiscalización.</li> <li>.Mediante Oficio Nro. MTOP-SIT-18-68-OF del 13 de marzo de 2018 mediante el cual el Subsecretario de Infraestructura del Transporte da a conocer al Gerente de INECO el informe emitido por el Coordinador de Asesoría Jurídica respecto a los pagos pendientes.</li> </ul> <p>Acciones: .Realizar la insistencia en la observaciones de los Planos Asbuilt<br/>.Hacer seguimiento respectivo a los Actos Administrativos que se realizan.</p>   | <p>Altamirano Arias,<br/>Fredy Oswaldo</p> | <p>04/04/2019 -<br/>02:12 PM</p> |
| <p>Febrero 2019<br/>Fiscalización (INECO) Pifo Papallacta.- Mediante Oficio N°. 1045-INEC-PIFO-PAPALLACTA de fecha 22 de febrero de 2018, el Gerente de Proyectos de INECO expresa estar de acuerdo con el Cronograma de Actividades para Mantenimiento de los 7 Proyectos. Sin embargo, se aclara que los 7 proyectos deberán estar expedidos para la Recepción Definitiva, cuando el MTOP lo designe. Fiscalización de proyecto de muelle internacional de Puerto de Manta y Fiscalización de proyecto de muelles marginales de Puerto de Manta, en espera el Aval para solicitar la Certificación Presupuestaria</p>  | <p>Altamirano Arias,<br/>Fredy Oswaldo</p> | <p>01/03/2019 -<br/>10:38 AM</p> |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Enero 2019<br>Se procede con la creación del proyecto para el pago de las Fiscalizaciones pendientes Pifo Papallacta, Muelles Marginales en el Puerto de Manta, Muelle Internacional N°2 en el Puerto de Manta | Altamirano Arias, Fredy Oswaldo | 31/01/2019 - 11:05 AM         |
| Enero 2017<br>Se procede con la creación del proyecto para el pago de las Fiscalizaciones pendientes Pifo Papallacta, Muelles Marginales en el Puerto de Manta, Muelle Internacional N°2 en el Puerto de Manta | Altamirano Arias, Fredy Oswaldo | 31/01/2019 - 09:25 AM         |

## PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema  | Fecha de última actualización | Responsable                       | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| Disponibilidad de los recursos para realizar los pagos correspondientes | 31/01/2019                    | Fredy Oswaldo<br>Altamirano Arias | 10       | 10      | 1            | 0/1                         |

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo   | Fecha de última actualización | Responsable                       | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>2- NACIONAL. * General.</b><br>No asignación de recursos CAUSARÍA el no pago y liquidación de fiscalización de diferentes obras | 05/07/2019                    | Fredy Oswaldo<br>Altamirano Arias | 40 %         | 60      | 24           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |  |
|----------------------|--|
| 1                    | Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona) |
| 2                    | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta                       |

## HITOS

|   | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado   | 1-Solicitud de Información | 01/01/2014         |                | 01/01/2014 |          | Sí            | 10.0          |
| 2 | EJECUCIÓN: Fiscalización de proyecto de muelle internacional de Puerto de Manta pagada | 1-Solicitud de Información | 02/12/2014         |                | 02/12/2014 |          | Sí            | 15.0          |
| 3 | EJECUCIÓN: Fiscalización de proyecto Pifo Papallacta pagada                            | 3-Adjudicación             | 31/10/2017         |                | 31/10/2017 |          | Sí            | 20.0          |
| 4 | EJECUCIÓN: Fiscalización de proyecto de muelles marginales de Puerto de Manta pagada   | 5-Entregables Intermedios  | 30/11/2017         |                | 30/11/2017 |          | Sí            | 15.0          |
| 5 | PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados                                 | 1-Solicitud de Información | 01/01/2019         |                | 01/01/2019 |          | Sí            | 5.0           |
| 6 | PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido   | 1-Solicitud de Información | 01/01/2019         |                | 01/01/2019 |          | Sí            | 5.0           |

**HITOS**

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 7  | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada  | 5-Entregables Intermedios | 01/03/2019         | 25/03/2019     |            | ▼        | No            | 3.0           |
| 8  | EJECUCIÓN: Fiscalización de proyecto de muelle internacional de Puerto de Manta pagada  | 9-Entregables Formales    | 31/03/2019         | 31/03/2019     |            | ▼        | No            | 5.0           |
| 9  | EJECUCIÓN: Fiscalización de proyecto de muelles marginales de Puerto de Manta pagada  | 9-Entregables Formales    | 31/03/2019         | 31/03/2019     |            | ▼        | No            | 5.0           |
| 10 | EJECUCIÓN: Fiscalización de proyecto Pifo Papallacta pagada   | 9-Entregables Formales    | 30/06/2019         | 30/06/2019     |            | ▼        | No            | 5.0           |
| 11 | CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            | ●        | No            | 6.0           |
| 12 | CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito | 5-Entregables Intermedios | 28/01/2020         | 28/01/2020     |            | ●        | No            | 1.0           |
| 13 | CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita  | 5-Entregables Intermedios | 28/01/2020         | 28/01/2020     |            | ●        | No            | 1.0           |
| 14 | CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado   | 5-Entregables Intermedios | 28/01/2020         | 28/01/2020     |            | ●        | No            | 2.0           |
| 15 | CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF  | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2020         | 28/02/2020     |            | ●        | No            | 1.5           |
| 16 | CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado   | 9-Entregables Formales    | 20/03/2020         | 20/03/2020     |            | ●        | No            | 0.5           |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador                   | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|-----------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de planillas pagadas | ⊘      | 0.00 %            | 6    | 0                     | 01/01/2019      | Ene-Jun                    |


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00          |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 629,677.66 ** |
| Costo Total:                  | 5,200,000.00  |
| Total Devengado:              | 0.00          |
| % Costo Total Devengado:      | 0.00 %        |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 0.00 %

**Perfil Económico 2019**

|   | Años Previos | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total        |
|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado  | 0.00         | 844,570.21        | 0.00         | 844,570.21   |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 0.00         | 629,677.66        | 0.00         | 629,677.66   |
| Ppto. Codificado  | 0.00         | 629,677.66        | 0.00         | 629,677.66   |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Planeado - Codificado (2019)                            |              | 214,892.55        |              |              |
| Programado a Devengar                                   | 629,677.66   | 629,677.66        | 0.00         | 1,259,355.32 |
| Ppto. Devengado   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Pagado Real   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Estimado a fin de año                                   | * 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 629,677.66   | 629,677.66        | 0.00         | 1,259,355.32 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 0.00 %     | 0.00 %            | 0.00 %       | 0.00 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019**

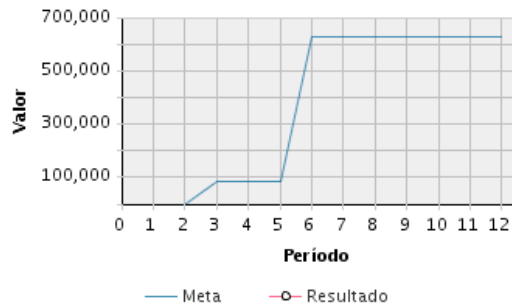

**Presupuesto Mensual 2019**

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00                       |                     | 0.00                         |                       |                  |        |              |

| Presupuesto Mensual 2019 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 0.00                       |                     | 0.00                         |                       |                  |        |              |
| Mar                      | 86,546.17                  |                     | 86,546.17                    |                       |                  |        |              |
| Abr                      | 0.00                       |                     | 86,546.17                    |                       |                  |        |              |
| May                      | 0.00                       |                     | 86,546.17                    |                       |                  |        |              |
| Jun                      | 543,131.49                 |                     | 629,677.66                   |                       |                  |        |              |
| Jul                      | 0.00                       |                     | 629,677.66                   |                       |                  |        |              |
| Ago                      | 0.00                       |                     | 629,677.66                   |                       |                  |        |              |
| Sep                      | 0.00                       |                     | 629,677.66                   |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 0.00                       |                     | 629,677.66                   |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 0.00                       |                     | 629,677.66                   |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 0.00                       |                     | 629,677.66                   |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>629,677.66</b>          |                     |                              |                       |                  |        |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |   |
|----------------------|---|
| 10                   | Incrementar el seguimiento, control y evaluación de los proyectos de construcción y fiscalización de la infraestructura del transporte MEDIANTE la supervisión de la aplicación de normas técnicas, administrativas y lineamientos para la gestión de construcciones en los procesos desconcentrados. |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo   | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 1  | 2- NACIONAL. * General. No asignación de recursos CAUSARÍA el no pago y liquidación de fiscalización de diferentes obras | Fiscalización_Obra_Contratada.rar   | 05/07/2019    |
| 2  | A.10_Respaldo_Fiscalización_INECO-Pifo_Papallacta  | Disponibilidad_de_Recursos.pdf  | 16/05/2019    |
| 3  | A.2_Respaldo_EJECUCIÓN_Fiscalización_de_proyecto_de Muelle Internacional de Puerto de Manta pagada                       | A.2_Respaldo_EJECUCIÓN_Fiscalización_de_proyecto_de Muelle Internacional de Puerto de Manta pagada.docx | 01/06/2019    |
| 4  | A.3_Respaldo_EJECUCIÓN_Fiscalización_de_proyecto de Pifo_Papallacta pagada   | A.3_Respaldo_EJECUCIÓN_Fiscalización_de_proyecto de Pifo_Papallacta pagada.docx                         | 31/05/2019    |
| 5  | A.4_Respaldo_EJECUCIÓN_Fiscalización_de_proyecto de Muelle Marginal de Puerto de Manta pagada                            | A.4_Respaldo_EJECUCIÓN_Fiscalización_de_proyecto de Muelle Marginal de Puerto de Manta pagada.docx      | 01/06/2019    |
| 6  | A.5_Respaldo_PLANEACIÓN_Proyecto_con_recursos económicos desconcentrados   | A.5_Respaldo_PLANEACIÓN_Proyecto_con_recursos económicos desconcentrados.pdf                            | 01/05/2019    |
| 7  | A.6_Respaldo_Planeación_Proyecto_en_PAI_incluido   | A.6_Respaldo_PLANEACIÓN_Proyecto_en_PAI_incluido.pdf  | 31/01/2019    |
| 8  | A.7_Cronograma_Actividades_Pifo_Papallacta_INECO   | A.7_Cronograma_Actividades_Pifo_Papallacta_INECO.rar  | 01/03/2019    |
| 9  | A.8_EJECUCIÓN: Fiscalización de proyecto de muelle internacional de Puerto de Manta pagada                               | Fiscalizacion_Muelle_Internacional_Manta.rar  | 05/06/2019    |
| 10 | A.8_Respaldo_Muelle_Marginal_Manta   | Fiscalización_Muelle_Marginal_Puerto_Manta_26_Marzo_2019.pdf  | 01/06/2019    |
| 11 | Julio 2019   | Fiscalización_Julio_2019.rar  | 05/08/2019    |

### EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                          | Rol                                    | Puesto   | Correo Electrónico      | Teléfono(s) |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|
| Altamirano Arias, Fredy Oswaldo | Líder de proyecto                      | Director de Construcciones del Transporte            | faltamirano@mtop.gob.ec |             |
| Guaman Vargas, César Manuel     | Supervisor zonal                       | Supervisión de la Región 4                           | cguaman@mtop.gob.ec     | 023974600   |
| Salgado Brasero, Jorge Fernando | Coordinador Técnico de infraestructura | Director de Construcciones del Transporte, Encargado | fsalgado@mtop.gob.ec    | 023974600   |
