

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Loja

PROYECTO: K039 MTOP - Centro Binacional de atención en Frontera -CEBAF- Macará

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Líder del Proyecto: | Vega Silva, Andrea Karla (avega@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Jaramillo Cantos, Luis Alberto | Programas Relacionados: | CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA - CEBAF- MACARA |
| Titular: | Rojas Cazar, Walter Emilio | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 50590000.1504.6387 | TIR: | 12.00 % |
| Objetivos Operativos: | 4 | VAN: | 0.01 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 14,043,658.83 |
| Localidad de Gestión: | Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 23/10/2014 - 31/12/2019 |
| Fecha de última actualización: | 26/09/2019 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2019 |
| Modificado por: | Rojas Cazar, Walter Emilio | Fecha del siguiente Hito: | 25/05/2019 |

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: La zona del proyecto está localizada al sur occidente de la ciudad de Loja, cuyo emplazamiento se ubica a una distancia de 140 Km desde la ciudad de Loja, en el sector del puente internacional de Macará y tiene las siguientes coordenadas:

LATITUD LONGITUD
 S 9514399.14 E 614940.28

Este proyecto tiene una población del área de influencia directa proyectada al año 2010 de 19.908 habitantes que se considera como población objetivo que se beneficiarán con la construcción del Centro Binacional de atención en fronteras y mejoramiento de las vías de acceso e internas.

Como beneficiarios indirectos se considera que este proyecto sirve a población flotante (turistas, comerciantes eventuales, romeriantes de ambos países, etc.) con 439.098 hab.

PRODUCTO: Construcción y Operación del Centro Binacional de atención de Frontera -CEBAF- Macará - La Tina

LINEA BASE: El proyecto se encuentra a 200 metros del puente Internacional de Macará. El 3 de febrero de 2011 se firmó el contrato entre La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (CNTTTSV), denominada en la actualidad como Agencia Nacional de Tránsito (ANT), pero se terminó por mutuo acuerdo el contrato de obra y de fiscalización. Mediante Decreto Ejecutivo 957 de fecha 08/dic del 2011, se encarga al MTOP la Planificación, administración y ejecución de la obra de infraestructura de los CEBAF. El proyecto es un compromiso Binacional por lo que el MTOP procedió a contratar el CEBAF Macará- La Tina el 27 de febrero de 2015.

Áreas de los Componentes del Centro Binacional CEBAF - MACARA.

1. Área de planta baja bloque principal; A=1582,75 m2.
2. Área de primera planta alta bloque principal; A= 325,83 m2
3. Área de segunda planta alta bloque principal; A=304,34 m2
4. Área de tercera planta alta bloque principal; A=48,79 m2
5. Área control de manifiestos; A= 358,52 m2
6. Área de pesos y medidas; A = 19,70 m2
7. Área de bodegas; A=467,88 m2
8. Área de generador y transformador; A=51,91 m2
9. Área de garita de control; A=13,28 m2
10. Área de restaurant para personal ; A= 213,94 m2
11. Área útil CEBAF; A= 3386,94 m2
12. Área bruta CEBAF; A = 4414,31 m2

De acuerdo a la topología se producirá y organizará todos los espacios necesarios en donde se efectúen eficazmente todas las actividades implícitas de un control integral eficiente, adoptando además los espacios mínimos recomendados por la Comunidad.

Entre ellos:

- . Vías de acceso
- . Cercos perimétricos
- . Edificación administrativa

DATOS GENERALES

Descripción

- . Galpón o depósito con su respectivo patio de maniobras
- . Andenes y equipos para el movimiento de la carga
- . Áreas para inspección física de mercancías
- . Patio(s) de estacionamiento para los vehículos de transporte Internacional de pasajeros y mercancías
- . Laboratorio para el control fito y zoonosanitario
- . Área para realizar labores de tratamiento e incineración
- . Área de control de viajeros, requisitos migratorios, aduaneros
- . Filtros y revisión de equipaje. (Narcóticos, Fito y zoonosanitario, Mercancías ilegales y peligrosas)
- . Área de control de vehículos particulares
- . Servicio de recaudación de aranceles y tributos (Banco)
- . Servicios Sanitarios para usuarios
- . Cafetería / Restaurante únicamente para el personal del CEBAF
- . Servicios para la gestión admin

OBJETIVO GENERAL: Construcción del Centro Binacional de atención de Frontera -CEBAF- Macará - La Tina

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Los objetivos específicos del CEBAF, son los siguientes:

- Obra Vial
- Construcción de Vías internas de circulación

CONTRATISTA: Consorcio A.S.
 FISCALIZADOR: Ing. Cecibel Vargas
 SUPERVISOR: Ing. Andrea Vega
 ADMINISTRADOR: Director Distrital de Loja. Ing. Walter Rojas
 FINANCIAMIENTO: Presupuesto General del Estado
 MONTO DE INVERSIÓN: USD. 12'343.178,58

Beneficios Cualitativos

Contribuir al Plan Maestro Vial Nacional en concordancia con la iniciativa para la integración de la Infraestructura, para que exista una integración regional, Provincial y Cantonal, con lo cual se mejorarán las condiciones socio - económicas y ambientales del sector.

Tipo de Beneficiario

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC y el VII censo de población y VI de vivienda, la población del área de influencia directa proyectada al año 2010 es de 19.908 habitantes que se considera como población objetivo que se beneficiarán con la construcción del Centro Binacional de atención en fronteras y mejoramiento de las vías de acceso e internas. Como beneficiarios indirectos se considera que este proyecto sirve a población flotante (turistas, comerciantes eventuales, romeriantes de ambos países, etc.), 439.098 habitantes


Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 6 meses. COSTO: el Valor monetario del presupuesto límite previsto para su realización es de \$ 12'343.178.58. ALCANCE: Construcción del Centro Binacional de atención de Frontera -CEBAF- Macará - La Tina, su Obra Vial y la Construcción de Vías internas de circulación . RECURSOS: equipo técnico ofertado, fiscalización, administración, trabajadores de la construcción, empleados administrativos, materiales, equipos y maquinaria. CALIDAD: la calidad de los materiales y de los equipos informáticos deberán cumplir las especificaciones del proyecto, caso contrario puede afectar el buen funcionamiento del centro. RIESGOS: el incumplimiento de las especificaciones técnicas pueden conllevar a no cumplir con el objetivo de este proyecto.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 95.20 %
 Fecha de Inicio: 23/10/2014 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

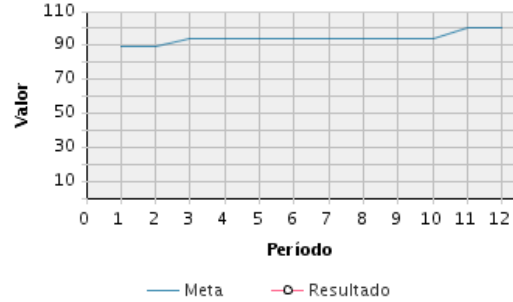

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2019 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 89 % | 89 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 100 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| AGOSTO 2019: OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DE 2019, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUÉS QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO Y OTRAS PENDIENTES DE ACREDITACIÓN. | Vega Silva, Andrea Karla | 05/09/2019 - 11:42 AM |
| JUICIO 2019: OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DE 2019, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUÉS QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, UNAS PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO Y OTRAS EN TRAMITE DE APROBACIÓN. | Vega Silva, Andrea Karla | 02/08/2019 - 10:04 AM |
| JUNIO 2019: OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DE 2019, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUÉS QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, UNAS PLANILLAS PENDIENTES DE ACREDITACIÓN POR EL MEF Y OTRAS PENDIENTES DE PAGO. | Vega Silva, Andrea Karla | 04/07/2019 - 03:08 PM |
| MAYO 2019: OBRA SUSPENDIDA, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUES QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, UNAS PLANILLAS PENDIENTES DE ACREDITACIÓN Y OTRAS PENDIENTES DE PAGO, DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS. | Rojas Cazar, Walter Emilio | 04/06/2019 - 12:29 PM |
| ABRIL 2019: OBRA SUSPENDIDA, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUES QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO DEL 2018 DEBIDO A LA NO ASIGNACIÓN DE RECURSOS A ESTA DIRECCIÓN EN LAS FUENTES 998 E IVA, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUEDE REALIZAR EL PAGO DE ESTAS PLANILLAS.. | Vega Silva, Andrea Karla | 02/05/2019 - 04:58 PM |
| MARZO 2019: OBRA EN EJECUCIÓN NORMAL, CON PLAZO VIGENTE HASTA 25/05/2019. PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO DEL 2018 DEBIDO A LA NO ASIGNACIÓN DE RECURSOS A ESTA DIRECCIÓN EN LAS FUENTES 998 E IVA, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUEDE REALIZAR EL PAGO DE ESTAS PLANILLAS.. | Vega Silva, Andrea Karla | 03/04/2019 - 09:19 AM |
| FEBERO 2019: CON LA EFECTIVIZACIÓN DEL ACTICIPO OBRA REINICIA SUS ACTIVIDADES DESDE EL 07/02/2019 DEL 2019, CON PLAZO VIGENTE HASTA 25/05/2019. PLANIOLLAS PENDIENTES DE PAGO DEBIDO A LA NO ASIGNACIÓN DE RECURSOS. | Vega Silva, Andrea Karla | 01/03/2019 - 09:37 AM |
| Ener 2019: Una vez que se ha regularizado la suscripción de los actos administrativos se reactivado la obra desde el 15 de noviembre de 2018, por lo tanto el proyecto se encuentra con una ejecución a partir de esta fecha. El pago de planillas aprobadas por la unidad administrativa no se pudo llevar a término debido a que MEF deshabilitó pagos con fuente998, el 28 de diciembre del 2018 se realizó el pago del anticipo por parte del MTOP, pero su acreditación no se realiza hasta la fecha, todo esto incumple lo establecido contractualmente, sumado a esto están pendientes de acreditación de 4 planillas, lo que dificulta la ejecución de la obra, por lo que | Vega Silva, Andrea Karla | 04/02/2019 - 02:34 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| dando cumplimiento a lo establecido contractualmente se suspende la obra hasta el pago de lo adeudado y anticipo del CC04. | | |
| Diciembre 2018: Una vez que se ha regularizado la suscripción de los actos administrativos se reactivado la obra desde el 15 de noviembre de 2018, por lo tanto el proyecto se encuentra con una ejecución a partir de esta fecha. El pago de planillas aprobadas por la unidad administrativa no se pudo llevar a término debido a que MEF deshabilitó pagos con fuente998, el 28 de diciembre del 2018 se realizo el pago del anticipo por parte del MTOP, pero su acreditación no se realiza, todo esto incumple lo establecido contractualmente, sumado a esto están pendientes de acreditación las planillas 4 planillas, lo que dificulta la ejecución por parte de la contratista llevandolos a la presentar la solicitud de paralización, misma que se encuentra en estudio de ser o no aprobada por parte de fiscalización. | Vega Silva, Andrea Karla | 02/01/2019 - 03:15 PM |
| Noviembre 2018: Una vez que se ha regularizado la suscripción de los actos administrativos se reactivado la obra desde el 26 de noviembre de 2018, por lo tanto el proyecto se encuentra en ejecución a partir de esta fecha. | Rojas Cazar, Walter Emilio | 05/12/2018 - 04:25 PM |
| <p>Octubre 2018: En vista de que la asignación presupuestaria no se realizó oportunamente para el CC03, se vio la necesidad de dividirlo a este en dos, en el CC03 y CC04, es así que el CC03 actualmente en trámite ahora no contempla incremento de monto per si ampliación de plazo de 60 días. Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y sin incremento de monto.</p> <p>Ya se realizó la asignación de 1.86MM USD para suscripción el CC03 para trámite del CC04.</p> <p>Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto</p> | Vega Silva, Andrea Karla | 05/11/2018 - 08:17 AM |
| <p>septiembre 2018: Debido a que matriz Quito hasta la fecha no hace la asignación d erecursos para la suscripcion del CC03, se vio la necesidad de dividirlo a este en dos, en el CC03 y CC04, es así que el CC03 actualmente en trámite ahora no contempla incremento de monto per si ampliación d eplazo de 60 días. Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y sin incremento de monto.</p> <p>El CC04 quedará pendiente hasta que haya la asignación de 2.32MM USD para su certificación y posterior trámite.</p> <p>Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto</p> | Vega Silva, Andrea Karla | 02/10/2018 - 04:46 PM |
| AGOSTO 2018: Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto | Vega Silva, Andrea Karla | 03/09/2018 - 12:27 PM |
| JULIO 2018: Obra en ejecución, obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto | Vega Silva, Andrea Karla | 02/08/2018 - 12:43 PM |
| JUNIO 2018: Obra en ejecución, obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto | Vega Silva, Andrea Karla | 05/07/2018 - 05:41 PM |
| MAYO 2018: Obra en ejecución, obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto | Vega Silva, Andrea Karla | 04/06/2018 - 12:37 PM |
| ABRIL 2018: Obra en ejecución, los trabajos se realizan con normalidad, con acta 451 firmada se da ampliación de plazo hasta el 04 de junio del 2018. En trámite contrato complementario Nro.03, variación de cantidades y rubros nuevos | Vega Silva, Andrea Karla | 02/05/2018 - 10:11 AM |
| ENERO-MARZO 2018: Obra en ejecución, los trabajos se realizan con normalidad, con acta 451 firmada se da ampliación de plazo hasta el 04 de junio del 2018. | Bustamante Rivera, Esner Fidel | 03/04/2018 - 09:27 AM |
| dic 2017: se levanta la paralización dle proyecto el 26 de diciembre del 2017. con ampliación d eplazo de 45 días, pendiente liquidación de plazo, se regularizan los trabajos en Cebaf-Macará | Vega Silva, Andrea Karla | 02/01/2018 - 11:41 AM |
| Nov 2017: Actualmente el proyecto se encuentra paralizado. | Vega Silva, Andrea Karla | 04/12/2017 - 05:03 PM |
| Oct 2017: Actualmente el proyecto se encuentra reactivado desde el 11/10/2017, se realizan trabajos electricos y eléctricos, además de trabajos de imprimación de vías. | Vega Silva, Andrea Karla | 01/11/2017 - 08:22 AM |
| SEP 2017: Actualmente el proyecto se encuentra paralizado por falta de pago de planillas, por parte del MTOP_Dirección Distrital de Loja se realizaron los pagos de planillas pendientes el día 17/08/2017, se requiere que MEF acredite dichos fondos urgentemente a la contratista, para levantar la paralización de la obra. | Ludeña Suescun, Rusbel Enrique | 03/10/2017 - 09:08 AM |
| AGOSTO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra paralizado por falta de pago de planillas.. | Vega Silva, Andrea Karla | 05/09/2017 - 12:44 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|----------------------------------|
| <p>1) Se realizaron los pagos de planillas pendientes el día 17/08/2017 por parte de la Dirección Distrital de Loja, se requiere que MEF acredite dichos fondos urgentemente.</p> <p>2) Con fecha 29 de marzo de 2017 se da la suspensión indefinida del proyecto, hasta que la comisión 451 resuelva sobre la solicitud de ampliación del plazo contractual y las condiciones climáticas mejoren. Con fecha 28 de junio de 2017, se reúne la Comisión 451 en Quito y celebran el acta, en la cual levantan la suspensión y aprueban la variación de cantidades, creación de rubros nuevos sin incremento de monto e incremento de plazo en sesenta días, tomando como nueva fecha para la terminación de los trabajos el 27 de agosto de 2017.</p> <p>Con memorando MTOP-DDL-2017-1351-ME, del 04 de agosto 2017 se da paso a la paralización legal de la obra hasta que de se de el pago de haberes pendientes al contratista.</p> <p>Con oficio Nro. 391-CONSORCIO A.S-CEBAF, del 04 de agosto, se solicita ampliación de 45 días a partir de la cancelación y acreditación de los haberes pendientes de pago. Por lo que urgentemente se requiere la colaboración del MEF.</p> <p>El Mtop es únicamente la ejecutora de la infraestructura, los responsable de los mecanismos de administración son INMOBILIAR y CANCELILLERIA de acuerdo a la reunión realizada entre Cancillería, MTOP, INMOBILIAR Y SENPLADES que así lo establecieron.</p> | | |
| <p>JULIO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución desde el 27 de junio del 2017, con un avance físico de la obra del 84%, con plazo vigente según acta 451 hasta el 28 de agosto del 2017. Planillas pendientes de pago por falta de asignación de recursos 998, por lo que la contratista solicitó la paralización legal de los trabajos por incumplimiento en el pago por parte de la contratista.</p> | <p>Vega Silva, Andrea Karla</p> | <p>02/08/2017 - 03:44 PM</p> |
| <p>JUNIO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario Nro.2.</p> | <p>Vega Silva, Andrea Karla</p> | <p>05/07/2017 - 08:35 AM</p> |
| <p>MAYO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario Nro.2.</p> | <p>Vega Silva, Andrea Karla</p> | <p>05/06/2017 - 10:38 AM</p> |
| <p>abril 2017</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-381-ME, de fecha 28 de octubre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual, referente a la Propuesta de Hormigon 350 Kg/cm2 en parqueos del CEBAF, Macara - La Tina. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.</p> | <p>Ocampo Veintimilla, Danny Andrei</p> | <p>05/05/2017 - 10:09 AM</p> |
| <p>Noviembre 2016: Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-381-ME, de fecha 28 de octubre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual, referente a la Propuesta de Hormigon 350 Kg/cm2 en parqueos del CEBAF, Macara - La Tina. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.</p> | <p>CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA</p> | <p>13/12/2016 - 09:37 AM</p> |
| <p>Octubre 2016: Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-381-ME, de fecha 28 de octubre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual, referente a la Propuesta de Hormigon 350 Kg/cm2 en parqueos del CEBAF, Macara - La Tina. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.</p> | <p>CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA</p> | <p>08/11/2016 - 07:51 PM</p> |
| <p>Septiembre 2016: Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-348-ME, de fecha 28 de septiembre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información solicitada desde matriz para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.</p> | <p>CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA</p> | <p>10/10/2016 - 09:05 AM</p> |
| <p>Agosto 2016: En trámite Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.</p> | <p>CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA</p> | <p>09/09/2016 - 12:55 PM</p> |
| <p>Julio 2016: En trámite Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto</p> | <p>CECIBEL DEL CARMEN,</p> | <p>09/08/2016 - 05:30 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| contractual. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario. | VARGAS PINEDA | |
| Junio 2016: Se reinician los trabajos de obra con una ampliación de 60 días, a partir del 8 de junio del 2016. Se legaliza Orden de Cambio No. 1 para ampliación de plazo. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 05/07/2016 - 03:24 PM |
| Mayo 2016: Mediante reunión de la comisión 451, aprobó una ampliación de 60 días para terminar los trabajos objeto del contrato, cuyo plazo corre a partir de que se efectivicen el pago correspondiente de cuatro planillas por parte del Ministerio de Finanzas. Actualmente el proyecto continúa suspendido. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 02/06/2016 - 04:45 PM |
| Abril 2016: Mediante reunión de la comisión 451, aprobó una ampliación de 60 días para terminar los trabajos objeto del contrato, cuyo plazo corre a partir de que se efectivicen el pago correspondiente de cuatro planillas por parte del Ministerio de Finanzas. Actualmente el proyecto continúa suspendido. Marzo 2016: Mediante reunión de la comisión 451, aprobó una ampliación de 60 días para terminar los trabajos objeto del contrato, cuyo plazo corre a partir de que se efectivicen el pago correspondiente de cuatro planillas por parte del Ministerio de Finanzas. Actualmente el proyecto continúa suspendido. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 04/05/2016 - 03:00 PM |
| Febrero 2016: Hasta la presente fecha el Ministerio de Finanzas no efectiviza el pago de las cuatro planillas realizadas por MTOP a la Contratista, por lo que no se reinician los trabajos con los 60 días de ampliación conforme a la aprobación de la Comisión 451. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 07/03/2016 - 04:14 PM |
| Enero 2016: Comisión 451, aprueba ampliación de plazo por 60 días. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 11/02/2016 - 12:53 PM |
| Diciembre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 30/12/2015 - 06:32 PM |
| Noviembre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 30/12/2015 - 06:32 PM |
| Octubre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 30/12/2015 - 06:32 PM |
| Septiembre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 30/12/2015 - 06:32 PM |
| Agosto 2015: Se culminan los trabajos de colocación de estructura metálica en el edificio central, mediante Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, notifica al contratista sobre la suspensión de los trabajos hasta que se proceda con los pagos correspondientes. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 30/12/2015 - 06:31 PM |
| Julio 2015: Se continúan realizando trabajos de colocación de estructura metálica, la contratista solicita suspensión de trabajos por cuanto hasta la presente fecha no se le han cancelado ninguna planilla. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 30/12/2015 - 06:31 PM |
| Junio 2015: Se continúan realizando trabajos de colocación de estructura metálica, construcción de tanque séptico. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 30/12/2015 - 06:31 PM |
| Mayo 2015: Con los contrapisos fundidos se inician trabajos de colocación de estructuras metálicas. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 30/12/2015 - 06:30 PM |
| Abril 2015: Se realizan trabajos preliminares como movimiento de tierras, construcción de bodegas para campamento y adquisición de materiales para colocación de estructuras metálicas. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 30/12/2015 - 06:29 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Marzo 2015: Se entrega el anticipo a la contratista con fecha 25 de marzo del 2015 con lo cual inician los trabajos. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 30/12/2015 - 06:29 PM |
| Febrero 2015: Se suscribe acta de adjudicación y contrato para construcción del CEBAF con la contratista CONSORCIO A.S | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 30/12/2015 - 06:28 PM |
| Enero 2015: El proceso precontractual se encuentra en proceso de adjudicación. | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 30/12/2015 - 06:28 PM |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema | Fecha de última actualización | Responsable | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|-------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| Falta de asignación presupuestaria suficiente. | 16/09/2019 | Andrea Karla Vega Silva | 10 | 10 | 1 | 0/1 |

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 2- NACIONAL. Económico. La falta de recursos económicos CAUSARÍA retraso en la entrega de la obra | 18/09/2019 | Andrea Karla Vega Silva | 20 % | 80 | 16 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|------------------------------|
| 1 | Zona 7 - Sur > Loja > Macara |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | Planificación: Certificación Presupuestaria ejecutada | 1-Solicitud de Información | 23/10/2014 | | 23/10/2014 | | Sí | 1.0 |
| 2 | Planificación: Documentos, contractuales, terminados | 1-Solicitud de Información | 23/10/2014 | | 23/10/2014 | | Sí | 1.5 |
| 3 | Planificación: Publicación en Portal de Compras Publicas, concluidas | 2-Publicación de Pliegos | 24/10/2014 | | 24/10/2014 | | Sí | 1.5 |
| 4 | Planificación: Acta de Adjudicación, ejecutada | 3-Adjudicación | 05/02/2015 | | 05/02/2015 | | Sí | 2.0 |
| 5 | Ejecución: Suscripción de Contrato, ejecutado | 3-Adjudicación | 27/02/2015 | | 27/01/2015 | | Sí | 2.0 |
| 6 | Ejecución: Entrega de anticipo, ejecutado | 4-Inicio de Trabajo | 25/03/2015 | | 25/03/2015 | | Sí | 4.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 7 | Ejecución: Inicio de Trabajos, ejecutado | 4-Inicio de Trabajo | 25/03/2015 | | 25/03/2015 | | Sí | 2.0 |
| 8 | Ejecución: Trabajos Preliminares, movimiento de tierras | 5-Entregables Intermedios | 22/07/2015 | | 22/07/2015 | | Sí | 3.0 |
| 9 | Ejecución: Obras de calzada fase 1 | 5-Entregables Intermedios | 19/11/2015 | | 19/11/2015 | | Sí | 5.0 |
| 10 | Ejecución: Obras Estructurales | 5-Entregables Intermedios | 27/11/2015 | | 27/11/2015 | | Sí | 15.0 |
| 11 | Ejecución: Instalaciones Hidro-sanitarias | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015 | | 30/11/2015 | | Sí | 6.0 |
| 12 | Ejecución: Construcción de garitas | 5-Entregables Intermedios | 09/09/2016 | | 09/09/2016 | | Sí | 6.0 |
| 13 | Ejecución: Instalaciones electricas | 5-Entregables Intermedios | 10/10/2016 | | 10/10/2016 | | Sí | 6.0 |
| 14 | Ejecución: Instalaciones Electrónicas y Mecánicas | 5-Entregables Intermedios | 10/10/2016 | | 10/10/2016 | | Sí | 7.0 |
| 15 | Ejecución: Obras arquitectonicas | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016 | | 30/11/2016 | | Sí | 10.0 |
| 16 | Ejecución: Acabados arquitectónicos | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018 | | 31/07/2018 | | Sí | 10.0 |
| 17 | Ejecución: Obras de calzada fase 2 | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2018 | 25/05/2019 | | | No | 2.0 |
| 18 | Ejecución: Señalización | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2018 | 25/05/2019 | | | No | 2.0 |
| 19 | Cierre: Liquidación Económica del Contrato ejecutada | 5-Entregables Intermedios | 01/01/2019 | 25/05/2019 | | | No | 3.0 |
| 20 | Cierre: Recepción provisional del proyecto y acta de recepción provisional | 9-Entregables Formales | 31/03/2019 | 30/06/2019 | | | No | 5.0 |
| 21 | Completado: Recepción definitiva del proyecto y acta de recepción, ejecutado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/11/2019 | 31/12/2019 | | | No | 6.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de área con capa de rodadura colocado en Vías internas | | 100.00 % | 0 | 0 | 01/01/2019 | Agosto |
| 2 | Porcentaje de Equipamiento tecnológico colocado | | 100.00 % | 1 | 1 | 01/01/2019 | Agosto |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 3,702,953.57 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 14,043,658.83 ** |
| Costo Total: | 12,343,178.58 |
| Total Devengado: | 13,308,816.25 |
| % Costo Total Devengado: | 107.82 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 107.82 %

Perfil Económico 2019

| | Años Previos | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 21,596,865.47 | 6,211,624.63 | 0.00 | 27,808,490.10 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 2,251,208.49 | 901,743.70 | 0.00 | 3,152,952.19 |
| Ppto. Codificado | 16,520,652.64 | 901,743.70 | 0.00 | 17,422,396.34 |
| Ppto. Comprometido | 14,644,512.06 | 0.00 | 0.00 | 14,644,512.06 |
| Planeado - Codificado (2019) | | 5,309,880.93 | | |
| Programado a Devengar | 10,128,536.42 | 1,803,487.40 | 0.00 | 11,932,023.82 |
| Ppto. Devengado | 12,240,171.43 | 1,068,644.82 | 0.00 | 13,308,816.25 |
| Pagado Real | 7,200,569.02 | 0.00 | 0.00 | 7,200,569.02 |
| Estimado a fin de año | * 12,240,171.43 | 0.00 | 0.00 | 12,240,171.43 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | -2,111,635.01 | 1,803,487.40 | 0.00 | -308,147.61 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 120.85 % | 59.25 % | 0.00 % | 111.54 % |
| Ppto. Codificado 998 | 1,859,349.36 | 0.00 | 0.00 | 1,859,349.36 |
| Ppto. Devengado 998 | 1,710,118.39 | 0.00 | 0.00 | 1,710,118.39 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

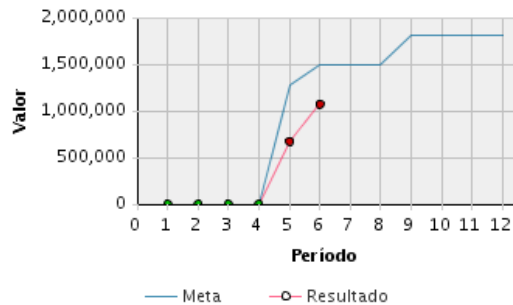

Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |

| Presupuesto Mensual 2019 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| May | 1,274,465.74 | 672,323.11 | 1,274,465.74 | 672,323.11 | 52.75 % | | 37.28 % |
| Jun | 219,569.13 | 396,321.71 | 1,494,034.87 | 1,068,644.82 | 71.53 % | | 59.25 % |
| Jul | 0.00 | | 1,494,034.87 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 1,494,034.87 | | | | |
| Sep | 309,452.53 | | 1,803,487.40 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 1,803,487.40 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 1,803,487.40 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 1,803,487.40 | | | | |
| Total | 1,803,487.40 | 1,068,644.82 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 15 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 16 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |
| 17 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 18 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 1 | | AVANCE_SEMANAL_OBRA_CEBAF_05_09_2017.xlsx | 03/10/2017 |
| 2 | A.1 Dictamen de prioridad SENPLADES | Dictamen_de_prioridad__SENPLADES_del_CEBAF.pdf | 31/05/2015 |
| 3 | A.2 Informe ejecutivo febrero-2015 | Infor-ejecutivo_febrero-2015.pdf | 10/12/2015 |
| 4 | A.3 Informe ejecutivo marzo-2015 | Infor-ejecutivo_marzo-2015.pdf | 10/12/2015 |
| 5 | A.4 Informe ejecutivo abril-2015 | Infor-ejecutivo_abril-2015.pdf | 10/12/2015 |
| 6 | A.5 Informe ejecutivo mayo-2015 | Infor-ejecutivo_mayo-2015.pdf | 10/12/2015 |
| 7 | A.6 Informe ejecutivo junio-2015 | Infor-ejecutivo_junio-2015.pdf | 10/12/2015 |
| 8 | A.7 Informe ejecutivo julio-2015 | Infor-ejecutivo_julio-2015.pdf | 10/12/2015 |
| 9 | A.8 Informe ejecutivo agosto-2015 | Infor-ejecutivo_agosto-2015.pdf | 10/12/2015 |
| 10 | A.9 Informe ejecutivo septiembre-2015 | Infor-ejecutivo_septiembre-2015.pdf | 10/12/2015 |
| 11 | B1 Informe ejecutivo octubre-2015 | Infor-ejecutivo_octubre-2015.pdf | 10/12/2015 |
| 12 | B2 Informe ejecutivo noviembre-2015 | Infor-ejecutivo_noviembre-2015.pdf | 10/12/2015 |
| 13 | B3 Convocatoria | CONVOCATORIA_CEBAF.pdf | 31/05/2015 |
| 14 | B4 Contrato | 01-contrato.pdf | 31/05/2015 |
| 15 | B5 Memorando nombrando Fiscalizador y Supervisor | MTOP-DPL-2015-365-ME.pdf | 31/05/2015 |
| 16 | B6 Memorando nombrando al nuevo fiscalizador | MTOP-DPL-2015-562-ME.pdf | 31/05/2015 |
| 17 | B7 ACTA 451 CEBAF - MACARA - LA TINA | ACTA_451_CEBAF_-_MACARA_-_LA_TINA.pdf | 05/04/2016 |
| 18 | B8 Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-348-ME | Memorando_Nro._MTOP-EITZ7-2016-348-ME.pdf | 10/10/2016 |
| 19 | C1 Informe Ejecutivo Enero 2016 | B.1_Informe_Ejecutivo_Enero_2016.pdf | 07/03/2016 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 20 | C2 Informe Ejecutivo Febrero 2016 | B.2_Informe_Ejecutivo_Febrero_2016.pdf | 07/03/2016 |
| 21 | C3 Informe Ejecutivo Marzo 2016 | B.3_Informe_Ejecutivo_Marzo_2016.pdf | 05/04/2016 |
| 22 | C4 Informe Ejecutivo Abril 2016 | Informe_Ejecutivo_Abril_2016.pdf | 04/05/2016 |
| 23 | C5 Informe Ejecutivo Mayo 2016 | Informe_Ejecutivo_Mayo_2016.pdf | 03/06/2016 |
| 24 | C6 Informe Ejecutivo Julio 2016 | Informe_Ejecutivo_Julio_2016.pdf | 11/08/2016 |
| 25 | C7 Informe Ejecutivo Agosto 2016 | Informe_Ejecutivo_Agosto_2016.pdf | 09/09/2016 |
| 26 | C8 Informe Ejecutivo Septiembre 2016 | B.9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2016.pdf | 10/10/2016 |
| 27 | D1 acta 451 cebaf | acta_451_cebaf.pdf | 02/08/2017 |
| 28 | D2 INFORME CEBAF AL 31 DE MARZO DEL 2018 | INFORME_CEBAF_AL_31_DE_MARZO_DEL_2018.pdf | 04/04/2018 |
| 29 | D3 INFORME SEMANAL CEBAF 04 2018 | INFORME_SEMANAL_CEBAF_04_2018.pdf | 02/05/2018 |
| 30 | D4 Informe Ejecutivo CEBAF Macará - La Tina Mayo 2018 | Informe_Ejecutivo_CEBAF_Macará_- _La_Tina_Mayo_2018.pdf | 04/06/2018 |
| 31 | D5 INFORME SEMANAL CEBAF 30 06 2018 | INFORME_SEMANAL_CEBAF_30_06_2018.pdf | 05/07/2018 |
| 32 | D6 informe de trabajos de julio del 2017 | AVANCE_SEMANAL_OBRA_CEBAF_08_2017.pdf | 02/08/2017 |
| 33 | D7 informe agosto | informe-CEBAF_04_08_2017.pdf | 05/09/2017 |
| 34 | D8 informe_OBRA_CEBAF_08_2017 | informe_OBRA_CEBAF_08_2017.pdf | 02/08/2018 |
| 35 | E1 DICTAMENDEPRIORIDADCEBAF | DICTAMENDEPRIORIDADCEBAF.PDF | 14/03/2019 |
| 36 | E2 ESTUDIOS_CEBAF_MACARA_V3 | ESTUDIOS_CEBAF_MACARA_V3.PDF | 14/03/2019 |
| 37 | E3 FORMATO SENPLADES CEBAF-MACARA 22-07-2014 | FORMATO_SENPLADES_CEBAF- MACARA_22-07-2014.docx | 20/03/2019 |
| 38 | E4 INFORMEDEEJECUCION | INFORMEDEEJECUCION.PDF | 14/03/2019 |
| 39 | E5 MTOP-CONS_LOJ-2019-141-ME SOLICITANDO INCREMENTO DE TECHO PRESUPUESTARIO PARA CULMINACIÓN DE OBRA | MTOP-CONS_LOJ-2019-141-ME.pdf | 01/03/2019 |
| 40 | E6 AYUDA MEMORIA CEBAF 02 01 2019 | AYUDA_MEMORIA_CEBAF_02_01_2019.pdf | 02/01/2019 |
| 41 | E7 AYUDA MEMORIA (FEBRERO 2019) | AYUDA_MEMORIA_(FEBRERO_26_2019)_CEBAF(1).pdf | 01/03/2019 |
| 42 | E8 AYUDA MEMORIA (MARZO 31 2019) CEBAF | AYUDA_MEMORIA_(MARZO_31_2019)_CEBAF.xlsx | 03/04/2019 |
| 43 | E9 CAMBIO DE FASE_ MTOP-SUBZ7-2019-0351-ME | MTOP-SUBZ7-2019-0351-ME.pdf | 15/04/2019 |
| 44 | F1 Suspension 15 03 2019 cebaf macará Administracion | suspension_15_03_2019_cebaf_macará_Administracion.pdf | 04/07/2019 |
| 45 | F2 AYUDA MEMORIA (07 2019) CEBAF | AYUDA_MEMORIA_(07_2019)_CEBAF.pdf | 02/08/2019 |
| 46 | F3 AYUDA MEMORIA (08 2019) CEBAF | AYUDA_MEMORIA_(08_2019)_CEBAF.pdf | 05/09/2019 |
| 47 | F4 CEDULA ENERO | CEDULA_ENERO.pdf | 17/09/2019 |
| 48 | F5 CEDULA FEBRERO | CEDULA_FEBRERO.pdf | 17/09/2019 |
| 49 | F6 CEDULA MARZO | CEDULA_MARZO.pdf | 17/09/2019 |
| 50 | F7 CEDULA ABRIL | CEDULA_ABRIL.pdf | 17/09/2019 |
| 51 | F8 CEDULA MAYO | CEDULA_MAYO.pdf | 17/09/2019 |
| 52 | F9 CEDULA JUNIO | CEDULA_JUNIO.pdf | 17/09/2019 |
| 53 | G1 CEDULA JULIO | CEDULA_JULIO.pdf | 17/09/2019 |

LIGAS EXTERNAS

| Dirección (URL) | |
|-----------------|---|
| 1 | SITOP |
| | http://sitop.mtop.gob.ec:8080/mtop/ |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|
| CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | Fiscalizador del Proyecto | Experto de Infraestructura Distrital | ebustamante@mtop.gob.ec | 23974798 |

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---------------------------------------|--|---|------------------------|--------------------|
| CORDERO SANCHEZ, ANDREA DEL CISNE | Analista Distrital de Presupuesto | ANALISTA DE PRESUPUESTO DISTRITAL | acordero@mtop.gob.ec | 072561665 EXT72509 |
| Hurtado Angamarca, Blanca Paulina | Coordinador Técnico de Infraestructura Distrital | Analista de Infraestructura Provincial 1 | bhurtado@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Jaramillo Cantos, Luis Alberto | Subsecretario Regional 7 | Subsecretario Zonal 7 | ljaramillo@mtop.gob.ec | |
| Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne | Coordinadora de Planificación Zonal 7 | Coordinadora de Planificación Zonal 7 | gpineda@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Rojas Cazar, Walter Emilio | Director Distrital de Loja | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Loja | wrojas@mtop.gob.ec | 023974600 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 97605_1.jpg | 03/04/2018 |
