

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Morona Santiago

PROYECTO: K047 MTOP - Construcción del Puente sobre el Río Namangoza Caf - Cfa - 3210 carretera Bella Unión - Limón

Líder del Proyecto:	Tipan Guañuna, Jairo Fernando (jtipan@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA: CAF-CFA-3210 CARRETERA BELLA UNION LIMON., Provincia - Morona Santiago, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Saavedra Correa, Jose Luis	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	22.00
CUP:	175200000.0000.372198	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,231,242.42
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	20/05/2013 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	10/09/2019	Fecha de Fin Base:	20/06/2015
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/10/2019

DATOS GENERALES

Descripción

Construcción del puente sobre el Río Namangoza, de 130 m. de longitud

Contratista: Ángel Ortega Ramón
 Fiscalización: Ing. Jairo Tip'an
 Supervisor: Ing. José Flores
 Administrador: Ing. Romeo Idrovo

Monto de construcción: \$ 2.264.239,62
 orden de cambio \$ 326.525,81
 costo + % \$ 143.466,82
 monto IVA \$ 258.119,09
 Reajuste \$ 143.466,82
 Monto total: \$ 3.165.184,97

Objetivo: Mejorar el nivel de servicio en el sector, implementando la conectividad a las poblaciones de Méndez, Logroño, Sucúa y Macas en la ruta norte y General Plaza, Indanza, San Juan Bosco y Gualaquiza en la ruta sur.

Linea base.- existe puente antiguo que permite el trafico vehicular en este sector en un solo carril, la construcción del puente nuevo se esta construyendo par habilitar 2 carriles.

Beneficios Cualitativos

Este proyecto mejorará el nivel de servicio en el sector, uniformizando el tráfico en dos carriles y la conectividad a las poblaciones de Méndez, Logroño, Sucúa y Macas en la ruta norte y General Plaza, Indanza, San Juan Bosco y Gualaquiza en la ruta sur.

Tipo de Beneficiario

Habitantes poblaciones de Méndez , Logroño, Sucúa y Macas en la ruta norte y General Plaza, Indanza, San Juan Bosco y Gualaquiza en la ruta sur, por constituir zona turística, ganadera, agrícola.


Restricciones

Este proyecto debe concluirse en 20 de Junio de 2015

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.24 %
 Fecha de Inicio: 20/05/2013 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

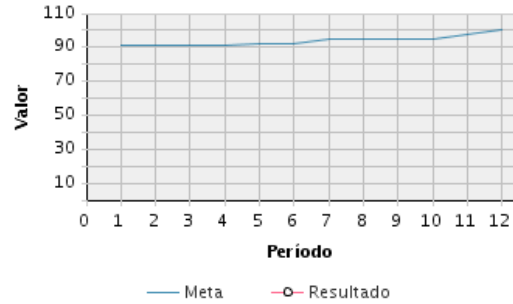

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	94 %	94 %	94 %	94 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2019.- Con Memorando Nro. MTOP-DDMS-2019-1562-ME Macas, de fecha Macas 27 de agosto de 2019, solicitando Directrices para cancelación de Planilla liquidación No. 17 del proyecto "Construcción del Puente sobre el Río Namangoza: CAF-CFA-3210" Morona Santiago,	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/09/2019 - 05:06 PM
JULIO 2019.- En espera de presupuesto de fuente fiscal correspondiente del valor del iva, ya que al momento se cuenta con el monto total de la planilla, con crédito 002, una vez que se cuente con los recursos se solicitara el pago inmediato de la planilla de liquidación.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/09/2019 - 05:06 PM
JUNIO 2019.- En espera de presupuesto de fuente fiscal correspondiente del valor del iva, ya que al momento se cuenta con el monto total de la planilla, con crédito 002, una vez que se cuente con los recursos se solicitara el pago inmediato de la planilla de liquidación.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/07/2019 - 03:25 PM
MAYO 2019.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2019; aprobado la inclusión se debera asignar los recursos para el pago de la planilla pendiente, por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto una vez cuente con los recursos	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/07/2019 - 03:46 PM
ABRIL 2019.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2019; aprobado la inclusión se debera asignar los recursos para el pago de la planilla pendiente, por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto una vez cuente con los recursos	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/05/2019 - 10:54 AM
MARZO 2019.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2019; aprobado la inclusión se debera asignar los recursos para el pago de la planilla pendiente, por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto una vez cuente con los recursos	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/04/2019 - 07:42 AM
FEBRERO 2019.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2019; aprobado la inclusión se debera asignar los recursos para el pago de la planilla pendiente, por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto una vez cuente con los recursos.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	01/03/2019 - 07:49 AM
ENERO 2019.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2019; aprobado la inclusión se debera asignar los recursos para el pago de la planilla pendiente, por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto una vez cuente con los recursos.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/02/2019 - 01:21 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2018.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2018; aprobado la inclusión se debera asignar los recursos para el pago de la planilla pendiente, por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto una vez cuente con los recursos.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/01/2019 - 10:23 AM
NOVIEMBRE 2018.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2018; aprobado la inclusión se debera asignar los recursos para el pago de la planilla pendiente, por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto una vez cuente con los recursos.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/12/2018 - 09:20 AM
OCTUBRE 2018.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2018; aprobado la inclusión se debera asignar los recursos para el pago de la planilla pendiente, por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto una vez cuente con los recursos.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/11/2018 - 04:15 PM
SEPTIEMBRE 2018.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2018; aprobado la inclusión se debera asignar los recursos para el pago de la planilla pendiente, por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto una vez cuente con los recursos.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/10/2018 - 09:40 AM
AGOSTO 2018.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2018; aprobado la inclusión se debera asignar los recursos para el pago de la planilla pendiente, por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto una vez cuente con los recursos.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/09/2018 - 12:21 PM
JULIO 2018. En espera de la inclusión al PAI 2018; aprobado la inclusión se deberá asignar los recursos para el pago de la planilla pendiente, por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto una vez cuente con los recursos.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	03/08/2018 - 08:50 AM
JUNIO 2018. Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2018; aprobado la inclusión se deberá asignar los recursos para el pago de la planilla pendiente, por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto una vez cuente con los recursos.	Idrovo Aguirre, Romeo Alexander	06/07/2018 - 07:28 PM
MAYO 2018. Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2018; aprobado la inclusión se deberá asignar los recursos para el pago de la planilla pendiente, por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto una vez cuente con los recursos.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/06/2018 - 09:55 AM
ABRIL 2018. Con fecha 15 de diciembre de 2016, el Contratista presentó la planilla de reajuste de precios definitivos con las correcciones de acuerdo a Oficio Nro. MTOP-CON_MOR-16-80-OF de fecha Macas 09 de septiembre de 2016; ahora es responsabilidad del Ministerio de Finanzas realizar asignar los recursos, una vez que se han solicitado la modificación de recursos y el Dpto. Financiero podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/05/2018 - 03:13 PM
HITO ASOCIADO 19. MARZO 2018.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2018; aprobado la inclusión se asignaran los recursos para el pago de la planilla pendiente por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/04/2018 - 04:19 PM
HITO ASOCIADO 19. FEBRERO 2018.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2018; aprobado la inclusión se asignaran los recursos para el pago de la planilla pendiente por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	20/03/2018 - 02:44 PM
HITO ASOCIADO 19. ENERO 2018.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2018; aprobado la inclusión se asignaran los recursos para el pago de la planilla pendiente por lo cual el Dpto. Financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	20/03/2018 - 02:44 PM
HITO ASOCIADO 19.- DICIEMBRE 2017.- Con fecha 15 de diciembre de 2016, el Contratista presento la planilla de reajuste de precios definitivos con las correcciones de acuerdo a Oficio Nro. MTOP-CON_MOR-16-80-OF de fecha Macas 09 de septiembre de 2016; ahora es responsabilidad del Ministerio de Finanzas realizar asignar los recursos, una vez que se han solicitado la modificación de recursos y el Dpto. financiero podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/01/2018 - 01:18 PM
HITO ASOCIADO 19.- NOVIEMBRE 2017.- Con fecha 15 de diciembre de 2016, el Contratista presento la planilla de reajuste de precios definitivos con las correcciones de acuerdo a Oficio Nro. MTOP-CON_MOR-16-80-OF de fecha Macas 09 de septiembre de 2016; ahora es responsabilidad del Ministerio de Finanzas realizar asignar los recursos, una vez que se han solicitado la modificación de recursos y el Dpto. financiero podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/12/2017 - 12:00 PM
HITO ASOCIADO 19.- OCTUBRE 2017.- Con fecha 15 de diciembre de 2016, el Contratista presento la planilla de reajuste de precios definitivos con las correcciones de acuerdo a Oficio	Reinoso Jara, Darwin Rolando	06/11/2017 - 08:54 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Nro. MTOP-CON_MOR-16-80-OF de fecha Macas 09 de septiembre de 2016; ahora es responsabilidad del Ministerio de Finanzas realizar asignar los recursos, una vez que se han solicitado la modificación de recursos y el Dpto. financiero podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto.		
SEPTIEMBRE 2017.- Proyecto del Rio Namangoza la reforma tipo INTER es disminución de fiscal y la reforma AMP es aumento en Crédito CAF.	Saavedra Correa, Jose Luis	04/10/2017 - 10:31 AM
AGOSTO 2017.- En espera que se tramite el pago de la Orden de cambio 4 y el reajuste definitivo.	Saavedra Correa, Jose Luis	06/09/2017 - 04:13 PM
JULIO 2017.- En espera que se tramite el pago de la Orden de cambio 4 y el reajuste definitivo.	Saavedra Correa, Jose Luis	04/08/2017 - 12:34 PM
JUNIO 2017.- En espera que se tramite el pago de la Orden de cambio 4 y el reajuste definitivo.	Saavedra Correa, Jose Luis	04/07/2017 - 03:24 PM
MAYO 2017.- En espera que se tramite el pago de la Orden de cambio 4 y el reajuste definitivo.	Saavedra Correa, Jose Luis	05/06/2017 - 04:58 PM
ABRIL 2017.- En espera que se tramite el pago de la Orden de cambio 4 y el reajuste definitivo.	Saavedra Correa, Jose Luis	03/05/2017 - 02:53 PM
MARZO 2017.- En espera que se tramite el pago de la Orden de cambio 4 y el reajuste definitivo.	Saavedra Correa, Jose Luis	05/04/2017 - 10:23 AM
FEBRERO 2017.- En tramite el pago de la Orden de cambio 4 y el reajuste definitivo.	Saavedra Correa, Jose Luis	07/03/2017 - 12:50 PM
ENERO 2017.- Con fecha 15 de diciembre de 2016, el Contratista presentó la planilla de reajuste de precios definitivos con las correcciones de acuerdo a Oficio Nro. MTOP-CON_MOR-16-80-OF de fecha Macas 09 de septiembre de 2016; ahora es responsabilidad del Dpto. Financiero hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto. Está en trámite la legalización del acta de entrega-recepción definitiva.	Saavedra Correa, Jose Luis	07/02/2017 - 09:31 AM
DICIEMBRE 2016.- Con fecha 15 de diciembre de 2016, el Contratista presentó la planilla de reajuste de precios definitivos con las correcciones de acuerdo a Oficio Nro. MTOP-CON_MOR-16-80-OF de fecha Macas 09 de septiembre de 2016; ahora es responsabilidad del Dpto. Financiero hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto. Está en trámite la legalización del acta de entrega-recepción definitiva.	Saavedra Correa, Jose Luis	05/01/2017 - 05:35 PM
NOVIEMBRE 2016. Tiene que realizar correcciones a la planilla de reajuste de precios definitivos de acuerdo a Oficio Nro. MTOP-CON_MOR-16-80-OF, de fecha Macas, 09 de septiembre de 2016, es responsabilidad del Contratista no cumplir con esta disposición, hasta la presente fecha no ha cumplido con lo dispuesto en el mencionado documento.	Arias Castro, Franklin	05/12/2016 - 10:28 AM
OCTUBRE 2016.- Tiene que realizar correcciones a la planilla de reajuste de precios definitivos de acuerdo a Oficio Nro. MTOP-CON_MOR-16-80-OF, de fecha Macas, 09 de septiembre de 2016, es responsabilidad del Contratista no cumplir con esta disposición.	Arias Castro, Franklin	01/11/2016 - 10:28 AM
SEPTIEMBRE 2016.- Tiene que realizar correcciones a la planilla de reajuste de precios definitivos de acuerdo a Oficio Nro. MTOP-CON_MOR-16-80-OF, de fecha Macas, 09 de septiembre de 2016.	Arias Castro, Franklin	03/10/2016 - 02:56 PM
AGOSTO 2016.- Está en revisión planilla liquidación reajuste de precios definitivos	Arias Castro, Franklin	06/09/2016 - 10:58 AM
JULIO 2016.- Con Oficio Nro. MTOP-CON_MOR-16-65-OF, se solicita al Contratista complementar información planilla de liquidación reajustes.	Arias Castro, Franklin	02/08/2016 - 10:19 AM
JUNIO 2016.- Con Oficio Nro. MTOP-CON_MOR-16-49-OF, de fecha Macas, 23 de junio de 2016, en el mismo se le dispone realice trámite planilla orden de cambio N° 4, de manera correcta	Arias Castro, Franklin	04/07/2016 - 02:40 PM
MAYO 2016.- Con Memorando Nro. MTOP-DDMS-2016-315-ME, de fecha 11 de abril de 2016, se devuelve la planilla de cálculo de reajuste definitivo y planilla de liquidación del proyecto, Contratista deberá coordinar con la Fiscalización para iniciar el trámite nuevamente con las correcciones a las observaciones realizadas, hasta la presente fecha no lo ha realizado por lo que es de su exclusiva responsabilidad	Arias Castro, Franklin	02/06/2016 - 12:41 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2016.- Con Memorando Nro. MTOP-DDMS-2016-315-ME, de fecha 11 de abril de 2016, se devuelve la planilla de cálculo de reajuste definitivo y planilla de liquidación del proyecto, Contratista deberá coordinar con la Fiscalización para iniciar el trámite nuevamente con las correcciones a las observaciones realizadas.	Arias Castro, Franklin	03/05/2016 - 10:17 AM
MARZO 2016.- Con Memorando Nro. MTOP-CON_MOR-2016-90-ME, de fecha Macas, 01 de abril de 2016, se calcula reajuste de precios definitivos, mismos que deberán ser considerados para el descuento en la planilla de orden de cambio n° 4 que se encuentra en trámite en el departamento financiero	Arias Castro, Franklin	01/04/2016 - 02:24 PM
FEBRERO 2016.- Con Memorando MTOP-CON_MOR-2016-42-ME, de fecha Macas, 03 de febrero de 2016, se solicito la disponibilidad de recursos economicos para pago planilla de liquidación y reajustes definitivos, ademas se inicio el trámite para legalización del acta definitiva, se deberá realizar proceso de prioridad con SENPLADES y aval del Ministerio de Finanzas.	Arias Castro, Franklin	01/03/2016 - 10:38 AM
ENERO 2016.- Con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2016-22-ME, de fecha Macas, 11 de enero de 2016, se nombro la comisión para la recepción definitiva, la misma que se realizo de acuerdo a la disposición, Contratista deberá presentar liquidación tecnico economica y el acta de recepción defintiva para su revisión y aprobación	Arias Castro, Franklin	03/02/2016 - 10:09 AM
DICIEMBRE 2015. Contratista deberá remediar guardacaminos y pasamanos lado izquierdo puente Namangoza, para proceder a dar el informe de nombramiento de la comisión	Arias Castro, Franklin	05/01/2016 - 08:17 AM
NOVIEMBRE 2015.- El plazo para terminación del contrato incluido el mantenimiento rutinario es el 30 de noviembre de 2015, por lo que el Contratista deberá la recepción definitiva del proyecto	Arias Castro, Franklin	01/12/2015 - 11:15 AM
OCTUBRE 2015.- Con Oficio Nro. MTOP-CON_MOR-15-113-OF, de fecha Macas, 22 de octubre de 2015, la Supervisión del MTOP M.S., dispuso que se realice el mantenimiento del proyecto hasta que se realice la recepción definitiva.	Arias Castro, Franklin	04/11/2015 - 03:48 PM
SEPTIEMBRE 2015.- La Dirección financiera deberá cancelar planillas pendientes de trabajos, para que Contratista presente liquidación reajustes definitivos, hasta la presente fecha no se realiza el pago.	Arias Castro, Franklin	02/10/2015 - 03:55 PM
AGOSTO 2015.- Contratista deberá realizar mantenimiento rutinario de manera permanente incluido la señalización horizontal y vertical que fuera destruido por accidentes de tránsito o por vandalismo	Arias Castro, Franklin	01/09/2015 - 08:38 AM
JULIO 2015.- Contratista deberá realizar mantenimiento rutinario de manera permanente incluido la señalización horizontal y vertical	Arias Castro, Franklin	06/08/2015 - 07:58 AM
JUNIO 2015.- Proyecto se encuentra en mantenimiento rutinario por 6 meses, dando prioridad a la limpieza de derrumbes y drenaje, por fuerte estación invernal, a fin de no interrumpir el tráfico vehicular	Arias Castro, Franklin	06/07/2015 - 10:00 AM
Mayo 2015.- Contratista deberá tramitar planillas y acta de recepción provisional a fin de ser legalizada.	Arias Castro, Franklin	05/06/2015 - 08:17 AM
Abril 2015.- Proyecto se encuentra en mantenimiento rutinario por 6 meses, dando prioridad a la limpieza de derrumbes y drenaje.	Arias Castro, Franklin	07/05/2015 - 09:48 AM
Marzo 2015.- Se termino el proyecto y esta en trámite nombramiento de comisión para recepción del proyecto.	Arias Castro, Franklin	06/04/2015 - 02:06 PM
Febrero 2015.- Contratista solicito ampliación de plazo por 30 días desde el 23 de febrero hasta el 24 de marzo de 2015, por cuanto el documento de no objeción de la CAF, no se dispone para efectuar actos administrativos	Arias Castro, Franklin	04/03/2015 - 10:07 AM
Enero 2015.- Se realizo la reunión del Decreto 451, con fecha 26 de enero de 2015, solicitando ampliación de plazo por 30 días hasta el 22 de febrero de 2015, mismo que esta aprobado.	Arias Castro, Franklin	04/02/2015 - 09:06 AM
Diciembre 2014.- Cia. Contratista realizo la fundición del tablero del puente, trabajos continuará hasta el 28 de enero de 2015, para cumplir con el objeto del contrato.	Arias Castro, Franklin	07/01/2015 - 01:33 PM
Noviembre 2014.- Contratista continúa trabajando colocación de armadura tablero, y acceso de entrada.	Arias Castro, Franklin	02/12/2014 - 12:24 PM
OCTUBRE 2014.- El contratista tramita una nueva ampliación de plazo y orden de trabajo de acuerdo a la reunión de decreto 451, en obra físicamente se constata el lanzado totalmente las vigas pare de la superestructura del puente.	Arias Castro, Franklin	07/11/2014 - 01:54 PM
SEPTIEMBRE 2014.- El contratista tramita una nueva ampliación de plazo y orden de trabajo de acuerdo a la reunión de Decreto 451, en obra se lanzado totalmente las primeras dos vigas y continua con el ensamblaje de resto de dobelas que conforman las ultimas vigas de la superestructura del puente.	Arias Castro, Franklin	03/10/2014 - 04:15 PM
AGOSTO 2014.- Contratista se encuentra realizando obras complementarias para el lanzamiento de 2 vigas metalicas, las mismas que se a lanzado en un 100%, se esta ejecutando el completamiento de las 2 vigas adicionales para completar el lanzamiento de las mismas	Arias Castro, Franklin	02/09/2014 - 04:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2014.- Contratista se encuentra ejecutando de lanzamiento de las vigas metálicas, además de el completamiento en el armado de las mismas conforme se logra el espacio en la plataforma de lanzamiento.	Arias Castro, Franklin	05/08/2014 - 11:42 AM
JUNIO 2014.-El Contratista ejecuta trabajos de construcción de estribo izquierdo y accesos al margen izquierdo, se ejecuta la soldadura de dovelas de la estructura metálica del puente y además se realiza la verificación de suelda.	Arias Castro, Franklin	08/07/2014 - 12:17 PM
MAYO 2014.- El Contratista a la fecha a ejecutado los trabajos de pila izquierda en 90%, pila derecha y estribo derecho 100% de acuerdo a los rediseños presentados por el Consultor, se ha dispuesto ejecutar estribo izquierdo de acuerdo a planos aprobados por las partes.	Arias Castro, Franklin	06/06/2014 - 11:34 AM
ABRIL 2014.- Se continúan con los trabajos de los Estribos de la margen derecha e izquierda, Contratista deberá cumplir con la programación de trabajos vigente.	Arias Castro, Franklin	06/06/2014 - 11:28 AM
MARZO 2014.- Se continúan con los trabajos de los Estribos de la margen derecha e izquierda, Contratista deberá cumplir con la programación de trabajos vigente.	Arias Castro, Franklin	07/04/2014 - 01:56 PM
FEBRERO 2014.- Se continúan con los trabajos de los Estribos de la margen derecha e izquierda, Contratista deberá cumplir con la programación de trabajos vigente.	Arias Castro, Franklin	06/03/2014 - 11:00 AM
ENERO 2014.- Se continúan con los trabajos de los Estribos de la margen derecha e izquierda DICIEMBRE 2013: Se continúan con los trabajos de los Estribos de la margen derecha e izquierda	Arias Castro, Franklin	18/02/2014 - 01:37 PM
NOVIEMBRE 2013: Se continúan con los trabajos de los Estribos de la margen derecha e izquierda	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	09/12/2013 - 06:46 AM
OCTUBRE 2013: Se reinician los trabajos una vez que se han realizado rediseños de los Estribos	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	09/12/2013 - 06:44 AM
SEPTIEMBRE 2013: Continúa paralizada la obra, se realiza rediseño de la Obra por parte del Consultor	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	09/12/2013 - 06:43 AM
AGOSTO 2013: Continúa paralizada la obra, se realiza rediseño de la Obra por parte del Consultor	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	09/12/2013 - 06:42 AM
JULIO 2013: Continúa paralizada la obra, se realiza rediseño de la Obra por parte del Consultor	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	09/12/2013 - 06:42 AM
JUNIO 2013: Continúa paralizada la obra, se realiza rediseño de la Obra por parte del Consultor	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	09/12/2013 - 06:41 AM
MAYO 2013: Se paraliza la obra por haber inconvenientes en los diseños	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	09/12/2013 - 06:40 AM
ABRIL 2013: Se inicia la obra con la construcción de los Estivos	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	09/12/2013 - 06:39 AM

Problemas cerrados: 16, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. El no pago de planilla de liquidación CAUSARIA incumplimiento por parte del MTOP	05/09/2019	Jairo Fernando Tipan Guañuna	10 %	10	1	1/2

Riesgos cerrados: 8, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
No hay información disponible	

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	20/05/2013		20/05/2013		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	21/05/2013		21/05/2013		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Publicación de los Pliegos ejecutado	2-Publicación de Pliegos	25/05/2013		25/05/2013		Sí	4.5
4	PLANEACIÓN: Calificación de las Ofertas ejecutado	2-Publicación de Pliegos	28/05/2013		28/05/2013		Sí	2.0
5	PLANEACIÓN: Adjudicación de la Obra ejecutado	3-Adjudicación	30/05/2013		30/05/2013		Sí	3.0
6	PLANEACIÓN: Entrega del Anticipo ejecutado	3-Adjudicación	03/06/2013		03/06/2013		Sí	0.5
7	EJECUCIÓN: Inicio de la Obra ejecutado	4-Inicio de Trabajo	07/06/2013		07/06/2013		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Construcción de las Zapatas ejecutado	5-Entregables Intermedios	25/08/2013		25/08/2013		Sí	6.0
9	EJECUCIÓN: Construcción de los Estribos y pilas ejecutado	5-Entregables Intermedios	15/05/2014		15/05/2014		Sí	23.0
10	EJECUCIÓN: Construcción de la loza del puente ejecutado	5-Entregables Intermedios	20/12/2014		20/12/2014		Sí	14.0
11	EJECUCIÓN: Ensayo prueba de carga ejecutado	5-Entregables Intermedios	17/02/2015		15/03/2015		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Construcción de los Accesos del puente ejecutado	5-Entregables Intermedios	18/02/2015		16/03/2015		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Construcción de losas de aproximación ejecutado	5-Entregables Intermedios	20/02/2015		28/02/2015		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Colocación de la Señalización ejecutado	5-Entregables Intermedios	21/02/2015		15/03/2015		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Construcción sistema de iluminación ejecutado	5-Entregables Intermedios	22/02/2015		20/03/2015		Sí	5.0
16	CIERRE: Liquidación económica elaborada	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		14/05/2015		Sí	0.25
17	CIERRE: Recepción Provisional acta legalizada	9-Entregables Formales	31/03/2015		14/05/2015		Sí	0.25
18	CIERRE: Recepción Definitiva legalizada	9-Entregables Formales	16/12/2016		17/10/2016		Sí	1.0
19	CIERRE: Pago de Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	31/05/2019	31/10/2019			No	1.0
20	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	31/10/2019			No	2.0
21	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	1.0
23	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	1.5
24	CIERRE: Liquidación económica y reajustes definitivos de la construcción pagados	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2019	31/12/2019			No	1.5
25	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión Negativa daños a las barandas de protección del acceso al puente	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	20/10/2015
2	Supervisión positiva de la gestion del proyecto en la provincia de Morona Santiago de acuerdo al hito 19	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	28/09/2015
3	Supervisión positiva se inspecciono la señalización vial y sistema de iluminación del puente sobre el río Namangoza	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	17/07/2015
4	Supervisión Positiva porque se observo que se ha colocado el asfalto para ingresar al puente y también los postes para el alumbrado.	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	09/04/2015
5	Negativa. No cumple con la Construcción sistema de iluminación	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	03/03/2015
6	Construcción de los accesos al puente en el sector de Bella Unión sobre la unión del río Paute y Negro	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	27/02/2015
7	Colocación de las barandas y construcción de la loza del puente.	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	27/01/2015
8	Construcción loza del punte y los accesos	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	16/12/2014
9	Avance de Obra Construcción de las Bases	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	24/04/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Periodo	Meta	Resultado del Periodo	Fecha de Inicio	Último Periodo Actualizado
No hay información disponible						

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	679,271.89
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,231,242.42 **
Costo Total:	3,165,184.97
Total Devengado:	3,163,953.75
% Costo Total Devengado:	99.96 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 99.96 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,360,157.00	60,776.86	0.00	2,420,933.86
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	3,757,902.31	60,776.86	0.00	3,818,679.17
Ppto. Codificado	3,300,375.59	60,776.86	0.00	3,361,152.45
Ppto. Comprometido	3,088,953.75	0.00	0.00	3,088,953.75
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	3,118,556.33	67,288.67	0.00	3,185,845.00
Ppto. Devengado	3,163,953.75	0.00	0.00	3,163,953.75
Pagado Real	2,512,276.53	0.00	0.00	2,512,276.53
Estimado a fin de año	* 3,163,953.75	0.00	0.00	3,163,953.75
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-45,397.42	67,288.67	0.00	21,891.25
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 101.46 %	0.00 %	0.00 %	99.31 %
Ppto. Codificado 998	732,406.86	0.00	0.00	732,406.86
Ppto. Devengado 998	656,771.88	0.00	0.00	656,771.88

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

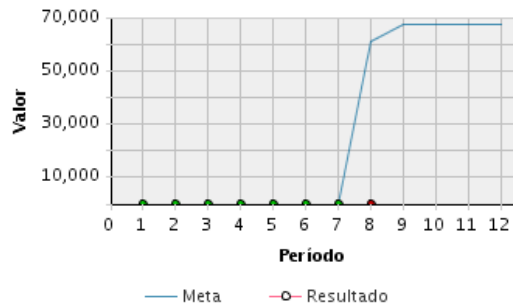

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	60,776.86	0.00	60,776.86	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	6,511.81		67,288.67				
Oct	0.00		67,288.67				
Nov	0.00		67,288.67				
Dic	0.00		67,288.67				
Total	67,288.67	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
18	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
19	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
20	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo
21	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	6144_ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	E.3.PDF	06/07/2015
2	6144_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	6144_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO__2019.pdf	05/09/2019
3	6144_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	6144_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
4	6144_MTOP-DDMS-2016-315-ME	F.9.PDF	03/05/2016
5	Acción Nro. 1.- Gestionar cambio de fuente-30/05/2019	Informe_Riesgos__1.pdf	27/06/2019
6	ACTA DE COMISIÓN ESPECIAL DECRETO 451	B.8.pdf	16/10/2014
7	acta de convalidación 1	D.8.pdf	28/05/2015
8	CONTRATO ORIGINAL	A.9.pdf	15/03/2014
9	ENSAYO PRUEBA DE CARGA	C.9.doc	07/05/2015
10	ENSAYO PRUEBA DE CARGA REALIZADO	D.9.PDF	03/06/2015
11	FOTOS DE RESPALDO PUENTE	D.1.doc	07/04/2015
12	FOTOS DEL PROYECTO	E.8.doc	01/12/2015
13	FOTOS DEL PUENTE	E.7.doc	06/11/2015
14	FOTOS PUENTE NAMANGOZA	B.6.pdf	31/07/2014
15	FOTOS PUENTE SEÑALIZACIÓN	D.2.doc	07/05/2015
16	INFORME 074 C - Nov. 2015	E.9.doc	02/12/2015
17	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013	A.1.pdf	15/03/2014
18	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	B.4.pdf	06/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2015	C.8.pdf	05/05/2015
20	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2016	F.8.pdf	03/05/2016
21	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	G.8.pdf	04/05/2017
22	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	INFORME_EJECUTIVO_6144.pdf	04/05/2018
23	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2019 6144	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2019_6144.pdf	02/05/2019
24	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	A.5.pdf	15/03/2014
25	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	B.7.pdf	03/09/2014
26	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2015	E.5.pdf	31/08/2015
27	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2016	F.9.pdf	06/09/2016
28	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2017	H.3.pdf	06/09/2017
29	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	6144.pdf	04/09/2018
30	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	A.8.pdf	15/03/2014
31	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	C.4.pdf	06/01/2015
32	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2015	F.1.pdf	05/01/2016
33	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2016	G.4.pdf	05/01/2017
34	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	6144.pdf	04/01/2019
35	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	B.1.pdf	15/03/2014
36	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	C.5.pdf	03/02/2015
37	INFORME EJECUTIVO ENERO 2016	F.2.pdf	03/02/2016
38	INFORME EJECUTIVO ENERO 2017	G.5.pdf	07/02/2017
39	INFORME EJECUTIVO ENERO 2018	6144.pdf	05/04/2018
40	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	6144.pdf	05/02/2019
41	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	B.2.pdf	03/04/2014
42	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	C.6.pdf	05/03/2015
43	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2016	F.3.pdf	01/03/2016
44	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2017	G.6.pdf	07/03/2017
45	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2018	6144.pdf	05/04/2018
46	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	6144.pdf	01/03/2019
47	INFORME EJECUTIVO JULIO 2013	A.4.pdf	15/03/2014
48	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	B.6.pdf	05/08/2014
49	INFORME EJECUTIVO JULIO 2015	E.4.pdf	06/08/2015
50	INFORME EJECUTIVO JULIO 2016	F.8.pdf	02/08/2016
51	INFORME EJECUTIVO JULIO 2017	H.2.pdf	04/08/2017
52	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	6144.pdf	03/08/2018
53	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	6144-2.pdf	06/08/2018
54	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013	A.3.pdf	15/03/2014
55	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	B.6.pdf	08/07/2014
56	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2015	E.2.pdf	06/07/2015
57	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2016	F.7.pdf	04/07/2016
58	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2017	H.1.pdf	05/07/2017
59	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018_Puente_namangoza.pdf	06/07/2018
60	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	6144.pdf	05/07/2019
61	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	B.3.pdf	03/04/2014
62	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	C.7.pdf	06/04/2015
63	INFORME EJECUTIVO MARZO 2016	F.4.pdf	01/04/2016
64	INFORME EJECUTIVO MARZO 2017	G.7.pdf	05/04/2017
65	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	6144.pdf	05/04/2018
66	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	6144.pdf	05/04/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
67	INFORME EJECUTIVO MAYO 2013	A.2.pdf	15/03/2014
68	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	B.5.pdf	06/06/2014
69	INFORME EJECUTIVO MAYO 2015	E.1.pdf	05/06/2015
70	INFORME EJECUTIVO MAYO 2016	E.9.pdf	02/06/2016
71	INFORME EJECUTIVO MAYO 2017	G.9.pdf	06/06/2017
72	INFORME EJECUTIVO MAYO 2018	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
73	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	A.7.pdf	15/03/2014
74	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	B.9.pdf	02/12/2014
75	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2015	E.9.pdf	01/12/2015
76	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2016	G.3.pdf	05/12/2016
77	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_6144_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
78	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	6144.pdf	05/12/2018
79	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	B.8.pdf	05/11/2014
80	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2015	E.7.pdf	04/11/2015
81	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2016	G.2.pdf	01/11/2016
82	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	I.D._6144.pdf	06/11/2017
83	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	A.6.pdf	15/03/2014
84	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	B.7.pdf	06/10/2014
85	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2015	E.6.pdf	05/10/2015
86	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2016	G.1.pdf	03/10/2016
87	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	6144.pdf	05/10/2018
88	MTOP-CON_MOR-16-49-OF	F.8.pdf	05/07/2016
89	MTOP-CON_MOR-16-65-OF	F.9.pdf	03/08/2016
90	MTOP-CON_MOR-16-80-OF	G.2.pdf	03/10/2016
91	mtop-con_mor-2015-94-me	C.8.pdf	07/04/2015
92	MTOP-CON_MOR-2016-44-ME	F.3.pdf	04/02/2016
93	MTOP-DDMS-2016-315-ME	F.7.PDF	25/04/2016
94	MTOP-DDMS-2016-684-ME	G.1.pdf	06/09/2016
95	MTOP-DDMS-2019-1542-ME, directrices de cancelación	MTOP-DDMS-2019-1542-ME.pdf	05/09/2019
96	MTOP-DDMS-2019-1562-ME, directrices de cancelación	MTOP-DDMS-2019-1562-ME.pdf	05/09/2019
97	MTOP-DPMS-2015-262-ME	C.9.pdf	07/04/2015
98	MTOP-DPMS-2015-385-ME	D.7.pdf	28/05/2015
99	MTOP-DPMS-2016-104-ME	F.6.pdf	04/02/2016
100	MTOP-DPMS-2016-14-ME	F.4.pdf	04/02/2016
101	MTOP-DPMS-2016-22-ME	F.5.pdf	04/02/2016
102	MTOP-SUBREG6-2014-1238-ME	C.3.pdf	17/12/2014
103	OFICIO N° MTOP-CON_MOR-15-113-OF	E.8.PDF	04/11/2015
104	OFICIO SN ANGEL ORTEGA	G.2.PDF	06/09/2016
105	ORDEN DE CAMBIO 1 INCREMENTO DE PLAZO	C.2.pdf	17/12/2014
106	ORDEN DE CAMBIO 2 INCREMENTO DE PLAZO	D.3.pdf	28/05/2015
107	ORDEN DE CAMBIO 3 INCREMENTO DE PLAZO	D.4.pdf	28/05/2015
108	ORDEN DE CAMBIO 4 INCREMENTO DE PLAZO	D.5.pdf	28/05/2015
109	ORDEN DE TRABAJO 1 INCREMENTO DE RUBROS NUEVOS	D.6.pdf	28/05/2015
110	RIO NAMANGOZA	H.4.pdf	04/10/2017
111	SENPLADES-SZ6A-2012-0271-OF	C.1.pdf	17/12/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	CONTRATISTA			
	FINANCIERO MTOP			
Flores Tubón, José Luis	SUPERVISOR VIAL MTOP ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	Experto de Infraestructura Distrital	jfflores@mtop.gob.ec	64206
Jaramillo Vintimilla, José Francisco	PATROCINADOR EJECUTIVO	Subsecretario Zonal 6	jjaramillo@mtop.gob.ec	
Saavedra Correa, Jose Luis	FISCALIZADOR VIAL MTOP ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Morona Santiago	jsaavedra@mtop.gob.ec	64021
Saavedra Correa, Jose Luis	ADMINISTRADOR DEL PROYECTO MTOP	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Morona Santiago	jsaavedra@mtop.gob.ec	64021

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
74445_1.jpg	06/01/2017
