

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Napo

PROYECTO: K032 MTOP - Construcción del Puente Piedra Fina 2 y Accesos en la vía Baeza - Lago Agrío

Líder del Proyecto:	Navas Coque, Richard Wladimir (rnavas@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO, Provincia - Napo, Proyectos Emblemáticos, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Zambrano Vacacela, José Gabriel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	11.40
CUP:	175200000.0000.372758	TIR:	16.50 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	904,293.63
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,109,547.84
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2011 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	03/10/2019	Fecha de Fin Base:	30/09/2013
Modificado por:	Navas Coque, Richard Wladimir	Fecha del siguiente Hito:	09/09/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

La construcción del Puente sobre el Rio Piedra Fina 2 de 45 metros de longitud, ubicado en la carretera Baeza- Lago Agrío, se realiza con la finalidad de mejorar la movilidad de los usuarios de la vía ante la necesidad de toda la Provincia de Napo y Sucumbíos.

Contratista: Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Fiscalizador: Compañía SISMOTEC S.A

Monto Construcción: 878.647.44 y Fiscalización : 142000

OBJETIVO

Interconectar las Regiones 1 y 2 en el tramo de vía Y de Baeza-El chaco-Reventador.

LINEA DE BASE

No existe puente en esa zona por lo que es necesario su construcción como parte del Programa Troncal Amazónica, se ha planificado que el puente esté terminado a finales del año 2011.

ESTRATEGIA

1. Supervisión técnica permanente
2. Disponibilidad de cupo presupuestario
3. Pago oportuno de planilla
4. Seguimiento al plan de obra
5. Aseguramiento del control de calidad

Beneficios Cualitativos

Se disminuirá el riesgo de accidente por el paso vehicular sobre los puentes provisionales que ya cumplieron su tiempo de servicio.

La calidad de la infraestructura vial mejorará el servicio a la circulación vehicular.

Influirá en beneficio del desarrollo de las comunidades del sector al acortar los tiempos de movilización de mercadería, personal, turismo y comercio.

Tipo de Beneficiario

Sector petrolero.
Turístico
Población de la Región

Restricciones

Plazo: 08 meses para culminación del contrato.

Recursos:

La mano de obra calificada requerida para la Ejecución del Proyecto considerando la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

Los Equipos y Materiales utilizados son de excelente calidad y rendimiento con el fin de desarrollar de manera afectiva y en el plazo estimado sumando al desarrollo del País con obras emblemáticas.

EQUIPO:

- 1 superintendente
- 2 residente de obra,
- 1 chofer
- 15 Albañiles
- 17 jornaleros
- residente de fiscalización
- 1 ambiental, 1 topógrafo
- 1 mecánico
- 1 operador
- 2 cadeneros


Alcance:

Las especificaciones técnicas que regirán cada uno de los Proyectos contratados por medio del MTOP Napo serán las "Especificaciones generales para la ejecución de puentes y caminos MOP-001-F 2002", del MTOP del Ecuador.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.27 %
Fecha de Inicio: 01/01/2011 **Fecha de Fin:** 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	96 %	98 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Navas Coque, Richard Wladimir	03/10/2019 - 05:42 PM
ENERO 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	01/10/2019 - 12:03 PM
DICIEMBRE 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	01/10/2019 - 12:03 PM
AGOSTO 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Navas Coque, Richard Wladimir	04/09/2019 - 06:34 PM
JULIO 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Navas Coque, Richard Wladimir	05/08/2019 - 03:41 PM
JUNIO 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Navas Coque, Richard Wladimir	04/07/2019 - 05:30 PM
MAYO 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Navas Coque, Richard Wladimir	03/06/2019 - 12:25 PM
ABRIL 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Navas Coque, Richard Wladimir	02/05/2019 - 10:36 AM
MARZO 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Navas Coque, Richard Wladimir	03/04/2019 - 06:02 PM
FEBRERO 2019: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Navas Coque, Richard Wladimir	01/03/2019 - 03:23 PM
NOVIEMBRE 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	03/12/2018 - 09:47 AM
OCTUBRE 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	05/11/2018 - 08:48 AM
SEPTIEMBRE 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/10/2018 - 10:25 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.		
AGOSTO 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	04/09/2018 - 05:46 PM
JULIO 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:25 PM
JUNIO 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:24 PM
MAYO 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:24 PM
ABRIL 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013 y se firma el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 12 de abril de 2018. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:23 PM
MARZO 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:23 PM
FEBRERO 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:23 PM
ENERO 2018: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 08 de mayo del 2013, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. Adicionalmente existen pagos pendientes de las Planillas de Liquidación y Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 32.562,97 sin IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:20 PM
DICIEMBRE 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción provisional y en espera de la acta de recepción definitiva la misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	02/01/2018 - 04:51 PM
NOVIEMBRE 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción provisional y en espera de la acta de recepción definitiva la misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/12/2017 - 04:01 PM
OCTUBRE 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/12/2017 - 04:01 PM
SEPTIEMBRE 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/10/2017 - 07:13 PM
AGOSTO 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	05/09/2017 - 11:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	Solano Pineda, Oscar Santiago	03/08/2017 - 05:59 PM
JUNIO 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/07/2017 - 11:39 AM
MAYO 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/06/2017 - 05:15 PM
ABRIL 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/05/2017 - 11:12 PM
MARZO 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/04/2017 - 02:39 PM
FEBRERO 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	Zarate Iñiguez, Luis Santiago	01/03/2017 - 05:34 PM
ENERO 2017: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	León Fernández, Jhoer Gustavo	03/02/2017 - 06:15 PM
DICIEMBRE 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/01/2017 - 10:54 AM
NOVIEMBRE 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	León Fernández, Jhoer Gustavo	02/12/2016 - 05:27 PM
OCTUBRE 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	León Fernández, Jhoer Gustavo	01/11/2016 - 11:50 AM
SEPTIEMBRE 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	León Fernández, Jhoer Gustavo	03/10/2016 - 03:54 PM
AGOSTO 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/09/2016 - 04:27 PM
JULIO 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, se cuenta con acta de recepción parcial y NO con definitiva misma que se firmará una vez se cierren los tres contratos (Piedra Fina 2, Reventador, Aguarico), existen pagos pendientes planillas de liquidación definitiva y reajuste definitivo.	León Fernández, Jhoer Gustavo	04/08/2016 - 05:05 PM
JUNIO 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de AGOSTO del 2016	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/07/2016 - 12:36 AM
MAYO 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista	León Fernández, Jhoer Gustavo	04/06/2016 - 07:07 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Julio del 2016		
ABRIL 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Mayo del 2016	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/05/2016 - 08:39 AM
MARZO 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de ABRIL del 2016	León Fernández, Jhoer Gustavo	01/04/2016 - 04:58 PM
FEBRERO 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de ABRIL del 2016	León Fernández, Jhoer Gustavo	07/03/2016 - 12:08 PM
Enero 2016: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Marzo del 2016	León Fernández, Jhoer Gustavo	03/02/2016 - 05:15 PM
Diciembre 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Febrero del 2016	León Fernández, Jhoer Gustavo	06/01/2016 - 11:36 AM
Se procedera a la recepción definitiva, una vez que se concluya con el ultimo puente del contrato global, se prevee para Febrero 2016	León Fernández, Jhoer Gustavo	09/12/2015 - 12:24 PM
Noviembre 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Febrero del 2015	León Fernández, Jhoer Gustavo	09/12/2015 - 12:11 PM
Octubre 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Diciembre del 2015	León Fernández, Jhoer Gustavo	09/11/2015 - 09:19 PM
Septiembre 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Noviembre del 2015	León Fernández, Jhoer Gustavo	08/10/2015 - 09:26 AM
Agosto 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Octubre del 2015	León Fernández, Jhoer Gustavo	06/09/2015 - 07:54 PM
Julio 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Septiembre del 2015.	Zarate Iñiguez, Luis Santiago	07/08/2015 - 01:23 PM
Junio 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como	Navas Coque, Richard Wladimir	06/07/2015 - 02:18 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Agosto del 2015.		
Mayo 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Julio del 2015.	Rendón Martínez, Fernando Ramiro	03/06/2015 - 05:29 PM
Abril 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Junio del 2015.	Rendón Martínez, Fernando Ramiro	05/05/2015 - 04:23 PM
Marzo 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Mayo del 2015.	Rendón Martínez, Fernando Ramiro	05/05/2015 - 04:23 PM
Febrero 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Marzo del 2015.	Navas Coque, Richard Wladimir	09/03/2015 - 08:37 AM
Enero 2015: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Febrero del 2015.	Navas Coque, Richard Wladimir	18/02/2015 - 12:04 PM
Diciembre 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Enero del 2015.	Navas Coque, Richard Wladimir	25/01/2015 - 09:12 PM
Noviembre 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, de no haber cumplido, ésta Dirección se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta fines de Diciembre del 2014.	Navas Coque, Richard Wladimir	10/12/2014 - 06:33 PM
Octubre 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, pero el contratista cuerpo de ingenieros del ejército aún no ha solicitado, por lo tanto mediante Memorando No. MTOP-DIRN-14-146-OF de fecha 04 de Septiembre del 2014, se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta 30 de Noviembre del 2014.	Navas Coque, Richard Wladimir	11/11/2014 - 10:36 AM
Septiembre 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, pero el contratista cuerpo de ingenieros del ejército aún no ha solicitado, por lo tanto mediante Memorando No. MTOP-DIRN-14-146-OF de fecha 04 de Septiembre del 2014, se le solicitó nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva, se prevé contar con el acta hasta 31 de Octubre del 2014.	Navas Coque, Richard Wladimir	13/10/2014 - 02:46 PM
Agosto 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, pero el contratista cuerpo de ingenieros del ejército aún no ha solicitado, por lo tanto mediante Memorando No. MTOP-DIRN-14-146-OF de fecha 04 de Septiembre del 2014, se le solicita nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	15/09/2014 - 07:21 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, pero el contratista cuerpo de ingenieros del ejército aún no ha solicitado, por lo tanto mediante Memorando No. MTOP-DIRN-14-102-OF se le solicita nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente de arreglos observados para posteriormente proceder con la recepción definitiva.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	11/08/2014 - 04:12 PM
Junio 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, pero el contratista cuerpo de ingenieros del ejército aún no ha solicitado, por lo tanto mediante Memorando No. MTOP-DIRN-14-102-OF se le solicita nuevamente al contratista proceder con el trámite correspondiente para la recepción definitiva.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	10/07/2014 - 12:42 PM
Mayo 2014: Los trabajos en el puente se encuentran concluidos, el acta de recepción provisional se legalizó el 08 de mayo del 2013, la recepción definitiva debió realizarse a los 6 meses tal como lo estipula la ley, pero el contratista cuerpo de ingenieros del ejército no ha solicitado, por lo tanto mediante memorando no. Mtop-dirm-14-102-Of del 02 de junio de 2014 se solicitó al contratista se proceda con el trámite correspondiente para la recepción definitiva.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	11/06/2014 - 12:31 PM
ABRIL 2014: Los trabajos en el puente sobre el río Piedra fina 2 se encuentran terminados, y el acta de recepción parcial provisional se firma el 08 de mayo del 2013, la planillas de excedente de obra se encuentra en tramite de pago, es necesario indicar que aun no ha sido solicitada la recepción definitiva, documento indispensable para iniciar con el trámite de recepción definitiva que no ha sido emitida por el cee.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	12/05/2014 - 11:52 AM
MARZO 2014: Los trabajos en el puente sobre el río Piedra fina 2 se encuentran terminados, y el acta de recepción parcial provisional se firma el 08 de mayo del 2013, la planillas de excedente de obra se encuentra en tramite de pago, es necesario indicar que aun no ha sido solicitada la recepción definitiva, documento indispensable para iniciar con el trámite de recepción definitiva que no ha sido emitida por el cee.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	10/04/2014 - 07:55 PM
FEBRERO 2014: Los trabajos en el puente sobre el río Piedra fina 2 se encuentran terminados, y el acta de recepción parcial provisional se firma el 08 de mayo del 2013, la planilla de liquidacion se encuentra en tramite de pago, es necesario indicar que aun no ha sido solicitada la recepción definitiva, documento indispensable para iniciar con el trámite de recepción definitiva que no ha sido emitida por el cee.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	10/03/2014 - 07:47 PM
ENERO 2014: Los trabajos en el puente sobre el río Piedra fina 2 se encuentran terminados, y el acta de recepción parcial provisional se firma el 08 de mayo del 2013, la planilla de liquidacion se encuentra en tramite de pago, es necesario indicar que aun no ha sido solicitada la recepción definitiva, documento indispensable para iniciar con el trámite de recepción definitiva que no ha sido emitida por el cee.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	10/02/2014 - 04:57 PM
DICIEMBRE 2013: Los trabajos en el puente sobre el río Piedra fina 2 se encuentran terminados, y el acta de recepción parcial provisional se firma el 08 de mayo del 2013, la planilla de liquidacion se encuentra en tramite de pago, es necesario indicar que aun no ha sido solicitada la recepción definitiva, documento indispensable para iniciar con el trámite de recepción definitiva que no ha sido emitida por el cee.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	13/01/2014 - 11:07 AM
NOVIEMBRE 2013: Los trabajos en el puente sobre el río Piedra fina 2 se encuentran terminados, y el acta de recepción parcial provisional se firma el 08 de mayo del 2013, la planilla de liquidacion se encuentra en tramite de pago, es necesario indicar que aun no ha sido solicitada la recepción definitiva, documento indispensable para iniciar con el trámite de recepción definitiva que no ha sido emitida por el cee.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	13/01/2014 - 11:07 AM
NOVIEMBRE 2013: LOS TRABAJOS EN EL PUENTE SOBRE EL RÍO PIEDRA FINA 2 SE ENCUENTRAN TERMINADOS, Y EL ACTA DE RECPCION PARCIAL PROVISIONAL SE FIRMA EL 08 DE MAYO DEL 2013, LA PLANILLA DE LIQUIDACION SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE PAGO, ES NECESARIO INDICAR QUE AUN NO HA SIDO SOLICITADA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, DOCUMENTO INDISPENSABLE PARA INICIAR CON EL TRÁMITE DE RECEPCIÓN DEFINITIVA QUE NO HA SIDO EMITIDA POR EL CEE.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	02/12/2013 - 06:13 PM
OCTUBRE 2013: LOS TRABAJOS EN EL PUNTE SOBRE EL RÍO PIEDRA FINA 2 SE ENCUENTRAN TERMINADOS, Y EL ACTA DE RECPCION PARCIAL PROVISIONAL SE FIRME EL 08 DE MAYO DEL 2013, LA PLANILLA DE LIQUIDACION SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE PAGO	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	07/11/2013 - 03:30 PM
SEPTIEMBRE 2013: LOS TRABAJOS EN EL PUNTE SOBRE EL RÍO PIEDRA FINA 2 SE ENCUENTRAN TERMINADOS, Y EL ACTA DE RECPCION PARCIAL PROVISIONAL SE FIRME EL 08 DE MAYO DEL 2013, LA PLANILLA DE LIQUIDACION SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE PAGO	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	07/10/2013 - 12:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La obra se concluye el 26 de Abril y el Acta de recepción Provisional se firma del acta de recepción provisional el 8de Mayo 2013	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	07/10/2013 - 12:33 PM
Julio 2013: LOS TRABAJOS EN EL PUNTE SOBRE EL RÍO PIEDRA FINA 2 SE ENCUENTRAN TERMINADOS, Y EL ACTA DE RECPCION PROVISIONAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	05/08/2013 - 01:02 PM
Junio 2013: LOS TRABAJOS EN EL PUNTE SOBRE EL RÍO PIEDRA FINA 2 SE ENCUENTRAN TERMINADOS, Y EL ACTA DE RECPCION PARCVIAL PROVISIONAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	08/07/2013 - 10:26 AM
MAYO 2013: Se concluye la obra el 26 de abril del 2013 con los respectivos accesos. El acta de recepción provisional se encuentra en proceso.	Cevallos Castillo, Eduardo Ramiro	07/06/2013 - 03:50 PM
ABRIL 2013: Se concluye la obra el 26 de abril del 2013 con los respectivos accesos.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	06/05/2013 - 07:21 PM
MARZO 2013: Se realizan los muros de gaviones y enrocado en ambos estribos del puente.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	26/03/2013 - 03:02 PM
FEBRERO 2013:Se suspende porque el contratista no presenta el estudio de estabilidad de talud en el que justifican la no afectación del cambio de ubicación del puente.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	26/03/2013 - 03:01 PM
ENERO 2013:Fabricación suministro y montaje A36:cantidad de 1943 kg.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	26/03/2013 - 02:54 PM
DICIEMBRE 2012:Fabricación de Acero Estructural ASTM588: 37816.17kg, Subbase Clase 3: 591.36 m3; Subbase:3340m3-km;1 monitoreo de agua; escollera:728 m3.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	26/03/2013 - 02:52 PM
NOVIEMBRE 2012: Se termina infraestructura y fabricación de elementos de acero estructural	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	26/03/2013 - 02:36 PM
OCTUBRE: Se funde parte de la pantalla del estribo izquierdo.	Avilés Castillo, Byron Alfonso	10/12/2012 - 10:52 AM
SEPTIEMBRE 2012: Se funde la tercera parte de la pantalla del estribo derecho y en el estribo izquierdo se funde replantillo. AGOSTO 2012: Configuración de los hierros para los estribos, excavaciones para los 2 estribos, en el estribo derecho se funde replantillo JULIO 2012: Se entrega el anticipo JUNIO 2012: El proyecto se encuentra en revisión en la R2. ABRIL-MAYO - 2012: El proyecto se encuentra en revisión en la R2. MARZO - 2012: El proyecto se encuentra en revisión en la R2. FEBRERO - 2012: El proyecto se encuentra en revisión en la R2. ENERO - 2012: Se entregan estudios a los técnicos de la subsecretaría regional, para su revisión y análisis. DICIEMBRE - 2011: Se continúa con los estudios definitivos. NOVIEMBRE 2011: Se están realizando los estudios definitivos para la construcción de este puente.	Avilés Castillo, Byron Alfonso	07/11/2012 - 03:26 PM

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Tiempo. La Erupción de volcán Reventador CAUSARÍA colapso total de la obra.	04/04/2019	Richard Wladimir Navas Coque	10 %	100	10	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Napo > El Chaco

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Estudios, TDR realizado	1-Solicitud de Información	30/01/2012		30/01/2012		Sí	2.0
2	PLANEACION: Contrato firmado	5-Entregables Intermedios	06/06/2012		06/06/2012		Sí	2.0
3	PLANEACION: Anticipo entregado	5-Entregables Intermedios	10/06/2012		10/06/2012		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Infraestructura: Remoción de subestructuras realizado	5-Entregables Intermedios	16/09/2012		16/09/2012		Sí	6.0
5	EJECUCIÓN: Infraestructura: Acero de refuerzo, hormigón ciclópeo y estructural realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2012		30/10/2012		Sí	13.0
6	EJECUCIÓN: Infraestructura: Excavación y relleno para puentes realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2012		30/10/2012		Sí	14.0
7	EJECUCIÓN: Rubros ambientales: comunicaciones radiales realizado	5-Entregables Intermedios	18/11/2012		18/11/2012		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Superestructura: Suministro, Fabricación y Montaje de acero ASTM A-588 realizado	5-Entregables Intermedios	20/11/2012		20/11/2012		Sí	11.0
9	EJECUCIÓN: Protecciones Hidráulicas: Escollera de piedra suelta realizado	5-Entregables Intermedios	18/12/2012		18/12/2012		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Accesos: Desbroce, desbosque y limpieza realizado	5-Entregables Intermedios	22/12/2012		26/04/2013		Sí	6.0
11	EJECUCIÓN: Superestructura: Acero de refuerzo, Hormigón estructural realizado	5-Entregables Intermedios	25/12/2012		16/04/2013		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Accesos: Sub-base y base realizado	5-Entregables Intermedios	26/12/2012		26/12/2012		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Superestructura: Placas de neopreno, juntas de dilatación realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		30/04/2013		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Accesos: de hormigón asfáltico e=7.5cm mezclado en planta realizado	5-Entregables Intermedios	25/01/2013		25/04/2013		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Accesos: Hormigón estructural realizado	5-Entregables Intermedios	25/01/2013		15/04/2013		Sí	4.0
16	EJECUCIÓN: Señalización: Pintura y tachas realizado	5-Entregables Intermedios	28/01/2013		31/08/2013		Sí	2.0
17	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	9-Entregables Formales	08/05/2013		08/05/2013		Sí	1.0
18	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	12/04/2018		12/04/2018		Sí	1.0
19	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	12/04/2018		12/04/2018		Sí	1.0
20	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	09/09/2019	09/09/2019			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
21	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	07/10/2019	07/10/2019		▼	No	1.0
22	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	21/10/2019	21/10/2019		▼	No	1.0
23	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	04/11/2019	04/11/2019		▼	No	1.5
24	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	18/11/2019	18/11/2019		●	No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	RECORRIDO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	28/09/2015
2	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	31/07/2015
3	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	28/05/2015
4	RECORRIDO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	28/02/2015
5	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/08/2014
6	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/03/2014
7	TERMINACIÓN DE TRABAJOS	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	21/10/2013
8	Obra por concluirse	Carrera Lopez, Milton Salomón	{PR} - Provincia - NAPO	14/05/2013
9	Cumplimiento hitos puente Piedra fina 2	Carrera Lopez, Milton Salomón	{PR} - Provincia - NAPO	09/04/2013
10	Historico - Se encuentra en período de estudio. Se encuentra dentro de la proforma presupuestaria de 2012.	Carrera Lopez, Milton Salomón	{PR} - Provincia - NAPO	08/12/2011

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,109,547.84 **
Costo Total:	1,045,088.63
Total Devengado:	1,032,953.81
% Costo Total Devengado:	98.84 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 98.84 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,522,541.02	104,625.37	0.00	2,627,166.39
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	76,594.03	0.00	76,594.03
Ppto. Codificado	1,899,537.80	76,594.03	0.00	1,976,131.83
Ppto. Comprometido	1,158,529.99	0.00	0.00	1,158,529.99
Planeado - Codificado (2019)		28,031.34		
Programado a Devengar	1,032,953.81	76,594.03	0.00	1,109,547.84
Ppto. Devengado	1,032,953.81	0.00	0.00	1,032,953.81
Pagado Real	283,543.48	0.00	0.00	283,543.48
Estimado a fin de año	* 1,032,953.81	0.00	0.00	1,032,953.81
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	76,594.03	0.00	76,594.03
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	93.10 %
Ppto. Codificado 998	934,908.99	0.00	0.00	934,908.99
Ppto. Devengado 998	199,276.77	0.00	0.00	199,276.77

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

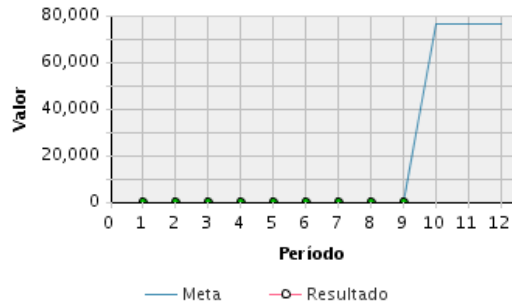

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Oct	76,594.03		76,594.03				
Nov	0.00		76,594.03				
Dic	0.00		76,594.03				
Total	76,594.03	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA RECPEPCION PROVISIONAL CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2	A8.pdf	16/03/2014
2	Anticipo de Obra	G6.pdf	02/12/2016
3	C.1.CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2019 NAPO	C.1.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
4	C2.CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2019 NAPO	C2.CEDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
5	C3.CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2019 NAPO	C3.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MARZO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
6	C4.CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2019 NAPO	C4.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
7	C5.CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2019 NAPO	C5.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
8	C6.CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2019 NAPO	C6.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JUNIO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
9	C7.CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2019 NAPO	C7.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JULIO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
10	C8.CEDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019 NAPO	C8.CEDULA_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
11	C9.CEDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2019 NAPO	C9.CEDULA_PRESUPUESTARIA_SEPTIEMBRE_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
12	Costo mas porcentaje construcción	E5.pdf	05/05/2015
13	Costo mas porcentaje fiscalización	E6.pdf	05/05/2015
14	Cédulas Presupuestarias Puente Piedra Fina 2 vía Baeza - Lago Agrio	I1.pdf	23/12/2016
15	Designacion de Funciones	G7.pdf	02/12/2016
16	Dictamen de Prioridad Puente Piedra Fina 2 en la vía Baeza -Lago Agrio	H9.pdf	23/12/2016
17	FOTOGRAFIA PUENTE PIEDRA FINA 2	A7.JPG	16/03/2014
18	FOTOGRAFIAS DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 CONCLUIDO FISICAMENTE	B4.JPG	16/03/2014
19	Informe ejec. Sitop Abril 2014	C6.pdf	12/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
20	Informe ejec. Sitop Diciembre 2013	B7.pdf	16/03/2014
21	Informe ejec. Sitop ENERO 2014	B9.pdf	16/03/2014
22	Informe ejec. Sitop Febrero 2014	C2.pdf	16/03/2014
23	Informe ejec. Sitop Junio 2013	A4.pdf	16/03/2014
24	Informe ejec. Sitop Marzo 2014	C4.pdf	10/04/2014
25	Informe ejec. Sitop Noviembre 2013	B6.pdf	16/03/2014
26	Informe ejec. Sitop Octubre 2013	B3.pdf	16/03/2014
27	Informe Ejecutivo - SEP 2012	B1.pdf	16/03/2014
28	Informe ejecutivo mes de Agosto 2015	E8.pdf	06/09/2015
29	Informe ejecutivo mes de Diciembre 2015	F3.pdf	06/01/2016
30	Informe ejecutivo mes de Julio 2015	E7.pdf	07/08/2015
31	Informe ejecutivo mes de Junio 2015	E6.pdf	06/07/2015
32	Informe ejecutivo mes de Mayo 2013	A3.pdf	16/03/2014
33	Informe ejecutivo mes de Noviembre 2015	F2.pdf	09/12/2015
34	Informe ejecutivo mes de Octubre 2015	F1.pdf	09/11/2015
35	Informe ejecutivo mes de Septiembre 2015	E9.pdf	08/10/2015
36	Informe ejecutivo Septiembre 2013	A9.pdf	16/03/2014
37	Informe ejecutivo Sitop_ Agosto 2016	G2.pdf	05/09/2016
38	Informe ejecutivo Sitop_ Julio 2016	G1.pdf	04/08/2016
39	Informe ejecutivo Sitop_ Junio 2016	F9.pdf	05/07/2016
40	Informe ejecutivo Sitop_ Noviembre 2016	G5.pdf	02/12/2016
41	Informe ejecutivo Sitop_ Octubre 2016	G4.pdf	01/11/2016
42	Informe ejecutivo Sitop_ Septiembre 2016	G3.pdf	03/10/2016
43	Informe ejecutivo Sitop_Abril 2016	F7.pdf	05/05/2016
44	Informe ejecutivo Sitop_Abril 2015	E4.pdf	05/05/2015
45	Informe Ejecutivo Sitop_Agosto 2014	D1.pdf	15/09/2014
46	Informe ejecutivo Sitop_Diciembre 2014	D9.pdf	29/01/2015
47	Informe ejecutivo Sitop_Diciembre 2016	I2.pdf	05/01/2017
48	Informe ejecutivo Sitop_Enero 2015	E2.pdf	10/03/2015
49	Informe ejecutivo Sitop_Enero 2016	F4.pdf	04/02/2016
50	Informe ejecutivo Sitop_Enero 2017	I3.pdf	03/02/2017
51	Informe ejecutivo Sitop_Febrero 2015	E1.pdf	10/03/2015
52	Informe ejecutivo Sitop_Febrero 2016	F5.pdf	07/04/2016
53	Informe Ejecutivo Sitop_Julio 2014	C9.pdf	15/09/2014
54	Informe ejecutivo Sitop_Marzo 2015	E3.pdf	08/04/2015
55	Informe ejecutivo Sitop_Marzo 2016	F6.pdf	07/04/2016
56	Informe ejecutivo Sitop_Mayo 2015	E5.pdf	03/06/2015
57	Informe ejecutivo Sitop_Mayo 2016	F8.pdf	04/06/2016
58	Informe ejecutivo sitop_Octubre 2014	D6.pdf	11/11/2014
59	Informe Ejecutivo Sitop_Septiembre 2014	D4.pdf	13/10/2014
60	Informe Ejecutivo_Sitop_Noviembre 2014	D7.pdf	10/12/2014
61	Informe Sitop Julio 2013	A6.pdf	16/03/2014
62	Julio 2014_ Pagos según Esigef	C8.pdf	11/08/2014
63	Memorando	A5.pdf	16/03/2014
64	Oficio de Fiscalización ; asunto: Suspensión de Trabajos de soldadura de vigas	A1.JPG	16/03/2014
65	Oficio solicitud de Recepción provisional	A2.pdf	16/03/2014
66	Pagos Esigef_Febrero 2014_Puente Piedra Fina 2	C1.pdf	16/03/2014
67	Pagos segun Esigef Abril 2014	C5.pdf	12/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
68	PAGOS SEGUN ESIGEF DICIEMBRE 2013	B8.pdf	16/03/2014
69	Pagos segun Esigef Marzo 2014	C3.pdf	10/04/2014
70	PAGOS SEGUN ESIGEF NOVIEMBRE 2013	B5.pdf	16/03/2014
71	PAGOS SEGUN ESIGEF OCTUBRE 2013	B2.pdf	16/03/2014
72	Pagos según Esigef Junio 2014	C7.pdf	10/07/2014
73	Pagos según Esigef_Agosto 2014	D2.pdf	15/09/2014
74	Pagos según Esigef_Noviembre 2014	D8.pdf	10/12/2014
75	Pagos según esigef_Octubre 2014	D5.pdf	11/11/2014
76	Pagos según Esigef_Septiembre 2014	D3.pdf	13/10/2014
77	Planilla 1 E INFORMES	G8.pdf	02/12/2016
78	Planilla 10 Liquidación	H9.pdf	02/12/2016
79	Planilla 2 E INFORMES	G9.pdf	02/12/2016
80	Planilla 3 E INFORMES	H1.pdf	02/12/2016
81	Planilla 4 E INFORMES	H3.pdf	02/12/2016
82	Planilla 5 E INFORMES	H4.pdf	02/12/2016
83	Planilla 6 E INFORMES	H5.pdf	02/12/2016
84	Planilla 7 E INFORMES	H6.pdf	02/12/2016
85	Planilla 8 E INFORMES	H7.pdf	02/12/2016
86	Planilla 9 E INFORMES	H8.pdf	02/12/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Calero Cordonez, Olga Margarita	Directora Distrital de Transporte y Obras Públicas del Napo	Directora Distrital de Transporte y Obras Públicas Del Napo	ocalero@mtop.gob.ec	0979242916
Granda Sarango, Rosa Consuelo	Financiera (Encargada)	Analista Administrativo Financiero Distrital (Encargada)	rgranda@mtop.gob.ec	0998627926
Navas Coque, Richard Wladimir	Supervisor	Analista de Infraestructura Distrital 2	rnavas@mtop.gob.ec	0987828118
Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Subsecretario Zonal 2	Subsecretario Zonal 2	rramirez@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
4826_1.jpg	10/12/2014
