

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 1**  
**Dirección Provincial Sucumbíos**

**PROYECTO: K033** MTOP-Construcción del puente Dureno, ubicado en la carretera: Lago Agrio- Cuyabeno -Tarapoa

Líder del Proyecto:	Orellana Sarmiento, Galo Oswaldo (gorellana@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO- CUYABENO - TARAPOA, Provincia - Sucumbíos, STPE - Inversión en 40km de frontera norte
Titular:	Solano Blacio, Wimper Vicente	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	2.37
CUP:	175200000.20.6935	TIR:	24.20 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	967,700.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,442,209.61
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	16/09/2011 - 31/03/2020
Fecha de última actualización:	05/11/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Orellana Sarmiento, Galo Oswaldo	Fecha del siguiente Hito:	06/11/2018


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
<p><b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:</b>          Construcción del puente Dureno, ubicado en la carretera: Lago Agrio- Cuyabeno -Tarapoa</p> <p><b>PRODUCTO / SERVICIO:</b>          El producto esperado, es el puente nuevo.</p> <p><b>LÍNEA BASE:</b>          La línea base para la construcción del puente es cero</p> <p><b>OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:</b>          Construir un puente que brinde mayor fluidez al tráfico vehicular</p> <p><b>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</b>          Disminuir el tiempo de viaje en la carretera Lago Agrio- Cuyabeno -Tarapoa</p> <p>Evitar accidentes de tránsito</p> <p>Constructor: PATE C.A.</p> <p>Valor Contractual:          1'0153 20.97 (valor contractual por puentes: Teteje, Parahuaico 1 y Dureno)</p>
<b>Beneficios Cualitativos</b>
<p>Disminución del tiempo de viaje entre las poblaciones: Lago Agrio, Dureno, Pacayacu, Chiritza, Tarapoa, Puerto el Carmen del Putumayo; disminución de accidentes debido al mal estado de las estructuras existentes, incremento del nivel de servicio.</p>
<b>Tipo de Beneficiario</b>
<p>Habitantes de la Provincia de Sucumbios, Orellana e industrias petroleras asentadas en el sector</p>
<b>Restricciones</b>
<p>Tiempo : El plazo estipulado en el contrato          Costo : El monto contractual para esta obra          Alcance : Construcción del puente sobre el río Dureno</p>

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


### AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 95.26 %  
 Fecha de Inicio: 16/09/2011 Fecha de Fin: 31/03/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

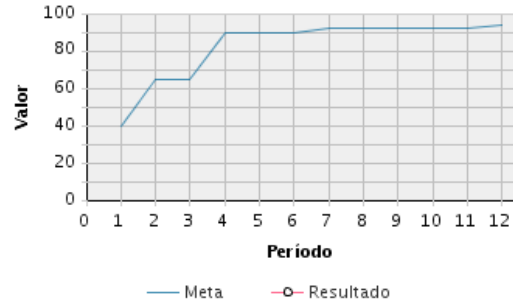

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	40 %	65 %	65 %	90 %	90 %	90 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	94 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Octubre 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.                      El segundo contrato se encuentra finalizada la obra y en proceso de acta de recepción provisional</p>	Orellana Sarmiento, Galo Oswaldo	05/11/2019 - 10:18 AM
<p>Septiembre 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.                      El segundo contrato se encuentra finalizada la obra y en proceso de acta de recepción provisional.</p>	Solano Blacio, Wimper Vicente	04/10/2019 - 03:40 PM
<p>Agosto 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.                      El segundo contrato se encuentra finalizada la obra y en proceso de acta de recepción provisional.</p>	Solano Blacio, Wimper Vicente	05/09/2019 - 06:28 PM
<p>Julio 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.                      El segundo contrato se encuentra suspendida la obra y cuenta con un avance del 85%</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	01/08/2019 - 03:05 PM
<p>Junio 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	02/07/2019 - 08:57 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización, el segundo contrato se encuentra en ejecución con un avance del 65%		
<p>Mayo 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización, el segundo contrato se encuentra en ejecución con un avance del 65%</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/06/2019 - 02:52 PM
<p>Abril 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	02/05/2019 - 09:07 AM
<p>Marzo 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización,</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/04/2019 - 01:46 PM
<p>Febrero 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización,</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	27/02/2019 - 08:00 AM
<p>ENERO 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización,</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/02/2019 - 01:41 PM
<p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	04/01/2019 - 08:59 AM
<p>NOVIEMBRE 2018</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	06/12/2018 - 08:08 AM
<p>Octubre 2018:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización, se solicitó la inclusión en el PAI 2019</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/11/2018 - 09:38 AM
<p>Septiembre 2018:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/10/2018 - 02:52 PM
<p>AGOSTO 2018:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	04/09/2018 - 02:29 PM
<p>Julio 2018:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/08/2018 - 02:45 PM
<p>Junio 2018:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/08/2018 - 02:44 PM
<p>MAYO 2018</p>	Enríquez Ocampos, Robin Cristian	01/06/2018 - 03:47 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, se ha realizado el pago de la liquidación al contratista		
Abril 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, se ha realizado el pago de la liquidación al contratista	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	03/05/2018 - 05:33 PM
Marzo 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, se ha realizado el pago de la liquidación al contratista	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/04/2018 - 12:02 PM
Febrero 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, se ha realizado el pago de la liquidación al contratista	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/04/2018 - 12:01 PM
Enero 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, se ha realizado el pago de la liquidación al contratista	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	08/02/2018 - 10:51 AM
Diciembre 2017:  La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, se ha realizado el pago de la liquidación al contratista	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	08/02/2018 - 10:51 AM
Noviembre 2017:  La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/12/2017 - 05:42 PM
Octubre 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/11/2017 - 04:19 PM
Septiembre 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/10/2017 - 11:17 AM
Agosto 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/09/2017 - 09:53 PM
Julio 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/08/2017 - 02:45 PM
Junio 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	04/07/2017 - 04:04 PM
Mayo 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/06/2017 - 11:27 AM
Abril 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/05/2017 - 01:29 PM
Marzo 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	30/03/2017 - 11:11 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Febrero 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p> <p>Enero 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/03/2017 - 01:41 PM
<p>Dicimembre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Benavides Morillo, Omar Alexander	05/01/2017 - 11:43 AM
<p>Noviembre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/12/2016 - 09:51 AM
<p>Octubre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	31/10/2016 - 12:55 PM
<p>Septiembre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p> <p>Agosto 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p> <p>Julio 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p> <p>Junio 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	29/09/2016 - 12:55 PM
<p>Mayo 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	13/05/2016 - 09:09 AM
<p>Abril 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	25/04/2016 - 12:03 PM
<p>Marzo 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/04/2016 - 05:09 PM
<p>Febrero 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	08/03/2016 - 04:04 PM
<p>Enero 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	13/02/2016 - 01:25 PM
<p>Diciembre 2015:</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	15/12/2015 - 12:32 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p> <p>Noviembre 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>		
<p>Octubre 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta pago correspondiente a la liquidación</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	30/10/2015 - 11:18 AM
<p>Septiembre 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta pago correspondiente a la liquidación</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	07/10/2015 - 08:59 AM
<p>Agosto 2015 La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo, debido a fallas en los estudios</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/09/2015 - 10:06 AM
<p>JULIO 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/08/2015 - 10:45 AM
<p>Junio 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/07/2015 - 11:00 AM
<p>Mayo 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/07/2015 - 10:59 AM
<p>MARZO 2015 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/04/2015 - 12:37 PM
<p>FEBRERO 2015 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/03/2015 - 08:46 AM
<p>ENERO 2015 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/02/2015 - 11:54 AM
<p>DICIEMBRE 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	23/01/2015 - 11:30 AM
<p>NOVIEMBRE 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	23/01/2015 - 11:29 AM
<p>OCTUBRE 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/11/2014 - 12:47 PM
<p>SEPTIEMBRE 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/11/2014 - 12:47 PM
<p>AGOSTO 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/11/2014 - 12:47 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<b>JULIO 2014</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	21/08/2014 - 04:30 AM
<b>JUNIO 2014</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 03:57 PM
<b>MAYO 2014</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 03:57 PM
<b>ABRIL 2014</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 03:57 PM
<b>MARZO 2014</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 10:18 AM
<b>FEBRERO 2014</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 10:18 AM
<b>ENERO 2014</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 10:18 AM
<b>DICIEMBRE 2013</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 10:17 AM
<b>NOVIEMBRE 2013</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 10:17 AM
<b>OCTUBRE 2013</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 10:16 AM
<b>SEPTIEMBRE 2013</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/11/2013 - 02:41 PM
<b>AGOSTO 2013</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/10/2013 - 02:37 PM
<b>JULIO 2013</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/09/2013 - 09:15 AM
<b>JUNIO 2013</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/07/2013 - 09:34 AM
<b>MAYO 2013</b> La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/07/2013 - 09:34 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>ABRIL 2013</b>                      La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.</p>	<p>Arizaga Davila,                      Leoncio                      Abelardo</p>	<p>06/06/2013 -                      08:40 PM</p>
<p><b>MARZO 2013</b>                      La aprobación de los nuevos estudios continúan en la Subsecretaria Regional 1. (Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construcción de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en aprobación en la Subsecretaria regional 1. Se ha realizado la consulta al departamento jurídico del MTOP central, para que emita su criterio jurídico respecto al problema presentado).</p>	<p>Arizaga Davila,                      Leoncio                      Abelardo</p>	<p>24/04/2013 -                      05:26 PM</p>
<p><b>FEBRERO 2013</b>                      Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construcción de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en aprobación en la Subsecretaria regional 1. Se ha realizado la consulta al departamento jurídico del MTOP central, para que emita su criterio jurídico respecto al problema presentado.</p>	<p>Arizaga Davila,                      Leoncio                      Abelardo</p>	<p>24/04/2013 -                      05:25 PM</p>
<p><b>ENERO 2013</b>                      Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construcción de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en aprobación en la Subsecretaria regional 1. Se ha realizado la consulta al departamento jurídico del MTOP central, para que emita su criterio jurídico respecto al problema presentado.</p>	<p>Arizaga Davila,                      Leoncio                      Abelardo</p>	<p>06/03/2013 -                      04:48 PM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2012</b>                      Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construcción de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en revisión en la Dirección Provincial de Sucumbios.</p>	<p>Arizaga Davila,                      Leoncio                      Abelardo</p>	<p>06/03/2013 -                      04:48 PM</p>
<p><b>NOVIEMBRE 2012</b>                      La obra continúa paralizada</p>	<p>Arizaga Davila,                      Leoncio                      Abelardo</p>	<p>09/01/2013 -                      03:07 PM</p>
<p><b>OCTUBRE 2012</b> Contratista : Pate C.A.                      La obra continúa paralizada  <b>SEPTIEMBRE 2012</b> Contratista : Pate C.A.                      La obra continúa paralizada  <b>AGOSTO 2012.-</b> Contratista : Pate C.A.                      Se realizó el montaje y lanzamiento del puente provisional  <b>JULIO 2012.-</b> Contratista : Pate C.A.                      Los trabajos se encuentran suspendidos, debido a fallas técnicas.  <b>JUNIO 2012</b>                      No se puede iniciar los trabajos de construcción debido a que existe la necesidad de colocar un puente tipo bailey que servirá de paso provisional hasta la construcción del puente definitivo. La Dirección Provincial de Sucumbios se encuentra realizando los tramites pertinentes para la obtención del puente bailey a través de Petroecuador.  <b>MAYO 2012</b>                      No se puede iniciar los trabajos de construcción debido a que existe la necesidad de colocar un puente tipo bailey que servirá de paso provisional hasta la construcción del puente definitivo. La Dirección Provincial de Sucumbios se encuentra realizando los tramites pertinentes para la obtención del puente bailey a través de Petroecuador.  <b>ABRIL 2012:</b>                      Se entrega el 13 de Abril el anticipo Todavía el contratista PATECA , no presenta planillas de ejecución de Obra. por ese motivo no se adjunta el reporte ejecutivo del SITOP. Los trabajos empiezan el 25 de Abril Este puente se en cuenta Ubicado en TRANSVERSAL NORTE E10 Lago Agrio- Puerto el Carmen del Putumayo  <b>MARZO 2012:</b>                      Se adjudica el proceso (no de lo declara desierto como estaba previsto)  <b>FEBRERO 2012:</b>                      Se cae el proceso y se espera iniciar nuevamente en los primeros días de Abril del 2012  <b>ENERO 2012:</b>                      En espera de adjudicación en el portal de Compras Publicas  <b>DICIEMBRE 2011:</b>                      Revisión de ofertas, convalidación y calificación y firma de resolución de adjudicación  <b>NOVIEMBRE 2011:</b>                      Publicación en el portal de Compras Publicas  <b>OCTUBRE 2011:</b>                      Certificación Presupuestaria</p>	<p>Arizaga Davila,                      Leoncio                      Abelardo</p>	<p>09/01/2013 -                      03:07 PM</p>



**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
No se pudo construir el puente debido a fallas en los estudios..	04/10/2019	Galo Oswaldo Orellana Sarmiento	10	10	1	0/1

*Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1*

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>3- REGIONAL. * General.</b> Falta de pago de la liquidacion economica	04/10/2019	Galo Oswaldo Orellana Sarmiento	10 %	10	1	0/1

*Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1*

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Cuyabeno

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Dictamen Senplades, obtenido	1-Solicitud de Información	16/09/2011		16/09/2011		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida	1-Solicitud de Información	31/10/2011		31/10/2011		Sí	3.0
3	PLANEACIÓN: Documentos precontractuales, realizado	1-Solicitud de Información	31/10/2011		31/10/2011		Sí	3.0
4	PLANEACIÓN: Publicación en el Portal Compras Públicas	2-Publicación de Pliegos	14/11/2011		14/11/2011		Sí	4.0
5	EJECUCIÓN: Contrato, suscrito	4-Inicio de Trabajo	03/04/2012		03/04/2012		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Acta de adjudicación y publicación en el portal de Compras Publicas, realizado	3-Adjudicación	15/05/2012		08/03/2012		Sí	3.0
7	EJECUCIÓN: Documentos precontractuales (2do. Contrato)	5-Entregables Intermedios	15/08/2018		15/08/2018		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: 2do. contrato, suscrito	4-Inicio de Trabajo	16/10/2018		16/10/2018		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Acta de adjudicación y publicación en el portal de Compras (2do. Contrato)	3-Adjudicación	06/11/2018	06/11/2018			No	4.0
10	EJECUCIÓN: Avance de obra 50% (2do. Contrato) según cronograma	5-Entregables Intermedios	28/02/2019	28/02/2019			No	25.0
11	EJECUCIÓN: Avance de obra 100% (2do. Contrato) según cronograma	5-Entregables Intermedios	30/04/2019	30/04/2019			No	25.0
12	CIERRE: Liquidacion económica (2do. Contrato)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	24/07/2019	24/07/2019			No	2.0


**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y Acta entrega recepción provisional							
13	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva (2do. Contrato)	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
14	CIERRE; Liquidación Económica por Mutuo Acuerdo (1er. Contrato)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
15	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	24/01/2020	24/01/2020			No	2.0
16	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	31/01/2020	31/01/2020			No	1.0
17	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	14/02/2020	14/02/2020			No	1.0
18	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	13/03/2020	13/03/2020			No	1.5
19	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/03/2020	31/03/2020			No	0.5

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	OBRA ABANDONADA	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	27/02/2014
2	Esta obra se encuentra abandonada,	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	01/04/2014
3	Esta obra se encuentra abandonada	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/04/2014
4	. Se sugiere retomar los trabajos, porque la ciudadanía exige que se cumpla con el ofrecimiento de construcción del puente.	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/06/2014
5	Obra abandonada, sin fecha de reinicio de trabajos.	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	31/07/2014
6	OBRA PARALIZADA	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/07/2013
7	Historico - JULIO-2012 obra paralizada. PROBLEMA: según el constructor los estudios de suelos no concuerdan con la realidad del puente. Iniciar los trabajos en cuanto le entreguen los estudios	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	20/07/2012
8	Historico - JUNIO 2012 Se encuentra con ciertos trabajos de resanteo y lastrado de los accesos ya que colocarán un puente provisional hasta construir el definitivo, según indica el resumen ejecutivo	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	15/06/2012
9	Historico - MAYO-2012 Aun no empiezan los trabajos de suelo, solo está realizado la limpieza de la maleza, no hay presencia de trabajadores.	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	10/05/2012
10	Historico - ABRIL-2012 En recorrido realizado por la Señora Gobernadora y el Supervisor de la SNAP se constató que en los puentes Teteye, Dureno y Parahuayco, aun no se inician los trabajos de con	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	25/04/2012

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de obra en la construcción del puente sobre el río Dureno		100.00 %	1	1	01/01/2017	Jul-Sep


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	102,422.13
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,442,209.61 **
Costo Total:	341,407.09
Total Devengado:	992,047.61
% Costo Total Devengado:	290.58 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 290.58 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,170,387.60	1,339,787.48	0.00	3,510,175.08
Ppto. Externo Planeado	341,407.09	0.00	0.00	341,407.09
Ppto. Aprobado Inicial	1,248,606.85	1,339,787.48	0.00	2,588,394.33
Ppto. Codificado	1,466,134.07	1,339,787.48	0.00	2,805,921.55
Ppto. Comprometido	0.00	1,117,264.43	0.00	1,117,264.43
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	1,597,837.00	1,339,787.48	0.00	2,937,624.48
Ppto. Devengado	102,422.13	889,625.48	0.00	992,047.61
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 102,422.13	0.00	0.00	102,422.13
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,495,414.87	1,339,787.48	0.00	2,835,202.35
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 6.41 %	66.40 %	0.00 %	33.77 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

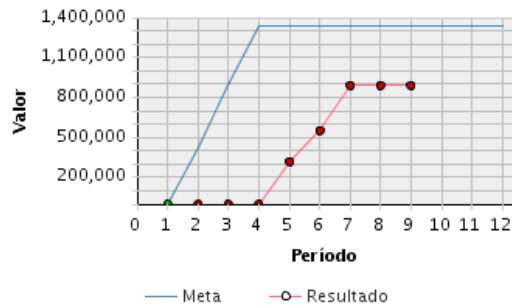

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	425,329.26	0.00	425,329.26	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	467,862.38	0.00	893,191.64	0.00	0.00 %		0.00 %
Abr	446,595.84	0.00	1,339,787.48	0.00	0.00 %		0.00 %
May	0.00	318,630.01	1,339,787.48	318,630.01	23.78 %		23.78 %
Jun	0.00	230,842.94	1,339,787.48	549,472.95	41.01 %		41.01 %
Jul	0.00	340,152.53	1,339,787.48	889,625.48	66.40 %		66.40 %
Ago	0.00	0.00	1,339,787.48	889,625.48	66.40 %		66.40 %
Sep	0.00	0.00	1,339,787.48	889,625.48	66.40 %		66.40 %
Oct	0.00		1,339,787.48				
Nov	0.00		1,339,787.48				
Dic	0.00		1,339,787.48				
<b>Total</b>	<b>1,339,787.48</b>	<b>889,625.48</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	00032 DEVENGADO MES DE SEPTIEMBRE	DEVENGADO_2019-09.PDF	04/10/2019
2	00033 DEVENGADO MES DE AGOSTO	DEVENGADO_2019-08.PDF	05/09/2019
3	00034 DEVENGADO MES DE JULIO	DEVENGADO_2019-07.pdf	01/08/2019
4	00035 DEVENGADO MES DE JUNIO	DEVENGADO_2019-06.pdf	26/07/2019
5	00036 DEVENGADO MES DE MAYO	DEVENGADO_2019-05.pdf	26/07/2019
6	00037 DEVENGADO MES DE ABRIL	DEVENGADO_2019-04.pdf	26/07/2019
7	00038 DEVENGADO MES DE MARZO	DEVENGADO_2019-03.pdf	26/07/2019
8	00039 DEVENGADO MES DE FEBRERO	DEVENGADO_2019-02.pdf	26/07/2019
9	1.01 INFORME EJECUTIVO A OCTUBRE 2016	1.02_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2016_FISCAL_6_PUENTES.pdf	09/11/2016
10	1.1 ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO PUENTES TETEYÉ , PARA HUAICO Y DURENO	Acta_puentes_parte1.pdf	25/05/2016
11	15. INFORME EJECUTIVO A SEPTIEMBRE 2016	INFORME_EJECUTIVO_DURENO_A_SEPTIEMBRE_2016.pdf	29/09/2016
12	16. INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO-FEBRERO 2016	INFORME_SITOP_FEBRERO_2016.pdf	08/03/2016
13	17. INFORME EJECUTIVO SITOP DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2015	INFORME_EJECUTIVO_DURENO.pdf	15/12/2015
14	18. OFICIO DE ACEPTACIÓN DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	A1_OFICIO_DE_ACEPTACIÓN_DE_TERMINACIÓN_POR_MUTUO_ACUERDO.pdf	07/02/2016
15	19. INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2015 DURENO	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MARZO_2015_DURENO.pdf	10/04/2015
16	20. INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2015	A3_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ABRIL_2015.pdf	08/06/2015
17	21. INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2015	A4_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAYO_2015.pdf	08/06/2015
18	22. INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2015	JUNIO.pdf	07/09/2015
19	23. INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2015	JULIO.pdf	07/09/2015
20	24. Informe Ejecutivo Agosto 2015	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2015.pdf	01/09/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
21	25_Informe Ejecutivo Septiembre 2015	A8_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2015.pdf	07/10/2015
22	26_DEVENGADO AL MES DE JULIO	Ejecucion_Enero_-_Julio_2012(1).xls	14/08/2012
23	27_DEVENGADO ES DE JUNIO	Ejecucion_Junio_2012.pdf	09/07/2012
24	28_DEVENGADO MES DE MAYO	DEVENGADOS_MES_DE_MAYO.pdf	08/06/2012
25	29_EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2013	Reporte_Ejecucion_Agosto_2013[1].pdf	09/09/2013
26	30_EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE	Ejecucion_Septiembre_del_2012(1).pdf	05/10/2012
27	31_EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2013	Reporte_de_Ejecucion_mes_de_Junio_2013[1].pdf	05/07/2013
28	32_FOTOGRAFIA AL MES DE MAYO	FOTOGRAFIA_DURENO.pdf	08/06/2012
29	33_INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2013 DURENO	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_JUNIO_2013_teteye_parahuaico_y_dureno.pdf	05/07/2013
30	34_INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE JULIO 2013	informe_ejecutivo_sitop_teteye_parahuaico_y_dureno_julio.pdf	02/08/2013
31	35_INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE SEPT 2013	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPT_teteye_parahuaico_y_dureno.pdf	07/10/2013
32	36_JUSTIFICATIVO PARA SUSPENDER LOS TRABAJOS	JUSTIFICATIVOS_TRABAJOS_SUSPENDIDOS_TETEYE_PATAKAYO_Y_DURENO.pdf	05/07/2013
33	37_JUSTIFICATIVOS DE LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICATIVOS_DE_LA_PARALIZACIÓN_DE_LA_OBRA.pdf	05/09/2012
34	38_OFICIO DE PATE C.A. ACEPTACIÓN DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	aceptacion_de_terminacion_pateca_teteye.pdf	05/07/2013
35	39_OFICIO DONDE SE HACE CONOCER LOS PROBLEMAS TECNICOS	MTOP-CON_SUC-12-40-OF.pdf	14/08/2012
36	40_Proyecto Priorizado SENPLADES	INFORME.doc	03/05/2012
37	A.0040 INFORME EJECUTIVO dICIEMBRE 2017	Informe_ejecutivo_id_4529.pdf	05/01/2018
38	A.0041 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	informe_ejecutivo_noviembre_id_4529.pdf	04/12/2017
39	A.0042 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017_PROYECTO_K032.pdf	03/11/2017
40	A.0043 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017_ID_4529.pdf	02/10/2017
41	A.0045 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2017	ID_CONTRATO_4529.pdf	05/09/2017
42	A.0046 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2017	INFORME_SITOP_JULIO_2017_ID_4529.pdf	02/08/2017
43	A.0047 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2017	INFORME_SITOP_JUNIO_2017_ID_4529.pdf	04/07/2017
44	A.048 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017_ID_4529.pdf	01/06/2017
45	A.049 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2017	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017_PROYECTO_4529.pdf	06/05/2017
46	A.050 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017_PROYECTO_4529.pdf	01/03/2017
47	A.1 INFORME EJECUTIVO DURENO A MAYO 2016	INFORME_EJECUTIVO_DURENO_A_MAYO_2016.pdf	13/05/2016

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Supervisor			
	Administrador			
Benavides Morillo, Omar Alexander	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Zonal 1	obenavides@mtop.gob.ec	023974600
López Mendoza, Cristhian Manuel	Líder de proyecto	Analista de Infraestructura	cmlopez@mtop.gob.ec	062991931 ext 13710
Noroña, Víctor	Supervisor Financiero	Analista	vnorona@mtop.gob.ec	Ext. 13706
Vinces Navarrete, Julio Cesar	Director Distrital Sucumbíos	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Sucumbíos	jcvinces@mtop.gob.ec	062991930 Ext 13701

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
30719_1.jpg	06/10/2015
