

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 7**  
**Dirección Provincial Loja**

**PROYECTO: K039 MTOP - Centro Binacional de atención en Frontera -CEBAF- Macará**

Líder del Proyecto:	Vega Silva, Andrea Karla (avega@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jaramillo Cantos, Luis Alberto	Programas Relacionados:	CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA - CEBAF- MACARA
Titular:	Rojas Cazar, Walter Emilio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	50590000.1504.6387	TIR:	12.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.01
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	14,043,658.83
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	23/10/2014 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	04/10/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Rojas Cazar, Walter Emilio	Fecha del siguiente Hito:	25/05/2019

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN: La zona del proyecto está localizada al sur occidente de la ciudad de Loja, cuyo emplazamiento se ubica a una distancia de 140 Km desde la ciudad de Loja, en el sector del puente internacional de Macará y tiene las siguientes coordenadas:

LATITUD LONGITUD  
 S 9514399.14 E 614940.28

Este proyecto tiene una población del área de influencia directa proyectada al año 2010 de 19.908 habitantes que se considera como población objetivo que se beneficiarán con la construcción del Centro Binacional de atención en fronteras y mejoramiento de las vías de acceso e internas.

Como beneficiarios indirectos se considera que este proyecto sirve a población flotante (turistas, comerciantes eventuales, romeriantes de ambos países, etc.) con 439.098 hab.

PRODUCTO: Construcción y Operación del Centro Binacional de atención de Frontera -CEBAF- Macará - La Tina

LINEA BASE: El proyecto se encuentra a 200 metros del puente Internacional de Macará. El 3 de febrero de 2011 se firmó el contrato entre La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (CNTTTSV), denominada en la actualidad como Agencia Nacional de Tránsito (ANT), pero se terminó por mutuo acuerdo el contrato de obra y de fiscalización. Mediante Decreto Ejecutivo 957 de fecha 08/dic del 2011, se encarga al MTOP la Planificación, administración y ejecución de la obra de infraestructura de los CEBAF. El proyecto es un compromiso Binacional por lo que el MTOP procedió a contratar el CEBAF Macará- La Tina el 27 de febrero de 2015.

Áreas de los Componentes del Centro Binacional CEBAF - MACARA.

1. Área de planta baja bloque principal; A=1582,75 m2.
2. Área de primera planta alta bloque principal; A= 325,83 m2
3. Área de segunda planta alta bloque principal; A=304,34 m2
4. Área de tercera planta alta bloque principal; A=48,79 m2
5. Área control de manifiestos; A= 358,52 m2
6. Área de pesos y medidas; A = 19,70 m2
7. Área de bodegas; A=467,88 m2
8. Área de generador y transformador; A=51,91 m2
9. Área de garita de control; A=13,28 m2
10. Área de restaurant para personal ; A= 213,94 m2
11. Área útil CEBAF; A= 3386,94 m2
12. Área bruta CEBAF; A = 4414,31 m2

De acuerdo a la topología se producirá y organizará todos los espacios necesarios en donde se efectúen eficazmente todas las actividades implícitas de un control integral eficiente, adoptando además los espacios mínimos recomendados por la Comunidad.

Entre ellos:

- . Vías de acceso
- . Cercos perimétricos
- . Edificación administrativa

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

- . Galpón o depósito con su respectivo patio de maniobras
- . Andenes y equipos para el movimiento de la carga
- . Áreas para inspección física de mercancías
- . Patio(s) de estacionamiento para los vehículos de transporte Internacional de pasajeros y mercancías
- . Laboratorio para el control fito y zoonosanitario
- . Área para realizar labores de tratamiento e incineración
- . Área de control de viajeros, requisitos migratorios, aduaneros
- . Filtros y revisión de equipaje. (Narcóticos, Fito y zoonosanitario, Mercancías ilegales y peligrosas)
- . Área de control de vehículos particulares
- . Servicio de recaudación de aranceles y tributos (Banco)
- . Servicios Sanitarios para usuarios
- . Cafetería / Restaurante únicamente para el personal del CEBAF
- . Servicios para la gestión admin

OBJETIVO GENERAL: Construcción del Centro Binacional de atención de Frontera -CEBAF- Macará - La Tina

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Los objetivos específicos del CEBAF, son los siguientes:

- Obra Vial
- Construcción de Vías internas de circulación

CONTRATISTA: Consorcio A.S.  
 FISCALIZADOR: Ing. Cecibel Vargas  
 SUPERVISOR: Ing. Andrea Vega  
 ADMINISTRADOR: Director Distrital de Loja. Ing. Walter Rojas  
 FINANCIAMIENTO: Presupuesto General del Estado  
 MONTO DE INVERSIÓN: USD. 12'343.178,58

**Beneficios Cualitativos**

Contribuir al Plan Maestro Vial Nacional en concordancia con la iniciativa para la integración de la Infraestructura, para que exista una integración regional, Provincial y Cantonal, con lo cual se mejorarán las condiciones socio - económicas y ambientales del sector.

**Tipo de Beneficiario**

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC y el VII censo de población y VI de vivienda, la población del área de influencia directa proyectada al año 2010 es de 19.908 habitantes que se considera como población objetivo que se beneficiarán con la construcción del Centro Binacional de atención en fronteras y mejoramiento de las vías de acceso e internas. Como beneficiarios indirectos se considera que este proyecto sirve a población flotante (turistas, comerciantes eventuales, romeriantes de ambos países, etc.), 439.098 habitantes


**Restricciones**

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 6 meses. COSTO: el Valor monetario del presupuesto límite previsto para su realización es de \$ 12'343.178.58. ALCANCE: Construcción del Centro Binacional de atención de Frontera -CEBAF- Macará - La Tina, su Obra Vial y la Construcción de Vías internas de circulación . RECURSOS: equipo técnico ofertado, fiscalización, administración, trabajadores de la construcción, empleados administrativos, materiales, equipos y maquinaria. CALIDAD: la calidad de los materiales y de los equipos informáticos deberán cumplir las especificaciones del proyecto, caso contrario puede afectar el buen funcionamiento del centro. RIESGOS: el incumplimiento de las especificaciones técnicas pueden conllevar a no cumplir con el objetivo de este proyecto.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 96.99 %  
 Fecha de Inicio: 23/10/2014 Fecha de Fin: 31/12/2019

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

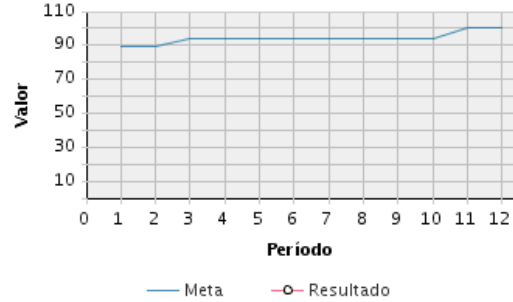

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	89 %	89 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2019: OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DE 2019, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUÉS QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, ACTUALMENTE PERSISTEN PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO Y OTRAS PENDIENTES DE ACREDITACIÓN. SE REQUIERE UNA REPROGRAMACIÓN DE HITOS, MAS NO SE LA PUEDE REALIZAR DEBIDO A QUE NO SE ESTABLECE LA FECHA DE REINICIO DE OBRA PARA DETERMINAR FECHAS DE NUEVOS HITOS.	Vega Silva, Andrea Karla	02/10/2019 - 10:51 AM
AGOSTO 2019: OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DE 2019, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUÉS QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO Y OTRAS PENDIENTES DE ACREDITACIÓN.	Vega Silva, Andrea Karla	05/09/2019 - 11:42 AM
JUUIO 2019: OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DE 2019, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUÉS QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, UNAS PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO Y OTRAS EN TRAMITE DE APROBACIÓN.	Vega Silva, Andrea Karla	02/08/2019 - 10:04 AM
JUNIO 2019: OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DE 2019, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUÉS QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, UNAS PLANILLAS PENDIENTES DE ACREDITACIÓN POR EL MEF Y OTRAS PENDIENTES DE PAGO.	Vega Silva, Andrea Karla	04/07/2019 - 03:08 PM
MAYO 2019: OBRA SUSPENDIDA, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUES QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, UNAS PLANILLAS PENDIENTES DE ACREDITACIÓN Y OTRAS PENDIENTES DE PAGO, DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	Rojas Cazar, Walter Emilio	04/06/2019 - 12:29 PM
ABRIL 2019: OBRA SUSPENDIDA, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUES QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO DEL 2018 DEBIDO A LA NO ASIGNACIÓN DE RECURSOS A ESTA DIRECCIÓN EN LAS FUENTES 998 E IVA, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUEDE REALIZAR EL PAGO DE ESTAS PLANILLAS..	Vega Silva, Andrea Karla	02/05/2019 - 04:58 PM
MARZO 2019: OBRA EN EJECUCIÓN NORMAL, CON PLAZO VIGENTE HASTA 25/05/2019. PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO DEL 2018 DEBIDO A LA NO ASIGNACIÓN DE RECURSOS A ESTA DIRECCIÓN EN LAS FUENTES 998 E IVA, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUEDE REALIZAR EL PAGO DE ESTAS PLANILLAS..	Vega Silva, Andrea Karla	03/04/2019 - 09:19 AM
FEBERO 2019: CON LA EFECTIVIZACIÓN DEL ACTICIPO OBRA REINICIA SUS ACTIVIDADES DESDE EL 07/02/2019 DEL 2019, CON PLAZO VIGENTE HASTA 25/05/2019. PLANIOLLAS PENDIENTES DE PAGO DEBIDO A LA NO ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	Vega Silva, Andrea Karla	01/03/2019 - 09:37 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Ener 2019: Una vez que se ha regularizado la suscripción de los actos administrativos se reactivado la obra desde el 15 de noviembre de 2018, por lo tanto el proyecto se encuentra con una ejecución a partir de esta fecha. El pago de planillas aprobadas por la unidad administrativa no se pudo llevar a término debido a que MEF deshabilitó pagos con fuente998, el 28 de diciembre del 2018 se realizó el pago del anticipo por parte del MTOP, pero su acreditación no se realiza hasta la fecha, todo esto incumple lo establecido contractualmente, sumado a esto están pendientes de acreditación de 4 planillas, lo que dificulta la ejecución de la obra, por lo que dando cumplimiento a lo establecido contractualmente se suspende la obra hasta el pago de lo adeudado y anticipo del CC04.	Vega Silva, Andrea Karla	04/02/2019 - 02:34 PM
Diciembre 2018: Una vez que se ha regularizado la suscripción de los actos administrativos se reactivado la obra desde el 15 de noviembre de 2018, por lo tanto el proyecto se encuentra con una ejecución a partir de esta fecha. El pago de planillas aprobadas por la unidad administrativa no se pudo llevar a término debido a que MEF deshabilitó pagos con fuente998, el 28 de diciembre del 2018 se realizo el pago del anticipo por parte del MTOP, pero su acreditación no se realiza, todo esto incumple lo establecido contractualmente, sumado a esto están pendientes de acreditación las planillas 4 planillas, lo que dificulta la ejecución por parte de la contratista llevandolos a la presentar la solicitud de paralización, misma que se encuentra en estudio de ser o no aprobada por parte de fiscalización.	Vega Silva, Andrea Karla	02/01/2019 - 03:15 PM
Noviembre 2018: Una vez que se ha regularizado la suscripción de los actos administrativos se reactivado la obra desde el 26 de noviembre de 2018, por lo tanto el proyecto se encuentra en ejecución a partir de esta fecha.	Rojas Cazar, Walter Emilio	05/12/2018 - 04:25 PM
<p>Octubre 2018: En vista de que la asignación presupuestaria no se realizó oportunamente para el CC03, se vio la necesidad de dividirlo a este en dos, en el CC03 y CC04, es así que el CC03 actualmente en trámite ahora no contempla incremento de monto per si ampliación de plazo de 60 días. Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y sin incremento de monto.</p> <p>Ya se realizó la asignación de 1.86MM USD para suscripción el CC03 para trámite del CC04.</p> <p>Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto</p>	Vega Silva, Andrea Karla	05/11/2018 - 08:17 AM
<p>septiembre 2018: Debido a que matriz Quito hasta la fecha no hace la asignación d erecursos para la suscripcion del CC03, se vio la necesidad de dividirlo a este en dos, en el CC03 y CC04, es así que el CC03 actualmente en trámite ahora no contempla incremento de monto per si ampliación d eplazo de 60 días. Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y sin incremento de monto.</p> <p>El CC04 quedará pendiente hasta que haya la asignación de 2.32MM USD para su certificación y posterior trámite.</p> <p>Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto</p>	Vega Silva, Andrea Karla	02/10/2018 - 04:46 PM
AGOSTO 2018: Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto	Vega Silva, Andrea Karla	03/09/2018 - 12:27 PM
JULIO 2018: Obra en ejecución, obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto	Vega Silva, Andrea Karla	02/08/2018 - 12:43 PM
JUNIO 2018: Obra en ejecución, obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto	Vega Silva, Andrea Karla	05/07/2018 - 05:41 PM
MAYO 2018: Obra en ejecución, obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto	Vega Silva, Andrea Karla	04/06/2018 - 12:37 PM
ABRIL 2018: Obra en ejecución, los trabajos se realizan con normalidad, con acta 451 firmada se da ampliación de plazo hasta el 04 de junio del 2018. En trámite contrato complementario Nro.03, variación de cantidades y rubros nuevos	Vega Silva, Andrea Karla	02/05/2018 - 10:11 AM
ENERO-MARZO 2018: Obra en ejecución, los trabajos se realizan con normalidad, con acta 451 firmada se da ampliación de plazo hasta el 04 de junio del 2018.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	03/04/2018 - 09:27 AM
dic 2017: se levanta la paralización dle proyecto el 26 de diciembre del 2017. con ampliación d eplazo de 45 días, pendiente liquidación de plazo, se regularizan los trabajos en Cebaf-Macará	Vega Silva, Andrea Karla	02/01/2018 - 11:41 AM
Nov 2017: Actualmente el proyecto se encuentra paralizado.	Vega Silva, Andrea Karla	04/12/2017 - 05:03 PM
Oct 2017: Actualmente el proyecto se encuentra reactivado desde el 11/10/2017, se realizan trabajos eléctricos y eléctricos, además de trabajos de imprimación de vías.	Vega Silva, Andrea Karla	01/11/2017 - 08:22 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEP 2017: Actualmente el proyecto se encuentra paralizado por falta de pago de planillas, por parte del MTOP_Dirección Distrital de Loja se realizaron los pagos de planillas pendientes el día 17/08/2017, se requiere que MEF acredite dichos fondos urgentemente a la contratista, para levantar la paralización de la obra.	Ludeña Suescun, Rusbel Enrique	03/10/2017 - 09:08 AM
AGOSTO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra paralizado por falta de pago de planillas.. 1) Se realizaron los pagos de planillas pendientes el día 17/08/2017 por parte de la Dirección Distrital de Loja, se requiere que MEF acredite dichos fondos urgentemente. 2) Con fecha 29 de marzo de 2017 se da la suspensión indefinida del proyecto, hasta que la comisión 451 resuelva sobre la solicitud de ampliación del plazo contractual y las condiciones climáticas mejoren. Con fecha 28 de junio de 2017, se reúne la Comisión 451 en Quito y celebran el acta, en la cual levantan la suspensión y aprueban la variación de cantidades, creación de rubros nuevos sin incremento de monto e incremento de plazo en sesenta días, tomando como nueva fecha para la terminación de los trabajos el 27 de agosto de 2017. Con memorando MTOP-DDL-2017-1351-ME, del 04 de agosto 2017 se da paso a la paralización legal de la obra hasta que de se de el pago de haberes pendientes al contratista. Con oficio Nro. 391-CONSORCIO A.S-CEBAF, del 04 de agosto, se solicita ampliación de 45 días a partir de la cancelación y acreditación de los haberes pendientes de pago. Por lo que urgentemente se requiere la colaboración del MEF. El Mtop es únicamente la ejecutora de la infraestructura, los responsable de los mecanismos de administración son INMOBILIAR y CANCELILLERIA de acuerdo a la reunión realizada entre Cancillería, MTOP, INMOBILIAR Y SENPLADES que así lo establecieron.	Vega Silva, Andrea Karla	05/09/2017 - 12:44 PM
JULIO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución desde el 27 de junio del 2017, con un avance físico de la obra del 84%, con plazo vigente según acta 451 hasta el 28 de agosto del 2017. Planillas pendientes de pago por falta de asignación de recursos 998, por lo que la contratista solicitó la paralización legal de los trabajos por incumplimiento en el pago por parte de la contratista.	Vega Silva, Andrea Karla	02/08/2017 - 03:44 PM
JUNIO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario Nro.2.	Vega Silva, Andrea Karla	05/07/2017 - 08:35 AM
MAYO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario Nro.2.	Vega Silva, Andrea Karla	05/06/2017 - 10:38 AM
abril 2017  Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-381-ME, de fecha 28 de octubre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual, referente a la Propuesta de Hormigon 350 Kg/cm2 en parqueos del CEBAF, Macara - La Tina. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	Ocampo Veintimilla, Danny Andrei	05/05/2017 - 10:09 AM
Noviembre 2016: Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-381-ME, de fecha 28 de octubre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual, referente a la Propuesta de Hormigon 350 Kg/cm2 en parqueos del CEBAF, Macara - La Tina. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	13/12/2016 - 09:37 AM
Octubre 2016: Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-381-ME, de fecha 28 de octubre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual, referente a la Propuesta de Hormigon 350 Kg/cm2 en parqueos del CEBAF, Macara - La Tina. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	08/11/2016 - 07:51 PM
Septiembre 2016: Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-348-ME, de fecha 28 de septiembre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información solicitada desde matriz para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	10/10/2016 - 09:05 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Agosto 2016: En trámite Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	09/09/2016 - 12:55 PM
Julio 2016: En trámite Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	09/08/2016 - 05:30 PM
Junio 2016: Se reinician los trabajos de obra con una ampliación de 60 días, a partir del 8 de junio del 2016. Se legaliza Orden de Cambio No. 1 para ampliación de plazo.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	05/07/2016 - 03:24 PM
Mayo 2016: Mediante reunión de la comisión 451, aprobó una ampliación de 60 días para terminar los trabajos objeto del contrato, cuyo plazo corre a partir de que se efectivicen el pago correspondiente de cuatro planillas por parte del Ministerio de Finanzas. Actualmente el proyecto continúa suspendido.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	02/06/2016 - 04:45 PM
Abril 2016: Mediante reunión de la comisión 451, aprobó una ampliación de 60 días para terminar los trabajos objeto del contrato, cuyo plazo corre a partir de que se efectivicen el pago correspondiente de cuatro planillas por parte del Ministerio de Finanzas. Actualmente el proyecto continúa suspendido. Marzo 2016: Mediante reunión de la comisión 451, aprobó una ampliación de 60 días para terminar los trabajos objeto del contrato, cuyo plazo corre a partir de que se efectivicen el pago correspondiente de cuatro planillas por parte del Ministerio de Finanzas. Actualmente el proyecto continúa suspendido.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	04/05/2016 - 03:00 PM
Febrero 2016: Hasta la presente fecha el Ministerio de Finanzas no efectiviza el pago de las cuatro planillas realizadas por MTOP a la Contratista, por lo que no se reinician los trabajos con los 60 días de ampliación conforme aprobación de Comisión 451.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	07/03/2016 - 04:14 PM
Enero 2016: Comisión 451, aprueba ampliación de plazo por 60 días.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	11/02/2016 - 12:53 PM
Diciembre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	30/12/2015 - 06:32 PM
Noviembre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	30/12/2015 - 06:32 PM
Octubre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	30/12/2015 - 06:32 PM
Septiembre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	30/12/2015 - 06:32 PM
Agosto 2015: Se culminan los trabajos de colocación de estructura metálica en el edificio central, mediante Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, notifica al contratista sobre la suspensión de los trabajos hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	30/12/2015 - 06:31 PM
Julio 2015: Se continúan realizando trabajos de colocación de estructura metálica, la contratista solicita suspensión de trabajos por cuanto hasta la presente fecha no se le han cancelado ninguna planilla.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	30/12/2015 - 06:31 PM
Junio 2015: Se continúan realizando trabajos de colocación de estructura metálica, construcción de tanque séptico.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	30/12/2015 - 06:31 PM
Mayo 2015: Con los contrapisos fundidos se inician trabajos de colocación de estructuras metálicas.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	30/12/2015 - 06:30 PM
Abril 2015: Se realizan trabajos preliminares como movimiento de tierras, construcción de bodegas para campamento y adquisición de materiales para colocación de estructuras metálicas.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	30/12/2015 - 06:29 PM
Marzo 2015: Se entrega el anticipo a la contratista con fecha 25 de marzo del 2015 con lo cual inician los trabajos.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	30/12/2015 - 06:29 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Febrero 2015: Se suscribe acta de adjudicación y contrato para construcción del CEBAF con la contratista CONSORCIO A.S	Bustamante Rivera, Esner Fidel	30/12/2015 - 06:28 PM
Enero 2015: El proceso precontractual se encuentra en proceso de adjudicación.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	30/12/2015 - 06:28 PM

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de asignación presupuestaria suficiente.	16/09/2019	Andrea Karla Vega Silva	10	10	1	0/1

*Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1*

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>2- NACIONAL. Económico.</b> La falta de recursos económicos CAUSARÍA retraso en la entrega de la obra	18/09/2019	Andrea Karla Vega Silva	20 %	80	16	0/1

*Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1*

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > Loja > Macara

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Planificación: Certificación Presupuestaria ejecutada	1-Solicitud de Información	23/10/2014		23/10/2014		Sí	1.0
2	Planificación: Documentos, contractuales, terminados	1-Solicitud de Información	23/10/2014		23/10/2014		Sí	1.5
3	Planificación: Publicación en Portal de Compras Publicas, concluidas	2-Publicación de Pliegos	24/10/2014		24/10/2014		Sí	1.5
4	Planificación: Acta de Adjudicación, ejecutada	3-Adjudicación	05/02/2015		05/02/2015		Sí	2.0
5	Ejecución: Suscripción de Contrato, ejecutado	3-Adjudicación	27/02/2015		27/01/2015		Sí	2.0
6	Ejecución: Entrega de anticipo, ejecutado	4-Inicio de Trabajo	25/03/2015		25/03/2015		Sí	4.0
7	Ejecución: Inicio de Trabajos, ejecutado	4-Inicio de Trabajo	25/03/2015		25/03/2015		Sí	2.0
8	Ejecución: Trabajos Preliminares, movimiento de tierras	5-Entregables Intermedios	22/07/2015		22/07/2015		Sí	3.0
9	Ejecución: Obras de calzada fase 1	5-Entregables Intermedios	19/11/2015		19/11/2015		Sí	5.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
10	Ejecución: Obras Estructurales	5-Entregables Intermedios	27/11/2015		27/11/2015		Sí	15.0
11	Ejecución: Instalaciones Hidro-sanitarias	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	6.0
12	Ejecución: Construcción de garitas	5-Entregables Intermedios	09/09/2016		09/09/2016		Sí	6.0
13	Ejecución: Instalaciones electricas	5-Entregables Intermedios	10/10/2016		10/10/2016		Sí	6.0
14	Ejecución: Instalaciones Electrónicas y Mecánicas	5-Entregables Intermedios	10/10/2016		10/10/2016		Sí	7.0
15	Ejecución: Obras arquitectonicas	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	10.0
16	Ejecución: Acabados arquitectónicos	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		31/07/2018		Sí	10.0
17	Ejecución: Obras de calzada fase 2	5-Entregables Intermedios	30/12/2018	25/05/2019			No	2.0
18	Ejecución: Señalización	5-Entregables Intermedios	30/12/2018	25/05/2019			No	2.0
19	Cierre: Liquidación Económica del Contrato ejecutada	5-Entregables Intermedios	01/01/2019	25/05/2019			No	3.0
20	Cierre: Recepción provisional del proyecto y acta de recepción provisional	9-Entregables Formales	31/03/2019	30/06/2019			No	5.0
21	Completado: Recepción definitiva del proyecto y acta de recepción, ejecutado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2019	31/12/2019			No	6.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de área con capa de rodadura colocado en Vías internas		100.00 %	0	0	01/01/2019	Septiembre
2	Porcentaje de Equipamiento tecnológico colocado		100.00 %	1	1	01/01/2019	Septiembre



**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	3,702,953.57
Estimado Al Fin Del Proyecto:	14,043,658.83 **
Costo Total:	12,343,178.58
Total Devengado:	13,308,816.25
% Costo Total Devengado:	107.82 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 107.82 %

**Perfil Económico 2019**

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	21,596,865.47	6,211,624.63	0.00	27,808,490.10
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	2,251,208.49	901,743.70	0.00	3,152,952.19
Ppto. Codificado	16,520,652.64	901,743.70	0.00	17,422,396.34
Ppto. Comprometido	14,644,512.06	0.00	0.00	14,644,512.06
Planeado - Codificado (2019)		5,309,880.93		
Programado a Devengar	10,128,536.42	1,803,487.40	0.00	11,932,023.82
Ppto. Devengado	12,240,171.43	1,068,644.82	0.00	13,308,816.25
Pagado Real	7,200,569.02	0.00	0.00	7,200,569.02
Estimado a fin de año	* 12,240,171.43	0.00	0.00	12,240,171.43
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-2,111,635.01	1,803,487.40	0.00	-308,147.61
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 120.85 %	59.25 %	0.00 %	111.54 %
Ppto. Codificado 998	1,859,349.36	0.00	0.00	1,859,349.36
Ppto. Devengado 998	1,710,118.39	0.00	0.00	1,710,118.39

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019**

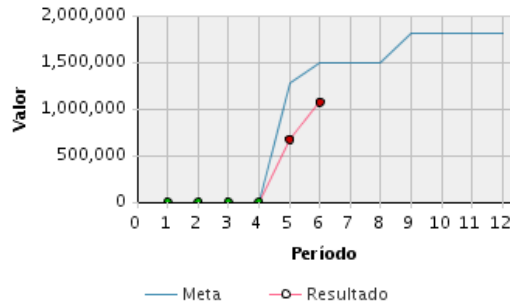

**Presupuesto Mensual 2019**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	1,274,465.74	672,323.11	1,274,465.74	672,323.11	52.75 %		37.28 %
Jun	219,569.13	396,321.71	1,494,034.87	1,068,644.82	71.53 %		59.25 %
Jul	0.00		1,494,034.87				
Ago	0.00		1,494,034.87				
Sep	309,452.53		1,803,487.40				
Oct	0.00		1,803,487.40				
Nov	0.00		1,803,487.40				
Dic	0.00		1,803,487.40				
<b>Total</b>	<b>1,803,487.40</b>	<b>1,068,644.82</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
16	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
17	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
18	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		AVANCE_SEMANAL_OBRA_CEBAF_05_09_2017.xlsx	03/10/2017
2	A.1 Dictamen de prioridad SENPLADES	Dictamen_de_prioridad__SENPLADES_del_CEBAF.pdf	31/05/2015
3	A.2 Informe ejecutivo febrero-2015	Infor-ejecutivo_febrero-2015.pdf	10/12/2015
4	A.3 Informe ejecutivo marzo-2015	Infor-ejecutivo_marzo-2015.pdf	10/12/2015
5	A.4 Informe ejecutivo abril-2015	Infor-ejecutivo_abril-2015.pdf	10/12/2015
6	A.5 Informe ejecutivo mayo-2015	Infor-ejecutivo_mayo-2015.pdf	10/12/2015
7	A.6 Informe ejecutivo junio-2015	Infor-ejecutivo_junio-2015.pdf	10/12/2015
8	A.7 Informe ejecutivo julio-2015	Infor-ejecutivo_julio-2015.pdf	10/12/2015
9	A.8 Informe ejecutivo agosto-2015	Infor-ejecutivo_agosto-2015.pdf	10/12/2015
10	A.9 Informe ejecutivo septiembre-2015	Infor-ejecutivo_septiembre-2015.pdf	10/12/2015
11	B1 Informe ejecutivo octubre-2015	Infor-ejecutivo_octubre-2015.pdf	10/12/2015
12	B2 Informe ejecutivo noviembre-2015	Infor-ejecutivo_noviembre-2015.pdf	10/12/2015
13	B3 Convocatoria	CONVOCATORIA_CEBAF.pdf	31/05/2015
14	B4 Contrato	01-contrato.pdf	31/05/2015
15	B5 Memorando nombrando Fiscalizador y Supervisor	MTOP-DPL-2015-365-ME.pdf	31/05/2015
16	B6 Memorando nombrando al nuevo fiscalizador	MTOP-DPL-2015-562-ME.pdf	31/05/2015
17	B7 ACTA 451 CEBAF - MACARA - LA TINA	ACTA_451_CEBAF_-_MACARA_-_LA_TINA.pdf	05/04/2016
18	B8 Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-348-ME	Memorando_Nro._MTOP-EITZ7-2016-348-ME.pdf	10/10/2016
19	B9 Proyecto postulado en SipeIP	Proyecto_postulado_en_SipeIP.pdf	02/10/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
20	C1 Informe Ejecutivo Enero 2016	B.1_Informe_Ejecutivo_Enero_2016.pdf	07/03/2016
21	C2 Informe Ejecutivo Febrero 2016	B.2_Informe_Ejecutivo_Febrero_2016.pdf	07/03/2016
22	C3 Informe Ejecutivo Marzo 2016	B.3_Informe_Ejecutivo_Marzo_2016.pdf	05/04/2016
23	C4 Informe Ejecutivo Abril 2016	Informe_Ejecutivo_Abril_2016.pdf	04/05/2016
24	C5 Informe Ejecutivo Mayo 2016	Informe_Ejecutivo_Mayo_2016.pdf	03/06/2016
25	C6 Informe Ejecutivo Julio 2016	Informe_Ejecutivo_Julio_2016.pdf	11/08/2016
26	C7 Informe Ejecutivo Agosto 2016	Informe_Ejecutivo_Agosto_2016.pdf	09/09/2016
27	C8 Informe Ejecutivo Septiembre 2016	B.9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2016.pdf	10/10/2016
28	D1 acta 451 cebaf	acta_451_cebaf.pdf	02/08/2017
29	D2 INFORME CEBAF AL 31 DE MARZO DEL 2018	INFORME_CEBAF_AL_31_DE_MARZO_DEL_2018.pdf	04/04/2018
30	D3 INFORME SEMANAL CEBAF 04 2018	INFORME_SEMANAL_CEBAF_04_2018.pdf	02/05/2018
31	D4 Informe Ejecutivo CEBAF Macará - La Tina Mayo 2018	Informe_Ejecutivo_CEBAF_Macará_-_La_Tina_Mayo_2018.pdf	04/06/2018
32	D5 INFORME SEMANAL CEBAF 30 06 2018	INFORME_SEMANAL_CEBAF_30_06_2018.pdf	05/07/2018
33	D6 informe de trabajos de julio del 2017	AVANCE_SEMANAL_OBRA_CEBAF_08_2017.pdf	02/08/2017
34	D7 informe agosto	informe-CEBAF_04_08_2017.pdf	05/09/2017
35	D8 informe_OBRA_CEBAF_08_2017	informe_OBRA_CEBAF_08_2017.pdf	02/08/2018
36	E1 DICTAMENDEPRIORIDADCEBAF	DICTAMENDEPRIORIDADCEBAF.PDF	14/03/2019
37	E2 ESTUDIOS_CEBAF_MACARA_V3	ESTUDIOS_CEBAF_MACARA_V3.PDF	14/03/2019
38	E3 FORMATO SENPLADES CEBAF-MACARA 22-07-2014	FORMATO_SENPLADES_CEBAF-MACARA_22-07-2014.docx	20/03/2019
39	E4 INFORMEDEEJECUCION	INFORMEDEEJECUCION.PDF	14/03/2019
40	E5 MTOP-CONS_LOJ-2019-141-ME SOLICITANDO INCREMENTO DE TECHO PRESUPUESTARIO PARA CULMINACIÓN DE OBRA	MTOP-CONS_LOJ-2019-141-ME.pdf	01/03/2019
41	E6 AYUDA MEMORIA CEBAF 02 01 2019	AYUDA_MEMORIA_CEBAF_02_01_2019.pdf	02/01/2019
42	E7 AYUDA MEMORIA (FEBRERO 2019)	AYUDA_MEMORIA_(FEBRERO_26_2019)_CEBAF(1).pdf	01/03/2019
43	E8 AYUDA MEMORIA (MARZO 31 2019) CEBAF	AYUDA_MEMORIA_(MARZO_31_2019)_CEBAF.xlsx	03/04/2019
44	E9 CAMBIO DE FASE_ MTOP-SUBZ7-2019-0351-ME	MTOP-SUBZ7-2019-0351-ME.pdf	15/04/2019
45	F1 Suspension 15 03 2019 cebaf macará Administracion	suspension_15_03_2019_cebaf_macará_Administracion.pdf	04/07/2019
46	F2 AYUDA MEMORIA (07 2019) CEBAF	AYUDA_MEMORIA_(07_2019)_CEBAF.pdf	02/08/2019
47	F3 AYUDA MEMORIA_(08_2019)_CEBAF	AYUDA_MEMORIA_(08_2019)_CEBAF.pdf	05/09/2019
48	F4 CEDULA ENERO	CEDULA_ENERO.pdf	17/09/2019
49	F5 CEDULA FEBRERO	CEDULA_FEBRERO.pdf	17/09/2019
50	F6 CEDULA MARZO	CEDULA_MARZO.pdf	17/09/2019
51	F7 CEDULA ABRIL	CEDULA_ABRIL.pdf	17/09/2019
52	F8 CEDULA MAYO	CEDULA_MAYO.pdf	17/09/2019
53	F9 CEDULA JUNIO	CEDULA_JUNIO.pdf	17/09/2019
54	G1 CEDULA JULIO	CEDULA_JULIO.pdf	17/09/2019
55	G2 CEDULA AGOSTO	CEDULA_AGOSTO.pdf	02/10/2019
56	G3 CEDULA SEPTIEMBRE	CEDULA_SEPTIEMBRE.pdf	02/10/2019

**LIGAS EXTERNAS**

Dirección (URL)	
1	SITOP
	<a href="http://sitop.mtop.gob.ec:8080/mtop/">http://sitop.mtop.gob.ec:8080/mtop/</a>

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
CORDERO SANCHEZ, ANDREA DEL CISNE	Analista Distrital de Presupuesto	ANALISTA DE PRESUPUESTO DISTRITAL	acordero@mtop.gob.ec	072561665 EXT72509
Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	Coordinador Tecnico de Infraestructura Distrital	Analista de Infraestructura Distrital 1	bhurtado@mtop.gob.ec	023974600
Jaramillo Cantos, Luis Alberto	Subsecretario Regional 7	Subsecretario Zonal 7	ljaramillo@mtop.gob.ec	
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Coordinadora de Planificación Zonal 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600
Rojas Cazar, Walter Emilio	Director Distrital de Loja	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Loja	wrojas@mtop.gob.ec	023974600
VARGAS PINEDA, CECIBEL DEL CARMEN	Fiscalizador del proyecto	EXPERTO DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL	cvargas@mtop.gob.ec	072561665 ext 72518

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
97605_1.jpg	03/04/2018
