

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 6**  
**Dirección Provincial Azuay**

**PROYECTO: K023** MTOP-(Estudio y Diseño de Proyectos)-Estudios de Factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos para la rectificación, mejoramiento y ampliación a cuatro carriles de la carretera El Descanso-Puente Europa-Paute-Gualaceo, incluye túnel

Líder del Proyecto:	Brito Puni, Andrea Valerie (abrito@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Programas Relacionados:	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS, Provincia - Azuay, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Zaldua Gaona, Fausto Enrique	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.860.7239	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,940,902.98
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/10/2012 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	10/09/2019	Fecha de Fin Base:	30/09/2014
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2019

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN: Estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos para la rectificación, mejoramiento y ampliación a cuatro carriles de la carretera: intercambiador Guanguarcho-Lumagpamba (Puente Europa)-Paute-Gualaceo, de 35 km de longitud aproximada, ubicada en la provincia del Azuay.

Contratista: ASOCIACION CVA-INGENNYA-GEOESTUDIOS

Supervisor: Ing. Andrea BritoP.

2.- PRODUCTO/SERVICIO: Estudios de la vía de vital importancia para el turismo y comunicación entre los cantones de la Provincia del Azuay, que las atravieza, además de nexo entre las Provincias de Azuay y Morona Santiago; Red vial Estatal E40 y E594; se hará cumplir las normas y especificaciones técnicas existentes para el efecto.

3.- Contrato Complementario para ampliación de plazo en 150 días por atraso (Quito) de aprobación de la ruta seleccionada

Monto Original \$2'033.587,50

Contrato Complementario 1'240.928,08

**Beneficios Cualitativos**

Mejorar la transitabilidad de los miles de usuarios de esta vía, mejorar el nivel de servicio de la vía, disminuir el tiempo de traslado, mejorar la calidad de vida de los directos beneficiarios, disminuir costo operativo de los vehículos.

**Tipo de Beneficiario**

Los beneficiarios directos de este proyecto son los habitantes de los cantones Cuenca, Gualaceo, Paute, Chordeleg y Sigsig principalmente.

**Restricciones**

COSTO: USD \$ 3.019.664,18

ALCANCE: Diseños Definitivos desde el Descanso hasta Paute y Gualaceo en los ejes viales E40 y E594.


TIEMPO: Plazo Original: 9 meses, suspensión de plazo desde el 28 de enero de 2015 hasta la presente fecha, Plazo Complementario: 6 meses adicionales para contrato complementario No. 2

RECURSOS:

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	<b>Congelado</b>	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------------------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 98.87 %  
 Fecha de Inicio: 05/10/2012 Fecha de Fin: 31/12/2019

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

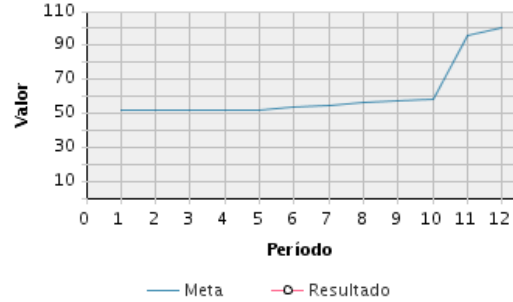

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	52 %	52 %	52 %	52 %	52 %	54 %	55 %	56 %	57 %	58 %	96 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2019: Proyecto suspendido desde el 29 de marzo de 2019, avance físico del proyecto 70%. Pago de planillas realizado el 31 de mayo de 2019, sin embargo se espera la acreditación por parte del Ministerio de Finanzas para el levantamiento de la suspensión del proyecto.	Brito Puni, Andrea Valerie	05/06/2019 - 11:35 AM
ABRIL 2019: Proyecto suspendido, avance físico del proyecto 70%. En trámite las planillas 22 y 23 y en revisión las planillas No. 24 y 25 del Contrato Original. Plazo suspendido por la no acreditación del pago de planillas. Se cambia la fase actual del proyecto a Congelado, hasta que se levante la suspensión del proyecto.	Brito Puni, Andrea Valerie	08/05/2019 - 12:39 PM
ABRIL 2019: Proyecto en ejecución, avance físico del proyecto 70%. En trámite las planillas 22 y 23 y en revisión las planillas No. 24 y 25 del Contrato Original. Plazo suspendido por la no acreditación del pago de planillas. Se cambia la fase actual del proyecto a Congelado, hasta que se levante la suspensión del proyecto.	Brito Puni, Andrea Valerie	08/05/2019 - 12:17 PM
MARZO 2019: Proyecto en ejecución, avance físico del proyecto 70%. En revisión planillas No. 21 y 22 del Contrato Original y 06 del Contrato Complementario Nro. 3. Plazo suspendido por la no acreditación del pago de planillas.	Brito Puni, Andrea Valerie	04/04/2019 - 11:11 AM
FEBRERO 2019: En revisión los informes de expropiaciones, observaciones del área hidraulica de las obras de arte mayor y menor, en revisión el avance de 4 puentes por el área estructural.	Brito Puni, Andrea Valerie	01/03/2019 - 09:42 AM
ENERO 2019: Tramitadas las planilla 18, 19, 20 del Contrato Original y planilla 3 del Contrato Complementario, en revisión de avances de los estudios por parte de los especialistas de la Subsecretaria Zonal 6	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/02/2019 - 08:02 PM
DICIEMBRE 2108: Tramitadas las planilla 18, 19, 20 del Contrato Original y planilla 3 del Contrato Complementario, en revisión de avances por parte de los especialistas de la Subsecretaria Zonal 6, suscripción del Contrato Complementario No. 4, el cual amplía el plazo desde el 13 de diciembre de 2018 al 31 de marzo del 2019.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/01/2019 - 03:49 PM
NOVIEMBRE 2108: En trámite las planillas 19, 20 y 21 del contrato original y las planillas 3,4 y 5 del contrato complementario, se realizan trabajos de perforación para cimentación de diseño de puentes, avance de ensayos geotécnicos y geo sísmico, revisión de alternativas de la ciclo ruta y trazado de la parte final del proyecto.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/12/2018 - 12:14 PM
OCTUBRE 2108: Pendiente acreditación del anticipo por parte del Ministerio de Finanzas, por un valor de USD 308.261,85. La Asociación Consultora informa que no cuenta con liquidez para continuar con los trabajos y solicita prórroga de plazo, se encuentra siendo analizado jurídicamente si procede o no la solicitud planteada. Se realizan trabajos para definir la ubicación del inicio de la ciclovia y puente de Chictic. Avanzan en los informes de señalización y seguridad vial.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/11/2018 - 10:31 AM
SEPTIEMBRE 2018:	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/10/2018 - 03:56 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Con fecha 12 de julio de 2018, se firma el Contrato Complementario Nro. 3 por un monto de \$1.027.539,50 y un plazo de ejecución de 5 meses. En trámite planillas Nro. 17 y 18 correspondientes al mes de Agosto y Septiembre, en revisión por parte de los especialistas de la Subsecretaria Zonal 6 el avance de los rubros de perforaciones, sitios críticos y fuentes de materiales.		
<b>AGOSTO 2018:</b> Con fecha 12 de julio de 2018, se firma el Contrato Complementario Nro. 3 por un monto de \$1.027.539,50 y un plazo de ejecución de 5 meses. Se avanza con la campaña de exploración Geotécnica.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/09/2018 - 10:11 AM
<b>JULIO 2018:</b> . Suspendido desde 28/01/2015. . Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente. . En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA. - Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018. La documentación de inclusión fue remitida a Planta Central -Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2018-774-ME de fecha 26 de junio de 2018, se informa que con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0514-OF de fecha 21 de junio del 2018 se emite el dictamen favorable a la inclusión y modificación presupuestaria del proyecto "Estudio y Diseño de Proyectos", se realizan las gestiones correspondientes para reanudar el proyecto. Con fecha 12 de julio de 2018, se firma el Contrato Complementario Nro. 3 por un monto de \$1.027.539,50 y un plazo de ejecución de 5 meses	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	03/08/2018 - 04:34 PM
<b>JUNIO 2018:</b> . Suspendido desde 28/01/2015. . Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente. . En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA. - Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018. La documentación de inclusión fue remitida a Planta Central -Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2018-774-ME de fecha 26 de junio de 2018, se informa que con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0514-OF de fecha 21 de junio del 2018 se emite el dictamen favorable a la inclusión y modificación presupuestaria del proyecto "Estudio y Diseño de Proyectos", se realizan las gestiones correspondientes para reanudar el proyecto.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/07/2018 - 04:27 PM
<b>MAYO 2018:</b> . Suspendido desde 28/01/2015. . Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente. . En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA. - Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018. La documentación de inclusión fue remitida a Planta Central.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/06/2018 - 05:24 PM
<b>ABRIL 2018:</b> . Suspendido desde 28/01/2015. . Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente. . En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA. - Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018. La documentación de inclusión fue remitida a Planta Central.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	04/05/2018 - 03:13 PM
<b>MARZO 2018:</b> . Suspendido desde 28/01/2015. . Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente. . En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA. - Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018. La documentación de inclusión fue remitida a Planta Central.	Brito Puni, Andrea Valerie	05/04/2018 - 02:08 PM
<b>FEBRERO 2018:</b> . Suspendido desde 28/01/2015. . Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente. . En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA. - Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018.	Brito Puni, Andrea Valerie	05/04/2018 - 02:08 PM
<b>ENERO 2018:</b> . Suspendido desde 28/01/2015. . Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.	Brito Puni, Andrea Valerie	05/04/2018 - 02:07 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>. En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.                      - Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018.</p>		
<p><b>DICIEMBRE 2017:</b>                      . Suspendido desde 28/01/2015.                      . Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.                      . En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.                      - Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018.</p>	Vásquez, Hugo Francisco	05/01/2018 - 12:15 PM
<p><b>NOVEIMBRE 2017:</b>                      . Suspendido desde 28/01/2015.                      . Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.                      . En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.                      . Se cuenta con Certificación Presupuestaria para Contrato Complementario.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	05/12/2017 - 10:58 PM
<p><b>OCTUBRE 2017:</b>                      . Suspendido desde 28/01/2015.                      . Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.                      . En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.                      . A la espera de las directrices para proceder con respecto al Decreto 58.                      . Mediante memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-1178-ME se procedió a enviar la documentación para la solicitud de aval ante SENPLADES y la Secretaría General de la Presidencia en función del Decreto 58.                      . Incluido en el PAI 2017.                      - Se esperan directrices respecto al nuevo Decreto Presidencial No. 198 de fecha 25 octubre de 2017.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	01/11/2017 - 05:07 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2017:</b>                      . Suspendido desde 28/01/2015.                      . Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.                      . En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.                      . A la espera de las directrices para proceder con respecto al Decreto 58.                      . Mediante memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-1178-ME se procedió a enviar la documentación para la solicitud de aval ante SENPLADES y la Secretaría General de la Presidencia en función del Decreto 58.                      . Incluido en el PAI 2017.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	05/10/2017 - 04:08 PM
<p><b>AGOSTO 2017:</b>                      Está prevista la suscripción del Contrato Complementario N° 3 en función de la aprobación de la certificación presupuestaria. El contrato se encuentra suspendido por disposición del Director Provincial del Azuay.                      Mediante Memorando No. MTOP-CONS_AZU-2017-274-ME de fecha 06 de julio de 2017, la Supervisión del contrato solicito directrices respecto al Decreto No. 58 a través del cual se decreta las Normas para Control de la Eficiencia de la Inversión Pública al Administrador del Contrato. A su vez mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-882-ME de fecha 17 de julio de 2017, el Subsecretario Regional 6 solicita a la Coordinación General de Planificación directrices de como proceder al respecto debido a la urgencia de la suscripción del contrato complementario sin hasta la fecha contar con respuesta alguna.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	05/09/2017 - 06:23 PM
<p><b>JULIO 2017:</b>                      Está prevista la suscripción del Contrato Complementario N° 3 en función de la aprobación de la certificación presupuestaria. El contrato se encuentra suspendido por disposición del Director Provincial del Azuay.                      Mediante Memorando No. MTOP-CONS_AZU-2017-274-ME de fecha 06 de julio de 2017, la Supervisión del contrato solicito directrices respecto al Decreto No. 58 a través del cual se decreta las Normas para Control de la Eficiencia de la Inversión Pública al Administrador del Contrato. A su vez mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-882-ME de fecha 17 de julio de 2017, el Subsecretario Regional 6 solicita a la Coordinación General de Planificación directrices de como proceder al respecto debido a la urgencia de la suscripción del contrato complementario.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	03/08/2017 - 12:57 PM
<p><b>JUNIO 2017:</b>                      Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-11-ME, de fecha 04 de Enero de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	05/07/2017 - 03:05 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención. Se cuenta con el aval por parte del MCPEC, SENPLADES ha emitido observaciones al trámite de aval.</p>		
<p><b>MAYO 2017:</b> Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-11-ME, de fecha 04 de Enero de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención. Se cuenta con el aval por parte del MCPEC, SENPLADES ha emitido observaciones al trámite de aval.</p>	<p>Brito Puni, Andrea Valerie</p>	<p>05/06/2017 - 05:21 PM</p>
<p><b>ABRIL 2017:</b> Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-11-ME, de fecha 04 de Enero de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención.  Se han enviado los Anexos 1A, 1B Y 3 para revisión por parte de la Coordinación General de Planificación previo al envío al MCPEC y SENPLADES.</p>	<p>Cordero Figueroa, Pablo Antonio</p>	<p>05/05/2017 - 01:07 PM</p>
<p><b>MARZO 2017:</b> Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-11-ME, de fecha 04 de Enero de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención.  Se han enviado los Anexos 1A, 1B Y 3 para revisión por parte de la Coordinación General de Planificación previo al envío al MCPEC y SENPLADES.</p>	<p>Brito Puni, Andrea Valerie</p>	<p>05/04/2017 - 04:22 PM</p>
<p><b>FEBRERO 2017:</b> Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-11-ME, de fecha 04 de Enero de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención.  Se han enviado los Anexos 1A, 1B Y 3 para revisión por parte de la Coordinación General de Planificación previo al envío al MCPEC y SENPLADES.</p>	<p>Brito Puni, Andrea Valerie</p>	<p>03/03/2017 - 03:14 PM</p>
<p><b>ENERO 2017:</b> Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-11-ME, de fecha 04 de Enero de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación (S) en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención; por lo que se insiste en dar continuidad al trámite requerido para la obtención del Aval y posterior firma del contrato complementario N° 3 a fin de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Cartera de Estado.</p>	<p>Brito Puni, Andrea Valerie</p>	<p>03/03/2017 - 03:13 PM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2016:</b> Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-11-ME, de fecha 04 de Enero de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación (S) en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención; por lo que se insiste en dar continuidad al trámite requerido para la obtención del Aval y posterior firma del contrato complementario N° 3 a fin de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Cartera de Estado.</p>	<p>Brito Puni, Andrea Valerie</p>	<p>06/01/2017 - 08:33 AM</p>
<p><b>NOVIEMBRE 2016:</b> Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2016-1076-ME, de fecha 28 de Noviembre de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación (S) en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención; por lo que se insiste en dar continuidad al trámite requerido para la obtención del Aval y posterior firma del contrato complementario N° 3 a fin de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Cartera de Estado.</p>	<p>Brito Puni, Andrea Valerie</p>	<p>05/12/2016 - 04:23 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>OCTUBRE 2016:</b> Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2016-678-ME, de fecha 26 de agosto de 2016, se realiza una insistencia al Coordinador General de Planificación para dar continuidad al trámite requerido para la obtención del Aval y posterior firma del contrato complementario N° 3 del mencionado proyecto, a fin de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Cartera de Estado. Hasta la fecha no se cuenta con directrices sobre el como proceder, debido a que el proyecto se encuentra suspendido desde el 28 de enero de 2015.</p>	Cordero Figuroa, Pablo Antonio	05/11/2016 - 03:45 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2016:</b> Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2016-678-ME, de fecha 26 de agosto de 2016, se realiza una insistencia al Coordinador General de Planificación para dar continuidad al trámite requerido para la obtención del Aval y posterior firma del contrato complementario N° 3 del mencionado proyecto, a fin de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Cartera de Estado. Hasta la fecha no se cuenta con directrices sobre el como proceder, debido a que el proyecto se encuentra suspendido desde el 28 de enero de 2015.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	10/10/2016 - 02:25 PM
<p><b>AGOSTO 2016:</b> Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2016-678-ME, de fecha 26 de agosto de 2016, se realiza una insistencia al Coordinador General de Planificación para dar continuidad al trámite requerido para la obtención del Aval y posterior firma del contrato complementario N° 3 del mencionado proyecto, a fin de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Cartera de Estado.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	05/09/2016 - 12:53 PM
<p><b>JULIO 2016:</b> Se mantiene la suspensión de plazo por la falta de Aval del Ministerio de Finanzas, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada. Mediante Memorando No. MTOP-CONS_AZU-2016-351-ME, de fecha 26 de julio de 2016, la Ing. Brito Supervisora del proyecto, da a conocer que hasta la fecha no se cuenta con el aval por parte del Ministerio de Finanzas e indica que es pertinente se consulte a la Subsecretaría Regional 6, el estado del trámite.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	04/08/2016 - 09:45 AM
<p><b>JUNIO 2016:</b> Se mantiene la suspensión de plazo por la falta de Aval del Ministerio de Finanzas, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada. Se ha realizado la gestión ante la Coordinación General de Planificación que permita contar con el aval para la suscripción del Contrato Complementario</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	05/07/2016 - 09:17 AM
<p><b>MAYO 2016:</b> Se mantiene la suspensión de plazo por la falta de Aval del Ministerio de Finanzas, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada. Se ha realizado la gestión ante la Coordinación General de Planificación que permita contar con el aval para la suscripción del Contrato Complementario.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	06/06/2016 - 08:27 AM
<p><b>ABRIL 2016:</b> Continúa la suspensión de plazo por la falta de Aval del Ministerio de Finanzas, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada. Se ha realizado la gestión ante la Coordinación General de Planificación que permita contar con el aval para la suscripción del Contrato Complementario.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	06/05/2016 - 10:54 AM
<p><b>MARZO 2016:</b> Continúa la suspensión de plazo por la falta de Aval del Ministerio de Finanzas, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada. Se ha consolidado los rubros revisados por cada uno de los Especialistas para el Contrato Complementario y se esta a la espera del Aval de Finanzas que permita dar continuidad al contrato</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	05/04/2016 - 05:07 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>FEBRERO 2016:</b>                      Continúa la suspensión de plazo por la falta de Aval del Ministerio de Finanzas, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.                      Mediante memorando No. MTOP-EITZ6-2016-112-ME de fecha 01 de marzo el Ing. Santiago Cevallos comunica que los rubros faltantes para la aprobación de los TDRs han sido remitidos por los especialistas de Planta Central</p>	<p>Brito Puni,                      Andrea Valerie</p>	<p>07/03/2016 -                      08:29 AM</p>
<p><b>ENERO 2016:</b>                      Continúa la suspensión de plazo por la falta de Aval del Ministerio de Finanzas, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.                      Mediante memorando No. MTOP-SUBREG6-2015-1035-ME, de fecha 28 de diciembre de 2015, la Subsecretaría Regional 6 envía nuevamente la solicitud de actualización de los avales a la Coordinación General de Planificación.</p>	<p>Brito Puni,                      Andrea Valerie</p>	<p>05/02/2016 -                      10:18 AM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2015:</b>                      Continúa la suspensión de plazo por la falta de Certificación Presupuestaria, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.                      Mediante memorando No. MTOP-SUBREG-2015-983-ME, de fecha 02 de diciembre de 2015 se remite la documentación correspondiente al área de factibilidad, para que sea revisada por personal técnico de la Subsecretaría Regional 7.</p>	<p>Brito Puni,                      Andrea Valerie</p>	<p>05/01/2016 -                      11:19 AM</p>
<p><b>NOVIEMBRE 2015:</b>                      Continúa la suspensión de plazo por la falta de Certificación Presupuestaria, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.</p> <p>El Consultor ha enviado la evaluación técnica-económica del proyecto corregida a nivel de factibilidad para que sea revisada, la cual ha sido remitida a la Subsecretaría Regional 7 para su análisis y aprobación.</p>	<p>Brito Puni,                      Andrea Valerie</p>	<p>07/12/2015 -                      02:52 PM</p>
<p><b>OCTUBRE 2015:</b>                      Continúa la suspensión de plazo por la falta de Certificación Presupuestaria, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.</p> <p>Algunos rubros de los TdRs estan siendo analizados por los Especialistas de matriz, razón por la cual mediante Memorando No. MTOP-SUBREG6-2015-824-ME, se ha solicitado el apoyo.</p>	<p>Brito Puni,                      Andrea Valerie</p>	<p>05/11/2015 -                      10:28 AM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2015:</b>                      Continúa la suspensión de plazo por la falta de Certificación Presupuestaria, no se puede suscribir el Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.</p> <p>Una vez revisadas y corregidas las observaciones a los TdRs por los Especialistas de la Subsecretaría Regional 6, se observaron que algunos rubros no podían ser atendidos debido a que no se cuentan con Especialistas en esa rama, razón por la cual mediante Memorando No. MTOP-SUBREG6-2015-824-ME, se ha solicitado el apoyo de la Dirección de Estudios en matriz.</p>	<p>Brito Puni,                      Andrea Valerie</p>	<p>07/10/2015 -                      10:25 AM</p>
<p><b>AGOSTO 2015:</b> Continúa la suspensión de plazo por la falta de Certificación Presupuestaria, no se puede suscribir el Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.</p> <p>Los TdRs enviados a matriz para revisión, han sido devueltos con observaciones y estos a su vez han sido remitidas a los Especialistas de la Subsecretaría Regional 6, los cuales se encuentran</p>	<p>Brito Puni,                      Andrea Valerie</p>	<p>07/09/2015 -                      09:20 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
trabajando con la finalidad de que estén listos para solicitar la certificación presupuestaria que permita la firma del Contrato Complementario No 3.		
Julio 2015: Continúa con la suspensión de plazo, por la falta de la certificación presupuestaria, no se puede suscribir el contrato complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicita la suspensión de los trabajos hasta que se suscriba el complementario, la misma que con oficio N° MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada. Se envió a la Dirección de Estudios del Transporte los TDRs de rubros nuevos que solicitaron justificar el monto para Contrato Complementario.	Alvarez Ordoñez, Cecilia	07/08/2015 - 02:36 PM
Junio 2015: Continúa con la suspensión de plazo, por la falta de la certificación presupuestaria, no se puede suscribir el contrato complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicita la suspensión de los trabajos hasta que se suscriba el complementario, la misma que con oficio N° MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada. Se envió a la Dirección de Estudios del Transporte los TDRs de rubros nuevos que solicitaron para el justificar el monto para Contrato Complementario.	Bonilla Ochoa, René Marcelo	03/07/2015 - 08:19 AM
Mayo 2015: Continúa con la suspensión de plazo, por la falta de la certificación presupuestaria, no se puede suscribir el contrato complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicita la suspensión de los trabajos hasta que se suscriba el complementario, la misma que con oficio N° MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada. Se envió a la Dirección de Estudios del Transporte los TDRs de rubros nuevos que solicitaron para el justificar el monto para Contrato Complementario.	Bonilla Ochoa, René Marcelo	02/06/2015 - 10:14 AM
Abril 2015: Continúa con la suspensión de plazo, por la falta de la certificación presupuestaria, no se puede suscribir el contrato complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicita la suspensión de los trabajos hasta que se suscriba el complementario, la misma que con oficio N° MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.	Bonilla Ochoa, René Marcelo	06/05/2015 - 01:16 PM
Marzo 2015. Continúa con la suspensión de plazo, por la falta de la certificación presupuestaria, no se puede suscribir el contrato complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicita la suspensión de los trabajos hasta que se suscriba el complementario, la misma que con oficio N° MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada	Bonilla Ochoa, René Marcelo	01/04/2015 - 02:17 PM
Febrero 2015. Continúa con la suspensión de plazo, por la falta de la certificación presupuestaria, no se puede suscribir el contrato complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicita la suspensión de los trabajos hasta que se suscriba el complementario, la misma que con oficio N° MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada	Bonilla Ochoa, René Marcelo	02/03/2015 - 01:31 PM
Enero 2015. Por la falta de la certificación presupuestaria, no se puede suscribir el contrato complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicita la suspensión de los trabajos hasta que se suscriba el complementario, la misma que con oficio N° MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada	Bonilla Ochoa, René Marcelo	05/02/2015 - 11:14 AM
DICIEMBRE 2014: Se encuentra en vigencia contrato complementario #2 desde el 28 de Noviembre del 2014 por ampliación de dos meses de plazo; esto es hasta el 28 de enero del 2015. esta en elaboración contrato complementario #3 por valores e incremento de plazo.	Sánchez Zamora, Iván Patricio	06/01/2015 - 04:33 PM
NOVIEMBRE 2014: Se solicita la elaboración del Contrato Complementario N° 2 por un valor de USD. 1'107.971.50 y una ampliación de plazo de 7 meses, por cambio de cantidades y creación de rubros nuevos, para cumplir con el objeto del contrato. OCTUBRE 2014: Se continúa con los trabajos de prospección Geológica y Geotécnicas de la vía y se programará las prospecciones para la zona del túnel. Hasta que no se apruebe el Contrato Complementario de monto, se va a ir generando un retraso en las cifras de avance de los trabajos. SEPTIEMBRE 2014: El contratista Asociación "Cva-Ingennya-Geoestudios", prepara una solicitud para que se apruebe un Contrato Complementario N° 2 por aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos, con una ampliación de plazo. Se va a dar comienzo al Replanteo, Nivelación, Referencias y perfiles, Transversales. Se presente el Informe Preliminar de Ingeniería. Se continuarán con los trabajos de las prospecciones Geológicas-Geotécnicas de la vía y se programarán las prospecciones para la zona del Túnel. AGOSTO 2014: Se termina con el levantamiento a escala 1:1000, se prepara informe para presentar y aprobar la fase Pre- Preliminar y También se trabaja en las prospecciones geotécnicas, trabajos estudios hidrológicos, hidráulicos. JULIO 2014: Este mes se continúa con el levantamiento topográfico siguiendo la ruta seleccionada para obtener la cartografía a escala 1:1000, para realizar el polígono, nivelación, y	Sánchez Zamora, Iván Patricio	11/12/2014 - 09:23 AM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>perfiles transversales. Se continua con la información Hidrológica - Hidráulica, informe ambiental, prospección Geológica, investigación Geofísica, para preparar el informe preliminar de ingeniería.</p> <p>JUNIO 2014: Se legaliza el Contrato Complementario por ampliación de 150 días (5 meses), suscrito el 11 de junio de 2014. Se realiza el Rubro 4.3. Polígono, nivelación y perfiles transversales para obtener la cartografía escala 1:100.</p> <p>MAYO 2014: La ruta seleccionada se aprueba mediante memorando N° MTOP-DEV-2014-610-ME de fecha 23 de mayo de 2014, suscrito por el Ing. Mario Renán González Revelo, Director de Estudios del Transporte Encargado. Por este atraso el Consultor solicita se realice un Contrato Complementario por 150 días de ampliación de plazo el mismo que está en elaboración del Jurídico de la Subsecretaría Regional 6 , según solicitud realizada en memorando N° MTOP-DPAZ-2014-614-ME de fecha 21 de mayo por el Ing. Fabián Pérez I. Administrador-Director Provincial MTOP-Azuay.</p> <p>ABRIL 2014: Por la falta de aprobación de la Ruta seleccionada por parte de la Dirección del Transporte, el proyecto no se puede continuar con lo programado, por lo que se tiene un atraso considerable, se adjunta el informe de la segunda quincena de marzo en la que se indica los trabajos realizados y las gestiones realizadas por parte del contratista, también se anexa el Informe SITOP por el mes de abril en el que se informa en comentarios las gestiones, oficios y memorandos que se han tramitado para que se dé la autorización indicada. El Contratista manifiesta que presentara una solicitud para celebrar un contrato complementario con ampliación de plazo y de esta forma cumplir con el objeto del contrato.</p>		
MARZO 2014: Se ha seleccionado la ruta la misma que tiene que aprobar la Ministra, y a partir de esta, se empieza con los estudios de detalle del proyecto, esperando cumplir con los plazos contractuales.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	01/04/2014 - 12:11 PM
FEBRERO 2014: Se ha seleccionado la ruta la misma que tiene que aprobar la Ministra, y a partir de esta, se empieza con los estudios de detalle del proyecto, esperando cumplir con los plazos contractuales.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	08/03/2014 - 10:28 AM
NOVIEMBRE 2013: Se inician los trabajos, de acuerdo al hito 4, estudios pre-preliminar	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/12/2013 - 04:18 PM
OCTUBRE 2013: Se inician los trabajos. Se adjudica los estudios a la Consultora CVA-INGENNYA-GEOESTUDIOS, se ha oficiado la disponibilidad del anticipo con fecha 30 de septiembre de 2013. Plaza Quintuña, Galo Patricio 07/10/2013 - 11:51 AM	Plaza Quintuña, Galo Patricio	01/11/2013 - 02:12 PM
SEPTIEMBRE 2013: Se adjudica los estudios a la Consultora CVA-INGENNYA-GEOESTUDIOS, se ha oficiado la disponibilidad del anticipo con fecha 30 de septiembre de 2013.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	07/10/2013 - 11:51 AM
JULIO 2013: Se adjudica los estudios a la Consultora CVA-INGENNYA-GEOESTUDIOS, se espera la entrega de las garantías por parte de la Asociación de consultoras, previo pago anticipo	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/08/2013 - 03:20 PM
JUNIO 2013: Se encuentra en proceso de adjudicación	Plaza Quintuña, Galo Patricio	22/07/2013 - 03:49 PM
MAYO 2013: Se encuentra en proceso de adjudicación	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/06/2013 - 11:20 AM
ABRIL 2013: Se encuentra en proceso de adjudicación	Plaza Quintuña, Galo Patricio	06/05/2013 - 04:03 PM
MARZO 2013: Se analiza ofertas recibidas, entregadas 12 de marzo de 2013	Plaza Quintuña, Galo Patricio	16/04/2013 - 11:55 AM
FEBRERO 2013: Se encuentra en el portal de compras públicas, entrega de ofertas para 12 de marzo de 2013	Plaza Quintuña, Galo Patricio	11/03/2013 - 04:34 PM
ENERO 2013: Se encuentra en etapa de presentación de ofertas	Plaza Quintuña, Galo Patricio	21/02/2013 - 04:22 PM
NOVIEMBRE 2012: Se declara desierto el proceso, se procederá a revisar los pliegos nuevamente	Soria Novoa, César	05/12/2012 - 12:39 PM
DICIEMBRE 2012: Se realizan cambios en los pliegos, se aprueban los mismos; se solicita al INCOP emita certificado de participación nacional.		
OCTUBRE 2012. Se ha elevado a concurso de ofertas por intermedio del INCOP, se prevee su adjudicación para la segunda quincena del mes de Noviembre.	Soria Novoa, César	08/11/2012 - 10:51 AM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Tiempo.</b> Temporada invernal CAUSARÍA que el proyecto se retrase	05/06/2019	Andrea Valerie Brito Puni	30 %	30	9	1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca
2	Zona 6 - Austro > Azuay > Gualaceo
3	Zona 6 - Austro > Azuay > Paute

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Pliegos Publicados	2-Publicación de Pliegos	05/10/2012		05/10/2012		Sí	10.0
2	PLANEACION: Proyecto Adjudicado	3-Adjudicación	20/03/2013		20/03/2013		Sí	10.0
3	EJECUCION: Anticipo entregado	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	6.0
4	EJECUCIÓN: Estudio Pre y Preliminar, recibidos	5-Entregables Intermedios	03/09/2014		30/09/2014		Sí	12.0
5	EJECUCION: Factibilidad, aceptados	5-Entregables Intermedios	02/10/2014		02/10/2014		Sí	14.0
6	CIERRE:CIERRE DE PROYECTO SEGUN FORMATO SENPLADES APROBADO	9-Entregables Formales	30/06/2019	30/06/2019			No	2.0
7	CIERRE: CERTIFICACIÓN GENERAL JURIDICA DE NO ENCONTRARSE INMERSO EN PROCESO LEGAL ALGUNO , SUSCRITA	V - Verificación ejecutiva	30/07/2019	30/07/2019			No	1.0
8	CIERRE: CERTIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINIQUITADOS Y DE NO EXISTENCIA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO-SUSCRITO	V - Verificación ejecutiva	30/08/2019	30/08/2019			No	1.0
9	CIERRE: CERTIFICACIÓN DE NO MANTENER SALDOS PRESUPUESTARIOS, CONTABLES O DE TESORERIA PENDIENTES POR LIQUIDAR-SUSCRITO MEF	V - Verificación ejecutiva	30/09/2019	30/09/2019			No	1.5
10	CIERRE: SOLICITO DE CIERRE DE PROYECTO MAXIMA AUTORIDAD APROBADO	9-Entregables Formales	30/10/2019	30/10/2019			No	0.5

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	EJECUCION: Estudio Ingeniería definitivo, recibidos	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019		▼	No	15.0
12	EJECUCION: Estudios para Túneles de Carretera, recibidos	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019		▼	No	6.0
13	EJECUCION: Impacto Ambientales, recibidos	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019		▼	No	10.0
14	EJECUCION: Obras Complementarias, recibidos	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019		▼	No	7.0
15	CIERRE: ACTA ENTREGA RECEPCIÓN UNICA	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019		●	No	2.0
16	CIERRE: INFORMES DE FISCALIZACIÓN APROBADOS	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019		●	No	1.0
17	CIERRE: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA APROBADA	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019		●	No	1.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión de avance	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	29/12/2016
2	supervision negativa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	31/03/2016
3	Supervisión al avances del proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	24/11/2014
4	Estudios avanzan pero se espera autorización de ruta.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	28/04/2014
5	Supervisión de Estudios de Proyecto.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	22/01/2014

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje Avance físico del proyecto	●	128.57 %	70	90	01/01/2014	Mayo


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	610,076.25
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,940,902.98 **
Costo Total:	2,033,587.50
Total Devengado:	993,201.71
% Costo Total Devengado:	48.84 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 48.84 %

**Perfil Económico 2019**

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	8,376,545.84	2,785,348.83	0.00	11,161,894.67
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	5,203,795.96	1,405,417.17	0.00	6,609,213.13
Ppto. Codificado	6,319,543.68	1,405,417.17	0.00	7,724,960.85
Ppto. Comprometido	233,665.24	0.00	0.00	233,665.24
Planeado - Codificado (2019)		1,379,931.66		
Programado a Devengar	6,157,995.78	947,701.27	0.00	7,105,697.05
Ppto. Devengado	993,201.71	0.00	0.00	993,201.71
Pagado Real	526,636.04	0.00	0.00	526,636.04
Estimado a fin de año	* 993,201.71	0.00	0.00	993,201.71
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	5,164,794.07	947,701.27	0.00	6,112,495.34
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 16.13 %	0.00 %	0.00 %	13.98 %
Ppto. Codificado 998	49,666.80	0.00	0.00	49,666.80
Ppto. Devengado 998	49,666.80	0.00	0.00	49,666.80

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019**



**Presupuesto Mensual 2019**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	250,445.90		250,445.90				
Jun	603.29		251,049.19				
Jul	0.00		251,049.19				
Ago	232,217.36		483,266.55				
Sep	232,217.36		715,483.91				
Oct	232,217.36		947,701.27				
Nov	0.00		947,701.27				
Dic	0.00		947,701.27				
<b>Total</b>	<b>947,701.27</b>						

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A 22 Informe ejecutivo mayo 2015	SITOP_mes_mayo_2015.pdf	02/06/2015
2	A 23 Informe ejecutivo junio 2015	SITOP_mes_junio_2015.pdf	03/07/2015
3	A.10 Contrato Complementario N° 1	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_GUANGARCUCHO.pdf	03/07/2014
4	A.11 Informe Ejecutivo SITOP, julio 2014	A.11_Informe_ejecutivo_SITOP__julio_2014.pdf	18/08/2014
5	A.12 Informe ejecutivo SITOP, agosto 2014.pdf	SITOP_mes_agosto_2014.pdf	02/09/2014
6	A.16 Informe ejecutivo Dic 2014	A.16_Informe_ejecutivo_Dic_2014_Estudios_Guangarcucho_02/09/2014.pdf	02/09/2014
7	A.18 Informe Ejecutivo febrero 2015	SITOP_mes_febrero_2015.pdf	02/03/2015
8	A.19 Informe Ejecutivo marzo 2015 (también es soporte del indicador)	SITOP_mes_marzo_2015.pdf	02/04/2015
9	A.1: Informe ejecutivo SITOP, octubre 2013.pdf	A.1_Informe_Ejecutivo_SITOP__octubre_2013.pdf	12/03/2014
10	A.21 Informe Ejecutivo abril 2015	SITOP_mes_abril_2015.pdf	06/05/2015
11	A.2: Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013.pdf	A.2_Informe_Ejecutivo_SITOP__noviembre_2013.pdf	12/03/2014
12	A.3 Informe ejecutivo SITOP, diciembre 2013.pdf	A.3_Informe_Ejecutivo_SITOP__diciembre_2013.pdf	12/03/2014
13	A.4 Informe ejecutivo SITOP, enero 2014.pdf	A.4_Informe_Ejecutivo_SITOP__enero_2014.pdf	12/03/2014
14	A.5 Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2014	A.5_Informe_Ejecutivo_SITOP__febrero_2014.pdf	12/03/2014
15	A.6 Informe Ejecutivo SITOP, estudios, Marzo 2014	A.6_Informe_Ejecutivo_SITOP__estudios_Marzo_2014.pdf	01/04/2014
16	A.7 Informe ejecutivo SITOP, abril 2014.pdf	A7_Informe_SITOP__mes_abril_2014.pdf	05/05/2014
17	A.8 Informe ejecutivo SITOP, mayo 2014.pdf	SITOP_mes_mayo_2014.pdf	04/06/2014
18	A.8 Informe segunda quincena contratista	A8_Informe__Segunda_Quincena_de_marzo_cva_guangarcucho_05/05/2014_gualaceo_058-ig.pdf	05/05/2014
19	A.9 Informe ejecutivo SITOP, junio 2014.pdf	SITOP_mes_junio_2014.pdf	03/07/2014
20	A13 Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2014.pdf	SITOP_mes_septiembre_2014.pdf	16/10/2014
21	A14 Informe ejecutivo SITOP, octubre 2014.pdf	SITOP_mes_octubre_2014.pdf	10/11/2014
22	A15 Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2014.pdf	SITOP_mes_noviembre_2014.pdf	02/12/2014
23	A17 Informe ejecutivo SITOP, enero 2015.pdf	SITOP_mes_enero_2015.pdf	05/02/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
24	Certificación Presupuestaria	MTOP-FINAN_AZU-2017-467-ME.pdf	05/12/2017
25	DICTAMEN DE INCLUSIÓN FAVORABLE	senplades-sip-2018-0514-OF.pdf	05/07/2018
26	IE Guangarcucho Diciembre 2017	IE_Guangarcucho_Diciembre_2017.pdf	05/01/2018
27	IE Guangarcucho Febrero 2017	IE_Guangarcucho_Febrero_2017.pdf	05/03/2017
28	IE Guangarcucho Octubre 2016	IE_Guangarcucho_Octubre_2016.pdf	05/11/2016
29	IE Septiembre 2015	SITOP_mes_septiembre_2015.pdf	07/10/2015
30	INFORMACIÓN EJECUTIVO - 4 CARRILES - ABRIL 2017	INFORME_EJECUTIVO_-_4_CARRILES_ABRIL_2017.pdf	05/05/2017
31	Informe Agosto 2015	STIOP-mes-agosto-2015.pdf	07/09/2015
32	Informe Ejecutivo - Junio 2017	Informe_Ejecutivo_-_4_Carriles_Junio_2017.pdf	05/07/2017
33	INFORME EJECUTIVO 4 CARRILES MAYO 2018	INFORME_EJECUTIVO_4_CARRILES_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
34	Informe Ejecutivo Abril 2016	IE_Abril_2016.pdf	06/05/2016
35	Informe Ejecutivo abril 2018	Informe_Ejecutivo_Cuatro_Carriles_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
36	Informe ejecutivo Abril 2019	INFORME_EJECUTIVO_CUATRO_CARRILES.pdf	02/05/2019
37	Informe Ejecutivo Agosto 2016	IE_Agosto_2016.pdf	05/09/2016
38	Informe Ejecutivo Agosto 2017	IE_Agosto_2017.pdf	05/09/2017
39	Informe Ejecutivo agosto 2018	informe_ejecutivo_cuatro_carriles.pdf	05/09/2018
40	Informe Ejecutivo Cuatro Carriles Enero 2019	Informe_Ejecutivo_4_carriles_Enero_2019.pdf	05/02/2019
41	Informe Ejecutivo cuatro carriles_Septiembre 2017	Informe_Ejecutivo_cuatro_carriles_Septiembre_2017.pdf	05/10/2017
42	Informe Ejecutivo Diciembre 2015	IE_Diciembre_2015.pdf	05/01/2016
43	Informe Ejecutivo Diciembre 2016	IE_Diciembre_2016.pdf	06/01/2017
44	Informe Ejecutivo diciembre 2018	Informe_Ejecutivo_Cuatro_Carriles_Diciembre_2018.pdf	04/01/2019
45	Informe Ejecutivo Enero 2016	IE_Enero_2016.pdf	05/02/2016
46	Informe Ejecutivo Enero 2018	IE_Enero_2018.pdf	05/04/2018
47	Informe Ejecutivo Febrero 2016	IE_Febrero_2016.pdf	07/03/2016
48	Informe Ejecutivo Febrero 2018	IE_Febrero_2018.pdf	05/04/2018
49	Informe Ejecutivo FEBRERO 2019	CUATRO_CARRILES.PDF	01/03/2019
50	Informe Ejecutivo Fiscalización Noviembre 2016	IE_Noviembre_2016.pdf	05/12/2016
51	Informe Ejecutivo Julio 2015	STIOP-mes-julio-2015.pdf	07/09/2015
52	Informe Ejecutivo Julio 2016	IE_Julio_2016.pdf	04/08/2016
53	Informe Ejecutivo junio 2018	Informe_Ejecutivo_-_Cuatro_Carriles.pdf	05/07/2018
54	Informe Ejecutivo Marzo 2016	IE_Marzo_2016.pdf	05/04/2016
55	Informe ejecutivo marzo 2017	SITOP_mes_marzo_2017.pdf	05/04/2017
56	Informe Ejecutivo Marzo 2018	IE_Marzo_2018.pdf	05/04/2018
57	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	INFORME_EJECUTIVO_CUATRO_CARRILES.pdf	04/04/2019
58	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	INFORME_EJECUTIVO_CUATRO_CARRILES.pdf	04/04/2019
59	Informe Ejecutivo Mayo 2016	IE_Mayo_2016.pdf	06/06/2016
60	Informe Ejecutivo Mayo 2017	INFORME_EJECUTIVO_-_4_CARRILES_MAYO_2017.pdf	05/06/2017
61	Informe Ejecutivo Noviembre 2015	IE_Noviembre_2015.pdf	07/12/2015
62	Informe Ejecutivo noviembre 2018	INFORME_EJECUTIVO.pdf	05/12/2018
63	Informe Ejecutivo Octubre 2015	IE_Octubre_2015.pdf	05/11/2015
64	Informe Ejecutivo Octubre 2017	IE_Octubre_2017.pdf	01/11/2017
65	Informe Ejecutivo Septiembre 2016	IE_Septiembre_2016.pdf	10/10/2016
66	Informe Julio 2018	Informe_Ejecutivo_Cuatro_Carriles_Julio_2018.pdf	03/08/2018
67	Insistencia Aval Contrato Complementario	2016_11_28_MTOP-SUBZ6-2016-1076-ME.pdf	05/12/2016
68	MTOP-SUBZ6-2017 -11-ME INSISTENCIA AVAL CUATRO CARRILES	2016_01_04_MTOP-SUBZ6-2017-11-ME.pdf	06/01/2017
69	MTOP-SUBZ6-2017-1178-ME	MTOP-SUBZ6-2017-1178-ME.pdf	05/10/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
70	SOLICITUD APERTURA PROYECTO	MTOP-CONS_AZU-2019-369-ME.pdf	26/04/2019
71	Suspección de plazo Estudios	SUSPENSION_DE_PLAZO_ESTUDIOS__Guangarcucho_Pa05032016.pdf	05/03/2016
72	SUSPENSIÓN DE PLAZO 29 DE MARZO DE 2019	suspencion_de_plazo(1).pdf	08/05/2019

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Brito Puni, Andrea Valerie	Lider de Estudios	Experta en infraestructura provincial	abrito@mtop.gob.ec	023974600
Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Zonal 6, Subrogante	jjaramillo@mtop.gob.ec	
Zaldua Gaona, Fausto Enrique	Administrador	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Azuay	fzaldua@mtop.gob.ec	

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
40197_1.jpg	05/07/2016
