

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 7**  
**Dirección Provincial Loja**

**PROYECTO: K026** MTOP.- Programa de Liquidación y Ejecución de Obra por concluir Fase I de la Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo Guayas Ex (Reconstrucción de la Carretera Célica - Cruzpamba - "Y" del Muerto.)

Líder del Proyecto:	Bustamante Rivera, Esner Fidel (ebustamante@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Programas Relacionados:	PROGRAMA DE LIQUIDACION Y EJECUCION DE OBRAS POR CONCLUIR FASE I DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS EX CORPECUADOR, Provincia - Loja
Titular:	Rojas Cazar, Walter Emilio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30340000.1278.7004	TIR:	18.26 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	18.20
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,193,348.09
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/07/2014 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	04/01/2020	Fecha de Fin Base:	31/07/2015
Modificado por:	Bustamante Rivera, Esner Fidel	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2019

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

El Ministerio de Transportes y Obras Públicas contrata a la Compañía SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, para la RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA "CELICA-CRUZPAMBA"Y" DEL MUERTO por un plazo de doce meses a partir de la fecha de firma del contrato (2 de julio de 2014), por un monto de 12'803.471,63 con una longitud 27.06 Km.  
 Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I001 el 10/11/2014  
 Reconstrucción de la carretera Célica Cruzpamba - "Y" del Muerto, con pavimento flexible, a cargo de la empresa estatal china SINOHYDRO CORPORATION LIMITADA.  
 Contratista: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED  
 Fiscalizador: ING. LUIS LUDEÑA  
 Fecha inicio Contrato: 02 de Julio de 2014  
 Plazo Original: 12 meses  
 Fecha Terminación Original: 02 de julio de 2015  
 Plazo Orden de Cambio No 1: 2 meses  
 Plazo Orden de Cambio No 2: 2 meses  
 Plazo Orden de Cambio No 3: 5 meses  
 Plazo Orden de Cambio No 4: 5 meses  
 Plazo Orden de Cambio No 5: 3 meses  
 Plazo Orden de Cambio No 6: 166 días  
 Fecha Terminación Orden de Cambio Nro. 1: 02 de Septiembre de 2015  
 Fecha Terminación Orden de Cambio Nro. 2: 31 de Octubre de 2015  
 Fecha Terminación Orden de Cambio Nro. 3: 31 de Marzo de 2016  
 Fecha Terminación Orden de Cambio Nro. 4: 31 de Agosto de 2016  
 Fecha Terminación Orden de Cambio Nro. 5: 30 de Noviembre de 2016  
 Fecha Terminación Orden de Cambio Nro. 6: 15 de mayo 2017  
 Fecha de Terminación Orden de Cambio Nro. 8: 30 de Enero de 2018  
 Por lo tanto el plazo que estaría vigente para la terminación de los trabajos es el 30 de enero 2018.

**Beneficios Cualitativos**

Construir una estructura de pavimento flexible, acordes a normas de diseño actualizadas.  
 Mejorar la transitabilidad del sector, disminuir tiempos de recorrido de los vehículos.  
 Mejorar la calidad de vida de los moradores del sector.

**Tipo de Beneficiario**

Se beneficiará a los moradores de la región con el incremento del turismo, facilidad en el transporte de los productos agrícolas que se dan en el sector.

Disminuir los accidentes de tránsito, disminuir tiempos en trasladarse.

Favorece al sector agrícola, ganadero y comercial del sector y la región de influencia del proyecto.


**Restricciones**

Para la ejecución de la obra debe contarse con el presupuesto y cronograma bien formulado, a fin de obtener una obra de buena calidad y que la misma sea entregada en la fecha establecida en el contrato.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado **Congelado** Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 84.80 %  
 Fecha de Inicio: 02/07/2014 Fecha de Fin: 31/12/2020

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

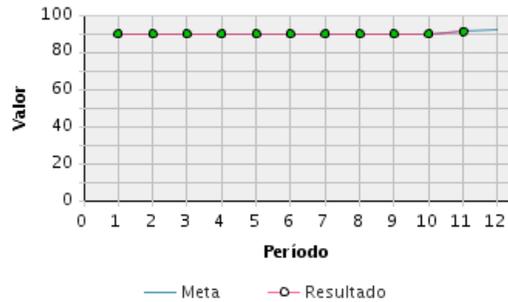

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	91 %	92 %
	Avance real acumulado											
	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	91 %	
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2020 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	04/01/2020 - 10:57 AM
DICIEMBRE 2019 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	04/12/2019 - 10:04 AM
OCTUBRE 2019 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	05/11/2019 - 04:38 PM
SEPTIEMBRE 2019 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	04/10/2019 - 01:02 PM
AGOSTO 2019 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	05/09/2019 - 04:40 PM
JULIO 2019 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	02/08/2019 - 03:17 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2019 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	04/07/2019 - 03:39 PM
Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	05/06/2019 - 04:12 PM
ABRIL 2019 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional. Según reporte de Finanzas adjunto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a cancelado a la contratista SINOHYDRO el valor de \$ 658.741,75	Bustamante Rivera, Esner Fidel	29/05/2019 - 05:21 PM
ABRIL 2019 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	29/05/2019 - 10:23 AM
MARZO 2019 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	29/05/2019 - 10:22 AM
FEBRERO 2019 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	29/05/2019 - 10:22 AM
ENERO 2019 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	29/05/2019 - 09:49 AM
ENERO 2019 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	29/05/2019 - 09:41 AM
DICIEMBRE 2018 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	07/01/2019 - 12:22 PM
NOVIEMBRE 2018 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Rojas Cazar, Walter Emilio	05/12/2018 - 04:27 PM
OCTUBRE 2018 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	05/11/2018 - 10:02 AM
SEPTIEMBRE 2018 Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	04/10/2018 - 11:00 AM
AGOSTO 2018. Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/09/2018 - 02:34 PM
Julio 2018.- Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	03/08/2018 - 02:04 PM
Junio 2018.- Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/07/2018 - 12:42 PM
Mayo 2018.- Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/06/2018 - 10:16 AM
Abril 2018.- Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	03/05/2018 - 01:55 PM
Marzo 2018.- Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Trámites administrativos para recepción provisional.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	02/05/2018 - 02:27 PM
Febrero 2018.- Proyecto se encuentra terminado, se realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Enero 2018.- Contratista ejecuta trabajos de señalización horizontal y vertical del tramo Celica Cruzpamba.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/04/2018 - 03:07 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2017.- Colocación de sello asfáltico, trabajo dispuesto mediante oficio MTOP-CON_LOJ-17-201-OF, para el tramo Celica Cruzpamba	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	03/04/2018 - 10:10 AM
NOVIEMBRE 2017: TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+390) Mantenimiento de la vía TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+300) Mantenimiento de la vía. Excavación para colocación de señales ambientales	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/12/2017 - 04:47 PM
OCTUBRE 2017: TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+390) Mantenimiento de la vía TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+300) Colocación de tachas en el eje de la vía. Colocación de Chevrone	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	01/11/2017 - 12:03 PM
SEPTIEMBRE 2017: TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+390) Reconstrucción de cunetas LI y LD TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+300) Colocación de postes para chevrone	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/10/2017 - 11:50 AM
AGOSTO 2017: TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+390) . Mantenimiento de tramo TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+300) . Excavación para implantación de Chevrone, colocación de guardacaminos. Replanteo de eje y bordes para ejecución de señalización horizontal.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/09/2017 - 02:38 PM
JULIO 2017: TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+390) . Limpieza de derrumbe. Mantenimiento de tramo TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+300) . Excavación para colocación de delineadores. Replanteo de eje y bordes para ejecución de señalización horizontal.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/09/2017 - 02:38 PM
JUNIO 2017: Mediante oficio MTOP-CONS_LOJ-17-16-OF, de fecha 01 de junio de 2017, la Fiscalización notifica a la Contratista la finalización de la suspensión temporal, a fin que se proceda con la reprogramación e inicio de los trabajos pertinentes a partir del 01 de junio de 2017. MAYO 2017.- Por la fuerte estación invernal que esta atravesando la zona del proyecto y a pedido del contratista, el 24 de marzo de 2017 se suspenden los trabajos.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	06/07/2017 - 11:12 AM
ABRIL 2017.- Por la fuerte estación invernal que esta atravesando la zona del proyecto y a pedido del contratista, el 24 de marzo de 2017 se suspenden los trabajos.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/06/2017 - 09:46 AM
MARZO 2017.- Por la fuerte estación invernal que esta atravesando la zona del proyecto y a pedido del contratista, el 24 de marzo de 2017 se suspenden los trabajos.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	09/05/2017 - 02:04 PM
FEBRERO 2017: TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+390) Construcción de cunetas LD, LI TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+290) Construcción de cunetas LD, LI	Alvarez Villacres, Hernán Roberto	20/04/2017 - 04:17 PM
ENERO 2017: TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+770) Colocación de carpeta asfáltica. Construcción de cunetas LI y LD TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+290) Transporte y tendido de Base Transporte y tendido de Mejoramiento Construcción de cunetas , LD Colocación de carpeta asfáltica	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	03/03/2017 - 11:58 AM
DICIEMBRE 2016: TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+770) Construcción de cunetas , LD TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+290) Transporte y tendido de Base	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	06/02/2017 - 04:53 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Transporte y tendido de Mejoramiento Construcción de cunetas , LD		
NOVIEMBRE 2016: TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+770) .Transporte y tendido de material de subbase. Construcción de cabezales Entrada y Salida TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+290) . Transporte y tendido de Base 12+454 - 10+800 . Construcción de subdren para empatar con la Parroquia Teniente Maximiliano. Construcción de cabezales Entrada y Salida . Armado y fundición de losa inferior alcantarilla ducto cajón 6+460 . Construcción de muros de ala alcantarilla de cajón 9+545	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	03/01/2017 - 10:15 AM
OCTUBRE 2016: TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+770) Transporte y tendido de material de subbase. Construcción de cabezales Entrada y Salida TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+290) Transporte y tendido de Base. Se realiza la imprimación. Excavación en suelo y colocación de Mejoramiento. Construcción de cabezales Entrada y Salida. Construcción de muros de ala alcantarillas de cajón.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	07/11/2016 - 02:57 PM
SEPTIEMBRE 2016: TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+770): Transporte y tendido de material de subbase. Construcción de subdrenes. Colocación de alcantarilla metálica. Construcción de cabezales. TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+290): Construcción de cabezales. Transporte y tendido de material de subbase. Fundición de losas superiores alcantarillas de cajón	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	07/11/2016 - 02:56 PM
AGOSTO 2016: TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+770) -Transporte de material de subbase. - Construcción de cabezales abscisa entrada y salida. - Construcción de subdrenes. -Arreglo conexión alcantarillado sanitario. - Colocacion de tubo de acero corrugado D=1.20 m. -En cumplimiento de Oficio Nro. MTOP-CONS_LOJ-16-165-OF, de fecha 02-09-2016, se encuentra pendiente de legalizar el plazo contractual. TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+290) -Construcción de cabezales entrada y salida. - Transporte y tendido de material de subbase. - Replanto alcantarillas ducto cajón. -Armado de losa inferior alcantarilla cajon	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	06/10/2016 - 03:38 PM
Julio 2016: TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+770) Limpieza de derrumbes. Desalojo del material producto de la limpieza de derrumbes hasta la escombrera. Transporte de material de mejoramiento desde la mina la Zanja. Construcción de cabezales varias abscisas	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/09/2016 - 05:17 PM
Junio 2016: Se realiza mantenimiento de la vía. En el tramo Cruzpamba-"Y" del Muerto se ejecuta trabajos de reposición de datos topográficos para nivel de mejoramiento y ancho de la vía.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/08/2016 - 03:51 PM
MAYO 2016: Mediante Oficio Nro. MTOP-CONS_LOJ-16-71-OF, la Fiscalización del Contrato, basado en las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES. MOP-001-F-2002, apartado 103-2.05. Suspensión temporal de los Trabajos.- considera pertinente aplicar una suspensión temporal de los trabajos en forma completa, desde el 31 de marzo del 2016 por causa del invierno presente, hasta que cesen las lluvias intensas que viene soportando la región.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	03/06/2016 - 03:42 PM
ABRIL 2016: Mediante Oficio Nro. MTOP-CONS_LOJ-16-71-OF, la Fiscalización del Contrato, basado en las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES. MOP-001-F-2002, apartado 103-2.05. Suspensión temporal de los Trabajos.- considera pertinente aplicar una suspensión temporal de los trabajos en forma completa, desde el 31 de marzo del 2016 por causa del invierno presente, hasta que cesen las lluvias intensas que viene soportando la región.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/05/2016 - 02:28 PM
MARZO 2016: TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+770) . Construcción de subdrenes desde abscisa 5+193 - 5+641 LI TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+290). Armado y de los muros de ala entrada alcantarilla de cajón abscisa 10+656. Fundición de losa superior alcantarilla de cajón abscisa 15+220 . Encofrado de losa superior alcantarilla de cajón abscisa 13+834	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/05/2016 - 02:24 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2016:                      TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+770) . Construcción de subdrenes desde abscisa 5+193 - 5+641 LI                      TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+290). Armado y de los muros de ala entrada alcantarilla de cajón abscisa 10+656. Fundición de losa superior alcantarilla de cajón abscisa 15+220 . Encofrado de losa superior alcantarilla de cajón abscisa 13+834</p>	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/05/2016 - 02:20 PM
<p>ENERO 2016.-                      TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+770) . Construcción de subdrenes desde abscisa 2+504 - 2+990 LI . Transporte de mejoramiento desde abscisa 9+680 - 9+800.                      TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+290) . Construcción alcantarilla de cajón abscisa 10+656 (armado pantallas y encofrado de losa superior). Replanteo y armado losa inferior alcantarilla de cajón abscisa 15+220</p>	Paredes Ortega, Ángel Alberto	05/02/2016 - 02:26 PM
<p>DICIEMBRE 2015:                      TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+770): Colocación de tubería de acero corrugado Km 09+449, 9+580, 10+147, 10+240. Construcción de subdrenes 3+785-4+000 lado derecho.                      TRAMO 2: CRUZPAMBA-"Y" DEL MUERTO (0+000 - 16+290): Arreglo de tubería de alcantarillado sanitario Km. 0+150. parroquia Cruzpamba.</p>	Paredes Ortega, Ángel Alberto	05/02/2016 - 02:25 PM
<p>NOVIEMBRE 2015:                      TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA                      .Tendido de material de mejoramiento km 8+000 - 10+300 primera capa . Transporte de material de mejoramiento 8+000 . Construcción de subdrenes 0+900 - 1+700                      TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO                      . Transporte de subbase 7+950 - 7+750 desde la mina Potrerillos . Transporte de mejoramiento 0+150 - 0+350 desde mina potrerillos</p>	Paredes Ortega, Ángel Alberto	05/01/2016 - 03:08 PM
<p>OCTUBRE 2015:                      TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+770).- Se realizan las siguientes actividades: Tendido de material de mejoramiento. Excavación en suelo para plataforma. Agua para control de polvo. Transporte de material de mejoramiento.                      TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO.- Se realizan las siguientes actividades: Tendido de material de mejoramiento. Excavación en suelo para plataforma. Limpieza de alcantarillas. Hormigón Ciclópeo y Hormigón estructural y acero de refuerzo. Control de polvo. Transporte de materiales (&gt;500m). Colocación de material de mejoramiento en la subrasante con suelo seleccionado. Colocación de geotextil para subdrenes y material filtrante.</p>	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	07/12/2015 - 12:24 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015:                      TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+770).- Se realizan las siguientes actividades: Tendido de material de mejoramiento. Excavación en suelo para plataforma. Agua para control de polvo. Transporte de material de mejoramiento.                      TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO.- Se realizan las siguientes actividades: Tendido de material de mejoramiento. Excavación en suelo para plataforma. Limpieza de alcantarillas. Hormigón Ciclópeo y Hormigón estructural y acero de refuerzo. Control de polvo. Transporte de materiales (&gt;500m). Colocación de material de mejoramiento en la subrasante con suelo seleccionado.</p>	Ludeña Granda, Luis Alfredo	06/11/2015 - 03:32 PM
<p>AGOSTO 2015:                      TRAMO 1: CELICA - CRUZPAMBA (0+000 - 10+770).- Se realizan las siguientes actividades: . Excavación en Suelo. . Agua para control de polvo. . Acabado de Obra Básica Abscisa Y Transporte de material producto de la excavación a escombreras absc. 2+410.                      TRAMO 2: CRUZPAMBA - "Y" DEL MUERTO.- Se realizan las siguientes actividades: Movimientos de tierra. . Excavación para plataforma. . Transporte de materiales (&gt;500m. . Colocación de material de mejoramiento en la subrasante con suelo seleccionado. . Transporte de material de mejoramiento, sub-base, base y material filtrante. . Colocación de subbase. . Transporte de subbase.</p>	Ludeña Granda, Luis Alfredo	10/09/2015 - 11:20 AM
<p>JULIO 2015:                      Hasta la fecha la empresa contratista ha realizado los siguientes trabajos: Movimiento de tierras en un 95% de todo el proyecto; Colocación de alcantarillas de acero corrugado en un 85% de toda la vía; Material de Mejoramiento en el tramo 2 (Cruzpamba-"Y" del Muerto) del km. 3+00 al 16+120; Construcción de subdrenes en el tramo 2 (Cruzpamba-"Y" del Muerto) en una longitud de 2,50 km; Construcción de cabezales de hormigón ciclópeo en 15 alcantarillas en el tramo 2. En la actualidad la contratista realiza la trituración para obtener el material para la sub-base y base en el sector de la Mina denominada Potrerillos. Es necesario recalcar que con el subcontratista que la empresa ha contratado los trabajos estan sumamente retrazados, pese a varias comunicaciones que por parte de la fiscalización se ha enviado en el sentido que de que se cambie al actual subcontratista o se ingrese un nuevo subcontratista, para que los trabajos tengan un mayor rendimiento, hasta la fecha no se tiene ningún resultado por parte de</p>	Ludeña Granda, Luis Alfredo	10/09/2015 - 10:03 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
la contratista, que igualmente aducen que el MTOP no les cancela las planillas por los trabajos realizados.		
JUNIO 2015.- La contratista hasta la presente fecha ha trabajado en la colocación de mejoramiento en el tramo 2 y construcción de cabezales en el mismo tramo "Y" del Muerto.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	16/07/2015 - 10:47 AM
MAYO 2015.- La contratista hasta la presente fecha ha trabajado en la colocación de tubería metálica para alcantarillas en un 80% a lo largo de todo el proyecto, colocación de mejoramiento en el tramo y construcción de cabezales en el tramo 2 Cruzpamba "Y" del Muerto.		
Abril 2015.- La contratista se encuentra colocando material de mejoramiento para Subrasante, construcción de subdrenes, cabezales de alcantarillas en el tramo 2 Cruzpamba-"Y" del Muerto y limpieza de derrumbes en el tramo 1 Celica-Cruzpamba.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	08/06/2015 - 04:26 PM
FEBRERO 2015.- La empresa Constructora continua realizando trabajos de colocación de alcantarillas y colocación de mejoramiento en el tramo II Celica-Cruzpamba y Cruzpamba "Y" del Muerto, cuyo longitud del proyecto es de 28 KM.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	06/03/2015 - 12:37 PM
ENERO 2015.- La empresa Constructora continua realizando trabajos de movimiento de tierras, y desalojo de materiales en los tramo Celica-Cruzpamba y Cruzpamba "Y" del Muerto, cuyo longitud del proyecto es de 28 KM.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	10/02/2015 - 02:45 PM
DICIEMBRE 2014.- La empresa Constructora continua realizando trabajos de movimiento de tierras, teniendo un avance en este rubro del 90% cuyo longitud del proyecto es de 28 KM.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	06/02/2015 - 10:35 AM
Noviembre de 2014.- Contratista ejecutando trabajos de movimientos de tierras, transporte de material, desbroce, desbosque y limpieza. Se cumple trabajos 24/7.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	08/12/2014 - 12:22 PM
Julio de 2014.- los trabajos no se inician en la fecha establecida. agosto de 2014.- Los trabajos no se inician en la fecha establecida en el contrato. septiembre de 2014.- El 26 de septiembre del presente año se inician los trabajos con movimiento de tierras. Octubre de 2014.- En este periodo se ha realizado los trabajos de movimientos de tierras, transporte de material, desbroce, desbosque y limpieza.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	08/12/2014 - 08:41 AM

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto
No hay información disponible

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACIÓN: Contrato suscrito realizado.	3-Adjudicación	02/07/2014		02/07/2014		Sí	1.0
2	EJECUCIÓN: Pago 7.5% de Anticipo	4-Inicio de Trabajo	25/07/2014		25/07/2014		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN: Pago 7.5% de Anticipo	5-Entregables Intermedios	27/07/2015		27/07/2015		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Tramo 1: Mejoramiento de la subrasante. Ejecutada	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		30/09/2016		Sí	6.0
5	EJECUCIÓN: Tramo 1: Obras de drenaje. Ejecutada	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		30/11/2016		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Tramo 2: Acabado de obra básica (Movimiento de tierras). Ejecutada	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		30/11/2016		Sí	6.0
7	EJECUCIÓN: Tramo 2: Mejoramiento de la subrasante. Ejecutada	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		30/09/2016		Sí	6.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	EJECUCIÓN: Tramo 2: Obras de drenaje. Ejecutada	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		30/11/2016		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Tramo 1: Acabado de obra básica (Movimiento de tierras). Ejecutada	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		30/11/2016		Sí	6.0
10	EJECUCIÓN: Tramo 1: Sub base clase 1. Ejecutada	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		30/11/2016		Sí	6.0
11	EJECUCIÓN: Tramo 2: Sub base clase 1. Ejecutada	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		30/11/2016		Sí	6.0
12	EJECUCIÓN: Tramo 1: Base clase 1A. Ejecutada	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2016		Sí	7.0
13	EJECUCIÓN: Tramo 1: Construcción de cunetas. Ejecutada	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2017		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Tramo 2: Base clase 1A. Ejecutada	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2016		Sí	7.0
15	EJECUCIÓN: Tramo 1: Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta. Ejecutada	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/01/2017		Sí	8.0
16	EJECUCIÓN: Tramo 2: Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta. Ejecutada	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		17/06/2017		Sí	8.0
17	EJECUCIÓN: Tramo 2: Construcción de cunetas. Ejecutada	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/07/2017		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN: Señalización Vial terminada	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/01/2018		Sí	5.0
19	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	1.0
20	CIERRE: Liquidación económica aprobada	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
21	CIERRE: Acta de Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	28/02/2020	28/02/2020			No	1.0
22	CIERRE: Acta de Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/08/2020	31/08/2020			No	1.0
23	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	30/09/2020	30/09/2020			No	2.0
24	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	30/10/2020	30/10/2020			No	1.0
25	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	30/11/2020	30/11/2020			No	1.0
26	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	18/12/2020	18/12/2020			No	1.5

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	0.5

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Tramo 1 de la vía presenta problemas	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	26/07/2017
2	Vía presenta avance del 75%	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	24/02/2017
3	Vía avanza de manera satisfactoria	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	28/12/2016
4	Obra presenta avance del 45%	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	25/10/2016
5	Obra avanza - supervisión positiva	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	26/08/2016
6	Construcción de vía paralizada	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	30/05/2016
7	Construcción de vía no avanza según lo programado, supervisión negativa	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	26/02/2016
8	Proyecto avanza en un 30%, supervisión negativa	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	27/11/2015
9	Reconstrucción de carretera Celica-Cruzpamba no avanza según lo planificado	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	30/09/2015
10	Reconstrucción de carretera Celica-Cruzpamba no avanza según lo planificado	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/07/2015
11	Avance de trabajos via Celica-Cruzpamba-Y del Muerto	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	22/12/2014
12	Reconstrucción de carretera retrasada	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	23/02/2015
13	Construcción de carretera retrasada	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	27/04/2015

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	PORCENTAJE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS		100.00 %	1	1	25/07/2014	Diciembre
2	PORCENTAJE DE AVANCE DE CALZADA		100.00 %	1	1	01/12/2014	Diciembre
3	PORCENTAJE DE AVANCE DE DRENAJE		100.00 %	1	1	01/01/2015	Diciembre


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	960,260.37
Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,193,348.09 **
Costo Total:	12,803,471.63
Total Devengado:	16,847,491.96
% Costo Total Devengado:	131.59 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 131.59 %

**Perfil Económico 2019**

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	11,033,212.81	0.00	0.00	11,033,212.81
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	23,549,141.71	0.00	0.00	23,549,141.71
Ppto. Comprometido	21,243,192.88	0.00	0.00	21,243,192.88
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	13,499,954.91	1,345,856.13	0.00	14,845,811.04
Ppto. Devengado	16,847,491.96	0.00	0.00	16,847,491.96
Pagado Real	13,304,695.06	0.00	0.00	13,304,695.06
Estimado a fin de año	* 16,847,491.96	0.00	0.00	16,847,491.96
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-3,347,537.05	1,345,856.13	0.00	-2,001,680.92
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 124.80 %	0.00 %	0.00 %	113.48 %
Ppto. Codificado 998	4,841,308.69	0.00	0.00	4,841,308.69
Ppto. Devengado 998	4,345,715.44	0.00	0.00	4,345,715.44

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019**

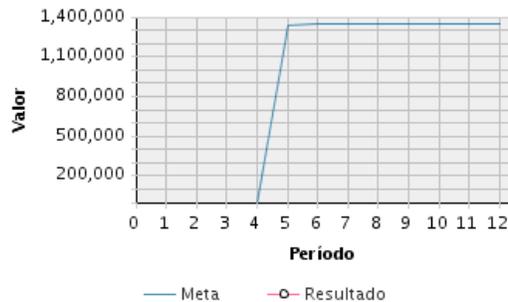

**Presupuesto Mensual 2019**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	1,335,856.13		1,335,856.13				
Jun	10,000.00		1,345,856.13				
Jul	0.00		1,345,856.13				
Ago	0.00		1,345,856.13				
Sep	0.00		1,345,856.13				
Oct	0.00		1,345,856.13				
Nov	0.00		1,345,856.13				
Dic	0.00		1,345,856.13				
<b>Total</b>	<b>1,345,856.13</b>						

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	1. CONTRATO ORIGINAL PROYECTO CELICA-Y DEL MUERTO	CONTRATO_ORIGINAL_CELICA-CRUZPAMBA-Y_DEL_MUERTO.pdf	07/12/2016
2	2. ORDEN DE CAMBIO 1	ORDEN_DE_CAMBIO_No._1.pdf	07/12/2016
3	3. ORDEN DE CAMBIO 2	ORDEN_DE_CAMBIO_No._2.pdf	07/12/2016
4	4. ORDEN DE CAMBIO 3	ORDEN_DE_CAMBIO_No._3.pdf	07/12/2016
5	5. ORDEN DE CAMBIO 4	ORDEN_DE_CAMBIO_No._4_SINOHYDRO_CON_FECHA.pdf	07/12/2016
6	6. ORDEN DE CAMBIO 5	ORDEN_DE_CAMBIO_No._5.pdf	07/12/2016
7	7. DICTAMEN PRIORIDAD SENPLADES CELICA-CRUZPAMBA-Y DEL MUERTO	DICATAMEN_PRIORIDAD_SENPLADES_CELICA.pdf	07/12/2016
8	8. ORDEN DE CAMBIO No. 6	ORDEN_DE_CAMBIO_No._6.pdf	21/04/2017
9	9. CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1	Complementario_1__Sinohydro.pdf	21/04/2017
10	A. INFORMES DE FISCALIZACIÓN 1, 2 Y 3	INFORMES_DE_FISCALIZACION_1_2_y_3.zip	21/04/2017
11	A. ORDEN DE CAMBIO No. 08	ORDEN_DE_CAMBIO_No._8.pdf	04/12/2017
12	A.1 Informe ejecutivo Julio 2014	Infor-ejecutivo_agost-2014.pdf	12/11/2014
13	A.2 Informe ejecutivo agosto-2014	Infor-ejecutivo_agost-2014.pdf	12/11/2014
14	A.3 Informe ejecutivo septiembre-2014	Infor-ejecutivo_sept-2014.pdf	12/11/2014
15	A.4 Informe ejecutivo octubre 2014	Infor-ejecutivo_Oct-2014.pdf	08/12/2014
16	A.5 Informe ejecutivo noviembre 2014	Infor-ejecutivo_Nov-2014.pdf	08/12/2014
17	A.6 Informe ejecutivo diciembre-2014	Infor-ejecutivo_Dic-2014.pdf	06/01/2015
18	B.1 Informe ejecutivo enero 2015	Infor-ejecutivo_enero-2015.pdf	06/02/2015
19	B.2 Informe Ejecutivo febrero 2015 SITOP	Infor-ejecutivo_feb-2015.pdf	06/03/2015
20	B.3 Informe ejecutivo marzo 2015	Infor-ejecutivo_marzo_2015.pdf	08/04/2015
21	B.4 Informe ejecutivo abril 2015	Informe_ejecutivo_abril-2015.pdf	06/05/2015
22	B.5 Informe ejecutivo mayo 2015	Infor-ejecutivo_mayo-2015.pdf	09/06/2015
23	B.6 Informe ejecutivo junio-2015	Infor-ejecutivo_junio-2015.pdf	09/07/2015
24	B.7 Informe ejecutivo julio-2015	Informes_Ejecutivos_Jul-2015.pdf	14/09/2015
25	B.8 Informe ejecutivo Ago-2015	Informes_Ejecutivos_Agos-2015.pdf	14/09/2015
26	B.9 Informe ejecutivo Sept-2015	Informes_Ejecutivos_Sept-2015.pdf	08/10/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
27	B10 Informe ejecutivo octubre-2015	Informe_ejecutivo_Octubre-2015.pdf	09/12/2015
28	B11 Informe ejecutivo Noviembre-2015	Informe_ejecutivo_Noviembre-2015.pdf	09/12/2015
29	B12 Informe Ejecutivo Diciembre 2015	Diciembre_2015.pdf	05/05/2016
30	C.1 Informe Ejecutivo Enero 2016	Enero_2016.pdf	05/05/2016
31	C.2 Informe Ejecutivo Febrero 2016	Febrero_2016.pdf	05/05/2016
32	C.3 Informe Ejecutivo Marzo 2016	Marzo_2016.pdf	05/05/2016
33	C.4 Informe Ejecutivo Abril 2016	Abril_2016.pdf	21/04/2017
34	C.5 Informe Ejecutivo Mayo 2016	Mayo_2016.pdf	21/04/2017
35	C.6 Informe Ejecutivo Junio 2016	Junio_2016.pdf	21/04/2017
36	C.7 Informe Ejecutivo Julio 2016	Julio_2016.pdf	21/04/2017
37	C.8 Informe Ejecutivo Agosto 2016	Agosto_2016.pdf	21/04/2017
38	C.9 Informe Ejecutivo Septiembre 2016	Septiembre_2016.pdf	21/04/2017
39	C10 Informe Ejecutivo Octubre 2016	Octubre_2016.pdf	21/04/2017
40	C11 Informe Ejecutivo Noviembre 2016	Noviembre_2016.pdf	21/04/2017
41	C12 Informe Ejecutivo Diciembre 2016	Diciembre_2016.pdf	21/04/2017
42	E.1 Informe Ejecutivo Enero 2017	Enero_2017.pdf	21/04/2017
43	E.2 Informe Ejecutivo Febrero 2017	Febrero_2017.pdf	21/04/2017
44	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	Informe_SITOP_Septiembre_2018_Celica-Cruzpamba.pdf	04/10/2018
45	Memorando No. MTOP-CGP-2019-650-ME AUTORIZACION FECHA FIN PROYECTO K026	Memorando_No._MTOP-CGP-2019-650-ME_AUTORIZACION_FECHA_FIN_PROYECTO_K026.pdf	29/05/2019
46	Memorando No. MTOP-DDL-2019-1092-ME SOLICITUD DE CAMBIO DE FECHA FIN PROYECTO K026	Memorando_No._MTOP-DDL-2019-1092-ME_SOLICITUD_DE_CAMBIO_DE_FECHA_FIN_PROYECTO_K026.pdf	29/05/2019
47	MEMORANDO TRAMITE DE RECEPCION PROVISIONAL PROYECTO K 26	MEMORANDO_TRAMITE_DE_RECEPCION_PROVISIONAL_PROYECTO_K_26.pdf	29/05/2019
48	REPORTE FINANCIERO CELICA- CRUZPAMBA	REPORTE_FINANCIERO_CELICA-_CRUZPAMBA.pdf	29/05/2019
49	Reporte Sitop ABRIL 2019 K026	Reporte_Sitop_ABRIL_2019_K026.pdf	29/05/2019
50	Reporte Sitop ENERO 2019 K026	Reporte_Sitop_ENERO_2019_K026.pdf	29/05/2019
51	Reporte Sitop FEBRERO 2019 K026	Reporte_Sitop_FEBRERO_2019_K026.pdf	29/05/2019
52	Reporte Sitop MARZO 2019 K026	Reporte_Sitop_MARZO_2019_K026.pdf	29/05/2019
53	Reporte Sitop MAYO 2019 K026	Reporte_Sitop_MAYO_2019_K026.pdf	05/06/2019
54	Reporte_Sitop_AGOSTO_2019_K026	Reporte_Sitop_AGOSTO_2019_K026.pdf	04/10/2019
55	Reporte_Sitop_DICIEMBRE_2019_K026	Reporte_Sitop_DICIEMBRE_2019_K026.pdf	04/01/2020
56	Reporte_Sitop_JULIO_2019_K026	Reporte_Sitop_JULIO_2019_K026.pdf	02/08/2019
57	Reporte_Sitop_JUNIO_2019_K026.pdf	Reporte_Sitop_JUNIO_2019_K026.pdf	04/07/2019
58	Reporte_Sitop_NOVIEMBRE_2019_k026	Reporte_Sitop_NOVIEMBRE_2019_k026.pdf	05/12/2019
59	Reporte_Sitop_OCTUBRE_2019_K026	Reporte_Sitop_OCTUBRE_2019_K026.pdf	05/11/2019
60	Reporte_Sitop_SEPTIEMBRE_2019_K026	Reporte_Sitop_SEPTIEMBRE_2019_K026.pdf	04/10/2019

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Subsecretario Regional 7			
Bustamante Rivera, Esner Fidel	Fiscalizador del proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Loja, Encargado	ebustamante@mtop.gob.ec	023974600
CORDERO SANCHEZ, ANDREA DEL CISNE	Analista de Presupuesto Distrital	ANALISTA DE PRESUPUESTO DISTRITAL	acordero@mtop.gob.ec	072561665 EXT72509

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	Coordinador de Técnico Infraestructura Distrital	Analista de Infraestructura Distrital 1	bhurtado@mtop.gob.ec	023974600
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Coordinadora de Planificación Zonal 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600
Rojas Cazar, Walter Emilio	Director Distrital MTOP-Loja	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Loja	wrojas@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
89110_1.jpg	03/05/2018
