

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1
Dirección Provincial Carchi

PROYECTO: K025 MTOP- Reconstrucción Mejoramiento y señalización de la Vía de Acceso a la Población de Mataje y Construcción del Puente Internacional Sobre el Río Mataje en la Provincia de Esmeraldas

Líder del Proyecto:	Benavides Bolaños, Wellington Renán (wbenavides@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cruz Chicaiza, Carlos René Alejandro	Programas Relacionados:	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS, Provincia - Carchi
Titular:	Benavides Bolaños, Wellington Renán	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.860.380151	TIR:	21.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	124.26
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,812,903.28
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Donaciones	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	03/01/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2015
Modificado por:	Benavides Bolaños, Wellington Renán	Fecha del siguiente Hito:	30/12/2019

DATOS GENERALES

Descripción

ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CABECERAS DE CARGA Y DOS CABECERAS DE PASAJEROS EN EL PASO DE FRONTERA DE RUMICHACA UBICADOS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA.

MONTO: 1' 120.000 USD

CONTRATISTA: Consorcio CVA - HIDROPLAN

LÍNEA BASE: 0

OBJETIVO: Implementar un Centro Binacional en la Frontera Norte en la provincia del Carchi para optimizar el control migratorio y de comercio exterior entre los países de la zona Andina, con ello se fomentará la producción reduciendo los costos en transporte y trámites migratorios.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Obtener los diseños arquitectónicos y estructurales de las zonas de atención migratoria y de carga.

Beneficios Cualitativos

Mejora el proceso de administración y control en la frontera norte, articulando instituciones como Migración, Policía Nacional, SENA, Min Turismo, ANT, entre otras. Optimiza tiempos de control y circulación vehicular.

Tipo de Beneficiario

Entidades del Estado para control migratorio de pasajeros y carga de transporte pesado. Habitantes y Turistas de la zona norte de Ecuador y la zona Sur de Colombia.


Restricciones

- 1.-Tiempo: Proceso congelado, no existe el desembolso del anticipo al consultor, no se tiene fecha de inicio, no se puede estimar el tiempo de finalización.
2. Costo: Proceso congelado, al momento no se puede devengar el monto presupuestado de este proyecto.
3. Recursos: No existe el desembolso del anticipo al consultor, en espera de respuesta.
4. Alcance: Proceso congelado, al momento no se obtiene el producto por el cual fue contratado.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

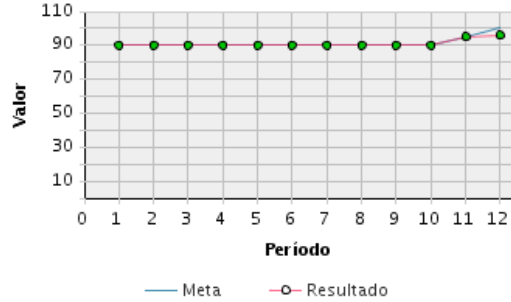

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %	100 %
	Avance real acumulado											
	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %	96 %
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2019</p> <p>*Con fecha del 02 de agosto del presente año, se firma el Contrato Complementario 3, que justifica incremento de monto y de plazo. Con fecha de 05 de Noviembre se da la orden de reinicio de trabajos, una vez realizado el desembolso del anticipo con esta fecha.</p> <p>*Existen un 100 % de productos de la Consultora presentados, y un 100 % de productos aprobados, por parte de la Subsecretaria Zona 1, Dirección Distrital del Carchi.</p> <p>*Al momento se cuenta con las aprobaciones de cada uno de los productos pertenecientes al estudio y se cuenta con la Aprobación Integral de los Estudios.</p> <p>*Se legaliza la Recepción Única del Estudio, con fecha 09 de diciembre de 2019</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	03/01/2020 - 05:10 PM
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>*Con fecha del 02 de agosto del presente año, se firma el Contrato Complementario 3, que justifica incremento de monto y de plazo. Con fecha de 05 de Noviembre se da la orden de reinicio de trabajos, una vez realizado el desembolso del anticipo con esta fecha.</p> <p>*Existen un 99 % de productos de la Consultora presentados, el 1% se encuentra en proceso de cierre, por parte de la Subsecretaria Zona 1, Dirección Distrital del Carchi.</p> <p>*Al momento se cuenta con las aprobaciones de cada uno de los productos pertenecientes al estudio y se cuenta con la Aprobación Integral de los Estudios.</p> <p>En trámite la Recepción Única del Estudio.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	05/12/2019 - 12:45 PM
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>Con fecha del 02 de agosto del presente año, se firma el Contrato Complementario 3, que justifica incremento de monto y de plazo. Con fecha de 05 de Noviembre se da la orden de reinicio de trabajos, una vez realizado el desembolso del anticipo con esta fecha.</p> <p>Existen un 98 % de productos de la Consultora presentados, el 2% se encuentra en proceso de revisión, por parte de Técnicos especializados en los diferentes temas.</p> <p>Una vez aprobados los productos a conformidad de la entidad contratante, se procederá a realizar la recepción única del estudio</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	05/11/2019 - 04:57 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>Con fecha del 02 de agosto del presente año, se firma el Contrato Complementario 3, que justifica incremento de monto y de plazo. Con fecha de 05 de Noviembre se da la orden de reinicio de trabajos, una vez realizado el desembolso del anticipo con esta fecha.</p> <p>Existen un 98 % de productos de la Consultora presentados, el 2% se encuentra en proceso de revisión, por parte de Técnicos especializados en los diferentes temas.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	04/10/2019 - 05:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Una vez aprobados los productos a conformidad de la entidad contratante, se procederá a realizar la recepción única del estudio		
<p>AGOSTO 2019</p> <p>Con fecha del 02 de agosto del presente año, se firma el Contrato Complementario 3, que justifica incremento de monto y de plazo. Con fecha de 05 de Noviembre se da la orden de reinicio de trabajos, una vez realizado el desembolso del anticipo con esta fecha. Existen un 97 % de productos de la Consultora presentados, el 3% se encuentra en proceso de revisión, por parte de Técnicos especializados en los diferentes temas. Una vez aprobados los productos a conformidad de la entidad contratante, se procederá a realizar la recepción única del estudio</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	03/09/2019 - 05:57 PM
<p>JULIO 2019</p> <p>Con fecha del 02 de agosto del presente año, se firma el Contrato Complementario 3, que justifica incremento de monto y de plazo. Con fecha de 05 de Noviembre se da la orden de reinicio de trabajos, una vez realizado el desembolso del anticipo con esta fecha. Existen un 97 % de productos de la Consultora presentados, el 3% se encuentra en proceso de revisión, por parte de Técnicos especializados en los diferentes temas. Una vez aprobados los productos a conformidad de la entidad contratante, se procederá a realizar la recepción única del estudio</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	02/08/2019 - 12:07 PM
<p>JUNIO 2019:</p> <p>Se realiza la respectiva socialización del proyecto: ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CABECERAS DE CARGA Y DOS CABECERAS DE PASAJEROS EN EL PASO DE FRONTERA DE RUMICHACA UBICADOS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA, frente a las entidades de control del Ecuador, con la participación de las instituciones del Estado que conforman el CEBAF Rumichaca, como son: Migración, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, Unidad de Vigilancia Aduanera UVA, Agrocalidad, Antinarcóticos, Policía de Migración, Policía de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador, Ministerio de Salud Pública y Unidad de Pesos y Dimensiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; la Dirección Distrital del Carchi.</p> <p>Por su parte la Dirección Distrital del Carchi, al constituirse el Administrador del contrato de estudios, realiza el seguimiento del recorrido de los diferentes componentes que conforman dicho estudio por parte de la Consultora a la entidad contratante.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	02/07/2019 - 03:45 PM
<p>MAYO 2019:</p> <p>Se realiza la respectiva socialización del proyecto: ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CABECERAS DE CARGA Y DOS CABECERAS DE PASAJEROS EN EL PASO DE FRONTERA DE RUMICHACA UBICADOS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA, frente a las entidades de control del Ecuador, con la participación de las instituciones del Estado que conforman el CEBAF Rumichaca, como son: Migración, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, Unidad de Vigilancia Aduanera UVA, Agrocalidad, Antinarcóticos, Policía de Migración, Policía de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador, Ministerio de Salud Pública y Unidad de Pesos y Dimensiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; la Dirección Distrital del Carchi.</p> <p>Por su parte la Dirección Distrital del Carchi, al constituirse el Administrador del contrato de estudios, realiza el seguimiento del recorrido de los diferentes componentes que conforman dicho estudio por parte de la Consultora a la entidad contratante.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	04/06/2019 - 02:18 PM
<p>ABRIL 2019:</p> <p>Dentro del requerimiento de socialización del proyecto: ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CABECERAS DE CARGA Y DOS CABECERAS DE PASAJEROS EN EL PASO DE FRONTERA DE RUMICHACA UBICADOS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA, la Dirección Distrital del Carchi, realiza el debido seguimiento para la aprobación definitiva de los componentes que conforman dicho estudio por parte de la Consultora a la entidad contratante. Con ello, se formaliza acciones de acercamiento para poder realizar la debida socialización con las instituciones del Estado que conforman el CEBAF Rumichaca, como son: Migración, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, Unidad de Vigilancia Aduanera UVA, Agrocalidad, Antinarcóticos, Policía de Migración, Policía de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador, Ministerio de Salud Pública y Unidad de Pesos y Dimensiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y con las instituciones homólogas de la República de Colombia; y por requerimiento con el Comité Cívico del Carchi.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	02/05/2019 - 02:27 PM
<p>MARZO 2019:</p>	Benavides Bolaños,	02/04/2019 - 11:38 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Dentro del requerimiento de socialización del proyecto: ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CABECERAS DE CARGA Y DOS CABECERAS DE PASAJEROS EN EL PASO DE FRONTERA DE RUMICHACA UBICADOS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA, la Dirección Distrital del Carchi, realiza el debido seguimiento para la aprobación definitiva de los componentes que conforman dicho estudio por parte de la Consultora a la entidad contratante. Con ello, se formaliza acciones de acercamiento para poder realizar la debida socialización con las instituciones del Estado que conforman el CEBAF Rumichaca, como son: Migración, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENA, Unidad de Vigilancia Aduanera UVA, Agrocalidad, Antinarcóticos, Policía de Migración, Policía de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador, Ministerio de Salud Pública y Unidad de Pesos y Dimensiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y con las instituciones homólogas de la República de Colombia; y por requerimiento con el Comité Cívico del Carchi.</p>	<p>Wellington Renán</p>	
<p>FEBRERO 2019:</p> <p>*Se aprueban los productos concernientes a Estudio de Instalaciones Eléctricas, Voz y Datos, Estudio de Instalaciones Electromecánicas, Estudios de Señalización, de Ecuador y de Colombia, se encuentra en proceso de revisión, por parte de Técnicos especializados en los diferentes temas.</p> <p>*Con fecha del 02 de agosto del presente año, se firma el Contrato Complementario 3, que justifica incremento de monto y de plazo, el proceso de estudio se encuentra paralizado, su inicio parte una vez que el anticipo se efectivice.</p> <p>*Con fecha de 05 de Noviembre se da la orden de reinicio de trabajos, una vez realizado el desembolso del anticipo con esta fecha.</p> <p>*Con esta fecha pasa del estado congelado al estado en ejecución, por lo que se solicita poder abrir el proyecto para poder cambiar al estado de EJECUCIÓN</p>	<p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p>	<p>02/03/2019 - 09:19 PM</p>
<p>ENERO 2019:</p> <p>*La Consultora presenta los productos concernientes a Estudio de Instalaciones Eléctricas, Voz y Datos, Estudio de Instalaciones Electromecánicas, Estudios de Señalización, de Ecuador y de Colombia, se encuentra en proceso de revisión, por parte de Técnicos especializados en los diferentes temas.</p> <p>*Con fecha del 02 de agosto del presente año, se firma el Contrato Complementario 3, que justifica incremento de monto y de plazo, el proceso de estudio se encuentra paralizado, su inicio parte una vez que el anticipo se efectivice.</p> <p>*Con fecha de 05 de Noviembre se da la orden de reinicio de trabajos, una vez realizado el desembolso del anticipo con esta fecha.</p> <p>*Con esta fecha pasa del estado congelado al estado en ejecución, por lo que se solicita poder abrir el proyecto para poder cambiar al estado de EJECUCIÓN</p>	<p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p>	<p>05/02/2019 - 12:29 PM</p>
<p>Diciembre 2018</p> <p>*La Consultora presenta los productos concernientes a Estudio de Instalaciones Eléctricas, Voz y Datos, Estudio de Instalaciones Electromecánicas, Estudios de Señalización, de Ecuador y de Colombia, se encuentra en proceso de revisión, por parte de Técnicos especializados en los diferentes temas.</p> <p>*Con fecha del 02 de agosto del presente año, se firma el Contrato Complementario 3, que justifica incremento de monto y de plazo, el proceso de estudio se encuentra paralizado, su inicio parte una vez que el anticipo se efectivice.</p> <p>*Con fecha de 05 de Noviembre se da la orden de reinicio de trabajos, una vez realizado el desembolso del anticipo con esta fecha.</p> <p>*Con esta fecha pasa del estado congelado al estado en ejecución, por lo que se solicita poder abrir el proyecto para poder cambiar al estado de EJECUCIÓN</p>	<p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p>	<p>04/01/2019 - 02:10 PM</p>
<p>Noviembre 2018</p> <p>*La Consultora presenta los productos concernientes a Estudio de Instalaciones Eléctricas, Voz y Datos, Estudio de Instalaciones Electromecánicas, Estudios de Señalización, de Ecuador y de Colombia, se encuentra en proceso de revisión, por parte de Técnicos especializados en los diferentes temas.</p> <p>*Con fecha del 02 de agosto del presente año, se firma el Contrato Complementario 3, que justifica incremento de monto y de plazo, el proceso de estudio se encuentra paralizado, su inicio parte una vez que el anticipo se efectivice.</p> <p>*Con fecha de 05 de Noviembre se da la orden de reinicio de trabajos, una vez realizado el desembolso del anticipo con esta fecha.</p> <p>*Con esta fecha pasa del estado congelado al estado en ejecución, por lo que se solicita poder abrir el proyecto para poder cambiar al estado de EJECUCIÓN.</p>	<p>Benavides Bolaños, Wellington Renán</p>	<p>04/12/2018 - 12:22 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Octubre 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> * La Consultora una vez que presenta los productos, Estudio de Instalaciones Eléctricas, voz y Datos, Estudio de Instalaciones Electromecánicas, Estudios de Señalización, de Ecuador y de Colombia, se encuentra en proceso de revisión, por parte de los técnicos afines a los productos en revisión. * Con fecha del 02 de agosto del presente año, se firma el Contrato Complementario 3, que justifica incremento de monto y de plazo, el proceso de estudio se encuentra paralizado, su inicio parte una vez que el anticipo se efectivice. 	Benavides Bolaños, Wellington Renán	04/11/2018 - 12:22 PM
<p>Septiembre 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> -La Consultora una vez que presenta los productos, Estudio de Instalaciones Eléctricas, voz y Datos, Estudio de Instalaciones Electromecánicas, Estudios de Señalización, de Ecuador y de Colombia, se encuentra en proceso de revisión, por parte de los técnicos afines a los productos en revisión. -Con fecha del 02 de agosto del presente año, se firma el Contrato Complementario 3, que justifica incremento de monto y de plazo, el proceso de estudio se encuentra paralizado, su inicio parte una vez que el anticipo se efectivice. 	Benavides Bolaños, Wellington Renán	02/10/2018 - 03:51 PM
<p>Agosto 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> -La Consultora una vez que presenta los productos, Estudio de Instalaciones Eléctricas, voz y Datos, Estudio de Instalaciones Electromecánicas, Estudios de Señalización, de Ecuador y de Colombia, se encuentra en proceso de revisión. -Con fecha del 02 de agosto del presente año, se firma el Contrato Complementario 3, que justifica incremento de monto y de plazo, el proceso de estudio se encuentra paralizado, su inicio parte una vez que el anticipo se efectivice. 	Benavides Bolaños, Wellington Renán	05/09/2018 - 03:34 PM
<p>Julio 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> -En proceso de revisión y posterior aprobación de los productos 13,14,15 dentro de una reprogramación aprobada. -La Consultora realiza la socialización del avance del estudio según Acta Paritaria No.31 realizada en las oficinas de Rumichaca. -Aprobado el Aval correspondientes al Contrato Complementario No.3. -Se solicita se legalice la firma del Contrato Complementario No.3 el cual traduce el incremento en plazo y el incremento en monto. - Se solicita realizar la apertura del proyecto, para poder modificar el estado del proyecto ya que actualmente se encuentra en la Fase Actual: Congelado, y se desea cambiar a la Fase Actual: Ejecución, ya que el proyecto se encuentra en ejecución. 	Benavides Bolaños, Wellington Renán	02/08/2018 - 02:16 PM
<p>Junio 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> -En proceso de revisión y posterior aprobación de los productos 13,14,15 dentro de una reprogramación aprobada. -La Consultora realiza la socialización del avance del estudio según Acta Paritaria No.31 realizada en las oficinas de Rumichaca. -Aprobado el Aval correspondientes. -Se solicita se legalice la firma del Contrato Complementario No.3 el cual traduce el incremento en plazo y el incremento en monto. - Se solicita realizar la apertura del proyecto, para poder modificar el estado del proyecto ya que actualmente se encuentra en la Fase Actual: Congelado, y se desea cambiar a la Fase Actual: Ejecución, ya que el proyecto se encuentra en ejecución. 	Benavides Bolaños, Wellington Renán	02/07/2018 - 12:18 PM
<p>Mayo 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> -En proceso de revisión y posterior aprobación de los productos 13,14,15 dentro de una reprogramación aprobada. -La Consultora realiza la socialización del avance del estudio según Acta Paritaria No.31 realizada en las oficinas de Rumichaca. -Se solicita se legalice la firma del Contrato Complementario No.3 el cual traduce el incremento en plazo y el incremento en monto. - Se solicita realizar la apertura del proyecto, para poder modificar el estado del proyecto ya que actualmente se encuentra en la Fase Actual: Congelado, y se desea cambiar a la Fase Actual: Ejecución, ya que el proyecto se encuentra en ejecución. 	Benavides Bolaños, Wellington Renán	04/06/2018 - 02:14 PM
<p>Abril 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> -En proceso de revisión y posterior aprobación de los productos 13,14,15 dentro de una reprogramación aprobada. 	Benavides Bolaños, Wellington Renán	04/05/2018 - 04:22 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-La Consultora realiza la socialización anteproyecto del Terminal de Carga de Colombia, ante la reunión binacional realizada en las oficinas de Rumichaca.</p> <p>-Se solicita se legalice la firma del Contrato Complementario No.3 el cual traduce el incremento en plazo y el incremento en monto.</p> <p>- Se solicita realizar la apertura del proyecto, para poder modificar el estado del proyecto ya que actualmente se encuentra en la Fase Actual: Congelado, y se desea cambiar a la Fase Actual: Ejecución, ya que el proyecto se encuentra en ejecución.</p>		
<p>Marzo 2018:</p> <p>-En proceso de revisión y posterior aprobación de los productos 13,14,15 dentro de una reprogramación aprobada.</p> <p>-La Consultora realiza la presentación del 3er anteproyecto del Terminal de Carga de Colombia, ante la reunión binacional realizada en la ciudad de Ipiales.</p> <p>-Se solicita se legalice la firma del Contrato Complementario No.3 el cual traduce el incremento en plazo y el incremento en monto.</p> <p>- Se solicita realizar la apertura del proyecto, para poder modificar el estado del proyecto ya que actualmente se encuentra en la Fase Actual: Congelado, y se desea cambiar a la Fase Actual: Ejecución, ya que el proyecto se encuentra en ejecución.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	04/04/2018 - 04:23 PM
<p>FEBRERO 2018:</p> <p>-Se continúa con la entrega de los productos para su revisión y aprobación de los productos 13,14 dentro de una reprogramación aprobada.</p> <p>-La Consultora realiza la presentación del 3er anteproyecto del Terminal de Carga de Colombia, ante la reunión binacional realizada en la ciudad de Ipiales.</p> <p>-Se solicita se legalice la firma del Contrato Complementario No.3 el cual traduce el incremento en plazo y el incremento en monto.</p> <p>- Se solicita realizar la apertura del proyecto, para poder modificar el estado del proyecto ya que actualmente se encuentra en la Fase Actual: Congelado, y se desea cambiar a la Fase Actual: Ejecución, ya que el proyecto se encuentra en ejecución.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	22/03/2018 - 02:34 PM
<p>Enero 2018:</p> <p>-Se continúa con la entrega de los productos para su revisión y aprobación de los productos 8,9,10,11,12 dentro de una reprogramación aprobada.</p> <p>-La Consultora realiza la presentación del 2 anteproyecto del Terminal de Carga de Ecuador y de Colombia, ante la reunión binacional realizada en la ciudad de Ipiales.</p> <p>-Se realiza la revisión del diseño de los Estudios Arquitectónicos y Estructurales, del terminal de carga y de pasajeros Ecuador y de Colombia.</p> <p>- Se solicita realizar la apertura del proyecto, para poder modificar el estado del proyecto ya que actualmente se encuentra en la Fase Actual: Congelado, y se desea cambiar a la Fase Actual: Ejecución, ya que el proyecto se encuentra en ejecución.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	22/03/2018 - 08:11 AM
<p>Diciembre 2017:</p> <p>-Se continúa con la entrega de los productos para su revisión y aprobación del producto 6 y del producto 7, dentro de una reprogramación aprobada.</p> <p>-La Consultora realiza la presentación del anteproyecto del Terminal de Carga de Ecuador y de Colombia, ante la reunión binacional realizada en la ciudad de Ipiales.</p> <p>-Se realiza la revisión del diseño de las vías que convergen al terminal de carga y de pasajeros Ecuador.</p> <p>- Se solicita realizar la apertura del proyecto, para poder modificar el estado del proyecto ya que actualmente se encuentra en la Fase Actual: Congelado, y se desea cambiar a la Fase Actual: Ejecución, ya que el proyecto se encuentra en ejecución.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	05/01/2018 - 05:08 PM
<p>Noviembre 2017:</p> <p>-Se continua con la entrega de los productos dentro de una reprogramación a, los cuales modifican el tiempo, incluyendo rubros y cantidades propuestas.</p> <p>-La Consultora en la actualidad cuenta realiza la entrega del anteproyecto del Terminal de Carga de Ecuador y de Colombia.</p> <p>-Se realiza la entrega de los productos 6 y 7 para su revisión.</p> <p>-La Consultora en la actualidad cuenta realiza la entrega del anteproyecto del Terminal de Pasajeros de Ecuador y de Colombia, dentro del marco del Contrato de Consultoría CPC-SR1-DPC-01-2015.</p> <p>-Estudio en ejecución.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	03/12/2017 - 01:15 PM
<p>OCTUBRE 2017:</p>	Benavides Bolaños,	01/11/2017 - 08:40 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Se realiza una reprogramación a los productos, los cuales modifican el tiempo, incluyendo rubros y cantidades propuestas.</p> <p>-La Consultora en la actualidad cuenta realiza la entrega del anteproyecto del Terminal de Carga de Ecuador y de Colombia.</p> <p>-La Consultora en la actualidad cuenta realiza la entrega del anteproyecto del Terminal de Pasajeros de Ecuador y de Colombia, dentro del marco del Contrato de Consultoría CPC-SR1-DPC-01-2015.</p>	Wellington Renán	
<p>Septiembre 2017:</p> <p>-Se analiza la posibilidad de realizar una reprogramación a los productos, los cuales modifican el tiempo, incluyendo rubros y cantidades propuestas.</p> <p>-La Consultora en la actualidad cuenta con la con el Diseño Geométrico Y Dibujo Topográfico de las vías internas, trabajos de sísmica de refracción y Estudio de Exploración Geotécnica para cimentación de edificaciones, dentro del marco del Contrato de Consultoría CPC-SR1-DPC-01-2015.</p>	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	04/10/2017 - 12:31 PM
<p>Agosto 2017:</p> <p>-Se analiza la posibilidad de realizar una reprogramación a los productos, los cuales modifican el tiempo, sin alterar el costo de los estudios incluyendo rubros y cantidades propuestas.</p> <p>-La Consultora trabaja para la entrega del tercer producto, para su análisis y aprobación.</p>	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	04/09/2017 - 05:28 PM
<p>JULIO 2017</p> <p>-Se entrega el segundo producto correspondiente al Anteproyecto de las Adecuaciones Terminales de carga y pasajeros de Ecuador y de Colombia, dentro del análisis y aprobación.</p> <p>-Reprogramación del proyecto en base a acuerdos Binacionales Ecuador y Colombia.</p>	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	05/08/2017 - 01:07 PM
<p>Junio 2017</p> <p>-El 03 de mayo de 2017 se legaliza el contrato complementario para modificar el alcance de los estudios de acuerdo a las reuniones binacionales.</p> <p>-Se define las infraestructuras a readecuarse en el CEBAF Rumichaca por parte de los dos países.</p> <p>-Se encuentra aprobado la fase de Factibilidad.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	04/07/2017 - 04:27 PM
<p>Mayo 2017</p> <p>-El 03 de mayo de 2017 se legaliza el contrato complementario para modificar el alcance de los estudios de acuerdo a las reuniones binacionales.</p> <p>-Se define las infraestructuras a readecuarse en el CEBAF Rumichaca por parte de los dos países. ---Se encuentra en fase de Factibilidad.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	04/07/2017 - 04:26 PM
<p>Abril 2017:</p> <p>- A pesar de que con fecha del 01 de febrero de 2017, se acredita a la Consultora CVA HIDROPLAN, el valor de \$ 476.189,87 USD.</p> <p>- El proyecto se encuentra congelado, en espera de elaboración de un contrato complementario el cual justifica la reprogramación del proyecto</p> <p>- La Reprogramación nace de los acuerdos y compromisos binacionales adquiridos, para proporcionar los diseños del CEBAF RUMICHACA a Colombia para que ejecute la obra física e instalaciones.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	04/05/2017 - 09:43 AM
<p>Marzo 2017:</p> <p>- A pesar de que con fecha del 01 de febrero de 2017, se acredita a la Consultora CVA HIDROPLAN, el valor de \$ 476.189,87 USD. El proyecto se encuentra congelado, se analiza la reprogramación del proyecto.</p> <p>- La Reprogramación nace de los acuerdos y compromisos binacionales adquiridos, para proporcionar los diseños del CEBAF RUMICHACA a Colombia para que ejecute la obra física e instalaciones.</p> <p>- Se ha dispuesto de igual manera realizar los estudios de funcionalidad adecuando el espacio físico disponible.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	05/04/2017 - 10:46 AM
<p>Febrero 2017:</p> <p>- Proyecto congelado, se espera la aprobación de la solicitud de aval para la acreditación del anticipo al consultor de los estudios.</p> <p>- Proyecto necesario de acuerdo a compromisos binacionales adquiridos, para proporcionar los diseños del CEBAF RUMICHACA a Colombia para que ejecute la obra física e instalaciones.</p> <p>- Se ha dispuesto de igual manera realizar los estudios de funcionalidad adecuando el espacio físico disponible.</p>	Benavides Bolaños, Wellington Renán	01/03/2017 - 04:42 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Se realizó el cambio de denominación de cuenta para administrar los fondos correspondientes a los proyectos binacionales con el país de Colombia.		
ENERO 2017 - Proyecto congelado, en espera la aprobación de la solicitud de aval para la acreditación del anticipo al consultor de los estudios. - Se realizó el cambio de denominación de cuenta para administrar los fondos correspondientes a los proyectos binacionales con el país de Colombia, - Proyecto necesario de acuerdo a compromisos binacionales adquiridos, para proporcionar los diseños del CEBAF RUMICHACA a Colombia para que ejecute la obra física e instalaciones. - Se ha dispuesto de igual manera realizar los estudios de funcionalidad adecuando el espacio físico disponible.	Benavides Bolaños, Wellington Renán	03/02/2017 - 02:17 PM
Diciembre 2016: - Proyecto congelado, en espera la aprobación de la solicitud de aval para la acreditación del anticipo al consultor. - Se realizó el cambio de denominación de cuenta para administrar los fondos correspondientes a los proyectos binacionales con el país de Colombia, - Proyecto necesario de acuerdo a compromisos binacionales adquiridos, para proporcionar los diseños del CEBAF RUMICHACA a Colombia para que ejecute la obra física e instalaciones. - Se ha dispuesto de igual manera realizar los estudios de funcionalidad adecuando el espacio físico actual.	Benavides Bolaños, Wellington Renán	05/01/2017 - 08:43 AM
Noviembre 2016: -Se realizó el cambio de denominación de cuenta para administrar los fondos correspondientes a los proyectos binacionales con el país de Colombia, Proyecto congelado, en espera la aprobación de la solicitud de aval para la acreditación del anticipo al consultor. - Proyecto necesario de acuerdo a compromisos binacionales adquiridos, para proporcionar los diseños del CEBAF RUMICHACA a Colombia para que ejecute la obra física e instalaciones. - Se ha dispuesto de igual manera realizar los estudios de funcionalidad adecuando el espacio físico actual.	Benavides Bolaños, Wellington Renán	06/12/2016 - 12:48 PM
Octubre 2016: -Se realizó el cambio de denominación de cuenta para administrar los fondos correspondientes a los proyectos binacionales con el país de Colombia, Proyecto congelado, en espera la aprobación de la solicitud de aval para la acreditación del anticipo al consultor. - Proyecto necesario de acuerdo a compromisos binacionales adquiridos, para proporcionar los diseños del CEBAF RUMICHACA a Colombia para que ejecute la obra física e instalaciones,. - Se ha dispuesto de igual manera realizar los estudios de funcionalidad adecuando el espacio físico actual.	Benavides Bolaños, Wellington Renán	07/11/2016 - 08:13 AM
Septiembre 2016: - Proyecto congelado. Se realizó el cambio de denominación de cuenta para administrar los fondos correspondientes a los proyectos binacionales con el país de Colombia. Se efectuó la solicitud de aval para la acreditación del anticipo al consultor. - Necesario realizar el estudio para proporcionar los diseños del CEBAF RUMICHACA a Colombia para que ejecute la obra física e instalaciones, de acuerdo a compromisos binacionales adquiridos. - El consultor realizó los primeros trabajos de Estudio de Factibilidad. Se ha dispuesto de igual manera realizar los estudios de funcionalidad adecuando el espacio físico actual.	Benavides Bolaños, Wellington Renán	03/10/2016 - 12:31 PM
Agosto 2016: - Proyecto congelado. Se efectuó la solicitud de aval para la acreditación del anticipo al consultor. Se realizó el cambio de denominación de cuenta para administrar los fondos correspondientes a los proyectos binacionales con el país de Colombia. - De acuerdo a compromisos binacionales adquiridos, es necesario realizar el estudio para proporcionar los diseños del CEBAF RUMICHACA a Colombia para que ejecute la obra física incluido instalaciones. - El consultor realizó los primeros trabajos de Estudio de Factibilidad.	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	06/09/2016 - 12:01 PM
Julio 2016: - Proyecto congelado. Se realizó el cambio de denominación de cuenta para administrar los fondos correspondientes a los proyectos binacionales con el país de Colombia. Se efectuó la solicitud de aval para la acreditación del anticipo al consultor.	Benavides Bolaños, Wellington Renán	06/09/2016 - 11:30 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Necesario realizar el estudio para proporcionar los diseños del CEBAF RUMICHACA a Colombia para que ejecute la obra física e instalaciones, de acuerdo a compromisos binacionales adquiridos. - El consultor realizó los primeros trabajos de Estudio de Factibilidad. Se ha dispuesto de igual manera realizar los estudios de funcionalidad adecuando el espacio físico actual para mostrar su operatividad a final de este año. 		
<p>Junio 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto congelado. Se realizó el cambio de denominación de cuenta para administrar los fondos correspondientes a los proyectos binacionales con el país de Colombia. Se realizó la solicitud de aval para la acreditación del anticipo al consultor. - Se necesita realizar el estudio para proporcionar los diseños del CEBAF RUMICHACA a Colombia para que ejecute la obra física e instalaciones, de acuerdo a compromisos binacionales. - El consultor realizó los primeros trabajos de Estudio de Factibilidad. Se ha dispuesto de igual manera realizar los estudios de funcionalidad adecuando el espacio físico actual para mostrar su operatividad a final de año. 	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	05/07/2016 - 11:10 PM
<p>Mayo 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto congelado. Se realizó el cambio de denominación de cuenta para administrar los fondos correspondientes a los proyectos binacionales con el país de Colombia, con ello se solicitará el Aval para la acreditación del anticipo al consultor. - Se necesita realizar el estudio para proporcionar los diseños del CEBAF de pasajeros a las instituciones de Colombia de acuerdo a compromisos binacionales. - El consultor realizó los primeros trabajos de Estudio de Factibilidad. 	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	06/06/2016 - 08:28 AM
<p>Abril 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto congelado. No se acredita la asignación presupuestaria para el pago de anticipo. - Se necesita realizar el estudio para proporcionar los diseños del CEBAF de pasajeros a las instituciones de Colombia de acuerdo a compromisos binacionales. - Se solicitó el AVAL al Ministerio de Finanzas, todavía se encuentra en espera y aprobación de las máximas autoridades. - El consultor realizó los primeros trabajos de Estudio de Factibilidad. 	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	05/05/2016 - 08:25 AM
<p>Marzo 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto congelado. No se acredita la asignación presupuestaria para el pago de anticipo. - Se necesita realizar el estudio para proporcionar los diseños del CEBAF de pasajeros a las instituciones de Colombia de acuerdo a compromisos binacionales. - Se solicitó el AVAL al Ministerio de Finanzas, todavía se encuentra en espera y aprobación de las máximas autoridades. - El consultor realizó los primeros trabajos de Estudio de Factibilidad. 	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	06/04/2016 - 11:35 AM
<p>Febrero 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto congelado. No se acredita la asignación presupuestaria para el pago de anticipo. - Se solicitó el AVAL al Ministerio de Finanzas, todavía se encuentra en espera y aprobación de las máximas autoridades. - El consultor realizó los primeros trabajos de Estudio de Factibilidad. 	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	06/03/2016 - 12:16 PM
<p>Enero 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto congelado. No se acredita la asignación presupuestaria para el pago de anticipo. - Se solicitó el AVAL al Ministerio de Finanzas, todavía se encuentra en espera. - El consultor realizó los primeros trabajos de Estudio de Factibilidad, estudios paralizados por falta de adjudicación del anticipo. 	Benavides Bolaños, Wellington Renán	11/02/2016 - 10:27 AM
<p>Diciembre 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto congelado. No se acredita aun la asignación presupuestaria para el pago de anticipo. - Se solicitó el AVAL al Ministerio de Finanzas, todavía se encuentra en espera. - El consultor realizó los primeros trabajos de Estudio de Factibilidad pero paralizó trabajos debido a la falta de adjudicación del anticipo. 	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	06/01/2016 - 12:18 PM
<p>Noviembre 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto paralizado. No se acredita la asignación presupuestaria para el pago de anticipo. - Se solicitó el AVAL al Ministerio de Finanzas, en espera hasta Diciembre de 2015 o sino se terminaría el contrato por mutuo acuerdo. 	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	06/12/2015 - 10:02 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- El consultor realizó los primeros trabajos de Estudio de Factibilidad pero paralizó trabajos debido a la adjudicación del anticipo.		
<p>Octubre 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto paralizado. No se acredita la asignación presupuestaria para el pago de anticipo. - No se sabe la fecha exacta, depende del AVAL del Ministerio de Finanzas, en espera hasta finales de 2015. 	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	08/11/2015 - 08:16 PM
<p>Septiembre 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúa ejecutandose el Estudio de Factibilidad. - Se realiza el levantamiento topográfico de las alternativas de implantación de las cabeceras de carga. - Estudios por paralizarse ya que se espera por la Administración Central del MTOP la acreditación de fondos para el pago de anticipo. - No se sabe la fecha exacta, depende del AVAL del Ministerio de Finanzas. 	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	11/10/2015 - 01:30 PM
<p>Agosto 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continúan los trabajos de los Estudios para LA CONSTRUCCION DE DOS CABECERAS DE CARGA Y DOS CABECERAS DE PASAJEROS EN EL PASO DE FRONTERA DE RUMICHACA UBICADOS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA. - Se empezó a realizar el levantamiento topográfico de las alternativas de implantación de las cabeceras de carga. - En espera de la acreditación de fondos para el pago de anticipo. 	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	09/09/2015 - 03:08 PM
<p>Julio 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los trabajos de los Estudios para LA CONSTRUCCION DE DOS CABECERAS DE CARGA Y DOS CABECERAS DE PASAJEROS EN EL PASO DE FRONTERA DE RUMICHACA UBICADOS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA empezaron con el levantamiento de información y el análisis de factibilidad. - En espera de la acreditación de fondos para el pago de anticipo. 	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	09/09/2015 - 03:05 PM
<p>Junio 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 1 de Junio se firmó el contrato de Estudios para LA CONSTRUCCION DE DOS CABECERAS DE CARGA Y DOS CABECERAS DE PASAJEROS EN EL PASO DE FRONTERA DE RUMICHACA UBICADOS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA. - En espera de la acreditación de fondos para el pago de anticipo. - De igual manera existe un estudio contratado por el MTOP para optimización de procesos del cual se harán los estudios de la infraestructura objeto de este contrato. Por ello se ampliará al plazo contractual. 	Champutiz Burbano, Paúl Andrés	08/07/2015 - 04:40 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Demora en la aprobación total de los Productos CAUSARIA retraso en la entrega de los Estudios a satisfacción de la entidad.	03/01/2020	Wellington Renán Benavides Bolaños	30	70	21	2/2

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La falta de aprobación total de los Productos CAUSARIA retraso en la entrega de los Estudios a satisfacción de la entidad.	03/01/2020	Wellington Renán Benavides Bolaños	30 %	80	24	2/2

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Internacional - Exterior > America Latina y el Caribe > Oficina Comercial Exterior


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Certificación Presupuestaria emitida.	1-Solicitud de Información	08/05/2015		08/05/2015		Sí	8.0
2	PLANEACIÓN: Documentos precontractuales elaborados.	1-Solicitud de Información	15/05/2015		15/05/2015		Sí	1.0
3	PLANEACIÓN: Publicación en portal compras públicas realizada.	2-Publicación de Pliegos	20/05/2015		20/05/2015		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Anticipo entregado.	4-Inicio de Trabajo	01/02/2017		02/02/2017		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Estudio completo de Factibilidad realizado.	5-Entregables Intermedios	21/02/2017		21/02/2017		Sí	9.0
6	EJECUCIÓN: Diseños de edificaciones entregados.	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	9.0
7	EJECUCIÓN: Estudio y Diseño Vial, entregados.	5-Entregables Intermedios	22/05/2018		22/05/2018		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Estudio de Impactos Ambientales realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	10.0
9	EJECUCIÓN: Diseño de Instalaciones Sanitarias y Contraincendios	5-Entregables Intermedios	22/01/2019		22/01/2019		Sí	10.0
10	EJECUCIÓN: Estudio electrónico de instalación de voz y datos del proyecto	5-Entregables Intermedios	22/01/2019		22/01/2019		Sí	10.0
11	EJECUCIÓN: Estudio Hidrológico - Hidráulico realizado.	5-Entregables Intermedios	22/01/2019		22/01/2019		Sí	10.0
12	EJECUCIÓN: Estudios Geotécnicos entregados	5-Entregables Intermedios	22/01/2019		22/01/2019		Sí	10.0
13	CIERRE: Acta Entrega Recepción Única suscrita, realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2019		30/11/2019		Sí	3.0
14	CIERRE: Informe de viabilidad e Informe final entregado.	V - Verificación ejecutiva	30/11/2019		30/11/2019		Sí	2.0
15	CIERRE: Liquidación económica contrato de estudio, realizado.	9-Entregables Formales	20/12/2019		20/12/2019		Sí	1.0
16	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita, realizado	9-Entregables Formales	30/12/2019	30/12/2019			No	1.0
17	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito, realizado	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF, realizado	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019		▼	No	1.0
19	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado, realizado	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019		▼	No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance del proyecto de Estudios		100.00 %	1	1	01/01/2018	Oct-Dic


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,812,903.28 **
Costo Total:	1,534,353.52
Total Devengado:	1,368,144.95
% Costo Total Devengado:	89.17 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 89.17 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,760,611.12	1,440,708.62	0.00	3,201,319.74
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,854,399.97	1,254,381.75	0.00	3,108,781.72
Ppto. Codificado	2,887,458.47	1,254,381.75	0.00	4,141,840.22
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		186,326.87		
Programado a Devengar	1,667,399.97	1,254,381.75	0.00	2,921,781.72
Ppto. Devengado	558,521.53	809,623.42	0.00	1,368,144.95
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 558,521.53	0.00	0.00	558,521.53
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,108,878.44	1,254,381.75	0.00	2,363,260.19
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 33.50 %	64.54 %	0.00 %	46.83 %
Ppto. Codificado 998	476,189.87	0.00	0.00	476,189.87
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

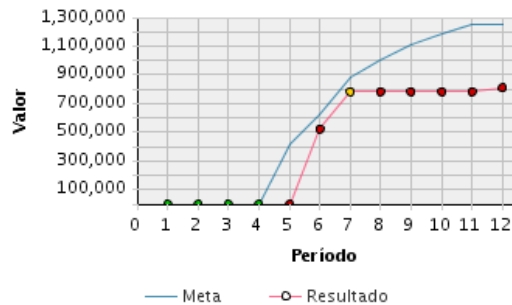

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	417,137.01	0.00	417,137.01	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	207,003.00	520,048.77	624,140.01	520,048.77	83.32 %		41.46 %
Jul	263,145.05	260,190.42	887,285.06	780,239.19	87.94 %		62.20 %
Ago	115,600.00	0.00	1,002,885.06	780,239.19	77.80 %		62.20 %
Sep	108,300.00	0.00	1,111,185.06	780,239.19	70.22 %		62.20 %
Oct	80,000.00	0.00	1,191,185.06	780,239.19	65.50 %		62.20 %
Nov	63,196.69	0.00	1,254,381.75	780,239.19	62.20 %		62.20 %
Dic	0.00	29,384.23	1,254,381.75	809,623.42	64.54 %		64.54 %
Total	1,254,381.75	809,623.42					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
18	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
21	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Contrato de Estudios del CEBAF Rumichaca	Contrato_Estudios_CEBAF_Rumichaca.pdf	09/07/2015
2	A2. Informe Ejecutivo Sitop, Agosto 2015	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_CEBAF_Agosto_2015.pdf	09/09/2015
3	A3. Informe ejecutivo Sitop, Sept 2015	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_CEBAF_Septiembre_2015.pdf	10/10/2015
4	A4. Informe ejecutivo Sitop, Octubre 2015	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_CEBAF_Octubre_2015.pdf	11/11/2015
5	A5. Informe ejecutivo Sitop, Noviembre 2015.	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_CEBAF_Noviembre_2015.pdf	12/12/2015
6	A6. Informe ejecutivo Sitop, Diciembre 2015	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_CEBAF_Diciembre_2015.pdf	01/01/2016
7	A7. Informe ejecutivo Sitop, Enero 2016	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_CEBAF_Enero_2016.pdf	02/02/2016
8	A8. Dictamen SENPLADES Estudio y Diseño de Proyectos	Dictamen_SENPLADES.pdf	11/02/2016
9	A9. Levantamiento de las áreas de Estudio - FACTIBILIDAD	20150913_CEBAF_Pasajeros_-_Planta_de_conjunto_-_Planta_de_segundo_nivel.pdf	11/02/2016
10	C1. Estudio de Superficies - FACTIBILIDAD	Superficies_Area_Fija_CEBAF-P_PEPS_PF_RUMICHACA_para_cada_país.v2.PAI.xlsx	11/02/2016
11	C10. Informe ejecutivo Sitop, Septiembre 2016	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Sept_2016..pdf	03/10/2016
12	C11. Informe ejecutivo Sitop, Octubre 2016	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Octubre_2016.pdf	31/10/2016
13	C12. Informe ejecutivo Sitop, Noviembre 2016	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Noviembre_2016.pdf	01/01/2017
14	C13. Informe ejecutivo Sitop, Diciembre 2016	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Diciembre_2016.pdf	01/01/2017
15	C2. Informe Ejecutivo Sitop, Feb 2016	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Feb_2016.pdf	07/03/2016
16	C3. Informe ejecutivo Sitop, Marzo 2016	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Mar_2016.pdf	06/04/2016
17	C4. Informe ejecutivo Sitop, Abril 2016	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Abril_2016.pdf	05/05/2016
18	C5. Memorando Proyecto Congelado.	MTOP-DDC-2016-245-ME_Proyecto_Congelado.pdf	05/05/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	C6. Informe Ejecutivo Sitop, Mayo 2016	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Mayo_2016.pdf	06/06/2016
20	C7. Informe ejecutivo Sitop, Junio 2016	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Junio_2016.pdf	05/07/2016
21	C8. Informe ejecutivo Sitop, Julio 2016	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Julio_2016.pdf	03/08/2016
22	C9. Informe ejecutivo Sitop, Agosto 2016	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Agosto_2016.pdf	01/09/2016
23	D1. Informe ejecutivo Sitop, Marzo 2017	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Marzo_2017.pdf	04/05/2017
24	D2. Informe ejecutivo Sitop, Mayo 2017	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Mayo_2017..pdf	05/06/2017
25	D3. Informe ejecutivo Sitop, Junio 2017	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Junio_2017.pdf	04/07/2017
26	D4. Informe ejecutivo Sitop, Julio 2017	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Julio_2017..pdf	05/08/2017
27	D5. Informe ejecutivo Sitop, Agosto 2017	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Agosto_2017..pdf	04/09/2017
28	D6. Informe ejecutivo Sitop, Septiembre 2017	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Septiembre_2017.pdf	05/10/2017
29	D7. Informe ejecutivo Sitop, octubre 2017	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_octubre_2017.pdf	01/11/2017
30	D8. Informe ejecutivo Sitop, noviembre 2017	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_Cebaf_Noviembre_2017.PDF	01/12/2017
31	D9. Informe ejecutivo Sitop, Diciembre 2017	Informe_Ejecutivo_Sitop_Cebaf_Diciembre_2017.pdf	05/01/2018
32	E1. Contrato Complementario	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_No.1.pdf	05/06/2017
33	E2.- A 7, Documento de aprobación del Componente de Estudio y Diseño Vial	1_MTOP-DDC-18-81-OF_- _APROBACION_VIAL.pdf	22/01/2019
34	E3.- A 9, Documento de aprobación del Componente Diseño de Instalaciones Sanitarias y Contra incendios	MTOP-SUBZ1-2019-0006-OF_aprobacion_hidraulico.pdf	22/01/2019
35	E4.- A 10, Documento de aprobación del Componente Estudio electrónico de instalación de voz y datos del proyecto	2_mtop-dev-2018-308-me-1.pdf	22/01/2019
36	E5.- A11, Documento de aprobación del Componente Hidrológico-Hidráulico	MTOP-SUBZ1-2018-0096-OF.pdf	22/01/2019
37	E6.- A12, Documento de aprobación del Componente Geotécnico	3_APROBACIÓN_ESTUDIOS_GEOTÉCNICOS.pdf	22/01/2019
38	F1. Informe ejecutivo Sitop, CEBAF Enero 2018	Informe_Ejecutivo_Sitop_Cebaf_Enero_2018.PDF	26/03/2018
39	F2. Informe ejecutivo Sitop, CEBAF Febrero 2018	Informe_Ejecutivo_Sitop_Cebaf_Febrero_2018.PDF	26/03/2018
40	F3. Informe ejecutivo Sitop, Marzo 2018	Informe_Ejecutivo_Sitop_Cebaf_Marzo_2018.PDF	05/04/2018
41	F4. Informe ejecutivo Sitop, Abril 2018	Informe_Ejecutivo_Sitop_Cebaf_Abril_2018.pdf	04/05/2018
42	F5. Informe ejecutivo Sitop, Mayo 2018	Informe_Ejecutivo_Sitop_Cebaf_Mayo_2018.pdf	05/06/2018
43	F6. Informe ejecutivo Sitop, Junio 2018	Informe_Ejecutivo_Sitop_Cebaf_Junio_2018.pdf	03/07/2018
44	F7. Informe ejecutivo Sitop, Julio 2018	Informe_Ejecutivo_estudios_CEBAF_Julio_18.pdf	02/08/2018
45	F8. Informe ejecutivo Sitop, Agosto 2018	Informe_Ejecutivo_estudios_CEBAF_AGOSTO_2018.pdf	05/09/2018
46	F9. Informe ejecutivo Sitop, Septiembre 2018	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_CEBAF_Septiembre_2018.pdf	02/10/2018
47	G1. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Octubre 2018	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_CEBAF_OCTUBRE_2018.pdf	01/11/2018
48	G2. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Noviembre 2018	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_CEBAF_NOVIEMBRE_2018.pdf	01/12/2018
49	G3. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Diciembre 2018	Informe_Ejecutivo_Sitop_Estudios_CEBAF_Diciembre_2018.pdf	01/01/2019
50	G4. Documento que sustenta el cambio de FASE (Solicitud de Autorización de Cambio de Fase)	Verificable__memorandos_de_solicitud_y_autorización_de_cambio_de_fase_K025.pdf	06/02/2019
51	H01. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Enero 2019	Informe_Ejecutivo_estudios_CEBAF_ENERO_2019.pdf	05/02/2019
52	H02. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Febrero 2019	Informe_Ejecutivo_estudios_CEBAF_Febrero_2019.pdf	02/03/2019
53	H03. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Marzo 2019	Informe_Ejecutivo_estudios_CEBAF_MARZO_2019.pdf	02/04/2019
54	H04. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Abril 2019	Informe_Ejecutivo_estudios_CEBAF_ABRIL_2019.pdf	02/05/2019
55	H05. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Mayo 2019	Informe_Ejecutivo_estudios_CEBAF_ENERO_2019.pdf	05/06/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
56	I0.1.- VERIFICABLE: PROBLEMA 3-ACCIÓN 2 (Mantener reuniones de trabajo)	REUNIÓN_DE_TRABAJO_ESTUDIOS_CEBAF-RUMICHACA.pdf	28/06/2019
57	I0.2.- VERIFICABLE: RIESGO 1-ACCIÓN 2 (Mantener reuniones de trabajo)	REUNIÓN_DE_TRABAJO_ESTUDIOS_CEBAF-RUMICHACA.pdf	28/06/2019
58	I1.1.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes ENERO 2019)	CEDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO.pdf	09/09/2019
59	I1.2.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes FEBRERO 2019)	CEDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO.pdf	09/09/2019
60	I1.3.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes MARZO 2019)	CEDULA_PRESUPUESTARIA_MARZO.pdf	09/09/2019
61	I1.4.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes ABRIL 2019)	CEDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL.pdf	09/09/2019
62	I1.5.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes MAYO 2019)	CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO.pdf	09/09/2019
63	I1.6.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes junio 2019)	Cedula_presupuestaria_junio.pdf	02/07/2019
64	I1.7.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes julio 2019)	CEDULA_PRESUPUESTARIA_JULIO.pdf	09/09/2019
65	I1.8.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes agosto 2019)	CEDULA_PRESUPUESTARIA_MATAJE_AGOSTO_2019.pdf	03/09/2019
66	I1.9.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes SEPTIEMBRE 2019)	CEDULA_PRESUPUESTARIA__MATAJE_septiembre.pdf	04/10/2019
67	I2.10.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes Octubre 2019)	CEDULA_PRESUPUESTARIA_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
68	I2.11.- VERIFICABLE: Ppto. Devengado (Cedula Presupuestaria, mes Octubre 2019)	CEDULA_PRESUPUESTARIA_NOVIEMBRE_2019.pdf	03/12/2019
69	I2.12.- VERIFICABLE HITO 13: CIERRE: (Acta Entrega Recepción Única suscrita, realizado)	ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_ESTUDIOS_CVA_HIDROPONIA_CEBAF.pdf	20/12/2019
70	J06. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Junio 2019	Informe_Ejecutivo_Sitop_CEBAF_Junio_2019.pdf	02/07/2019
71	J07. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Julio 2019	Informe_Ejecutivo_Sitop_CEBAF_Julio_2019.pdf	03/09/2019
72	J08. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Agosto 2019	Informe_Ejecutivo_Sitop_CEBAF_Agosto_2019.pdf	03/09/2019
73	J09. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Septiembre 2019	CRONOGRAMA_PRODUCTOS_ENTREGADOS_Estudios_CEBAF_Septiembre_2019.pdf	04/10/2019
74	J1.10. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Octubre 2019	INFORME_EJECUTIVO_CEBAF_RUMICHACA_Octubre_2019.pdf	05/11/2019
75	J1.11. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Noviembre 2019	informe_ejecutivo_cebaf_noviembre.pdf	05/12/2019
76	J1.12. Informe ejecutivo Sitop, Estudios CEBAF, Diciembre 2019	Informe_Ejecutivo_Sitop_CEBAF_Diciembre_2019.pdf	03/01/2020

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Benavides Bolaños, Wellington Renán	Supervisor de Estudios	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Carchi, Encargado	wbenavides@mtop.gob.ec	0994926228
Benavides Bolaños, Wellington Renán	Director Distrital Carchi de Unidad Ejecutora	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Carchi, Encargado	wbenavides@mtop.gob.ec	0994926228
Cruz Chicaiza, Carlos René Alejandro	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Zona 1	ccruz@mtop.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Ruiz, Fernanda	Supervisora Financiera del Carchi	Supervisora Financiera del Carchi	lruiz@mtop.gob.ec	0994917109

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
97509_1.jpg	04/01/2019
