

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Proyectos SECOB

PROYECTO: K433 ICO - MSP - Construcción y Repotenciación del Hospital General de Latacunga en la provincia de Cotopaxi.

Líder del Proyecto:	Topón Alborno, Roberto Carlos (rtoyon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Programas Relacionados:	Provincia - Cotopaxi
Titular:	Sotomayor Toro, John Francisco	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	123200000.632.2477	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	12,625,431.82
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	31/03/2013 - 30/04/2021
Fecha de última actualización:	02/05/2021	Fecha de Fin Base:	22/11/2014
Modificado por:	Topón Alborno, Roberto Carlos	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2020

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

PROYECTO: Infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudios y fiscalización en salud.

PRODUCTO: Construcción y Repotenciación del Hospital General de Latacunga en la provincia de Cotopaxi.

PROPÓSITO: Dotar de infraestructura hospitalaria al Cantón de Latacunga.

Beneficios Cualitativos

- Modernización, eficiencia y calidad del servicio hospitalario en las instituciones públicas,
- Adecuada funcionalidad espacial, confort ambiental y dotación de equipamiento -mobiliario y equipos- que dignifiquen las condiciones de trabajo tanto de los funcionarios como de los pacientes.
- Mejoramiento de las unidades hospitalarias, enmarcando una nueva imagen institucional, estandarizando materiales y mejorando la calidad de atención a sus habitantes.

Tipo de Beneficiario

Los habitantes de Latacunga en la provincia de Cotopaxi.

Restricciones

TIEMPO: El plazo del contrato es de 360 días.

COSTO: El monto del contrato es de \$ 18'999.387,46.
Orden de cambio#1. es de \$153041,37, más reajuste \$ 5662,53.

ALCANCE: En el área arquitectónica referente a la Primera fase de La Etapa será la construcción de la edificación nueva Integral, se realizarán trabajos de obra civil, e ingenierías mismas que deberán cumplir con la estandarización establecida en edificaciones hospitalarias. La Segunda fase será la remodelación integral de la edificación existente, la cual es de carácter Patrimonial, esta será tratada bajo estricto apego a normas y exigencias para este tipo de construcciones impuestas por el órgano regulador del Instituto de Nacional de Patrimonio Cultural, las áreas se intervendrá en ingenierías mecánicas, eléctricas, electrónicas, hidráulicas, tomando en cuenta la parte ambiental, sistemas contra incendios y aire acondicionado, gases medicinales, Obras Exteriores como jardines, parqueaderos, guardianías.

RECURSOS: Económicos, materiales, humanos y tecnológicos.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 31/03/2013 Fecha de Fin: 30/04/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

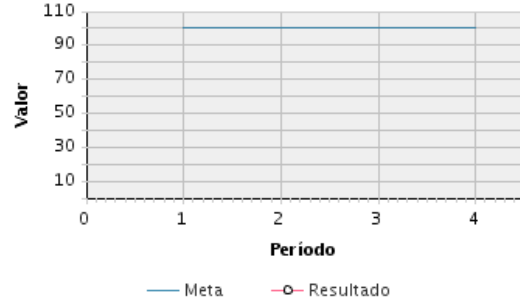

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %								
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2021: 1.- Obra terminada al 100 %, en uso de la ciudadanía. 2.- El Contratista al haber realizado la Recepción Definitiva de Pleno Derecho, considera que su relación contractual ha terminado, y que el mantenimiento lo debe realizar el equipo técnico del Hospital. 3.- Pendiente suscripción del Acta de Obra Pública.	Topón Albornoz, Roberto Carlos	02/05/2021 - 02:31 AM
Marzo de 2021: 1.- Obra terminada al 100 %, en uso de la ciudadanía. 2.- El Contratista al haber realizado la Recepción Definitiva de Pleno Derecho, considera que su relación contractual ha terminado, y que el mantenimiento lo debe realizar el equipo técnico del Hospital. 3.- Pendiente suscripción del Acta de Obra Pública 4.- La ficha se mantiene en estado de CIERRE	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/04/2021 - 09:55 PM
Febrero 2021: 1.- Avance Físico General: 100,00 % 2.- Obra terminada 3.- Pendiente suscripción de las actas de Acta de Recepción Definitiva y de Obra Pública 4.- La ficha queda en estado de CIERRE	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/03/2021 - 01:40 PM
Enero 2021: 1.- Obra terminada 2.- El Contratista con fecha 20 de julio de 2020 ante el Notario Suplente de la Notaría Primera del Cantón Quito realiza y notifica a la Dirección Nacional del SECOB la Recepción Definitiva de Pleno Derecho. 3.- La ficha queda en estado de CIERRE 4.- Administrador de contrato Arq. Hernán Patricio Castro Castro	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/02/2021 - 12:41 PM
JULIO 2020: 1.- Contratista debe subsanar observaciones en obra previo iniciar el trámite para la recepción definitiva.(Hito 28) 2.- En este período no se realizó pagos	Velasco Pinto, Juan Eduardo	17/07/2020 - 08:36 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3.- La ficha se encuentra en estado de cierre pendiente Acta de Recepción Definitiva .(Hito 28) 4.- La ficha queda en estado de CIERRE		
JUNIO 2020 1.- Previa la suscripción del acta de recepción definitiva y entrega de obra pública el contratista debe subsanar observaciones en la obra realizadas por la fiscalización.(Hito 28)	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/07/2020 - 08:19 AM
MAYO 2020 1.- Previa la suscripción del acta de recepción definitiva y entrega de obra pública el contratista debe subsanar observaciones en la obra.(Hito 28)	Velasco Pinto, Juan Eduardo	05/06/2020 - 12:47 PM
ABRIL 2020 1.- Previa la suscripción del acta de recepción definitiva y entrega de obra pública el contratista debe subsanar observaciones en la obra.(Hito 28)	Velasco Pinto, Juan Eduardo	06/05/2020 - 04:41 PM
MARZO 2020 1.- Previa la suscripción del acta de recepción definitiva y entrega de obra pública el contratista debe subsanar observaciones en la obra.(Hito 28)	Velasco Pinto, Juan Eduardo	03/04/2020 - 02:39 PM
FEBRERO 2020 1.- Previa la suscripción del acta de recepción definitiva y entrega de obra pública el contratista debe subsanar observaciones en la obra.(Hito 28)	Velasco Pinto, Juan Eduardo	04/03/2020 - 03:37 PM
ENERO 2019 1.- Con fecha 26 de febrero de 2019 se realizó la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional de la obra. (Hito 27) 2.- Debido a la desvinculación de funcionarios del SECOB, se realiza nueva designación para la Fiscalización de la Obra, de tal forma se realizará los trámites correspondientes a la conformación de comisión técnica para la suscripción del Acta Recepción Definitiva. 3.- La obra se encuentra al 100%	Velasco Pinto, Juan Eduardo	02/03/2020 - 10:41 AM
DICIEMBRE 2019 1.- Con fecha 26 de febrero de 2019 se realizó la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional de la obra. (Hito 27) 2. Se conformo la comisión técnica para el recorrido de obra previa suscripción del Acta Recepción Definitiva. 3.- La obra se encuentra al 100%	Freire Flores, Marlon Benigno	16/01/2020 - 04:27 PM
NOVIEMBRE 2019 1.- Con fecha 26 de febrero de 2019 se realizó la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional de la obra. (Hito 27) 2. Se espera el tiempo que establece la Ley para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 3.- La obra se encuentra al 100% (Anexo 53)	Freire Flores, Marlon Benigno	02/01/2020 - 03:13 PM
OCTUBRE 2019 1.- Con fecha 26 de febrero de 2019 se realizó la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional de la obra. (Hito 27) 2. Se espera el tiempo que establece la Ley para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 3.- En Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-3013-M 05 de noviembre de 2019 del Director Financiero, Encargado, en el cual se indica los pagos de planilla en el mes de octubre, se constata que no existe ningún pago realizado del presente proyecto.	Freire Flores, Marlon Benigno	06/11/2019 - 03:56 PM
SEPTIEMBRE 2019 1.- Con fecha 26 de febrero de 2019 se realizó la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional de la obra. (Hito 27) 2. Se espera el tiempo que establece la Ley para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 3.- En Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2662-M 01 de octubre de 2019 del Director Financiero, Encargado, en el cual se indica los pagos de planilla en el mes de septiembre, se constata que no existe ningún pago realizado del presente proyecto.	Freire Flores, Marlon Benigno	14/10/2019 - 10:46 AM
AGOSTO 2019 1.- Con fecha 26 de febrero de 2019 se realizó la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional de la obra. (Hito 27) 2. Se espera el tiempo que establece la Ley para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 3.- En Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2437-M 04 de septiembre de 2019 del Director Financiero, Encargado, en el cual se indica los pagos de planilla en el mes de agosto, se constata que no existe ningún pago realizado del presente proyecto.	Freire Flores, Marlon Benigno	23/09/2019 - 10:14 AM
JULIO 2019 1.- Con fecha 26 de febrero de 2019 se realizó la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional de la obra. (Hito 27) 2. Se espera el tiempo que establece la Ley para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva.	Freire Flores, Marlon Benigno	07/08/2019 - 04:45 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3.-Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2074-M de 05 de agosto de 2019 el Director Financiero envió el detalle de las planillas aprobadas en el mes de julio de 2019, en el cual no se encuentra información del contrato de la ficha presente.		
JUNIO 2019 1.- Con fecha 26 de febrero de 2019 se realizó la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional de la obra. (Hito 27) 2. Se espera el tiempo que establece la Ley para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 3.- Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-1782-M de 03 de julio de 2019 el Director Financiero envió el detalle de las planillas aprobadas en el mes de junio de 2019, en el cual no se encuentra información del contrato de la ficha presente	Freire Flores, Marlon Benigno	08/07/2019 - 02:23 PM
MAYO 2019: 1.- Con fecha 26 de febrero de 2019 se realizó la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional de la obra. (Hito 27) 2. Se espera el tiempo que establece la Ley para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 4.-Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-1433-M de 04 de junio de 2019 el Director Financiero envió el detalle de las planillas aprobadas en el mes de abril de mayo, en el cual no se encuentra información del contrato de la ficha presente.	Freire Flores, Marlon Benigno	07/06/2019 - 05:02 PM
ABRIL 2019: 1.- Con fecha 26 de febrero de 2019 se realizó la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional de la obra. (Hito 27) 2. Se espera el tiempo que establece la Ley para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 3.- Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-1138-M de 02 de mayo de 2019 el Director Financiero envió el detalle de las planillas aprobadas en el mes de abril de 2019, en el cual no se encuentra información del contrato de la ficha presente.	Freire Flores, Marlon Benigno	17/05/2019 - 10:53 AM
MARZO 2019: 1.- Con fecha 26 de febrero de 2019 se realizó la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional de la obra. (Hito 27)	Freire Flores, Marlon Benigno	10/04/2019 - 10:28 AM
FEBRERO 2019: 1.- Mediante Oficio Nro. SECOB-SDG-2019-0080-O se solicitó al MSP el Delegado para la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional. (Anexo 51). 2.- El 05 de febrero se realizó el recorrido constatando el funcionamiento de las ingenierías del Hospital, sin presencia del delegado del MSP. 3.- No se suscribió el Acta de Recepción Provisional debido a observaciones presentadas en la obra el cual el contratista se le estableció un tiempo para subsanarlas y de esta manera suscribir el Acta en mención. 4.- Con fecha 26 de febrero de 2019 se realizó la diligencia de la Entrega Recepción Provisional de la obra. (Anexo 52)	Freire Flores, Marlon Benigno	07/03/2019 - 11:59 AM
ENERO 2019: Mediante Oficio Nro. SECOB-SDG-2019-0080-O se solicitó al MSP el Delegado para la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional. (Anexo 51)	Freire Flores, Marlon Benigno	06/02/2019 - 12:23 PM
DICIEMBRE 2018: 1.- Porcentaje físico de la Obra 100% 2.- Hito 27.- Acta de Recepción Provisional firmada: de acuerdo al Informe de la Supervisora de Contrato, Fiscalización no emitido informe aprobatorio de subsanación de las observaciones realizadas por el MSP en la obra por parte del contratista, las cuales deberán corregirse para proceder con la suscripción del Acta en mención. (Anexo 50)	Freire Flores, Marlon Benigno	07/01/2019 - 11:36 AM
NOVIEMBRE 2018: 1.- Porcentaje físico de la Obra 100% 2.- Hito 27.- Acta de Recepción Provisional firmada: de acuerdo al Informe de la Supervisora de Contrato, Fiscalización no entrega informe referente al cumplimiento de subsanación por parte del contratista de las observaciones realizadas por el MSP, las cuales deberán corregirse para proceder con la suscripción del Acta en mención. (Anexo 49)	Freire Flores, Marlon Benigno	06/12/2018 - 10:10 AM
OCTUBRE 2018: 1.- Porcentaje físico de la Obra 100% 2.- Hito 27.- Acta de Recepción Provisional firmada: de acuerdo al Informe de la Supervisora de Contrato, la obra se encuentra con observaciones de parte de Fiscalización y especialistas del MSP, las cuales deberán subsanado para proceder con la suscripción del Acta en mención. (Anexo 48) 3.- Los valores financieros es de acuerdo al Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2018-2591-M de la Dirección Financiera	Freire Flores, Marlon Benigno	07/11/2018 - 05:00 PM
SEPTIEMBRE 2018: 1.- Con fecha 31 de Agosto de 2018 se levanto la suspensión de la obra.	Freire Flores, Marlon Benigno	05/10/2018 - 08:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2.- Fecha de conclusión del plazo contractual 06 de septiembre de 2018 3.- Contratista solicitó la prorroga de plazo por 30 días para la ejecución de la Orden de Trabajo, a partir del 03 de septiembre de 2018 cuyo terminó de la obra será el 02 de octubre de 2018 4.- A continuación se indica los siguientes Hitos (Anexo 47): Hito 11.- Sistema de agua potable terminado, avance físico de 100% Hito 12.- Sistema hidrosanitario terminado, avance físico de 100% Hito 13.- Sistema eléctrico terminado, avance físico de 100% Hito 14.- Sistema electrónico terminado, avance físico de 100% Hito 15.- Sistema contra incendios terminado, avance físico de 100% Hito 16.- Sistema de climatización terminado, avance físico de 100% Hito 17.- Sistemas de vapor y condensado terminado, avance físico de 100% Hito 18.- Sistema de gases medicinales terminados, avance físico de 100%		
AGOSTO 2018: 1.- Obra suspendida desde el 27 de abril de 2017 por impases entre el GAD de Latacunga y MSP respecto a la legalización de terrenos (Anexo 45).	Freire Flores, Marlon Benigno	21/09/2018 - 12:02 PM
JULIO 2018: 1.- Obra suspendida desde el 27 de abril de 2017. (Anexo 45)	Freire Flores, Marlon Benigno	13/08/2018 - 11:51 AM
JUNIO 2018: 1.- Obra suspendida desde el 27 de abril de 2017. (Anexo 45)	Freire Flores, Marlon Benigno	03/08/2018 - 12:57 PM
MAYO 2018: 1.- Obra suspendida desde el 27 de abril de 2017. (Anexo 45)	Freire Flores, Marlon Benigno	05/06/2018 - 11:22 AM
ABRIL 2018: 1.- Obra suspendida desde el 27 de abril de 2017. (Anexo 45)	Freire Flores, Marlon Benigno	01/06/2018 - 03:12 PM
MARZO 2018: 1.- Obra suspendida desde el 27 de abril de 2017. (Anexo 45)	Freire Flores, Marlon Benigno	09/05/2018 - 05:58 PM
FEBRERO 2018: 1.- Obra suspendida desde el 27 de abril de 2017. (Anexo 45)	Freire Flores, Marlon Benigno	20/04/2018 - 12:00 PM
ENERO 2018: 1.- Obra suspendida desde el 27 de abril de 2017. (Anexo 45)	Freire Flores, Marlon Benigno	06/03/2018 - 04:59 PM
DICIEMBRE 2017: 1.- Obra suspendida desde el 27 de abril de 2017.	Carvajal Santana, Bolivar Israel	16/01/2018 - 11:05 AM
NOVIEMBRE 2017: 1.- Obra suspendida desde el 27 de abril de 2017. 2. Se adjunta RESOLUCION SECOB-DG-2017-003 para cambio de Patrocinador (Anexo 46).	Carvajal Santana, Bolivar Israel	12/01/2018 - 01:10 PM
OCTUBRE 2017: 1.- Obra suspendida desde el 27 de abril de 2017.	Carvajal Santana, Bolivar Israel	11/12/2017 - 11:10 AM
SEPTIEMBRE 2017: 1.- Obra suspendida desde el 27 de abril de 2017.	Carvajal Santana, Bolivar Israel	26/10/2017 - 04:32 PM
AGOSTO 2017: 1.- Plazo de la obra suspendida.	Carvajal Santana, Bolivar Israel	26/09/2017 - 08:56 AM
JULIO 2017: 1.- Plazo de la obra suspendida. 2.- Se adjunta suspensión del plazo (Anexo 45).	Carvajal Santana, Bolivar Israel	17/08/2017 - 03:39 PM
JUNIO 2017: 1.- La ejecución de los trabajos contractuales están en proceso de terminación, contratista iniciará la verificación de lo ejecutado y liquidación. 2.- Se adjunta Informe del Administrador del periodo Junio 2017 (Anexo 44).	Carvajal Santana, Bolivar Israel	25/07/2017 - 05:20 PM
MAYO 2017: 1.- La mampostería se encuentra terminada (Hitos 10) 2.- La ejecución del sistema de agua potable está en el 92% (Hito 11) 3.- El sistema hidrosanitario tiene un avance del 90% (Hito 12) 4.- El sistema eléctrico tiene un avance del 92% (Hito 13) 5.- El sistema electrónico tiene un avance del 92% (Hito 14) 6.- El sistema contra incendios tiene un avance del 95% (Hito 15) 7.- El sistema de climatización tiene un avance del 98% (Hito 16) 8.- El sistema de vapor y condensados tiene un avance del 95% (Hito 17) 9.- El sistema de gases medicinales tiene un avance del 98% (Hito 18)	Carvajal Santana, Bolivar Israel	12/06/2017 - 11:06 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>10.- El sistema de voz y datos se encuentra terminado (Hito 19)</p> <p>11.- La instalación de cielo raso y mobiliario tiene un avance del 75% (Hito 20)</p> <p>12.- La instalación de vinil en pisos y pared tiene un avance del 80% (Hito 21)</p> <p>13.- Se está realizando el recubrimiento de pintura interior en las partes que se encuentran terminadas con un avance del 80% (Hito 22)</p> <p>14.- No se ha ejecutado señalética en la construcción (Hito 23)</p> <p>15.- No se contempla la intervención del edificio antiguo (Hitos 24 y 25)</p> <p>16.- Las obras exteriores tienen un avance de obra del 85% (Hito 26)</p> <p>17.- El contrato Complementario tiene un avance del 96% (Hito 27)</p> <p>18.- Se inició proceso de liquidación y terminación del contrato para la construcción del hospital.</p> <p>19.- Se adjunta Informe del Administrador del periodo mayo 2017 (Anexo 43).</p>		
<p>ABRIL 2017:</p> <p>1.- Se avanza con la ejecución de los dos bloques nuevos, se ejecutan trabajos en los sistemas hidrosanitarios, mecánicos, eléctricos, electrónicos, obras exteriores y acabados (Hitos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 26).</p> <p>2.- Se adjunta Informe del Administrador del periodo Abril 2017 (Anexo 42).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	23/05/2017 - 09:58 AM
<p>MARZO 2017:</p> <p>1.- Actualmente se están interviniendo en todos los niveles de los dos bloques construidos, se ejecutan trabajos de los sistemas sanitarios, hidráulico, contra incendios, eléctrico, cableado estructurado, climatización, obras exteriores y acabados. Actualmente se tiene un avance físico del 72% (Hitos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 26).</p> <p>2.- Se adjunta Informe del Administrador del periodo Marzo 2017 (Anexo 41).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	13/04/2017 - 12:54 PM
<p>FEBRERO 2017:</p> <p>1.- Actualmente se están interviniendo en todos los niveles de los dos bloques construidos, se ejecutan trabajos de los sistemas sanitarios, hidráulico, contra incendios, eléctrico, cableado estructurado, climatización y obras exteriores, acabados actualmente se tiene un avance físico del 65% (Hitos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 26).</p> <p>2.- Se adjunta Informe del Administrador del periodo Febrero 2017 (Anexo 40).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	28/03/2017 - 02:37 PM
<p>ENERO 2017:</p> <p>1.- Actualmente se están interviniendo en todos los niveles de los dos bloques construidos, se ejecutan trabajos de los sistemas sanitarios, hidráulico, contra incendios, eléctrico, cableado estructurado, climatización y obras exteriores, actualmente se tiene un avance físico del 48% (Hitos 11, 12, 13, 14, 15, 16).</p> <p>2.- Se adjunta Informe del Administrador del periodo Enero 2017 (Anexo 39).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	21/02/2017 - 03:40 PM
<p>DICIEMBRE 2016:</p> <p>1.- Actualmente se están interviniendo en todos los niveles de los dos bloques construidos, se ejecutan trabajos de los sistemas sanitarios, hidráulico, contra incendios, eléctrico, cableado estructurado, climatización, etc (Hitos 11, 12, 13, 14, 15, 16).</p> <p>2.- Se adjunta Informe del Administrador del periodo Diciembre 2016 (Anexo 38).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	04/01/2017 - 08:47 AM
<p>NOVIEMBRE 2016:</p> <p>1.- Actualmente se está realizando el trazado de las instalaciones eléctrica y electrónicas, por lo que no se puede concluir con la construcción total de la mampostería (Hito 10).</p> <p>2.- Se trabaja en la colocación de tubería de PVC del sistema de sanitario, hidráulico, sistema contra incendios, eléctrico, electrónico de los bloques 1 y 2 (Hito 11, 12, 13, 14, 15).</p> <p>3.- Se adjunta Informe del Administrador del periodo Noviembre 2016 (Anexo 37).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	27/12/2016 - 04:43 PM
<p>OCTUBRE 2016:</p> <p>1.- Una vez suscrito y realizado el pago del anticipo del Contrato Complementario No. 2 (Anexo 35), se levantó la suspensión y actualmente la obra se encuentra en ejecución.</p> <p>2.- La estructura horizontal está terminada (Hito 9).</p> <p>3.- Actualmente se ha levantado el 98% de mampostería (Hito 10).</p> <p>4.- Se trabaja en la colocación de tubería de PVC del sistema de sanitario e hidráulico de los bloques (Hito 11).</p> <p>5.- Se adjunta Informe del Administrador del periodo Octubre 2016 (Anexo 36).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	28/11/2016 - 09:15 AM
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <p>1.- Obra suspendida.</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	21/10/2016 - 03:38 PM
<p>AGOSTO 2016:</p> <p>1.- Obra suspendida.</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	22/09/2016 - 08:38 AM
<p>JULIO 2016:</p> <p>1.- Obra suspendida (Anexo 34).</p> <p>2.- Se está gestionando un contrato complementario con el fin de que la obra pueda avanzar con normalidad y cumplir con el objeto del contrato.</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	30/08/2016 - 03:47 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2016:</p> <p>1.- La obra sigue retrasada y el avance físico es mínimo, contratista tiene problemas con sus subcontrataciones en los sistemas especiales y acabados.</p> <p>2.- Se está gestionando un contrato complementario con el fin de que la obra pueda avanzar con normalidad y cumplir con el objeto del contrato.</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	12/07/2016 - 03:53 PM
<p>MAYO 2016:</p> <p>1.- La obra sigue retrasada y el avance físico es mínimo, contratista tiene problemas con sus subcontrataciones en los sistemas especiales y acabados.</p> <p>2.- Actualmente se trabaja en el encofrado y armado del tapagrada del Bloque 2 (Hito 9)</p> <p>3.- La colocación de la mampostería tiene un avance físico del 95% (Hito 10).</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador del mes de mayo 2016 (Anexo 33).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	07/06/2016 - 08:57 AM
<p>ABRIL 2016:</p> <p>1.- La obra sigue retrasada y el avance físico es mínimo, contratista tiene problemas con sus subcontrataciones en los sistemas especiales y acabados.</p> <p>2.- Se adjunta informe del Administrador del mes de abril 2016 (Anexo 32).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	20/05/2016 - 10:20 AM
<p>MARZO 2016:</p> <p>1.- La obra sigue retrasada y el avance físico es mínimo, contratista tiene problemas con sus subcontrataciones en los sistemas especiales y acabados.</p> <p>2.- Se adjunta informe del Administrador del mes de marzo 2016 (Anexo 31).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	22/04/2016 - 10:03 AM
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>1.- La obra sigue retrasada y el avance físico es mínimo, contratista tiene problemas con sus subcontrataciones en los sistemas especiales y acabados.</p> <p>2.- Se adjunta informe del Administrador del mes de febrero 2016 (Anexo 30).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	05/04/2016 - 12:36 PM
<p>ENERO 2016:</p> <p>1.- La obra no tiene un avance significativo, los trabajos son mínimos, contratista tiene problemas con sus subcontrataciones en los sistemas especiales y acabados.</p> <p>2.- Faltan por construir la estructura horizontal tapagradas del Bloque 2 (Hito 9).</p> <p>3.- Actualmente se continua con la colocación de mampostería, se tiene un avance del 95% (Hito 10).</p> <p>4.- No se están ejecutando trabajos de los sistemas de agua potable e hidrosanitario (Hitos 11 y 12).</p> <p>5.- Se adjunta informe del Administrador del mes de enero 2016 (Anexo 29).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	25/02/2016 - 04:07 PM
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>1.- Faltan por construir la estructura horizontal tapagradas del Bloque 2 (Hito 9).</p> <p>2.- Actualmente se continua con la colocación de mampostería, se tiene un avance del 95% (Hito 10).</p> <p>3.- No se están ejecutando trabajos de los sistemas de agua potable e hidrosanitario (Hitos 11 y 12).</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador del mes de diciembre 2015 (Anexo 28).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	29/01/2016 - 02:12 PM
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 35,37%.</p> <p>2.- Faltan por construir la estructura horizontal tapagradas del Bloque 2 (Hito 9).</p> <p>3.- Actualmente se continua con la colocación de mampostería, se tiene un avance del 95%. se ha iniciado la colocación de la ventanería en las fachadas (Hito 10).</p> <p>4.- No se están ejecutando trabajos de los sistemas de agua potable e hidrosanitario (Hitos 11 y 12).</p> <p>5.- Se adjunta informe del Administrador del mes de noviembre 2015 (Anexo 27).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	04/01/2016 - 05:57 PM
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 35,35%.</p> <p>2.- Faltan por construir la estructura horizontal tapagradas de los Bloques 1 y 2 (Hito 9).</p> <p>3.- Actualmente se continua con la colocación de mampostería, se tiene un avance del 95% (Hito 10).</p> <p>4.- No se están ejecutando trabajos de los sistemas de agua potable e hidrosanitario (Hitos 11 y 12).</p> <p>5.- Se adjunta informe del Administrador del mes de octubre 2015 (Anexo 26).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	30/11/2015 - 11:41 AM
<p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 35,23%.</p> <p>2.- Faltan por construir la estructura horizontal tapagradas de los Bloques 1 y 2 (Hito 9).</p> <p>3.- Actualmente se continua con la colocación de mampostería, se tiene un avance del 95% (Hito 10).</p> <p>4.- No se están ejecutando trabajos de los sistemas de agua potable e hidrosanitario (Hitos 11 y 12).</p> <p>5.- Se adjunta informe del Administrador del mes de septiembre 2015 (Anexo 25).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	05/11/2015 - 10:34 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 33.60%.</p> <p>2.- Faltan por construir la estructura horizontal tapagradas (Hito 9).</p> <p>3.- Actualmente se continua con la colocación de mampostería en los Pisos 4to y 5to que corresponde al área de hospitalización. Se está ejecutando el enlucido vertical exterior fachadas norte, sur, este y oeste (Hito 10).</p> <p>4.- No se están ejecutando trabajos del sistema de agua potable (Hito 11).</p> <p>5.- Se colocó tubería horizontal PVC en losas Nv. -8.00m, Nv-4.00m, Nv. 0.00 y Nv+ 4.50m, Nv +9.00 Bloque 1 y 2. Se encuentra paralizada esta actividad (Hito 12)</p> <p>6.- Se adjunta informe del Administrador del mes de agosto 2015 (Anexo 24).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	15/09/2015 - 04:54 PM
<p>JULIO 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 33.50%.</p> <p>2.- Faltan por construir la estructura horizontal tapagradas (Hito 9).</p> <p>3.- Se continua con la colocación de mampostería en los Nv.+4.50, Nv.+9,00 Bloque 1 y 2. Se está ejecutando el enlucido vertical interior en el Nv-8.00, Nv-4.00, Nv. 0.00, Nv+4.50 y Nv+9.00 (Hito 10).</p> <p>4.- Se están ejecutando trabajos para sistema contraincendios (Hito 11).</p> <p>5.- Se colocó tubería horizontal PVC en losas Nv. -8.00m, Nv-4.00m, Nv. 0.00 y Nv+ 4.50m, Nv +9.00 Bloque 1 y Bloque 2. Se encuentra paralizada esta actividad (Hito 12)</p> <p>6.- Se adjunta informe del Administrador del mes de julio 2015 (Anexo 23).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	18/08/2015 - 09:09 AM
<p>JUNIO 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 31.50%.</p> <p>2.- Terminada la estructura horizontal correspondiente a la losa del Nv. +22.50 del Bloque 1 y 2. Está construido las gradas de acceso del Bloque 1, desde el Nv. +13,50 al Nv. +18,00 m Bloque 1 y 2. Faltan por construir la estructura horizontal tapagradas y gradas (Hito 9).</p> <p>3.-Se continua con la colocación de mampostería en los Nv.+4.50, Nv.+9,00 Bloque 1 y 2. Se está ejecutando el enlucido vertical interior en el Nv-8.00, Nv-4.00, Nv. 0.00, Nv+4.50 y Nv+9.00 (Hito 10).</p> <p>4.-Se están ejecutando trabajos para sistema contraincendios (Hito 11).</p> <p>5.- Se adjunta informe del Administrador del mes de junio 2015 (Anexo 22).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	16/07/2015 - 09:50 AM
<p>MAYO 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 31.00%.</p> <p>2.-Esta terminado hasta la estructura horizontal correspondiente a la losa del Nv. +22.50 del Bloque 1 y 2. Está construido las gradas de acceso del Bloque 1, desde el Nv. +13,50 al Nv. +18,00 m Bloque 1 y 2. Faltan por construir la estructura horizontal tapagradas y gradas (Hito 9).</p> <p>3.-Actualmente se continua con la colocación de mampostería en los Nv.-4.00 m, Nv.9.00, Nv. +4.50 Bloque 1 y 2, y la colocación de mampostería en los antepechos del Nv. +9,00m. (Hito 10).</p> <p>4.-Se están ejecutando trabajos para guachimanía para vivienda de obreros para ejecutar los trabajos correspondientes a sistema contraincendios (Hito 11).</p> <p>5.- Se adjunta informe del Administrador del mes de mayo 2015 (Anexo 21).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	09/06/2015 - 08:28 AM
<p>ABRIL 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 30.00%.</p> <p>2.-Esta terminado hasta la estructura horizontal correspondiente a la losa del Nv. +22.50 del Bloque 1. Actualmente se está armando la losa Nv.+22.50 m Bloque 2. Esta construido las gradas de acceso del Bloque 1 y 2, desde el Nv.+13.50 al Nv.+18.00 m. Faltan por construir la estructura horizontal tapagradas bloque 1 y 2 (Hito 9).</p> <p>3.-Actualmente se continua con la colocación de mampostería en los Nv.+4.50 m, Nv.9.00, Nv. +4.50 Bloque 1 y 2 (Hito 10).</p> <p>4.- El hito 11 aun no es ejecutado, ya que en la actualidad se trabaja en la construcción de los bloques 1 y 2, Nv.+18.00 Obra civil (estructura horizontal y vertical) (Hito 11).</p> <p>5.- Se adjunta informe del Administrador del mes de abril 2015 (Anexo 20).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	08/05/2015 - 08:41 AM
<p>MARZO 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 27.00%.</p> <p>2.-Esta terminado hasta la estructura horizontal correspondiente a la losa del Nv. +18.00 del Bloque 1 y 2. Actualmente se está encofrando losa y vigas Nv.+22.50 m Bloque 1. Esta construido las gradas de acceso del Bloque 1, desde el Nv.+13.50 al Nv.+18.00 m Bloque 1 y Bloque 2. Faltan por construir la estructura horizontal tapagradas (Hito 9).</p> <p>3.-Actualmente se continua con la colocación de mampostería en los Nv.-4.00 m, Nv.0.00, Nv.+4.50 Bloque 1, 2 y la colocación de mampostería en los antepechos del Nv.+9.00m; adicionalmente a esta actividad se realiza la provisión de acero de refuerzo y el hormigonado para riostras verticales y horizontales. Desde el 21 de marzo del 2015 se empezó a realizar los trabajos de enlucidos de paredes del Nv.-4.00 m Bloque 1 (Hito 10).</p> <p>4.- El hito 11 aun no es ejecutado, ya que en la actualidad se trabaja en la construcción de los bloques 1 y 2, Nv.+18.00 Obra civil (estructura horizontal y vertical) (Hito 11).</p> <p>5.- Se adjunta informe del Administrador del mes de marzo 2015 (Anexo 19).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	02/04/2015 - 04:36 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 18.10%.</p> <p>2.-Esta terminado hasta la estructura horizontal correspondiente a la losa del Nv. +18.00 del Bloque 1 y 2. Actualmente se está encofrando las columnas y diafragmas sobre la losa del N +18.00 al N+22.50 del Bloque 1. Falta por construir la estructura horizontal de los Bloques 1 y 2 en los Niveles +22.50 y tapagradas (Hito relacionado 9).</p> <p>3.-Actualmente se continua con la colocación de mampostería en los Nv.-4.00 m, Nv.0.00, Nv.+4.50 Bloque 1, 2 y la colocación de mampostería en los antepechos del Nv.+9.00m; adicionalmente a esta actividad se realiza la provisión de acero de refuerzo y el hormigonado para riostras verticales y horizontales. (Hito relacionado 10).</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador del mes de febrero 2015 (Anexo 18).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	09/03/2015 - 04:19 PM
<p>ENERO 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 17.70%.</p> <p>2.-Esta terminado hasta la estructura horizontal correspondiente a la losa del Nivel +13.50 del Bloque 1 y bloque 2. Actualmente se está encofrando las columnas y diafragmas sobre la losa del N+13.50 al N+18.00 del Bloque 2. Falta por construir la estructura horizontal de los Bloques 1 y 2 en los Niveles +18.00, +22.50 (Hito relacionado 9).</p> <p>3.-Actualmente se continua con la colocación de mampostería en los Nv.-4.00 m, Nv.0.00, Nv.+4.50 Bloque 1 y 2; adicionalmente a esta actividad se realiza la provisión de acero de refuerzo para riostras verticales y horizontales se tiene un avance del 12% (Hito relacionado 10).</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador del mes de enero 2015 (Anexo 17).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	28/02/2015 - 04:34 PM
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>1.- Avance de obra 17.40%.</p> <p>2.-Esta terminado hasta la estructura horizontal correspondiente a la losa del Nivel +13.50 del Bloque 1 y bloque 2. Actualmente se está encofrando las columnas y diafragmas sobre la losa del N+13.50 del Bloque 1. Falta por construir la estructura horizontal de los Bloques 1 y 2 en los Niveles +18.00, +22.50 (Hito relacionado 9).</p> <p>3.- Se reinició los trabajos de mampostería a partir del 15 de diciembre del 2014 desde el N0.00 del Bloque 1 y Bloque 2, el cual está en un avance del 0.70% (Hito relacionado 10).</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador del mes de diciembre (Anexo 16).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	08/01/2015 - 09:41 AM
<p>NOVIEMBRE 2014:</p> <p>1.- Avance de obra 17%.</p> <p>2.-Esta terminado hasta la estructura horizontal correspondiente a la losa del Nivel +13.50 del Bloque 1 y actualmente se está armando y encofrando las vigas sobre la losa del Nivel +13.50 del bloque 2. Falta por construir la estructura horizontal de los Bloques 1 y 2 en los Niveles +18.00, +22.50 (Hito relacionado 9).</p> <p>3.- Se empezó a realizar trabajos de mampostería en los Niveles -4.00 y +0.00 Bloque 1 y 2 el cual está en un avance del 0.60%.</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador del mes de noviembre (Anexo 15).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	03/12/2014 - 11:40 AM
<p>OCTUBRE 2014:</p> <p>1.- Avance de obra 16,61%.</p> <p>2.-Esta terminado hasta la estructura horizontal correspondiente a la losa del Nivel +9.00 del Bloque 1 y 2. Actualmente se está encofrando la estructura horizontal correspondiente a la losa del N+13,50 del bloque 1. Faltan por construir la estructura horizontal de los Bloques 1 y 2 en los N+13.50, +18.00, +22.50 (Hito relacionado 9).</p> <p>3.- Se adjunta informe del Administrador del mes de octubre (Anexo 14).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	06/11/2014 - 09:04 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014:</p> <p>1.- Avance de obra 14,15%.</p> <p>2.-Esta terminado hasta la estructura horizontal correspondiente a la losa del Nivel +4.50 del Bloque 1 y 2. Actualmente se está encofrando la estructura horizontal correspondiente a la losa del N+9,00 del bloque 1. Faltan por construir la estructura horizontal de los Bloques 1 y 2 en los N +9.00, +13.50, +18.00, +22.50 (Hito relacionado 9).</p> <p>3. Se tramita contrato complementario a fin de corregir la formula polinómica.</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador del mes de septiembre (Anexo 13).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	08/10/2014 - 08:46 AM
<p>AGOSTO 2014:</p> <p>1.- Avance de obra 14,00%.</p> <p>2.-Esta terminado hasta la estructura horizontal correspondiente a la losa del Nivel +4.50 del Bloque 1 y 2. La rampa de ingreso a los parqueaderos del Bloque 2, N-4.00 a N-8.00, está hormigonada. Esta construido las gradas de acceso del Bloque 1, desde el Nivel -8.00 hasta el Nivel +0.00. Faltan por construir la estructura horizontal de los Bloques 1 y 2 en los N+9.00, +13.50, +18.00, +22.50 (Hito relacionado 9).</p> <p>3. Se tramita contrato complementario a fin de corregir la formula polinómica.</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador Julio (Anexo 12).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	23/09/2014 - 02:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2014:</p> <p>1.- Avance de obra 14,00%.</p> <p>2.- La estructura horizontal correspondiente a la losa del Nivel +0.00 del Bloque 1 y 2 está hormigonada. La rampa de ingreso a los parqueaderos del Bloque 2, N-4.00 a N-8.00 está hormigonada. Esta construido las gradas de acceso del Bloque 1, desde el Nivel -8.00 hasta el Nivel +0.00. Se trabaja en el encofrado y armado de vigas y losa N+4.50 de los Bloques 1 y 2 (Hito relacionado 9).</p> <p>3. Se tramita contrato complementario a fin de corregir la formula polinómica.</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador Julio (Anexo 11).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	26/08/2014 - 12:55 PM
<p>JUNIO 2014:</p> <p>1.- Se corrigió la configuración del perfil Económico (Anexo 10).</p> <p>2. La estructura horizontal correspondiente a la losa del Nivel +0.00 del Bloque 1 y 2 está hormigonada. En quince días se procederá a hormigonar la losa del Nivel +4.50 del bloque 1 (Hito relacionado 9).</p> <p>3. Se tramita contrato complementario a fin de corregir la formula polinómica.</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo 9).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	17/07/2014 - 05:51 PM
<p>MAYO 2014:</p> <p>1. Se trabaja en el encofrado de las losas del Nivel 0.00 del Bloque 2, se tiene hormigonado la losas del Bloque 1 Niveles -4.00 y 0.00, bloque 2 de la losa del Nivel -4.00. En los próximos días se procederá a hormigonar la losa del Nivel 0.00 Bloque 2 (Hito relacionado 9). Se adjunta informe del Administrador (A8).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	24/06/2014 - 07:51 PM
<p>ABRIL 2014:</p> <p>1. Se trabajó en el hormigonado de las gradas de acceso del Bloque 1, N-4.00 a N-8.00 (Hito relacionado 9). Se adjunta informe del Administrador (A7).</p> <p>2. La mampostería, los sistemas de agua potable, sistemas hidrosanitarios y sistemas eléctricos aún no son ejecutados, ya que en la actualidad se trabaja en la construcción de los bloques 1 y 2, N-4.00 Obra civil (estructura horizontal) (Hitos relacionados 10, 11, 12 y 13).</p> <p>3. Se adjunta informe del Administrador (A7).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	14/05/2014 - 10:02 AM
<p>MARZO 2014:</p> <p>1. Se trabaja en la estructura horizontal correspondiente a la losa del Nivel -4. de los bloques 1 y 2, ya están hormigonadas; además se tiene hormigonada la rampa de ingreso a los parqueaderos del bloque 2, N-4.00 a N+0.00 (Hito relacionado 9). Se adjunta informe del Administrador (A.6).</p> <p>2. Aún no se entregan los planos definitivos. Se adjunta informe del Administrador (A.6).</p> <p>3. No corre el plazo por la formula polinómico que se encuentra en DATP. Se adjunta informe del Administrador (A.6).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	25/04/2014 - 03:04 PM
<p>FEBRERO 2014:</p> <p>1. Se hormigonó la estructura horizontal correspondiente a la losa del nivel -4.00 del bloque 1, además se tiene hormigonado la rampa de ingreso a los parqueaderos del bloque 2 nivel +0.00 (Hito relacionado 9). Se adjunta informe del Administrador (A.5).</p> <p>2. Los trabajos relacionados a la colocación de mampostería, sistema de agua potable y sistema hidrosanitario aún no son ejecutados ya que solo se está trabajando en la construcción de los bloques 1 y 2 (Hitos relacionados 10,11 y12). Se adjunta informe del Administrador (A.5).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	26/03/2014 - 12:05 PM
<p>ENERO 2014:</p> <p>1. Se trabaja en la estructura vertical, en los próximos días se procederá a hormigonar la losa del Nivel -4.00 de los Bloques 1 y 2, así como la rampa de ingreso a los parqueaderos (Hito relacionado 9). Se adjunta informe del Administrador (A.4)</p> <p>2. No se inician los trabajos de colocación de mampostería (Hito Relacionado 10). Se adjunta informe del Administrador (A.4)</p> <p>3. Hasta la presente fecha no se cuenta con el Acta de Inicio de Obra. Se adjunta informe del Administrador (A.4)</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	26/02/2014 - 04:16 PM
<p>DICIEMBRE 2013: Se culmina la colocación del hierro en losa y posteriormente las fundiciones de la Estructura horizontal terminada (Hito 9) por lo cual el hito no se encuentra terminado. Los trabajos se irán desarrollando posteriormente en los Hitos 10 al Hito 20. El administrador manifiesta que los retrasos se debe a que no se han entregado lo planos definitivos en cuanto a varios frentes de trabajo, se anexa informe del Administrador (Anexo 2).</p>	Guilcapi Pillajo, Rodrigo Fabricio	14/01/2014 - 04:22 PM
<p>NOVIEMBRE 2013: Se culminaron las Fundiciones de contrapisos (Hitos 7), y las Estructura vertical terminada (Hito 8) , los trabajos se irán desarrollando en los (Hito 9) al (Hito 17) .</p>	Romero Yamunaque, Yadira Lorena	19/12/2013 - 02:16 PM
<p>OCTUBRE 2013: Se trabaja en la colocación del colchón de piedra y posteriormente en la Fundición de contrapisos (Hitos 7) Anexo A1, se trabaja en la Estructura vertical terminada (Hito 8), y los trabajos en el (Hito 9) de la Estructura horizontal se prepara el hierro en campo.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2013: En este mes se ha realizado la cimentación, (Hito 6). De acuerdo a las cláusulas del contrato no se puede correr los plazos por la modificación de la fórmula polinómica</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2013: De acuerdo a las cláusulas del contrato no se puede correr los plazos por la modificación de la fórmula polinómica		
JULIO 2013: De acuerdo a las cláusulas del contrato no se puede correr los plazos por la modificación de la fórmula polinómica		
JUNIO 2013: Replanteo y nivelación concluidos (Hito 4). Se realizan trabajos de excavación, los cuales están casi terminados (Hito 5)		
MAYO 2013: Terminaron los trabajos de limpieza y desbroce del terreno (Hito 3). Se trabaja en el replanteo y nivelación (Hito 4) .		
ABRIL 2013: El contrato fue suscrito con fecha 01 de abril del 2013 (Hito 2). Iniciaron los trabajos de limpieza y desbroce de terreno (Hito 3).		

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La no subsanación de observaciones CAUSARÍA el retraso en la fiema del Acta de Recepción Definitiva y Obra Pública	17/07/2020	Juan Eduardo Velasco Pinto	50 %	50	25	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Latacunga

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Proceso de Contratación de obra a cargo de DC Adjudicado	3-Adjudicación	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0
2	EJECUCIÓN: Contrato de obra a cargo de DAJ firmado	4-Inicio de Trabajo	01/04/2013		01/04/2013		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Limpieza y desbroce de terreno terminado	5-Entregables Intermedios	29/04/2013		29/05/2013		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Replanteo y nivelación de terreno terminado	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/06/2013		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Excavación para cimentación terminado	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/08/2013		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN: Cimentación terminada	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		31/08/2013		Sí	8.0
7	EJECUCIÓN: Fundición de contrapisos terminado	5-Entregables Intermedios	29/06/2013		30/11/2013		Sí	8.0
8	EJECUCIÓN: Estructura vertical terminada	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/11/2013		Sí	11.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
9	EJECUCIÓN: Estructura horizontal terminada	5-Entregables Intermedios	30/07/2013		28/10/2016		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Mampostería terminada	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		03/05/2017		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Sistema de agua potable terminado	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/09/2018		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Sistema hidrosanitario terminado	5-Entregables Intermedios	31/08/2013		30/09/2018		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Sistema eléctrico terminado	5-Entregables Intermedios	29/09/2013		30/09/2018		Sí	4.0
14	EJECUCIÓN: Sistema electrónico terminado	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2018		Sí	4.0
15	EJECUCIÓN: Sistema contra incendios terminado	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/09/2018		Sí	4.0
16	EJECUCIÓN: Sistema de climatización terminado	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		30/09/2018		Sí	4.0
17	EJECUCIÓN: Sistemas de vapor y condensado terminado	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		30/09/2018		Sí	4.0
18	EJECUCIÓN: Sistema de gases medicinales terminados	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/09/2018		Sí	3.0
19	EJECUCIÓN: Sistema de voz y datos terminado	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		03/05/2017		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: Instalación de cielo raso y mobiliario terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		30/09/2018		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Instalación de vinil en pisos y paredes terminado	5-Entregables Intermedios	30/01/2014		30/09/2018		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN: Acabados interiores terminados	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		30/09/2018		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN: Implementación de señalética terminado	1-Solicitud de Información	27/02/2014		30/09/2018		Sí	3.0
24	EJECUCIÓN: Intervención especial en edificio patrimonial terminado	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		03/05/2017		Sí	4.0
25	EJECUCIÓN: Remodelación y tecnologías en edificio patrimonial terminado	5-Entregables Intermedios	26/03/2014		03/05/2017		Sí	3.5
26	EJECUCIÓN: Obras exteriores terminadas	5-Entregables Intermedios	27/03/2014		30/09/2018		Sí	3.5
27	CIERRE: Acta de Recepción Provisional firmada	5-Entregables Intermedios	26/04/2014		26/03/2019		Sí	2.0
28	COMPLETADO: Acta de Recepción Definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	22/11/2014	31/07/2020			No	1.0
29	EJECUCIÓN: Contrato Complementario	5-Entregables Intermedios	02/03/2017		31/03/2019		Sí	1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	REPONTENCIACIÓN HOSPITAL LATACUNGA	Gonzalez Jara, Hector Guillermo	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/10/2017
2	HOSPITAL LATACUNGA	Gonzalez Jara, Hector Guillermo	{PR} - Provincia - COTOPAXI	08/12/2017
3	Construcción y Repotenciación del Hospital General de Latacunga	Gonzalez Jara, Hector Guillermo	{PR} - Provincia - COTOPAXI	15/09/2017

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
4	Construcción y Repotenciación del Hospital General de Latacunga en la provincia de Cotopaxi.	Gonzalez Jara, Hector Guillermo	{PR} - Provincia - COTOPAXI	23/08/2017
5	Repotenciación del Hospital General de Latacunga en la provincia de Cotopaxi	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/05/2017
6	REPONTENCIACIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	28/04/2017
7	HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/03/2017
8	REPONTENCIACIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	28/02/2017
9	REPONTENCIACIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	12/01/2017
10	REPONTENCIACIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/12/2016
11	REPONTENCIACIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	18/10/2016
12	REPONTENCIACIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/08/2016
13	HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/07/2016
14	REPONTENCIACIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/06/2016
15	REPONTENCIACIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/05/2016
16	Repotenciación del Hospital General de Latacunga	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/04/2016
17	Hospital General de Latacunga en la provincia de Cotopaxi	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/03/2016
18	Repotenciación del Hospital General de Latacunga	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/02/2016
19	Hospital General de Latacunga en la provincia de Cotopaxi	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/01/2016
20	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	22/04/2015
21	Hospital General de Latacunga	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/12/2015
22	Hospital General de Latacunga	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/11/2015
23	Hospital General de Latacunga	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/10/2015
24	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	12/08/2015
25	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/06/2015
26	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/03/2015
27	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	27/02/2015
28	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	23/12/2014
29	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	21/10/2014
30	HOSPITAL EN LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	24/02/2014
31	HOSPITAL GENERAL DE LATACUNGA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	24/10/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	9,499,693.73
Estimado Al Fin Del Proyecto:	12,625,431.82 **
Costo Total:	18,999,387.46
Total Devengado:	12,625,431.82
% Costo Total Devengado:	66.45 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 66.45 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	12,625,431.82	172,426.02	0.00	12,797,857.84
Ppto. Externo Planeado	7,818,809.12	0.00	0.00	7,818,809.12
Ppto. Aprobado Inicial	4,100,374.60	0.00	0.00	4,100,374.60
Ppto. Codificado	8,574,327.16	172,426.02	0.00	8,746,753.18
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	12,625,431.82	0.00	0.00	12,625,431.82
Ppto. Devengado	12,625,431.82	0.00	0.00	12,625,431.82
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 12,625,431.82	0.00	0.00	12,625,431.82
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 1 - Proceso de Contratación de obra Adjudicado a cargo de DC	1._Hito_1.pdf	09/10/2013
2	A.2 - Hito 2 - Contrato de obra firmado a cargo de DAJ	2._Hito_2.pdf	09/10/2013
3	A.3 - Hito 3 - Limpieza y desbroce de terreno terminado	3._Hito_3.jpg	09/10/2013
4	A.4 - Hito 4 - Replanteo y nivelación de terreno terminado	4._Hito_4.jpg	09/10/2013
5	A.5 - Hito 5 - Excavación para cimentación terminado	5._Hito_5.jpg	09/10/2013
6	A.6 - Hito 6 - Cimentación terminada	6._Hito_6.jpg	09/10/2013
7	A.7 - Hito 7 - Fundición de contrapisos terminado	Hito_7_Latacunga.JPG	11/11/2013
8	A.8 - Anexo 1 - Informe administrador de Obra octubre	Hito_7-Latacunga.JPG	30/11/2013
9	A.9 - Hito 8 - Estructura vertical terminada	Hito_8-Latacunga.JPG	30/11/2013
10	B.1 - (Hito 8) Estructura vertical terminada - Anexo 2 - Informe del Administrador en Diciembre	A2-_LATACUNGA.pdf	23/12/2013
11	B.2 - Anexo 3 - Solicitud de TDR's entregados	TDR's_Solicitud.pdf	17/01/2014
12	B.3 - Anexo 4.- Informe del Administrador Enero 2014	A.1.pdf	07/05/2014
13	B.4 - Anexo 5.- Informe del Administrador Febrero 2014	A.2.pdf	07/05/2014
14	B.6 - Anexo 7.- Informe del Administrador Abril 2014	A.4.pdf	07/05/2014
15	B.7 - Anexo 8.- Informe del Administrador Mayo 2014	A.5.pdf	26/05/2014
16	B.8 - Anexo 9.- Informe del Administrador Junio 2014	A.6.pdf	30/06/2014
17	B.9 - Anexo 10 - Autorización Corrección Perfil Económico	Corrección_Perfil_Económico.pdf	07/07/2014
18	C.1 - Anexo 11.- Informe del Administrador Julio 2014	A.7.pdf	28/07/2014
19	C.2 - Anexo 12.- Informe del Administrador Agosto 2014	A.8.pdf	30/08/2014
20	C.3 - Anexo 13.- Informe del Administrador Septiembre 2014	A.9.pdf	26/09/2014
21	C.4 - Anexo 14.- Informe del Administrador Octubre 2014	B.1.pdf	27/10/2014
22	C.5 - Anexo 15.- Informe del Administrador Noviembre 2014	B.2.pdf	28/11/2014
23	C.6 - Anexo 16.- Informe del Administrador Diciembre 2014	B.3.pdf	19/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
24	C.7 - Anexo 17.- Informe del Administrador Enero 2015	B.4.pdf	29/01/2015
25	C.8 - Anexo 18.- Informe del Administrador Febrero 2015	B.5.pdf	10/03/2015
26	C.9 - Anexo 19.- Informe del Administrador Marzo 2015	B.6.pdf	01/04/2015
27	D.1 - Anexo 20.- Informe del Administrador Abril 2015	B.7.pdf	28/04/2015
28	D.2 - Anexo 21.- Informe del Administrador Mayo 2015	B.8.pdf	28/05/2015
29	D.3 - Anexo 22.- Informe del Administrador Junio 2015	B.9.pdf	26/06/2015
30	D.4 - Anexo 23.- Informe del Administrador Julio 2015	C.1.pdf	29/07/2015
31	D.5 - Anexo 24.- Informe del Administrador Agosto 2015	C.2.pdf	27/08/2015
32	D.6 - Anexo 25.- Informe del Administrador Septiembre 2015	C.3.pdf	02/10/2015
33	D.7 - Anexo 26.- Informe del Administrador Octubre 2015	C.4.pdf	05/11/2015
34	D.8 - Anexo 27.- Informe del Administrador Noviembre 2015	C.5.pdf	01/12/2015
35	D.9 - Anexo 28.- Informe del Administrador Diciembre 2015	C.6.pdf	04/01/2016
36	E.1 - Anexo 29.- Informe del Administrador Enero 2016	C.7.pdf	29/01/2016
37	E.2 - Anexo 30.- Informe del Administrador Febrero 2016	C.8.pdf	01/03/2016
38	E.3 - Anexo 31.- Informe del Administrador Marzo 2016	C.9.pdf	05/04/2016
39	E.4 - Anexo 32.- Informe del Administrador Abril 2016	D.1.pdf	02/05/2016
40	E.5 - Anexo 33.- Informe del Administrador Mayo 2016	D.2.pdf	30/05/2016
41	E.6 - Anexo 34.- Suspensión de Obra No. 1	D.3.pdf	02/08/2016
42	E.7 - Anexo 35.- Contrato Complementario No. 2	D.4.pdf	28/10/2016
43	E.8 - Hito 9 - Estructura horizontal terminada	D.5.jpg	28/10/2016
44	E.9 - Anexo 36.- Informe del Administrador Octubre 2016	D.6.pdf	28/10/2016
45	F.1 - Anexo 37.- Informe del Administrador Noviembre 2016	D.7.pdf	02/12/2016
46	F.2 - Anexo 38.- Informe del Administrador Diciembre 2016	D.8.pdf	04/01/2017
47	F.3 - Anexo 39.- Informe del Administrador Enero 2017	D.9.pdf	31/01/2017
48	F.4 - Anexo 40.- Informe del Administrador Febrero 2017	E.1.pdf	01/03/2017
49	F.5 - Anexo 41.- Informe del Administrador Marzo 2017	E.2.pdf	31/03/2017
50	F.6 - Anexo 42.- Informe del Administrador Abril 2017	E.3.pdf	03/05/2017
51	F.7 - Hitos 10, 19, 24, 25 - Trabajos Concluidos	E.4.jpg	30/05/2017
52	F.8 - Anexo 43.- Informe del Administrador Mayo 2017	E.5.pdf	30/05/2017
53	F.9 - Anexo 44.- Informe del Administrador Junio 2017	E.6.pdf	05/07/2017
54	G.1 - Anexo 45.- Suspensión de plazo	E.7.pdf	07/08/2017
55	G.1 - Anexo 46 - Resolución cambio de Patrocinador.	RESOLUCION_SECOB-DG-2017-003_PATROCINADOR_GPR.pdf	11/12/2017
56	G.2 - Anexo 47 - Informe Supervisor Septiembre de 2018	Informe_GPR_Latacunga_septiembre_2018.pdf	02/10/2018
57	G.3 Hito 11,12,13,14,15,16,17,18 cumplidos	Hitos_11_12_13_14_15_16_17_18_cumplidos.pdf	02/10/2018
58	G.4.- Anexo 48- Informe de Supervisor Octubre 2018	H_LATACUNGA_30-10-2018.pdf	30/10/2018
59	G.5.- Anexo 49- Informe de Supervisor Noviembre 2018	Hospital_de_Latacunga.pdf	29/11/2018
60	G.5.- Anexo 50- Informe de Supervisor Diciembre 2018	Informe_GPR_Diciembre_2018.pdf	04/01/2019
61	G.6.- Anexo 51- Solicitud de Delegado al MSP para suscripción del Acta Recepción Entrega Provisional	SECOB-SDG-2019-0080-O_solicitud_de_delegado_para_suscripcion_del_Acta_Provisional.pdf	31/01/2019
62	G.7.- Anexo 52- Informe de Supervisor Febrero 2019	INFORME_GPR_FEBRERO_2019_H_LATACUNGA.pdf	06/03/2019
63	G.8.- Hito 27- Acta Entrega de Recepción Provisional	Acta_de_Recepción_Provisional_RE-ICO-013-2013_(1).pdf	27/03/2019
64	G.9.- Anexo 53 - INFORME ADMINISTRADOR DICIEMBRE 2019	GPR_DICIEMBRE-_2019_HOSPITAL_LATACUNGA.doc.pdf	09/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
65	H.1.- Anexo 54 - INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO ENERO DE 2021	k433_INFORME_ADMINISTRADOR_CONTRATO_ENERO_05/03/2021	05/03/2021
66	H.2.- Anexo 55 - INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO FEBRERO DE 2021	K433_hospital_de_latacunga-febrero-2021.pdf	04/03/2021
67	H.3.- Anexo 56 - INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO MARZO DE 2021	K433_hospital_de_latacunga-marzo-2021-signed0964399001617630949.pdf	05/04/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Chamorro Flores, Cristian Patricio	Analista de obra	Dirección Nacional de Recepción Entrega de Producto	cchamorro@secob.gob.ec	3964800
Costa Paladines, Patricio Vicente	Ministerio de Salud Pública	Subsecretario Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud	patricio.costa@msp.gob.ec	
Medina Villao, Elizabeth del Rocío	Administrador de Contrato	Administrador de Contrato	emedina@secob.gob.ec	3964800
