

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 1**  
**Dirección Provincial Sucumbíos**

**PROYECTO: K037 MTOP - Construcción del puente sobre el río Aguarico 1.**

Líder del Proyecto:	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo (aarizaga@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO 1, Provincia - Sucumbíos, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Villacres Angulo, Oscar Ivan	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.374024	TIR:	18.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	6.61
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	7,304,492.52
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Obligaciones	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	19/06/2012 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	15/01/2020	Fecha de Fin Base:	09/10/2013
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	30/10/2017

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN:**  
 El puente sobre el Río Aguarico, ubicado en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Gonzalo Pizarro, Parroquia Lumbaqui, corresponde a una longitud de 237 metros.

**PRODUCTO / SERVICIO:**  
 Construcción de un puente de 237 metros que facilitará la movilidad en la carretera Nueva Loja - Quito

**LÍNEA BASE:**  
 La línea base para la construcción del Puente Aguarico 1 inicia en cero y avanza a medida en que se realizan los trabajos de Construcción, el 100% correspondería a la terminación de los trabajos y puesta en funcionamiento el puente.

**OBJETIVO GENERAL:**  
 Construcción de un puente de 237 metros.

**OBJETIVO ESPECIFICO:**  
 Facilitar la movilidad de bienes y servicios en la carretera Nueva Loja - Quito, disminuyendo el tiempo de viaje e incrementando el nivel de servicio, con el correspondiente ahorro en el costo de viaje.

**CONTRATISTA :** Cuerpo de Ingenieros del Ejército

**VALOR CONTRACTUAL**  
 7.909.972,83

**Beneficios Cualitativos**

Integrar la ciudad de Lago Agrio con las diferentes provincias como Pichincha y Napo, disminuir el tiempo de viaje hacia la ciudad de Quito. Además permitirá un ahorro sustancial en el costo del viaje Lago Agrio - Quito

**Tipo de Beneficiario**

La población de la provincia de Sucumbios 176472 habitantes, específicamente el sector del transporte.


**Restricciones**

Tiempo: Los trabajos se deben ejecutar en el plazo estipulado en el convenio

Fase Actual:  Anteproyecto  Definición  Planeación  Ejecución  Cierre  Completado  Congelado  Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 19/06/2012 Fecha de Fin: 31/12/2019

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

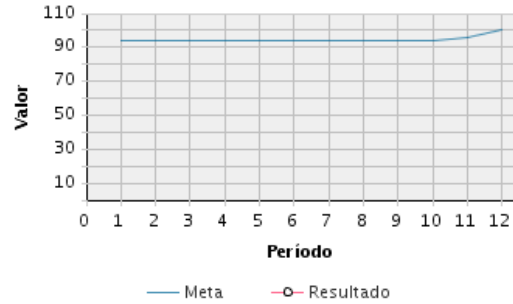

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	96 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Noviembre 2019: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; se encuentra pendiente la liquidación al contratista	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/01/2020 - 02:46 PM
Noviembre 2019: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; se encuentra pendiente la liquidación al contratista Solano Blacio, Wimper Vicente04/10/2019 - 03:45 PM	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	04/12/2019 - 04:29 PM
Octubre 2019: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; se encuentra pendiente la liquidación al contratistaSolano Blacio, Wimper Vicente04/10/2019 - 03:45 PM	Orellana Sarmiento, Galo Oswaldo	05/11/2019 - 10:20 AM
Septiembre 2019: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; se encuentra pendiente la liquidación al contratista	Solano Blacio, Wimper Vicente	04/10/2019 - 03:45 PM
Agosto 2019: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; se encuentra pendiente la liquidación al contratista.	Solano Blacio, Wimper Vicente	05/09/2019 - 04:50 PM
Julio 2019: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; se encuentra pendiente la liquidación al contratista.	López Mendoza, Cristhian Manuel	02/08/2019 - 03:48 PM
Junio 2019: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; se encuentra pendiente la liquidación al contratista.	López Mendoza, Cristhian Manuel	02/07/2019 - 09:03 AM
Mayo 2019: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; se encuentra pendiente la liquidación al contratista.	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/06/2019 - 02:53 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2019: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; se encuentra pendiente la liquidación al contratista	López Mendoza, Cristhian Manuel	02/05/2019 - 09:08 AM
Marzo 2019: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; se encuentra pendiente la liquidación al contratista	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/04/2019 - 01:46 PM
Febrero 2019: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; se encuentra pendiente la liquidación al contratista	López Mendoza, Cristhian Manuel	27/02/2019 - 08:02 AM
Enero 2019: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; se encuentra pendiente la liquidación al contratista	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/02/2019 - 01:43 PM
Enero 2018: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; en trámite del acta Recepción Provisional.	Enríquez Ocampos, Robin Cristian	08/02/2018 - 10:58 AM
DICIEMBRE 2017: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; en trámite del acta Recepción Provisional.	Enríquez Ocampos, Robin Cristian	05/01/2018 - 05:29 PM
Octubre 2017: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; en trámite el acta Recepción Provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/11/2017 - 04:23 PM
Septiembre 2017: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; en trámite el acta Recepción Provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/10/2017 - 11:25 AM
Agosto 2017: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; en trámite el acta Recepción Provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/09/2017 - 09:58 PM
Julio 2017: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; en trámite el acta Recepción Provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/08/2017 - 02:53 PM
Junio 2017: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; en trámite el acta Recepción Provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	04/07/2017 - 04:16 PM
Mayo 2017: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; en trámite el acta Recepción Provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/06/2017 - 11:35 AM
Abril 2017: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; en trámite el acta Recepción Provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/05/2017 - 01:31 PM
Marzo 2017: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; en trámite el acta Recepción Provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/04/2017 - 12:20 PM
Marzo 2017: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; en trámite el acta Recepción Provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	30/03/2017 - 12:08 PM
Febrero 2017: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; en trámite el acta Recepción Provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/03/2017 - 01:55 PM
Enero 2017: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; en trámite el acta Recepción Provisional.	Navas Coque, Richard Wladimir	08/02/2017 - 02:42 PM
Diciembre 2016: El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; los trabajos se encuentran concluidos; en trámite el acta Recepción Provisional.	Navas Coque, Richard Wladimir	26/01/2017 - 02:41 PM
Noviembre 2016 El Puente se encuentra prestando servicio a la comunidad; se encuentra concluido y con Recepción Definitiva. Marzo 2016 Conformación de la comisión para realizar la recepción provisional del proyecto.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/12/2016 - 09:28 AM
Febrero 2016	Navas Coque, Richard Wladimir	04/03/2016 - 03:19 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Fecha de terminación de proyecto 30-01-2016; la fiscalización conjuntamente con la contratista realizan la liquidación económica del proyecto.		
<p>Enero 2016</p> <p>El proyecto no concluyo en la fecha establecida en el contrato, se están aplicando las multas respectivas y el contratista se encuentra realizando las siguientes actividades para entregar la obra:</p> <p>Colocación de carpeta asfáltica.                      Transporte de material de base para accesos                      Tendido de material de base en acceso izquierdo y acceso derecho                      Compactación de material de base en acceso izquierdo y acceso derecho</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	04/03/2016 - 03:15 PM
<p>Diciembre 2015</p> <p>EL plazo del Puente continua suspendido por falta de aprobación de los avales presupuestarios para la firma de los contratos complementarios del contratista y fiscalización.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	04/03/2016 - 03:14 PM
<p>Noviembre 2015</p> <p>EL plazo del Puente se encuentra suspendido por falta de aprobación de los avales presupuestarios para la firma de los contratos complementarios del contratista y fiscalización.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	04/03/2016 - 03:13 PM
<p>Octubre 2015:</p> <p>Los trabajos se ejecutan de acuerdo al cronograma establecido en el contrato, con las siguientes actividades: Descenso de dovelas eje 1; armado de pasamanos del viaducto; encofrado y hormigonado de barandas y pasamanos del viaducto; empuje del eje 3; hormigonado de veredas del viaducto; descenso de dovedas eje 2; ensamblaje de conectores en dovela eje 1; ensamblaje de dovelas C-B A eje 3; empuje de dovelas eje 3; colocación de aisladores en las pilas 0+305 y 0+410 encofrado de dovelas eje 1.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	19/11/2015 - 12:41 PM
<p>Septiembre 2015:</p> <p>Empuje del eje 3 hasta pasar la pila 0+410, ensamble y suelda de las dovelas A Y BC del eje 3, empuje de dovelas eje 3 hasta su posicion final, descenso de ejes de viga, colocacion de mejoramiento, sub base y base en el inicio del acceso derecho del puente, fundicion de pasamanos de la losa del viaducto, construccion de cunetas del acceso derecho, actualmente se encuentra en el proceso de pago de planillas.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	12/10/2015 - 03:53 PM
<p>Agosto 2015:</p> <p>Empuje dovelas eje 1, ensamblaje dovela C eje 1, ensamblaje de dovela E-D eje 3, soldadura de patín refuerzo en dovela I-H eje 3, soldadura de patín inferior dovela E-D eje 3, empuje de dovelas eje 3.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	04/09/2015 - 10:40 AM
<p>Julio 2015:</p> <p>Se continua los trabajos; Ensamblaje de dovelas F-G eje #2, prueba de ultrasonido, biselado alma dovelaE-F eje #3, soldadura de alma patin dovelaH eje #2; soldadura de patin inferior dovela F-G eje #3.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	04/09/2015 - 10:31 AM
<p>Junio 2015:</p> <p>En ejecución, a la espera de firma de Orden de Cambio.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	04/09/2015 - 10:29 AM
<p>Mayo 2015:</p> <p>En ejecución, a la espera de firma de Orden de Cambio</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	04/09/2015 - 10:11 AM
<p>ABRIL 2015 .- Colocación y amarre de estribos, en cuerpo de la pila 0+305, ecofrado del cuerpo de la pila 0+305. Transporte de acero estructural (dovelas) de la superestructura del puente desde la fabrica Santa Bárbara Quito hasta el sitio de la obra Lumbaqui. Reconformación de muro de protección de pila 0+410 y plataforma de maniobras para equipos de trabajo pila 0+410. La construcción del muro de protección del estribo izquierdo se encuentra terminada. En la abscisa 0+410 tenemos 14 pilotes a una profundidad de 21 metros, 6 pilotes a 16 metros y 7 pilotes a 11 metros.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/05/2015 - 10:05 PM
<p>MARZO 2015 .- Colocación y amarre de estribos, en cuerpo de la pila 0+305, ecofrado del cuerpo de la pila 0+305. Transporte de acero estructural (dovelas) de la superestructura del puente desde la fabrica Santa Bárbara Quito hasta el sitio de la obra Lumbaqui. Reconformación de muro de protección de pila 0+410 y plataforma de maniobras para equipos de trabajo pila 0+410. La construcción del muro de protección del estribo izquierdo se encuentra terminada. En la abscisa 0+410 tenemos 14 pilotes a una profundidad de 21 metros, 6 pilotes a 16 metros y 7 pilotes a 11 metros.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/04/2015 - 11:57 AM
<p>FEBRERO 2015 .- Colocación y amarre de estribos, en cuerpo de la pila 0+305, ecofrado del cuerpo de la pila 0+305. Transporte de acero estructural (dovelas) de la superestructura del puente desde la fabrica Santa Bárbara Quito hasta el sitio de la obra Lumbaqui. Reconformación de muro de protección de pila 0+410 y plataforma de maniobras para equipos de trabajo pila 0+410. La construcción del muro de protección del estribo izquierdo se encuentra terminada. En</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/03/2015 - 08:54 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
la abscisa 0+410 tenemos 14 pilotes a una profundidad de 21 metros, 6 pilotes a 16 metros y 7 pilotes a 11 metros.		
ENERO 2015 .- Colocación y amarre de estribos, en cuerpo de la pila 0+305, ecofrado del cuerpo de la pila 0+305. Transporte de acero estructural (dovelas) de la superestructura del puente desde ña fabrica Santa BArbara Quito hasta el sitio de la obra Lumbaqui. Reconformación de muro de protección de pila 0+410 y plataforma de maniobras para equipos de trabajo pila 0+410.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/02/2015 - 09:58 AM
DICIEMBRE 2014 .- Colocación y amarre de estribos, en cuerpo de la pila 0+305, ecofrado del cuerpo de la pila 0+305. Transporte de acero estructural (dovelas) de la superestructura del puente desde ña fabrica Santa BArbara Quito hasta el sitio de la obra Lumbaqui. Reconformación de muro de protección de pila 0+410 y plataforma de maniobras para equipos de trabajo pila 0+410.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	23/01/2015 - 11:22 AM
NOVIEMBRE 2014 .- Colocación y amarre de estribos, en cuerpo de la pila 0+305, ecofrado del cuerpo de la pila 0+305. Transporte de acero estructural (dovelas) de la superestructura del puente desde ña fabrica Santa BArbara Quito hasta el sitio de la obra Lumbaqui. Reconformación de muro de protección de pila 0+410 y plataforma de maniobras para equipos de trabajo pila 0+410.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/12/2014 - 08:44 AM
OCTUBRE 2014 .- Colocación y amarre de estribos, en cuerpo de la pila 0+305, ecofrado del cuerpo de la pila 0+305. Transporte de acero estructural (dovelas) de la superestructura del puente desde ña fabrica Santa BArbara Quito hasta el sitio de la obra Lumbaqui. Reconformación de muro de protección de pila 0+410 y plataforma de maniobras para equipos de trabajo pila 0+410.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/11/2014 - 12:35 PM
SEPTIEMBRE 2014 .- Se está realizando derrocamiento de la pila del puente antiguo que se encuentra ubicada en area de influencia de la cimentación de la pila ubicada en la abscisa 0+410. Se continúa con el barrenado e incado de los pilotes de la pila ubicado en la abscisa 0+305. Conformación de la pla taforma para obra falsa, construcción de las bigas y diafragmas en hormigón armado, relleno y compactación con material de préstamo importado en el sector del acceso derecho del puente, Armado de acero de refuerzo de las bigas y diafragmas del puente.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/10/2014 - 10:15 AM
AGOSTO 2014 .- Se está realizando derrocamiento de la pila del puente antiguo que se encuentra ubicada en area de influencia de la cimentación de la pila ubicada en la abscisa 0+410. Se continúa con el barrenado e incado de los pilotes de la pila ubicado en la abscisa 0+305. Conformación de la pla taforma para obra falsa, construcción de las bigas y diafragmas en hormigón armado, relleno y compactación con material de préstamo importado en el sector del acceso derecho del puente, Armado de acero de refuerzo de las bigas y diafragmas del puente.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/10/2014 - 10:14 AM
JULIO 2014 .- Se está realizando derrocamiento de la pila del puente antiguo que se encuentra ubicada en area de influencia de la cimentación de la pila ubicada en la abscisa 0+410. Se continúa con el barrenado e incado de los pilotes de la pila ubicado en la abscisa 0+305. Conformación de la pla taforma para obra falsa, construcción de las bigas y diafragmas en hormigón armado, relleno y compactación con material de préstamo importado en el sector del acceso derecho del puente, Armado de acero de refuerzo de las bigas y diafragmas del puente.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	21/08/2014 - 04:18 AM
Con fecha 24 deSeptiembre del 2013, se amplía el plazo hasta el 30 de Junio 2014 y un incremento de presupeusto de 603,348.44. Actualmente se está tramitando la segunda Acta de Comisión especial 451, con la que se tiene previsto realizar una ampliación de plazo hasta el 31 de Enero del 2015 y un monto de incremento de obra de 3'073,823.67.		
JUNIO 2014 .- Se está realizando derrocamiento de la pila del puente antiguo que se encuentra ubicada en area de influencia de la cimentación de la pila ubicada en la abscisa 0+410. Se continúa con el barrenado e incado de los pilotes de la pila ubicado en la abscisa 0+305. Conformación de la pla taforma para obra falsa, construcción de las bigas y diafragmas en hormigón armado, relleno y compactación con material de préstamo importado en el sector del acceso derecho del puente, Armado de acero de refuerzo de las bigas y diafragmas del puente.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	30/07/2014 - 05:06 PM
Con fecha 24 deSeptiembre del 2013, se amplía el plazo hasta el 30 de Junio 2014 y un incremento de presupeusto de 603,348.44. Actualmente se está tramitando la segunda Acta de Comisión especial 451, con la que se tiene previsto realizar una ampliación de plazo hasta el 31 de Enero del 2015 y un monto de incremento de obra de 3'073,823.67.		
MAYO 2014 .- Se continúa los trabajos de la construcción del viaducto del acceso derecho, los trabajos de perforaciones de los pilotes en la pila central, verificación de construcción de las bigas metálicas en la fábrica Santa Bárbara.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 12:03 PM
ABRIL 2014 .- Se continúa los trabajos de la construcción del viaducto del acceso derecho, los trabajos de perforaciones de los pilotes en la pila central, verificación de construcción de las bigas metálicas en la fábrica Santa Bárbara.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 12:02 PM

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2014 .- Se continúa los trabajos de la construcción del viaducto del acceso derecho, los trabajos de perforaciones de los pilotes en la pila central, verificación de construcción de las bigas metálicas en la fábrica Santa Bárbara.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	15/04/2014 - 04:51 PM
FEBRERO 2014 .- Se continúa los trabajos de la construcción del viaducto del acceso derecho, los trabajos de perforaciones de los pilotes en la pila central, verificación de construcción de las bigas metálicas en la fábrica Santa Bárbara.  Se ha solicitado a la Dirección Provincial de Napo la Programación Presupuestaria, hasta la presente fecha no ha entregado. Arizaga Davila , Abelardo 10/02/2014 - 11:48 AM	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	17/03/2014 - 08:31 AM
ENERO 2013 .- Se continúa los trabajos de la construcción del viaducto del acceso derecho, los trabajos de perforaciones de los pilotes en la pila central, verificación de construcción de las bigas metálicas en la fábrica Santa Bárbara.  Se ha solicitado a la Dirección Provincial de Napo la Programación Presupuestaria, hasta la presente fecha no ha entregado.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	17/03/2014 - 08:30 AM
DICIEMBRE 2013 .- Se inicia los trabajos de la construcción del viaducto del acceso derecho, los trabajos de perforaciones de los pilotes en la pila central, verificación de construcción de las bigas metálicas en la fábrica Santa Bárbara.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/02/2014 - 11:40 AM
NOVIEMBRE 2013.- Se está realizando un espigón en el lugar donde se ubicará la pila 0+410, para poder trabajar en los pilotes, allí se ubicarán, también se está construyendo otro espigón como muro de protección para los pilotes.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/01/2014 - 03:31 PM
OCTUBRE 2013.- Se está realizando un espigón en el lugar donde se ubicará la pila 0+410, para poder trabajar en los pilotes, allí se ubicarán, también se está construyendo otro espigón como muro de protección para los pilotes de la p'ola 0+305.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/12/2013 - 02:12 AM

### PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Liquidación Económica pendiente	25/11/2019	Leoncio Abelardo Arizaga Davila	40	60	24	0/1
Legalización Acta Recepción Definitiva	25/11/2019	Leoncio Abelardo Arizaga Davila	40	60	24	0/1
Legalización Acta Recepción Provisional	25/11/2019	Leoncio Abelardo Arizaga Davila	40	60	24	0/1

*Problemas cerrados: 3, Abiertos: 3*

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Recursos.</b> La falta de recursos económicos CAUSARÍA el retraso en el plazo establecido del proyecto.	25/11/2019	Leoncio Abelardo Arizaga Davila	60 %	70	42	0/1

*Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1*

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Gonzalo Pizarro

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Contrato suscrito, firmado.	4-Inicio de Trabajo	19/06/2012		19/06/2012		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Elaboración del contrato, realizado	4-Inicio de Trabajo	19/06/2012		19/06/2012		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Entrega de anticipo.- Entregado	4-Inicio de Trabajo	26/06/2012		26/06/2012		Sí	10.0
4	EJECUCIÓN: Construcción de infraestructura 1, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		30/11/2014		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Construcción de infraestructura 2, realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/06/2013		Sí	11.0
6	EJECUCIÓN: Construcción de superestructura, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2014		Sí	12.0
7	EJECUCIÓN: Señalización, realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/12/2014		Sí	8.0
8	EJECUCIÓN: Mitigación de impactos ambientales, realizado	5-Entregables Intermedios	19/06/2014		31/10/2015		Sí	8.0
9	EJECUCIÓN: Construcción de accesos, realizado	5-Entregables Intermedios	20/06/2014		31/10/2015		Sí	12.0
10	CIERRE: Acta Entrega Recepcion provisional, firmado	9-Entregables Formales	26/06/2014		29/12/2014		Sí	1.0
11	CIERRE: Liquidación económica del contrato, realizado	9-Entregables Formales	26/06/2014	30/10/2017			No	1.0
12	CIERRE: Acta entrega Recepción definitiva, firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/07/2015	28/12/2017			No	1.0
13	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	15/11/2019	15/11/2019			No	2.0
14	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	01/12/2019	01/12/2019			No	1.0
15	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	01/12/2019	01/12/2019			No	1.0
16	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	13/12/2019	13/12/2019			No	1.5
17	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	18/02/2016
2	TERMINADA	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	09/03/2016

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
3	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	18/02/2016
4	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	24/12/2015
5	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	22/01/2016
6	PROYECTO: K037 MTOP - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO No. 1 - OCTUBRE 2015	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	22/10/2015
7	PROYECTO EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	01/10/2015
8	PROYECTO EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	31/08/2015
9	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	29/07/2015
10	PROYECTO EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	29/06/2015
11	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	28/05/2015
12	Proyecto en ejecucion	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/12/2014
13	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	21/03/2015
14	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/01/2015
15	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	06/02/2015

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						




**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	2,372,991.85
Estimado Al Fin Del Proyecto:	7,304,492.52 **
Costo Total:	13,078,208.45
Total Devengado:	7,304,492.52
% Costo Total Devengado:	55.85 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 55.85 %

**Perfil Económico 2019**

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	14,528,682.38	3,949,956.52	0.00	18,478,638.90
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	6,791,443.37	1,943,181.86	0.00	8,734,625.23
Ppto. Codificado	7,304,492.52	0.00	0.00	7,304,492.52
Ppto. Comprometido	3,027,653.34	0.00	0.00	3,027,653.34
Planeado - Codificado (2019)		3,949,956.52		
<b>Programado a Devengar</b>	7,356,338.81	0.00	0.00	7,356,338.81
Ppto. Devengado	7,304,492.52	0.00	0.00	7,304,492.52
Pagado Real	3,027,653.34	0.00	0.00	3,027,653.34
Estimado a fin de año	* 7,304,492.52	0.00	0.00	7,304,492.52
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	51,846.29	0.00	0.00	51,846.29
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 99.30 %	0.00 %	0.00 %	99.30 %
<b>Ppto. Codificado 998</b>	835,318.08	0.00	0.00	835,318.08
<b>Ppto. Devengado 998</b>	835,318.08	0.00	0.00	835,318.08

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019**

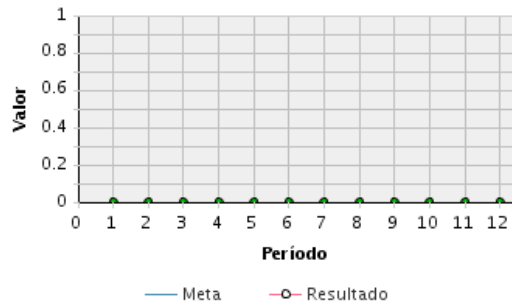

**Presupuesto Mensual 2019**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	100.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	0040 DEVENGADO MES DE NOVIEMBRE	DEVENGADO_2019-11.PDF	04/12/2019
2	0041 COSTO TOTAL DE PROYECTO	K037.docx	26/11/2019
3	0042 DEVENGADO MES DE OCTUBRE	DEVENGADO_2019-10.PDF	18/11/2019
4	0043 DEVENGADO MES DE SEPTIEMBRE	DEVENGADO_2019-09.PDF	18/11/2019
5	0044 DEVENGADO MES DE AGOSTO	DEVENGADO_2019-08.PDF	05/09/2019
6	0045 DEVENGADO MES DE JULIO	DEVENGADO_2019-07.pdf	05/09/2019
7	0046 DEVENGADO MES DE JUNIO	DEVENGADO_2019-06.pdf	05/09/2019
8	0047 DEVENGADO MES DE MAYO	DEVENGADO_2019-05.pdf	05/09/2019
9	0048 DEVENGADO MES DE ABRIL	DEVENGADO_2019-04.pdf	05/09/2019
10	0049 DEVENGADO MES DE MARZO	DEVENGADO__2019-03.pdf	05/09/2019
11	0050 DEVENGADO MES DE FEBRERO	DEVENGADO__2019-02.pdf	05/09/2019
12	A CONTRATO	contrato_aguarico1.pdf	09/12/2013
13	A.0040 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017	puente_sobre_el_rio_aguarico1.pdf	05/01/2018
14	A1 ACTA DE COMISION ESPECIAL DECRETO 451	A1_ACTA_DE_COMISION_ESPECIAL_451.pdf	15/04/2014
15	A2 PROGRAMACION PUENTE AGUARICO	A2_PROGRAMACION_PUENTE_AGUARICO.xlsx	15/04/2014
16	A4 EJECUCION PRESUPUESTARIA OCT 2014	A4_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_OCT_2014.pdf	10/11/2014
17	A5 AVANCE FISICO DE PROYECTO	A5_AVANCE_FISICO_DE_PROYECTO.doc	10/11/2014
18	A6 EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO 2014	A6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_JULIO_2014.pdf	12/12/2014
19	A6 INFORME SITOP	A6_INFORME_SITOP.pdf	12/12/2014
20	A7 INFORME EJECUTIVO SITOP DIC 2014 AGUARICO	A7_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_DIC_2014_AGUARICO_23.pdf	23/01/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
21	A8 INFORME EJECUTIVO SITOP AGUARICO1 ENERO 2015	A8_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AGUARICO1_ENERO_2015.pdf	01/02/2015
22	A9 PUENTE AGUARICO FEBRERO 2015	A9_PUENTE_AGUARICO_FEBRERO_2015.docx	12/03/2015
23	B1 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2015 PTE. AGUARICO 1	B1_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MARZO_2015_PTE_AGUARICO1.pdf	08/04/2015
24	B2 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2015	B2_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ABRIL_2015.pdf	09/06/2015
25	B3 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2015	B3_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAYO_2015.pdf	09/06/2015
26	B4 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2015	B4_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JUNIO_2015.pdf	04/09/2015
27	B5 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2015	B5_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JULIO_2015.pdf	04/09/2015
28	B6 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2015	B6_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AGOSTO_2015.pdf	04/09/2015
29	B7 ACTA DE COMISIÓN ESPECIAL DECRETO 451 N °3	ACTA_451_(ORDEN_DE_CAMBIO_N°3).pdf	23/09/2015
30	B8 ACTA DE COMISIÓN ESPECIAL DECRETO 451 N °6	ACTA_451_(ORDEN_DE_CAMBIO_N°6).pdf	23/09/2015
31	B9 ACTA DE COMISIÓN ESPECIAL DECRETO 451 N °6	ACTA_451_(ORDEN_DE_CAMBIO_N°6).pdf	23/09/2015
32	C1 ORDEN DE CAMBIO NRO. 3	ORDEN_DE_CAMBIO_NRO._3.pdf	30/09/2015
33	C2 ORDEN DE CAMBIO NRO. 6	ORDEN_DE_CAMBIO_NRO._6.pdf	30/09/2015
34	C3 ORDEN DE CAMBIO NRO. 8	ORDEN_DE_CAMBIO_NRO._8.pdf	30/09/2015
35	C4 INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2015	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPTIEMBRE_2015.pdf	13/10/2015
36	DEVENGADO MES DE NOVIEMBRE 2013	REPORTE_MES_DE_NOV_2013[1].pdf	10/12/2013
37	DICTAMEN DE PRIORIDAD	dictamen_de_prioridad_aguarico.pdf	23/09/2015

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Administrador			
	Supervisor			
	Fiscalización			
	Contratista			
	Líder de proyecto			
Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	Patrocinador Ejecutivo	Director	ccruz@mtop.gob.ec	023974600
Noroña, Víctor	Supervisor Financiero	Analista	vnorona@mtop.gob.ec	Ext. 13706
Solano Blacio, Wimper Vicente	Director Distrital Sucumbíos		salio@mtop.gob.ec	

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
72005_1.jpg	04/03/2016
