

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 7
Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Loja

PROYECTO: K008 MTOP.- Construcción de Obras Emergentes en la Red Vial Estatal de la Provincia de Loja Tramo Vial Olmedo Chaguarpamba Sector Km 15

Líder del Proyecto:	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina (bhurtado@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Bustamante Rivera, Esner Fidel	Programas Relacionados:	
Titular:	Ocampo Veintimilla, Danny Andrei	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.387851	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	27/05/2022 - 31/07/2023
Fecha de última actualización:	08/08/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2022
Modificado por:	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	Fecha del siguiente Hito:	20/08/2022


DATOS GENERALES

Descripción
La Red Vial Estatal E50, tramo Velacruz - Chaguarpamba de 31,50 km de longitud, ubicado en el cantón Olmedo provincia de Loja, es una arteria vial que une las provincias de El Oro con Loja y Zamora Chnchiye, la región costa y sierra y oriente del País, convirtiéndose así en el eje vial más importante para el desarrollo comercial, agrícola, ganadero y turístico de la región. Este tramo de vía se desarrolla en terreno montañoso con presencia de lluvias en la mayor parte del año, por lo que dada la geología de los suelos originan de manera inevitable la activación de fallas geológicas, inestabilidad de taludes, aludes, etc., ocasionando el daño o colapso de elementos viales como calzada, cunetas, alcantarillas, señalización, muros, etc.
Beneficios Cualitativos
Realizar las obras necesarias para recuperar el ancho de calzada, la estabilidad de la mesa de la vía y obras de drenaje en el sector afectado, obras que se ejecutarán en cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en las Especificaciones Generales para la Construcción de Puentes y Caminos MOP-001-F 2002 y el y el Acuerdo Ministerial No-066-2021.
Tipo de Beneficiario
Población Provincia de Loja: 448.966
Restricciones
Tiempo: El proyecto tendrá una duración de 1 mes (30 días) Costo: \$ 337.125,90 Sin IVA

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 22.51 %
 Fecha de Inicio: 27/05/2022 Fecha de Fin: 31/07/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

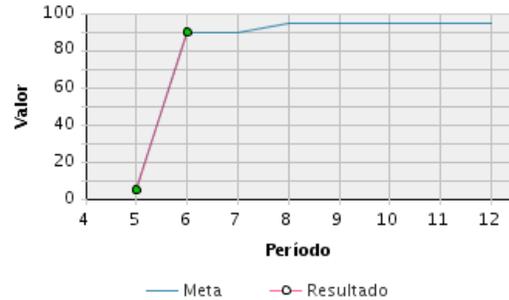

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
					5 %	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Avance real acumulado											
					5 %	90 %						
Estado												
					●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2022: SE CONCLUYERON LOS RUBROS DE MOVIMIENTOS DE TIERR. RUBROS OBRAS DE CALZADA.Y OBRAS DE ARTE. EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA ES DEL 100%.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/08/2022 - 03:53 PM
JUNIO 2022: SE SUSCRIBIO EL ACTA DE ENTREGA DE SITIO E INICIO DE TRABAJOS CON FECHA 21 DE JUNIO DE 2022. SE REALIZARON TRABAJOS DE: EXCAVACION EN SUELO CON MÁQUINA. REMOCION DEL HORMIGÓN, CORTE LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO. EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/08/2022 - 03:30 PM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > Loja > Chaguarpamba

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Dictamen de Prioridad para el proyecto	1-Solicitud de Información	27/05/2022		27/05/2022	●	Sí	5.0
2	DEFINICIÓN: Certificación de disponibilidad presupuestaria para el proyecto	1-Solicitud de Información	10/06/2022		10/06/2022	●	Sí	5.0
3	PLANIFICACIÓN: Pliegos aprobados	1-Solicitud de Información	15/06/2022		15/06/2022	●	Sí	2.5
4	PLANIFICACIÓN: Firma del Contrato	3-Adjudicación	20/06/2022		20/06/2022	●	Sí	5.0
5	PLANIFICACIÓN: Resolución de la Adjudicación	3-Adjudicación	20/06/2022		20/06/2022	●	Sí	2.5
6	EJECUCIÓN: Excavación en suelo con maquina, ejecutada	5-Entregables Intermedios	21/06/2022		21/06/2022	●	Sí	8.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
7	EJECUCIÓN: Impactos Ambientales, ejecutada	5-Entregables Intermedios	21/06/2022		21/06/2022		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Inicio de obra	5-Entregables Intermedios	21/06/2022		21/06/2022		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, ejecutada	5-Entregables Intermedios	21/06/2022		21/06/2022		Sí	15.0
10	EJECUCIÓN: Obras de arte, ejecutada	5-Entregables Intermedios	21/06/2022		21/06/2022		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Obras de calzada, ejecutada	5-Entregables Intermedios	21/06/2022		21/06/2022		Sí	3.0
12	EJECUCIÓN: Transporte de material de excavación (transporte libre 500 m)> 50 Km, ejecutada	5-Entregables Intermedios	21/06/2022		21/06/2022		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Transporte de material de mejoramiento > 50 Km, ejecutada	5-Entregables Intermedios	21/06/2022		21/06/2022		Sí	35.0
14	CIERRE: Liquidación económica finalizado.	9-Entregables Formales	20/08/2022	20/08/2022			No	2.0
15	CIERRE: Acta de Entrega Recepción Provisional suscrita	9-Entregables Formales	30/08/2022	30/08/2022			No	3.0
16	CIERRE: Acta de Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/02/2023	28/02/2023			No	2.0
17	CIERRE: Cierre de proyecto según Informe Formato SNP aprobado	9-Entregables Formales	30/03/2023	30/03/2023			No	1.0
18	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	29/04/2023	29/04/2023			No	1.0
19	COMPLETADO: Informe de Cierre de Proyectos (SENPLADES) aprobada.	9-Entregables Formales	29/04/2023	29/04/2023			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de transporte de material de mejoramiento		95.79 %	95	91	27/05/2022	Julio


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	377,581.01
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	377,581.01	0.00	377,581.01
Ppto. Comprometido	0.00	168,562.95	0.00	168,562.95
Planeado - Codificado (2022)		-377,581.01		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr							
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
19	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
149049_1.jpg	05/08/2022
