

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Producción de Obras Públicas

PROYECTO: K114 Fortalecimiento Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad

Líder del Proyecto:	Armijos Robles, Jessica Paola (jarmijos@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santamaría Loor, Kiura Ninoska	Programas Relacionados:	
Titular:	Prado Leverone, Juan Carlos	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	123200000.628.2513	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,797,346.27
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2024
Fecha de última actualización:	27/09/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2024
Modificado por:	Armijos Robles, Jessica Paola	Fecha del siguiente Hito:	28/10/2022

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: Contratación de estudios, fiscalización y construcción de obras de salud coejecutados en coordinación y con el financiamiento del Ministerio de Salud Pública.

PRODUCTO: Centros de salud tipo A, B y C.

LÍNEA BASE: Contratación de estudios, fiscalización y construcción de Centros de Salud Tipo A, B y C a nivel nacional.

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al mejoramiento del primer nivel del servicio de salud en el componente de infraestructura.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Financiar la contratación de estudios, fiscalización y construcción de centros de salud tipo A, B y C.

Beneficios Cualitativos

Este proyecto contribuye a solucionar el problema a nivel nacional respecto a la falta de infraestructura de salud a nivel nacional, además de asegurar el acceso de la población a los servicios de salud.

Tipo de Beneficiario

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7.094.001

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 11.659.539

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tiene una duración de 12 años.

COSTO: Presupuesto límite transferido por el Ministerio de Salud Pública.


ALCANCE: Contratar las obras de infraestructura de salud y ejecutar sus etapas precontractual, contractual y de administración de cada contrato tanto de obra, fiscalización y demás servicios relacionados, en cumplimiento de la normas vigentes.

RECURSOS: Humanos y materiales.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 82.71 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

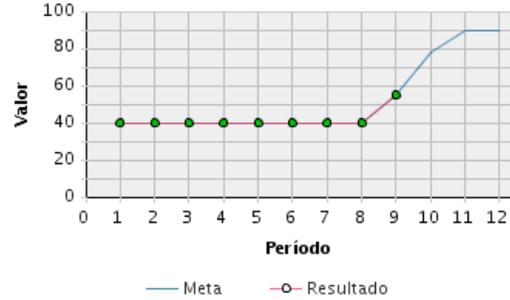

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	55 %	78 %	90 %	90 %
	Avance real acumulado											
	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	55 %			
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2022:</p> <p>1.- Este proyecto de inversión tiene como ejecutor y entidad requirente al Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO) actúa exclusivamente como co-ejecutor, una vez que se realiza la transferencia de recursos por parte del MSP (conforme convenio interinstitucional). Además, el MTO actúa como co-ejecutor a partir de la supresión del Servicio de Contratación de Obras (SECOB) a través del D.E. 1063 de 19 de mayo de 2020.</p> <p>2.- La presente ficha denominada "K114 Fortalecimiento Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad" fue creada por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica conforme con lo señalado en el memorando Nro. MTO-CGPGE-2022-1040-ME de 02 de septiembre de 2022; en virtud de lo cual, no hay registros de valores devengados de años previos.</p> <p>3.- A través del oficio Nro. MTO-CGPGE-22-202-OF de 06 de septiembre de 2022, el Mgs. Carlos Javier Becerra Albuja en calidad de Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, solicitó al Ministerio de Salud Pública, la autorización para utilizar y disponer libremente de un valor de USD. 2.559.310,34 de los recursos entregados del proyecto Fortalecimiento red de servicios de salud y mejoramiento de la calidad con CUP 123200000.628.2513, en necesidades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.</p> <p>4.- El bajo porcentaje en el costo total devengado se debe a que varias Subsecretarías de Transporte y Obras Públicas Zonales han puesto el recurso a libre disponibilidad por diversos motivos, entre ellos, la falta de documentación habilitante para el pago de planillas de liquidación con terminaciones unilaterales realizadas y suscritas por el Ex SECOB.</p> <p>5.- A través del memorando Nro. MTO-SOP-2022-1286-ME de 21 de septiembre de 2022, Ing. Kiura Ninoska Santamaria Loo, Subsecretaria de Obras Públicas, solicitó al Sr. Mgs. Carlos Javier Becerra Albuja en calidad de Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, se realice la capacitación en el uso del sistema GPR a los nuevos líderes de proyecto, señalando lo siguiente: "se realiza una insistencia para que se realice la capacitación pertinente y oportuna, así como, el acompañamiento en el manejo de la herramienta de Gobierno por Resultados - GPR para el correcto registro de información"; así mismo, se solicitó que se entregue el Dictamen de Prioridad emitido por la Secretaría Nacional de Planificación, el documento del Proyecto, la Cédula Presupuestaria y la Matriz de Marco Lógico por cada proyecto de inversión asignado; sin embargo, en el presente periodo sólo se proporcionó las cédulas presupuestarias.</p> <p>6.- La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica realizó la capacitación a los líderes de proyecto el 22 de septiembre de 2022 conforme Acta de asistencia adjunta, en la cual se emitieron algunos lineamientos bajo los cuales se procedió a completar la información en la presente ficha denominada "K114 Fortalecimiento Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad".</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	27/09/2022 - 08:56 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
7.- A través del memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0592-ME de 26 de septiembre de 2022, se solicitó la información correspondiente a los contratos de estudios y fiscalización pertenecientes al referido proyecto de inversión, con la finalidad de recopilar la mayor cantidad de información que permita registrar el avance real del proyecto de inversión y registrarlo mediante los hitos, los mismos que podrían variar de acuerdo con la información que proporcione cada una de las áreas.		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Cierre económico de los contratos pertenecientes al proyecto de inversión.	23/09/2022	Juan Carlos Prado Leverone	70	60	42	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Técnico. La falta de documentación de las planillas de liquidación CAUSARÍAN retraso en el cierre del proyecto de inversión y pérdida de los recursos asignados por el Ministerio de Salud Pública.	23/09/2022	Juan Carlos Prado Leverone	10 %	10	1	0/1
2- NACIONAL. Económico. Limitada asignación de recursos por parte de las Entidades Requirentes CAUSARÍA el retraso en los procesos de ejecución y entrega de obras de infraestructura pública.	23/09/2022	Jessica Paola Armijos Robles	10 %	10	1	1/2

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Internacional - Exterior > America Latina y el Caribe > Embajada / Consulado
2	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
3	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Riobamba
4	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Chone
5	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta
6	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Tosagua

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 DEFINICIÓN: Convenio interinstitucional suscrito.	1-Solicitud de Información	02/01/2012		02/01/2012		Sí	10.0
2 PLANEACIÓN: Recursos presupuestarios asignados.	1-Solicitud de Información	02/01/2012		02/01/2012		Sí	10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	EJECUCIÓN: Contrato No. REOC-SECOB-002-2018 suscrito.	4-Inicio de Trabajo	06/09/2018		06/09/2018		Sí	20.0
4	EJECUCIÓN: Solicitud de información realizada.	5-Entregables Intermedios	26/09/2022		26/09/2022		Sí	15.0
5	EJECUCIÓN: Recopilación de información realizada.	5-Entregables Intermedios	28/10/2022	28/10/2022			No	15.0
6	EJECUCIÓN: Contratos de obra suscritos.	5-Entregables Intermedios	30/10/2022	30/10/2022			No	8.0
7	EJECUCIÓN: Contratos de estudios suscritos.	5-Entregables Intermedios	30/11/2022	30/11/2022			No	4.0
8	EJECUCIÓN: Contratos de fiscalización suscritos.	5-Entregables Intermedios	30/11/2022	30/11/2022			No	8.0
9	CIERRE: Actas de entrega recepción provisional de los contratos de obra suscritas.	9-Entregables Formales	02/01/2023	02/01/2023			No	4.0
10	CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva de los contratos de obra, fiscalización y estudios suscritas.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2023	30/06/2023			No	2.0
11	CIERRE: Terminaciones anticipadas unilaterales y de mutuo acuerdo suscritas	9-Entregables Formales	30/06/2023	30/06/2023			No	2.0
12	CIERRE: Informe de cierre del proyecto de inversión suscrito.	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de informes de monitoreo y control de los procesos de ejecución de contratos de obras públicas conforme las cláusulas contractuales.		-	-	-	01/10/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,797,346.27 **
Costo Total:	6,797,346.27
Total Devengado:	3,052,415.72
% Costo Total Devengado:	44.91 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 44.91 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	6,797,346.27	0.00	6,797,346.27
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	6,797,346.27	0.00	6,797,346.27
Ppto. Codificado	0.00	6,797,346.27	0.00	6,797,346.27
Ppto. Comprometido	0.00	2,139,951.42	0.00	2,139,951.42
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	6,797,346.27	0.00	6,797,346.27
Ppto. Devengado	0.00	3,052,415.72	0.00	3,052,415.72
Pagado Real	0.00	2,139,951.42	0.00	2,139,951.42
Estimado a fin de año	* 0.00	3,744,930.55	0.00	3,744,930.55
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	3,052,415.72	0.00	3,052,415.72
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	44.91 %	0.00 %	44.91 %
Ppto. Codificado 998	0.00	1,794,836.31	0.00	1,794,836.31
Ppto. Devengado 998	0.00	1,794,836.31	0.00	1,794,836.31

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	938,122.80	659,402.22	938,122.80	659,402.22	70.29 %		9.70 %
Jul	3,627,087.60	253,062.08	4,565,210.40	912,464.30	19.99 %		13.42 %
Ago	1,277,403.78	2,139,951.42	5,842,614.18	3,052,415.72	52.24 %		44.91 %
Sep	154,938.73		5,997,552.91				
Oct	758,221.76		6,755,774.67				
Nov	41,571.60		6,797,346.27				
Dic	0.00		6,797,346.27				
Total	6,797,346.27	3,052,415.72					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar procesos de ejecución y entrega de obras de infraestructura pública a nivel nacional, MEDIANTE el desarrollo de herramientas de supervisión y control de proyectos de conformidad con la normativa legal vigente aplicable a los procesos de contratación de obra pública.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 1 - Convenio interinstitucional suscrito	convenio_interinstitucional_ico_ministerio_de_salud.pdf	08/09/2022
2	A.2 - Hito 2 - Recursos presupuestarios asignados.	oficio_nro__snp-spn-2022-0548-of_dictamen0211817001650991781.pdf	08/09/2022
3	A.3 - Hito 3 - Contrato No. REOC-SECOB-002-2018 suscrito.	Contrato_de_obra.pdf	08/09/2022
4	A.4 - Anexo 1 - Memorando Nro. MTOP-CGPGE-2022-1040-ME	mtop-cgpge-2022-1040-me0542469001662496868(1).pdf	26/09/2022
5	A.5 - Anexo 2 - Oficio Nro. MTOP-CGPGE-22-202-OF	MTOP-CGPGE-22-202-OF.pdf	08/09/2022
6	A.6 - Anexo 3 - Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1286-ME	MTOP-SOP-2022-1286-ME.pdf	26/09/2022
7	A.7 - Anexo 4 - Acta de asistencia a capacitación y lineamientos GPR.	Acta_de_asistencia_a_la_capacitación.pdf	26/09/2022
8	A.8 - Anexo 5 - Cédulas presupuestarias	Cédulas_presupuestarias.rar	13/09/2022
9	A.9 - Anexo 6 - Respaldos libre disponibilidad de recursos	Libre_disponibilidad.rar	26/09/2022
10	B.1 - Hito 4 - Solicitud de información realizada.	MTOP-DNPOP-2022-0592-ME.pdf	27/09/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Armijos Robles, Jessica Paola	Líder del proyecto	Analista de Construcciones	jarmijos@mtop.gob.ec	
Prado Leverone, Juan Carlos	Titular	Director Nacional de Producción de Obras Públicas	jprado@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
150610_1.jpg	08/09/2022
