

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Delegaciones de los Servicios del Transporte y Obras Públicas
Dirección Nacional de Administración de Delegaciones

PROYECTO: K004 MTOP.-Intervención de Obras Emergentes Corredor Delegado Naranjal - Tenguel

Líder del Proyecto:	Villavicencio Mafla, Soraya Elizabeth (sevillavicencio@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cañizares Jaramillo, Ana Katherin	Programas Relacionados:	
Titular:	Villavicencio Mafla, Soraya Elizabeth	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.387638.	TIR:	48.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	23,415,345.80
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,726,885.65
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/12/2022 - 31/12/2023
Fecha de última actualización:	29/12/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2023
Modificado por:	Villavicencio Mafla, Soraya Elizabeth	Fecha del siguiente Hito:	20/12/2022

DATOS GENERALES

Descripción

Se orienta a rehabilitar de manera emergente el corredor vial naranjal - Tenguel que fue afectado por el fuerte temporal invernal de inicios del año 2022, mediante la construcción del Puente Gala, Puente Chico, control de taludes en la estación de peaje Jaime Roldós Aguilera y la reparación de alcantarillas.

Beneficios Cualitativos

Se considera como beneficiarios indirectos a los habitantes de las provincias de Guayas y el Oro, esta población para el año 2020 fue de 4.403.580 habitantes.

Y se considera como beneficiarios directos a la población que utiliza el tramo vial, obtenida a partir del TPDA, y que es de 45.968 usuarios.

Tipo de Beneficiario

Son principalmente conductores de vehículos de pasajeros, carga pesada, considerando que la vía integra con los puertos orientados a las exportaciones, así como también comerciantes. También son beneficiarios, los vinculados a actividades de turismo, y en general toda la ciudadanía.

Restricciones

TIEMPO: 24 MESES

COSTO: US \$ 5.294.111,94


RECURSOS: Económicos, materiales, humanos.

ALCANCE: Intervención en los puentes sobre los ríos Gala y Chico, estabilización de taludes en la Estación de Peaje Jaime Roldós Aguilera, y reparación de alcantarillas.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Trascurrido: 8.33 %
 Fecha de Inicio: 01/12/2022 Fecha de Fin: 31/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

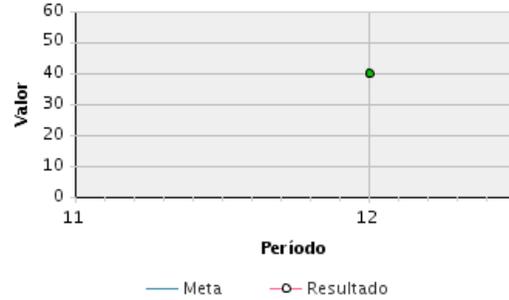

Porcentaje de Avance													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2022	Avance programado acumulado												
													50 %
	Avance real acumulado												
													40 %
Estado													
												●	

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2022</p> <p>Asociación Hito 1. Se dispone del proeycto en modelo SNP Asociación Hito 2. Proyecto en la herramienta SIPeIP postulado Asociación Hito 3. Mediante el Oficio SNP-SMP-SGP-2022-0054 , la Secretaría Nacional de Planificación emite el dictamen de prioridad para el proyecto. Asociación Hito 4. Mediante el Oficio SNP-SGP-SPN-2022-1131-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emite pronunciamiento favorable para la inclusión del proyecto al PAI 2022 Asociación Hito 5. Mediante el Oficio MEF-SP-2022-0661, el Ministerio de Economía y Finanzas, indican la disponibilidad de recursos para el proyecto Asociación Hito 6. Entre el MTOP y la Empresa Concesionaria INTERVIAS, suscriben la ordnden de trabajo Nro. 1 para la ejecución de las obras emergentes del tramo Naranjal - Tenguel. Asociación Hito 7. Mediante el Oficio MTOP-SDSTOP-22-1110-OF, se comunica a la Empresa Intervías la entrega del anticipo Asociación Hito 8.</p>	Villavicencio Mafía, Soraya Elizabeth	28/12/2022 - 09:03 PM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida:	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SNP elaborado	9-Entregables Formales	01/12/2022		01/12/2022	●	Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	9-Entregables Formales	01/12/2022		01/12/2022	●	Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SNP emitida	9-Entregables Formales	02/12/2022		02/12/2022	●	Sí	7.0
4	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	9-Entregables Formales	05/12/2022		05/12/2022	●	Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	9-Entregables Formales	06/12/2022		06/12/2022		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN: Suscripción del contrato	9-Entregables Formales	07/12/2022		07/12/2022		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Entrega del anticipo	9-Entregables Formales	08/12/2022		08/12/2022		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Planilla de avance 1 de obras, aprobada	9-Entregables Formales	20/12/2022	20/12/2022			No	10.0
9	EJECUCIÓN: Planilla de avance 2 de obras, aprobada	9-Entregables Formales	01/01/2023	31/01/2023			No	10.0
10	EJECUCIÓN: Planilla de avance 3 de obras, aprobada	9-Entregables Formales	01/02/2023	28/02/2023			No	10.0
11	EJECUCIÓN: Planilla de avance 4 de obras, aprobada	9-Entregables Formales	01/03/2023	31/03/2023			No	10.0
12	EJECUCIÓN: Planilla de avance 5 de obras, aprobada	9-Entregables Formales	01/04/2023	30/04/2023			No	10.0
13	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	9-Entregables Formales	01/05/2023	31/05/2023			No	1.0
14	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	9-Entregables Formales	01/05/2023	31/05/2023			No	1.0
15	CIERRE: Cierre de proyecto según Informe Formato SNP aprobado	9-Entregables Formales	01/05/2023	31/05/2023			No	1.0
16	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	9-Entregables Formales	01/05/2023	31/05/2023			No	1.0
17	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	9-Entregables Formales	01/05/2023	31/05/2023			No	1.0
18	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	31/05/2023	31/05/2023			No	1.0
19	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno suscrita	9-Entregables Formales	31/05/2023	31/05/2023			No	1.0
20	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	31/05/2023	31/05/2023			No	1.5
21	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/05/2023	31/05/2023			No	1.5

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,308,819.96
Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,726,885.65 **
Costo Total:	5,294,111.93
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	4,726,885.65	0.00	4,726,885.65
Ppto. Externo Planeado	0.00	4,726,885.65	0.00	4,726,885.65
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	4,726,885.65	0.00	4,726,885.65
Ppto. Codificado	0.00	4,726,885.65	0.00	4,726,885.65
Ppto. Comprometido	0.00	4,220,433.62	0.00	4,220,433.62
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	4,726,885.65	0.00	4,726,885.65
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	2,193,336.33	0.00	2,193,336.33
Estimado a fin de año	* 0.00	2,193,336.33	0.00	2,193,336.33
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	2,533,549.32	0.00	2,533,549.32
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic	4,726,885.65		4,726,885.65				
Total	4,726,885.65						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar la eficiencia y eficacia en la supervisión y control de las vías delegadas MEDIANTE la verificación del cumplimiento de las disposiciones contractuales.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. HITO 1. Documento modelo SNP	PROYECTO_INTERVENCION_EMERGENTE_NARANJAL_TENGUEL(30.06.22).docx	28/12/2022
2	A2. HITO 2 Proyecto SIPelp postulado	PROYECTO_387638_POSTULACIÓN_SNP.pdf	28/12/2022
3	A3.Hito 3. Priorización del proyecto por parte de la SNP	SNP-SNP-SGP-2022-0054._DICTAMEN_NARANJAL-TENGUEL.pdf	28/12/2022
4	A4. HITO 4. Inclusión del proyecto en el PAI 2022	SNP-SGP-SPN-2022-1131-OF_INCLUSIÓN_NARANJAL_TENGUEL.pdf	28/12/2022
5	A5. Hito 5. Proyecto con recursos asignados	Oficio_Nro._MEF-SP-2022-0611.pdf	28/12/2022
6	A6. Hito 6. Contrato suscrito	ORDEN_DE_TRABAJO_No_1_PUENTE_GALA_Y_CHICO	28/12/2022
7	A7. Hito 7. Anticipo entregado	MTOP-SDSTOP-22-1110-OF_NOTIFICACIÓN_ANTICIPO_NARANAJL_TENGUEL.pdf	28/12/2022
8	A8. Planilla de avance de obra 1 aprobada	MTOP-SDSTOP-22-1110-OF_NOTIFICACIÓN_ANTICIPO_NARANAJL_TENGUEL.pdf	28/12/2022
9	A9. Cédula presupuestaria diciembre 2022	387638._Naranjal_-_Tenguel_al_27.12.2022.pdf	28/12/2022
