

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 6
Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Cañar

PROYECTO: K007 MTOP.- Obras Emergentes de protección en el tramo comprendido entre las abscisas referenciales 14+050 Y 0+000 del cruce El Río Burgay en Azogues del Tramo: San Jose - Chiturco, Provincia del Cañar

Líder del Proyecto:	Dután Sanango, Italo Medardo (imdutan@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Barsallo Chavez, Luis Mario	Programas Relacionados:	
Titular:	Barsallo Chavez, Luis Mario	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.388283	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	21/04/2022 - 30/05/2024
Fecha de última actualización:	05/01/2023	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Castro Vásquez, Luis Alberto	Fecha del siguiente Hito:	01/03/2023

DATOS GENERALES

Descripción

En cumplimiento de los objetivos del Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a través de la Zonal 6-MTOP, con el propósito de proteger y mitigar los daños ocasionados en infraestructura pública y privada, en el cantón Azogues por la crecida del Río Burgay en el tramo comprendido entre San José y Chiturco ocurrida el 20 de abril del presente situación que propició la declaratoria de EMERGENCIA DEL TRAMO COMPRENDIDODESDE EL KM 14+050 HASTA KM 0+000 Del eje del Río Burgay en su curso por el cantón Azogues.

Mediante resolución No. 098-AA-2022, de fecha 21 de abril de 2022, la máxima autoridad de la I. Municipalidad del cantón Azogues, resuelve en 6 artículos la necesidad de realizar trabajos de OBRAS EMERGENTES DE PROTECCIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS REFER 14+050 y 0+000 DEL CAUCE DEL RÍO BURGAY EN AZOGUES DEL TRAMO: SAN JOSÉ-CHITURCO, PROVINCIA DEL CAÑAR, que están enfocados a realizar la construcción de barreras de protección y sus taludes, así como medidas de bioingeniería encaminadas a la estabilidad de las márgenes.

Objetivo General

"GESTIONAR OBRAS EMERGENTES DE PROTECCIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS REFERENCIALES 14+050 y 0+000 DEL CAUCE DEL RÍO BURGAY EN AZOGUES, DEL TRAMO: SAN JOSÉ-CHITURCO, PROVINCIA DEL CAÑAR".

Objetivos Específicos

Realizar la construcción de protecciones emergentes a lo largo del cauce del río Burgay.

Beneficios Cualitativos

Lograr la protección y restauración integral del río. así como la reinserción de especies de plantas que aportan estabilidad a las márgenes, contribuyendo a la recuperación ecológica del cauce.
 Mejorar la calidad de vida de la población. incremento de comercio en la zona.

Tipo de Beneficiario

Población regional

Restricciones

Tiempo: El plazo es de once (11) meses, contados a partir de la asignación de recursos económicos a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues realizada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mismo que podrá ser ampliado previa la presentación de Informe Técnico que así lo justifique, siempre y cuando no se desnaturalice el objeto del presente convenio.


Costo: USD \$ 1.405.410,79 (Un millón cuatrocientos cinco mil cuatrocientos diez con 79/100 dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA

Alcance: Estas obras tienen la finalidad de proteger las márgenes de la acción del flujo durante las crecidas como también, contribuir a la dinámica del río para devolver el espacio perdido al cauce en los puntos donde se han invadido las llanuras de inundación.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	-------------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 33.59 %
 Fecha de Inicio: 21/04/2022 Fecha de Fin: 30/05/2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

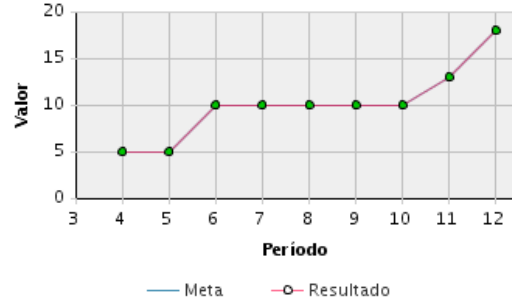

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
				5 %	5 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	13 %	18 %
	Avance real acumulado											
				5 %	5 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	13 %	18 %
	Estado											
				●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2022 El 19 de diciembre de 2022, la Dirección DISTRITAL 03D01_AZOGUES_BIBLIAN_DELEG_CANAR_MTOP realiza la transferencia de recursos del AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON AZOGUES para el Proyecto.	Dután Sanango, Italo Medardo	04/01/2023 - 03:38 PM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Cañar > Azogues


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Convenio Macro a ser firmado	9-Entregables Formales	21/04/2022		21/04/2022	●	Sí	5.0
2	DEFINICIÓN: Declaratoria de emergencia firmada	9-Entregables Formales	20/06/2022		20/06/2022	●	Sí	5.0
3	PLANEACION: Dictamen de Prioridad aprobado.	9-Entregables Formales	30/11/2022		30/11/2022	●	Sí	3.0
4	PLANEACION: Dictamen favorable aprobado.	9-Entregables Formales	02/12/2022		02/12/2022	●	Sí	2.0
5	PLANEACION: Convenio Específico firmado	9-Entregables Formales	14/12/2022		14/12/2022	●	Sí	3.0
6	PLANEACION: Firma del contrato realizada.	9-Entregables Formales	01/03/2023	01/03/2023		●	No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
7	EJECUCION: Desbroce y limpieza de terreno realizado.	4-Inicio de Trabajo	05/03/2023	05/03/2023			No	5.0
8	EJECUCION: Replanteo y Nivelación realizado.	5-Entregables Intermedios	10/03/2023	10/03/2023			No	5.0
9	EJECUCION: Excavación mecánica con excavadora de oruga realizado.	5-Entregables Intermedios	15/03/2023	15/03/2023			No	5.0
10	EJECUCION: Suministro y colocación de geotextil realizado.	5-Entregables Intermedios	20/03/2023	20/03/2023			No	5.0
11	EJECUCION: Colocación de piedra escollera realizado.	5-Entregables Intermedios	25/03/2023	25/03/2023			No	5.0
12	EJECUCION: Suministro y cargado de piedra escollera realizado	5-Entregables Intermedios	28/03/2023	28/03/2023			No	5.0
13	EJECUCION: Transporte de material (Roca diametro < 1 m.) realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023	31/03/2023			No	5.0
14	EJECUCION: Conformación de Taludes realizado.	5-Entregables Intermedios	01/04/2023	01/04/2023			No	5.0
15	EJECUCION: Relleno compactado realizado.	5-Entregables Intermedios	15/04/2023	15/04/2023			No	5.0
16	EJECUCION: Sum y colocación de tierra vegetal realizado.	5-Entregables Intermedios	17/04/2023	17/04/2023			No	5.0
17	EJECUCION: Sum y colocación de césped natural realizado.	5-Entregables Intermedios	20/04/2023	20/04/2023			No	5.0
18	EJECUCION: Sum y siembra de plantas forestales realizado.	5-Entregables Intermedios	25/04/2023	25/04/2023			No	5.0
19	EJECUCION: Sum y siembra de plantas arbustivas realizado.	5-Entregables Intermedios	26/04/2023	26/04/2023			No	5.0
20	EJECUCION: Sum y construcción de muro gaviones realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2023	30/04/2023			No	5.0
21	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional firmada.	9-Entregables Formales	20/05/2023	20/05/2023			No	2.0
22	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2023	30/11/2023			No	3.0
23	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	30/12/2023	30/12/2023			No	1.0
24	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	31/03/2024	31/03/2024			No	1.0
25	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendietes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	10/04/2024	10/04/2024			No	1.0
26	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	15/04/2024	10/04/2024			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	Cierre: Finalización del convenio	9-Entregables Formales	30/05/2024	30/05/2024			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
----	---
