

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 5
Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Los Ríos

PROYECTO: K011 MTOP - Construcción del Puente sobre el Río Quevedo de 154 de Longitud ubicado en la calle Séptima y Camilo Arévalo, Provincia de Los Ríos.

Líder del Proyecto:	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes (vquezada@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO, UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO AREVALO, Provincia - Los Ríos
Titular:	Alegría Bazante, Karen Kristhel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3656	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,145,537.55
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/12/2008 - 31/12/2023
Fecha de última actualización:	02/05/2023	Fecha de Fin Base:	15/09/2012
Modificado por:	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	Fecha del siguiente Hito:	01/12/2023

DATOS GENERALES

Descripción

Construcción del Puente sobre el Río Quevedo de 154 de Longitud ubicado en la calle Séptima y Camilo Arévalo, Provincia de Los Ríos.

Contratista: CONSORCIO ECUATORIANO DE PUENTES
 Fiscalizador: QUEZADA CABRERA VICENTE HERMÓGENES

Beneficios Cualitativos

Disminuye en 20 minutos el tiempo de cruce entre San Camilo y Quevedo, se evita también la contaminación ambiental, en la ciudad de Quevedo debido al intenso tráfico en el casco urbano de la ciudad de Quevedo.

Tipo de Beneficiario

Toda la ciudad de Quevedo.


Restricciones

Tiempo: Se debe de cumplir con los plazos establecidos según contrato.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 95.57 %
 Fecha de Inicio: 05/12/2008 Fecha de Fin: 31/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO A ABRIL 2023: Con Memorando Nro. MTOP-DDR-2023-141-ME del 30 de enero del 2023 la Directora Distrital MTOP-LOS RIOS, envía al Subsecretario Zonal 5 la documentación pertinente, solicitando dictamen de arrastre del presente proyecto. Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2023-244-ME del 30 de enero del 2023 el Subsecretario Zonal 5 envía al señor Viceministro dicha documentación solicitando el trámite respectivo. Con Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0084-O del 10 de marzo del 2023, la Msg. Vannessa Alicia Centeno Vasco, informa al Señor Ministro la emisión del dictamen de arrastre para el proyecto en referencia. Con Memorando Nro. MTOP-FINAN_RIO-2023-59-ME, del 5 de abril del 2023, la Lic. Gabriela Alvarado Hidalgo, Servidor Público de Apoyo 3, informa a la Directora Distrital la aprobación de la reforma presupuestaria por el valor de \$ 320.927,72 por parte del Ministerio de Finanzas, para su cancelación respectiva. Se anexa el comprobante de pago y cédula presupuestaria correspondientes.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/05/2023 - 09:28 AM
<p>ENERO A DICIEMBRE 2022: SE REALIZA LOS TRÁMITES RESPECTIVOS PARA QUE REALICEN LA DESIGNACIÓN DE RECURSOS PARA CANCELACIÓN DE LA PLANILLA FINAL POR \$ 320.927,72 .</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/05/2023 - 09:27 AM
<p>ENERO A DICIEMBRE 2021: SE REALIZA LOS TRÁMITES RESPECTIVOS PARA QUE REALICEN LA DESIGNACIÓN DE RECURSOS PARA CANCELACIÓN DE LA PLANILLA FINAL POR \$ 320.927,72 .</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/05/2023 - 09:27 AM
<p>DICIEMBRE 2020: SE REALIZA LOS TRÁMITES RESPECTIVOS PARA QUE REALICEN LA DESIGNACIÓN DE RECURSOS PARA CANCELACIÓN DE LA PLANILLA FINAL POR \$ 320.927,72 .</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/05/2023 - 09:23 AM
<p>NOVIEMBRE 2020:</p> <p>1.- Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-670-ME de fecha 12 de mayo de 2020 suscrito por la COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA autorizó el cambio a fase congelado. 2.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2020-710-ME de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el SUBSECRETARIO ZONAL 5, solicitó el cambio a fase congelado. 3.- Con Memorando Nro. MTOP-DDR-2020-477-ME de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE LOS RIOS solicitó el cambio a fase congelado 4.- Con Memorando Nro. MTOP-CON_RIO-2020-168-ME de fecha 07 de mayo de 2020 suscrito por el lider del proyecto solicitó el cambio a fase congelado</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	03/12/2020 - 03:16 PM
<p>OCTUBRE 2020:</p> <p>1.- Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-670-ME de fecha 12 de mayo de 2020 suscrito por la COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA autorizó el cambio a fase congelado. 2.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2020-710-ME de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el SUBSECRETARIO ZONAL 5, solicitó el cambio a fase congelado. 3.- Con Memorando Nro. MTOP-DDR-2020-477-ME de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE LOS RIOS solicitó el cambio a fase congelado 4.- Con Memorando Nro. MTOP-CON_RIO-2020-168-ME de fecha 07 de mayo de 2020 suscrito por el lider del proyecto solicitó el cambio a fase congelado</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	05/11/2020 - 04:52 PM
<p>SEPTIEMBRE 2020:</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	01/10/2020 - 01:09 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.- Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-670-ME de fecha 12 de mayo de 2020 suscrito por la COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA autorizó el cambio a fase congelado.</p> <p>2.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2020-710-ME de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el SUBSECRETARIO ZONAL 5, solicitó el cambio a fase congelado.</p> <p>3.- Con Memorando Nro. MTOP-DDR-2020-477-ME de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE LOS RIOS solicitó el cambio a fase congelado</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-CON_RIO-2020-168-ME de fecha 07 de mayo de 2020 suscrito por el lider del proyecto solicitó el cambio a fase congelado</p>		
<p>AGOSTO 2020:</p> <p>1.- Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-670-ME de fecha 12 de mayo de 2020 suscrito por la COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA autorizó el cambio a fase congelado.</p> <p>2.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2020-710-ME de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el SUBSECRETARIO ZONAL 5, solicitó el cambio a fase congelado.</p> <p>3.- Con Memorando Nro. MTOP-DDR-2020-477-ME de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE LOS RIOS solicitó el cambio a fase congelado</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-CON_RIO-2020-168-ME de fecha 07 de mayo de 2020 suscrito por el lider del proyecto solicitó el cambio a fase congelado</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	04/09/2020 - 08:46 AM
<p>JULIO 2020:</p> <p>1.- Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-670-ME de fecha 12 de mayo de 2020 suscrito por la COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA autorizó el cambio a fase congelado.</p> <p>2.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2020-710-ME de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el SUBSECRETARIO ZONAL 5, solicitó el cambio a fase congelado.</p> <p>3.- Con Memorando Nro. MTOP-DDR-2020-477-ME de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE LOS RIOS solicitó el cambio a fase congelado</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-CON_RIO-2020-168-ME de fecha 07 de mayo de 2020 suscrito por el lider del proyecto solicitó el cambio a fase congelado</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/08/2020 - 11:45 AM
<p>JUNIO 2020:</p> <p>1.- Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-670-ME de fecha 12 de mayo de 2020 suscrito por la COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA autorizó el cambio a fase congelado.</p> <p>2.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2020-710-ME de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el SUBSECRETARIO ZONAL 5, solicitó el cambio a fase congelado.</p> <p>3.- Con Memorando Nro. MTOP-DDR-2020-477-ME de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE LOS RIOS solicitó el cambio a fase congelado</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-CON_RIO-2020-168-ME de fecha 07 de mayo de 2020 suscrito por el lider del proyecto solicitó el cambio a fase congelado</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	01/07/2020 - 07:37 PM
<p>MAYO 2020:</p> <p>1.- Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-670-ME de fecha 12 de mayo de 2020 suscrito por la COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA autorizó el cambio a fase congelado.</p> <p>2.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2020-710-ME de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el SUBSECRETARIO ZONAL 5, solicitó el cambio a fase congelado.</p> <p>3.- Con Memorando Nro. MTOP-DDR-2020-477-ME de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE LOS RIOS solicitó el cambio a fase congelado</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-CON_RIO-2020-168-ME de fecha 07 de mayo de 2020 suscrito por el lider del proyecto solicitó el cambio a fase congelado</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	04/06/2020 - 05:02 PM
<p>MAYO-2020</p> <p>En espera que el MTOP cancele la planilla de trabajos adicionales por el valor de \$ 286.542,61 + IVA, para proceder con el cierre del presente contrato, se informa que actualmente la obra se encuentra en servicio al usuario en forma normal.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	03/05/2020 - 07:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL-2020</p> <p>En espera que el MTOP cancele la planilla de trabajos adicionales por el valor de \$ 286.542,61 + IVA, para proceder con el cierre del presente contrato.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	01/05/2020 - 11:14 AM
<p>ABRIL-2020</p> <p>En espera que el MTOP cancele la planilla de trabajos adicionales por el valor de \$ 286.542,61 + IVA, para proceder con el cierre del presente contrato.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	03/04/2020 - 11:26 AM
<p>MARZO-2020</p> <p>Se procura que el MTOP cancele la planilla de trabajos adicionales por el valor de \$ 286.542,61 + IVA, para proceder con el cierre del presente contrato.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	01/04/2020 - 11:55 AM
<p>MARZO-2020</p> <p>Se procura que el MTOP cancele la planilla de trabajos adicionales por el valor de \$ 286.542,61 + IVA, para proceder con el cierre del presente contrato.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	03/03/2020 - 02:33 PM
<p>ENERO2020:</p> <p>El Líder del proyecto mediante Memorando Nro. MTOP-CON_RIO-2020-63-ME de fecha 31 de enero de 2020 comunica al Director Distrital de Los Ríos que es necesario la gestión de ampliar la fecha de fin para el año 2020, Director Distrital comunica al Subsecretario Regional 5 que solicite gestionar en el sistema GPR la apertura de las fichas del proyecto para actualizar la "Fecha de Fin" correspondiente al año 2020, a su vez solicita a la Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2020-184-ME de fecha 03 de febrero de 2020, la apertura de las fichas del proyecto para actualizar la "Fecha de Fin" correspondiente al año 2020; la Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-131-ME de fecha 04 de febrero de 2020 autoriza el cambio de "Fecha de Fin" del proyecto "K011 MTOP - Construcción del Puente sobre el Río Quevedo de 154 de Longitud ubicado en la calle Séptima y Camilo Arévalo, Provincia de Los Ríos", por cuanto éste se encuentra actualmente en fase "Cierre" y si bien no consta en el PAI 2020 "...falta de cancelar planilla de trabajos adicionales".</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	05/02/2020 - 04:52 PM
<p>ENERO2020:</p> <p>Se continúa en espera que el MTOP asigne los recursos para la cancelación al contratista, de la planilla de trabajos adicionales por el valor de \$ 286.542,61 + IVA, actualmente el trámite se encuentra en el Despacho del Señor Viceministro, la supervisión procura el cierre del contrato en el presente año.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	05/02/2020 - 04:31 PM
<p>DICIEMBRE2019:</p> <p>Se continúa en espera que el MTOP asigne los recursos para la cancelación al contratista, de la planilla de trabajos adicionales por el valor de \$ 286.542,61 + IVA, actualmente el trámite se encuentra en el Despacho del Señor Viceministro, la supervisión procura el cierre del contrato en el presente año.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/12/2019 - 08:32 AM
<p>NOVIEMBRE-2019</p> <p>Se continúa en espera que el MTOP asigne los recursos para la cancelación al contratista, de la planilla de trabajos adicionales por el valor de \$ 286.542,61 + IVA, actualmente el trámite se encuentra en el Despacho del Señor Viceministro, la supervisión procura el cierre del contrato en el presente año.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	04/11/2019 - 02:01 PM
<p>OCTUBRE-2019</p> <p>Se continúa en espera que el MTOP asigne los recursos para la cancelación al contratista, de la planilla de trabajos adicionales por el valor de \$ 286.542,61 + IVA y proceder con el cierre de este contrato, actualmente el trámite se encuentra en el Despacho del Señor Viceministro del MTOP.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	04/10/2019 - 11:36 AM
<p>SEPTIEMBRE-2019</p> <p>Se continúa en espera que el MTOP asigne los recursos para la cancelación al contratista, de la planilla de trabajos adicionales por el valor de \$ 286.542,61 + IVA y proceder con el cierre de este contrato, actualmente el trámite se encuentra en el Despacho del Señor Viceministro.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	04/09/2019 - 02:24 PM
<p>AGOSTO-2019</p> <p>Se continúa en espera que el MTOP asigne los recursos para la cancelación al contratista, de la planilla de trabajos adicionales por el valor de \$ 286.542,61 + IVA y proceder con el cierre de este contrato.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/08/2019 - 09:56 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO-2019</p> <p>Con memorando Nro. MTOP-DDR-2019-765-ME, el Director Distrital de Los Rios informa al Subsecretario Zonal 5 que no dispone de los recursos para cancelar esta planilla de trabajos adicionales al Consorcio Ecuatoriano de Puentes, y solicita se digne requerirlos de la autoridad correspondiente, el valor es USD. 286.542,61+IVA.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	03/07/2019 - 10:05 AM
<p>JUNIO-2019</p> <p>De acuerdo al Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-498-ME del 24 de abril del 2019, emitido por la Coordinación General de Planificación, el trámite continúa en la Subsecretaría Zonal 5, se espera la consecución de recursos económicos para la cancelación de la planilla pendiente por \$ 286.542,61 + IVA y proceder con el cierre del presente contrato.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	03/06/2019 - 09:29 AM
<p>MAYO-2019</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-CGJ-2019-500-ME de 15 de abril del 2019, la Coordinación General de Asesoría Jurídica se dirige a la Coordinación General de Planificación informando que el convenio de pago es factible en el presente caso, y que se digne continuar su trámite.</p> <p>La Coordinación General de Planificación con memorando Nro. MTOP-CGP-2019-498-ME de 24 de abril del 2019 se dirige a la Subsecretaría Zonal 5 informando que considera procedente la cancelación de los \$ 286.542,61 al Consorcio Ecuatoriano de Puentes, por lo que será necesario realizar modificaciones presupuestarias con financiamiento propio.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/05/2019 - 09:41 AM
<p>ABRIL-2019</p> <p>La elaboración del Convenio de pago se encuentra en la Coordinación General Jurídica, se espera el trámite correspondiente para su cancelación y cierre del presente contrato, la obra se encuentra terminada, con recepción definitiva.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	03/04/2019 - 12:23 PM
<p>MARZO-2019</p> <p>El trámite de convenio de pago se encuentra en la Coordinación General Jurídica, despachado por el Subsecretario Regional 5 con Memorando Nro. MTOP-SUBZ-5-2019-73-ME, del 16 de enero del 2019, se espera su aprobación para conseguir el aval presupuestario correspondiente.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	01/03/2019 - 08:40 AM
<p>ENERO-2019</p> <p>Se espera revisión y trámite del convenio de pago para viabilizar la cancelación de esta planilla de trabajos adicionales, y proceder al cierre del presente contrato.</p> <p>Actualmente el proyecto de convenio de pago se encuentra en la Coordinación General Jurídica, enviado por el Subsecretario Regional 5, no se conoce la comunicación despachada por la Subsecretaría.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/01/2019 - 08:34 AM
<p>DICIEMBRE DEL 2018</p> <p>Se continúa el presente trámite, la Dirección Distrital del MTOP-LOS RIOS, con memorando Nro. MTOP-DDR-2018-1637-ME del 22 de noviembre del 2018 (adjunto copia), ha despachado a la Subsecretaría Regional 5 el proyecto de convenio de pago para viabilizar la cancelación de la planilla de trabajos adicionales por el valor de \$ 320.927,69, se espera revisión y trámite del referido instrumento legal.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/12/2018 - 07:41 PM
<p>NOVIEMBRE DEL 2018</p> <p>Se ha completado la documentación solicitada por la Coordinación General de Planificación para inclusión al PAI-2018, y poder cancelar al Consorcio Ecuatoriano de Puentes la planilla (\$ 320.927,69) de trabajos adicionales del proyecto "Construcción del Puente Sobre el Rio Quevedo de 154m de longitud, ubicado en la Calle Séptima y Camilo Arévalo Provincia de Los Rios", sin embargo el Ing. Mauricio Jiménez Guevara me ha informado que esta cancelación quedaría para el año 2019.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	04/11/2018 - 06:05 PM
<p>Se ha completado la documentación solicitada por la Coordinación General de Planificación para inclusión al PAI-2018, y poder cancelar al Consorcio Ecuatoriano de Puentes la planilla (\$ 320.927,69) de trabajos adicionales del proyecto "Construcción del Puente Sobre el Rio Quevedo de 154m de longitud, ubicado en la Calle Séptima y Camilo Arévalo Provincia de Los Rios", sin embargo el Ing. Mauricio Jiménez Guevara, funcionario de la Coordinación General de Planificación, me ha informado que esta cancelación quedaría para el año 2019.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	04/11/2018 - 06:02 PM
<p>OCTUBRE-2018</p> <p>Se ha completado la documentación solicitada por la Coordinación General de Planificación para inclusión al PAI-2018, y poder cancelar al Consorcio Ecuatoriano de Puentes la planilla (\$</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	04/10/2018 - 08:03 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
320.927,69) de trabajos adicionales del proyecto "Construcción del Puente Sobre el Río Quevedo de 154m de longitud, ubicado en la Calle Séptima y Camilo Arévalo Provincia de Los Ríos", sin embargo el Ing. Mauricio Jiménez Guevara me ha informado que esta cancelación quedaría para el año 2019.		
AGOSTO-2018. Se ha completado la documentación solicitada por la Coordinación General de Planificación para inclusión al PAI-2018, y poder cancelar al Consorcio Ecuatoriano de Puentes la planilla (\$ 320.927,69) de trabajos adicionales del proyecto "Construcción del Puente Sobre el Río Quevedo de 154m de longitud, ubicado en la Calle Séptima y Camilo Arévalo Provincia de Los Ríos".	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/08/2018 - 11:13 AM
JUNIO 2018: El monto de USD 320.927.69 que el MTOP debe cancelar al contratista para el cierre del contrato se refiere al contrato de construcción del Puente sobre el Río Quevedo, de 154 m. de longitud ubicado en la calle Séptima y Camilo Arévalo, provincia de Los Ríos, a cargo del contratista "Consorcio Ecuatoriano de Puentes".	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	05/07/2018 - 10:27 AM
JULIO-2018 El Ministerio debe cancelar al Contratista el valor de \$ 320.927,69 correspondiente a la planilla de trabajos adicionales, para lo cual está en trámite su inclusión al PAI-2018 y posterior elaboración del Convenio de Pago.	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	04/07/2018 - 08:58 PM
JUNIO-2018 Para el cierre de este contrato es necesario que el Ministerio cancele al contratista la suma de \$ 320.927,69 valor correspondiente a la planilla de trabajos adicionales, para lo cual está en trámite el respectivo convenio de pago y su inclusión al PAI-2018.	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	04/06/2018 - 09:43 AM
MAYO-2018: Para el cierre de este contrato, el MTOP debe cancelar al contratista la suma de \$ 320.927,69 incluido IVA, correspondiente a la planilla de trabajos adicionales, para lo cual está en trámite el respectivo convenio de pago y su inclusión al PAI-2018.	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/05/2018 - 05:03 PM
ABRIL-2018 El Puente Quevedo sobre el Río Quevedo de 154m de longitud, contratado con el "Consorcio Ecuatoriano de Puentes", para su cierre es necesario que el MTOP cancele el valor correspondiente a la planilla de trabajos adicionales, para lo cual está en trámite un convenio de pago por el monto de \$ 320.927,69 incluido IVA.	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/04/2018 - 08:09 AM
ENERO-2018 El Puente Quevedo sobre el Río Quevedo de 154m de longitud, contratado con el "Consorcio Ecuatoriano de Puentes", para su cierre es necesario que el MTOP cancele el valor correspondiente a la planilla de trabajos adicionales, para lo cual está en trámite un convenio de pago, el monto es \$ 286.542,58 + IVA.	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	05/03/2018 - 09:15 AM
DICIEMBRE-2017 El Puente Quevedo sobre el Río Quevedo de 154m de longitud, contratado con el "Consorcio Ecuatoriano de Puentes", para su cierre es necesario que el MTOP cancele el valor correspondiente a la planilla de trabajos adicionales, para lo cual está en trámite un convenio de pago, el monto es \$ 286.542,58 + IVA.	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	07/12/2017 - 09:24 AM
NOVIEMBRE-2017 El Puente Quevedo sobre el Río Quevedo de 154m de longitud, contratado con el "Consorcio Ecuatoriano de Puentes", para su cierre es necesario que el MTOP cancele el valor correspondiente a la planilla de trabajos adicionales, para lo cual está en trámite un convenio de pago, el monto es \$ 286.542,58 + IVA.	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	01/11/2017 - 10:34 AM
OCTUBRE-2017 El puente Quevedo sobre el Río Quevedo de 154m de longitud, para su cierre es necesario que el MTOP cancele el valor correspondiente a la planilla de trabajos adicionales.	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	01/10/2017 - 09:47 PM
OCTUBRE-2017 El puente gallina se encuentra terminado, con liquidación y recepción definitiva, no se adeuda valor alguno.	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	01/10/2017 - 04:42 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE-2017:</p> <p>El Puente Sobre el Rio Gallina, construido por el Ing. Eduardo Jalil Salmón en el cantón Buena Fe, ya se encuentra terminado, con liquidación y recepción definitiva.</p> <p>El Puente Quevedo, construido por el Consorcio "Ecuatoriano de Puentes" en la ciudad de Quevedo, falta por cancelar la suma de \$ 326.658.54 correspondiente a la planilla de trabajos adicionales, fuera de contrato.</p>	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/09/2017 - 03:26 PM
<p>JULIO 2017:</p> <p>Esta obra ya fue terminada, falta por cancelar el monto de 326.658.54 mediante convenio, el mismo que se encuentra en tramite por parte de la Direccion Distrital de los Rios solicitando Aval.</p>	Marcillo Gavilánez, Danny Orlando	07/08/2017 - 03:31 PM
<p>JUNIO 2017:</p> <p>Esta obra ya fue terminada, se encuentra pagado 399.395,76 por reajuste de precios definitivos; y falta por cancelar el monto de 326.658.54 mediante convenio, el mismo que se encuentra en tramite por parte de la Direccion Distrital de los Rios solicitando Aval.</p>	Marcillo Gavilánez, Danny Orlando	05/07/2017 - 02:01 PM
<p>MAYO 2017:</p> <p>Esta obra ya fue terminada, se encuentra pagado 399.395,76 por reajuste de precios definitivos; y falta por cancelar el monto de 326.658.54 mediante convenio</p>	Marcillo Gavilánez, Danny Orlando	08/06/2017 - 10:32 AM
<p>ENERO ABRIL 2017</p> <p>: El acta de entrega-recepción definitiva se realizo, solo falta recopilar las firmas necesarias.</p>	Marcillo Gavilánez, Danny Orlando	05/05/2017 - 10:14 AM
<p>OCTUBRE 2012: Se firmo el Acta de entrega-recepción definitiva.</p> <p>SEPTIEMBRE 2012: El acta de entrega-recepción definitiva se realizo, solo falta recopilar las firmas necesarias.</p> <p>AGOSTO 2012: Esta en tramite el Acta de entrega-recepción definitiva. El contratista esta recopilando la información.</p> <p>JULIO 2012: Por firmarse el acta de entrega de recepcion definitiva que sera para el 30 de agosto.</p> <p>JUNIO 2012. En espera del Acta de recepción definitiva.</p> <p>MAYO 2012: Se firmo el acta de recepción provisional la obra esta concluida.</p> <p>ABRIL 2012: Pendiente saldo de planillas por cancelar</p> <p>MARZO 2012: En espera la recepción definitiva de la obra para Agosto/12</p> <p>FEBRERO 2012: Se termino la obra</p> <p>ENERO 2012: Los trabajos fueron concluidos al 100%</p> <p>JULIO 2011: La obra tiene un avance físico del 52%, el Ministerio ha aprobado la justificación de plazo desde el 30 de enero del 2011 hasta el 10 de junio del 2011 y amplía el plazo hasta el 20 de septiembre del 2011. La fiscalización ha solicitado un contrato complementario para la construcción de accesos.</p>	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	28/11/2012 - 04:11 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Cierre del presente contrato.	02/05/2023	Vicente Hermógenes Quezada Cabrera	10	10	1	1/2

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Buena Fe

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	30/12/2009		30/12/2009		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	30/12/2009		30/12/2009		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Acta de constitución del proyecto aprobada	1-Solicitud de Información	30/12/2009		30/12/2009		Sí	0.5
4	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	30/12/2009		30/12/2009		Sí	4.5
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	30/12/2009		30/12/2009		Sí	3.0
6	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	30/12/2009		30/12/2009		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN : Inicio de los trabajos	4-Inicio de Trabajo	30/01/2010		30/01/2010		Sí	8.0
8	EJECUCIÓN: Contrato firmado	4-Inicio de Trabajo	30/01/2010		30/01/2010		Sí	10.0
9	EJECUCIÓN :Excavación del estribo derecho	5-Entregables Intermedios	31/03/2010		31/03/2010		Sí	8.0
10	EJECUCIÓN :Excavación del estribo izquierdo	5-Entregables Intermedios	31/05/2010		31/05/2010		Sí	8.0
11	EJECUCIÓN :Construcción del estribo derecho	5-Entregables Intermedios	30/09/2010		30/09/2010		Sí	5.5
12	EJECUCIÓN :Construcción del estribo izquierdo	5-Entregables Intermedios	30/10/2010		30/10/2010		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN :Transporte de la Estructura metálica	5-Entregables Intermedios	31/07/2011		31/07/2011		Sí	3.5
14	EJECUCIÓN :Armado de la Estructura metálica	5-Entregables Intermedios	20/08/2011		20/08/2011		Sí	7.0
15	EJECUCIÓN :Armado de la Losa	5-Entregables Intermedios	10/09/2011		10/09/2011		Sí	7.0
16	EJECUCIÓN :Fundición de la Losa	5-Entregables Intermedios	17/09/2011		17/09/2011		Sí	6.5
17	EJECUCIÓN :Construcción de los accesos	5-Entregables Intermedios	30/01/2012		30/01/2012		Sí	1.5
18	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	9-Entregables Formales	31/01/2012		31/01/2012		Sí	1.0
19	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	31/01/2012		31/01/2012		Sí	1.0
20	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	31/01/2012		31/01/2012		Sí	1.0
21	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	04/01/2017		04/01/2017		Sí	1.0
22	CIERRE: Informe Técnico y Matriz de Arrastre del Puente Quevedo	V - Verificación ejecutiva	01/12/2023	01/12/2023			No	0.5
23	CIERRE: Solicitud Dictamen de Arrastre	V - Verificación ejecutiva	01/12/2023	01/12/2023			No	1.5
24	CIERRE: Partida Presupuestaria	V - Verificación ejecutiva	02/12/2023	02/12/2023			No	2.0
25	CIERRE: Asignación de Recursos	V - Verificación ejecutiva	18/12/2023	18/12/2023			No	1.0
26	CIERRE: Comprobante de Pago	V - Verificación ejecutiva	25/12/2023	25/12/2023			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	6,204,368.08
Estimado Al Fin Del Proyecto:	6,145,537.55 **
Costo Total:	16,976,563.57
Total Devengado:	5,858,994.94
% Costo Total Devengado:	34.51 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 34.51 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	3,922,393.98	320,927.72	0.00	4,243,321.70
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	3,084,207.61	0.00	0.00	3,084,207.61
Ppto. Codificado	5,858,994.95	320,927.72	0.00	6,179,922.67
Ppto. Comprometido	399,395.76	320,927.72	0.00	720,323.48
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	5,858,994.94	286,542.61	0.00	6,145,537.55
Ppto. Devengado	5,858,994.94	0.00	0.00	5,858,994.94
Pagado Real	399,395.76	286,542.61	0.00	685,938.37
Estimado a fin de año	* 5,858,994.94	0.00	0.00	5,858,994.94
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	286,542.61	0.00	286,542.61
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	95.34 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023

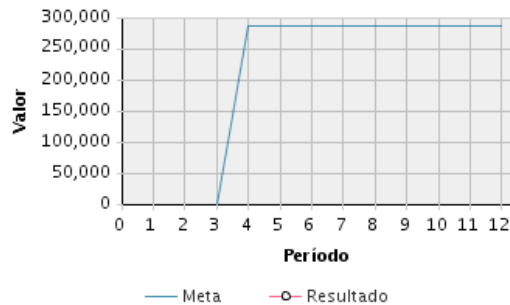

Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	286,542.61		286,542.61				
May	0.00		286,542.61				
Jun	0.00		286,542.61				
Jul	0.00		286,542.61				
Ago	0.00		286,542.61				
Sep	0.00		286,542.61				
Oct	0.00		286,542.61				
Nov	0.00		286,542.61				
Dic	0.00		286,542.61				
Total	286,542.61						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada,

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1.- PQ 2011-01 (ced.presup.)	PQ_2011-01_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
2	A2.- PQ 2011-02 (ced.presup.)	PQ_2011-02_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
3	A3.- PQ 2011-03 (ced.presup.)	PQ_2011-03_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
4	A4.- PQ 2011-04 (ced.presup.)	PQ_2011-04_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
5	A5.- PQ 2011-05 (ced.presup.)	PQ_2011-05_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
6	A6.- PQ 2011-06 (ced.presup.)	PQ_2011-06_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
7	A7.- PQ 2011-07 (ced.presup.)	PQ_2011-07_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
8	A8.- PQ 2011-08 (ced.presup.)	PQ_2011-08_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
9	A9.- PQ 2011-09 (ced.presup.)	PQ_2011-09_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
10	B1.- PQ 2011-10 (ced.presup.)	PQ_2011-10_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
11	B2.- PQ 2011-11 (ced.presup.)	PQ_2011-11_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
12	B3.- PQ 2011-12 (ced.presup.)	PQ_2011-12_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
13	B4.- PQ 2012-01 (ced.presup.)	PQ_2012-01_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
14	B5.- PQ 2012-02 (ced.presup.)	PQ_2012-02_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
15	B6.- PQ 2012-03 (ced.presup.)	PQ_2012-03_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
16	B7.- PQ 2012-04 (ced.presup.)	PQ_2012-04_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
17	B8.- PQ 2012-05 (ced.presup.)	PQ_2012-05_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
18	B9.- PQ 2012-06 (ced.presup.)	PQ_2012-06_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
19	C1.- PQ 2012-07 (ced.presup.)	PQ_2012-07_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
20	C2.- PQ 2012-08 (ced.presup.)	PQ_2012-08_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
21	C3.- PQ 2012-09 (ced.presup.)	PQ_2012-09_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
22	C4.- PQ 2012-10 (ced.presup.)	PQ_2012-10_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
23	C5.- PQ 2012-11 (ced.presup.)	PQ_2012-11_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
24	C6.- PQ 2012-12 (ced.presup.)	PQ_2012-12_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
25	C7.- PQ 2013-01 (ced.presup.)	PQ_2013-01_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
26	C8.- PQ 2013-02 (ced.presup.)	PQ_2013-02_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
27	C9.- PQ 2013-03 (ced.presup.)	PQ_2013-03_(ced.presup.).pdf	22/11/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
28	D1.- PQ 2013-04 (ced.presup.)	PQ_2013-04_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
29	D2.- PQ 2013-05 (ced.presup.)	PQ_2013-05_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
30	D3.- PQ 2013-06 (ced.presup.)	PQ_2013-06_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
31	D4.- PQ 2013-07 (ced.presup.)	PQ_2013-07_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
32	D5.- PQ 2013-08 (ced.presup.)	PQ_2013-08_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
33	D6.- PQ 2013-09 (ced.presup.)	PQ_2013-09_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
34	D7.- PQ 2013-10 (ced.presup.)	PQ_2013-10_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
35	D8.- PQ 2013-11 (ced.presup.)	PQ_2013-11_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
36	D9.- PQ 2013-12 (ced.presup.)	PQ_2013-12_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
37	E1.- PQ 2014-01 (ced.presup.)	PQ_2014-01_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
38	E2.- PQ 2014-02 (ced.presup.)	PQ_2014-02_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
39	E3.- PQ 2014-03 (ced.presup.)	PQ_2014-03_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
40	E4.- PQ 2014-04 (ced.presup.)	PQ_2014-04_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
41	E5.- PQ 2014-05 (ced.presup.)	PQ_2014-05_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
42	E6.- PQ 2014-06 (ced.presup.)	PQ_2014-06_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
43	E7.- PQ 2014-07 (ced.presup.)	PQ_2014-07_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
44	E8.- PQ 2014-08 (ced.presup.)	PQ_2014-08_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
45	E9.- PQ 2014-09 (ced.presup.)	PQ_2014-09_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
46	F1.- PQ 2014-10 (ced.presup.)	PQ_2014-10_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
47	F2.- PQ 2014-11 (ced.presup.)	PQ_2014-11_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
48	F3.- PQ 2014-12 (ced.presup.)	PQ_2014-12_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
49	F4.- PQ 2017-01 (ced.presup.)	PQ_2017-01_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
50	F5.- PQ 2017-02 (ced.presup.)	PQ_2017-02_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
51	F6.- PQ 2017-03 (ced.presup.)	PQ_2017-03_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
52	F7.- PQ 2017-04 (ced.presup.)	PQ_2017-04_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
53	F8.- PQ 2017-05 (ced.presup.)	PQ_2017-05_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
54	F9.- PQ 2017-06 (ced.presup.)	PQ_2017-06_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
55	G1.- PQ 2017-07 (ced.presup.)	PQ_2017-07_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
56	G2.- PQ 2017-08 (ced.presup.)	PQ_2017-08_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
57	G3.- PQ 2017-09 (ced.presup.)	PQ_2017-09_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
58	G4.- PQ 2017-10 (ced.presup.)	PQ_2017-10_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
59	G5.- PQ 2017-11 (ced.presup.)	PQ_2017-11_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
60	G6.- PQ 2017-12 (ced.presup.)	PQ_2017-12_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
61	G7.- PQ 2019-01 (ced.presup.)	PQ_2019-01_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
62	G8.- PQ 2019-02 (ced.presup.)	PQ_2019-02_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
63	G9.- PQ 2019-03 (ced.presup.)	PQ_2019-03_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
64	H1.- PQ 2019-04 (ced.presup.)	PQ_2019-04_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
65	H2.- PQ 2019-05 (ced.presup.)	PQ_2019-05_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
66	H3.- PQ 2019-06 (ced.presup.)	PQ_2019-06_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
67	H4.- PQ 2019-07 (ced.presup.)	PQ_2019-07_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
68	H5.- PQ 2019-08 (ced.presup.)	PQ_2019-08_(ced.presup.).pdf	22/11/2019
69	H6.- Costo total al 21-11-2019 k011	Costo_total_al_21-11-2019_k011.pdf	22/11/2019
70	H7.- PQ 2019-09 (ced.presup.)	PQ_2019-09_(ced.presup.).pdf	03/12/2019
71	H8.- PQ 2019-10 (ced.presup.)	PQ_2019-10_(ced.presup.).pdf	03/12/2019
72	H9.- PQ 2019-11 (ced.presup.)	PQ_2019-11_(ced.presup.).pdf	03/12/2019
73	I1.- SUSCRIPCION DEL CONTRATO	1.-_1137_-_CO.pdf	03/12/2019
74	I2.- ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL	6.-_1137_-_ACTA-PROV..pdf	03/12/2019
75	I3. Solicitud de recursos para el proyecto Construcción del Puente sobre el Río Quevedo.	MTOP-DDR-2019-1185-ME.pdf	31/01/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
76	14.- TRÁMITE DE CONVENIO DE PAGO PARA EL PUENTE QUEVEDO	MTOP-DDR-2018-1637-ME.pdf	02/12/2018
77	15.- Observaciones al Informe de inclusión y matriz resumen de contrato en el PAI 2018 del Proyecto "Construcción del Puente sobre el Río Quevedo, ubicado en la calle Séptima y Camilo Arévalo".	MTOP-CON_RIO-2018-555-ME.pdf	05/08/2018
78	16.- TRÁMITE DE CONVENIO DE PAGO PARA CANCELACIÓN DE PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO. UBICADO EN LA CALLE SÉPTIMA Y CAMILO ARÉVALO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.	MTOP-SUBZ5-2019-73-ME.pdf	01/03/2019
79	17.- LOS RÍOS: INFORME CONVENIO DE PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO ECUATORIANO DE PUENTES	MTOP-CGP-2019-498-ME-1.pdf	02/05/2019
80	18.- ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA	Acta_Entrega-Recepcion_definitiva.pdf	12/11/2012
81	19.- Diciembre-2019 Partida Presupuestaria	I9.-_PQ_2019-12_(ced.presup.).pdf	19/02/2020
82	J1.- Enero-2020 Partida Presupuestaria	J1.-_PQ_2020-01_(ced.presup.).pdf	19/02/2020
83	J2.- costo de inversión k011, 19.02.2020	J2.-_k011__costo_de_inversión_19.02.2020.pdf	19/02/2020
84	J3.- PQ 2020-02 (ced.presup.)	PQ_2020-02_(ced.presup.).pdf	31/03/2020
85	J4.- PQ 2020-03 (ced.presup.)	PQ_2020-03_(ced.presup.).pdf	31/03/2020
86	J5.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO A FASE CONGELADO	2020.05.12_MTOP-CGP-2020-670-ME_y_anexos__autoriza_congelar_K011__K013_DDLR.pdf	13/05/2020
87	J6.- CEDULA DE presupuesto devengado de los proyectos K011 y K013 (Dirección Distrital Los Ríos)	CEDULA_DE__presupuesto_devengado_de_los_proyectos_K011_y_K013.pdf	05/09/2019
88	J7.- Certificado de la no disponibilidad de recursos para cancelación a la Constructora.	MTOP-FINAN_RIO-2019-105-ME.pdf	03/07/2019
89	J8.- Contrato Original	CONTRATO_ORIGINAL.pdf	20/05/2013
90	J9.- Informe Ejecutivo Sitop Enero 2011	GestionReporteFN-01-2011.pdf	07/08/2012
91	K1.- Informe Ejecutivo Sitop Febrero 2011	GestionReporteFN-02-2011.pdf	07/08/2012
92	K2.- Informe Ejecutivo Sitop Marzo 2011	GestionReporteFN-03-2011.pdf	07/08/2012
93	K3.- Informe Ejecutivo Sitop Abril 2011	GestionReporteFN-04-2011.pdf	07/08/2012
94	K4.- Informe Ejecutivo Sitop Diciembre 2011	GestionReporteFN-12-2011.pdf	05/03/2012
95	K5.- La Dirección Distrital MTOP-LOS RÍOS, solicita a la Subsecretaría Zonal 5 se digne gestionar los recursos para cancelar al contratista.	MTOP-DDR-2019-765-ME.pdf	03/07/2019
96	K6.- QUIPUX DE TRÁMITE DE INCLUSIÓN AL PAI	SENPLADES__04-SEPT-2018.pdf	04/09/2018
97	K7.- Documentos de solicitud y de autorización de ampliación de fecha de fin del proyecto K011	2020.02.04_MTOP-CGP-2020-131-ME_y_anexos__autoriza_ampliar_fecha_de_fin_K011__DDLRL.pdf	05/02/2020
98	K8.- RESPALDO DE SOLICITUD DE LIDER	MTOP-CON_RIO-2019-631-ME.pdf	06/05/2020
99	K9.- RESPALDO DE SOLICITUD DE LIDER AUTORIZACION CAMBIO A FASE CONGELADO	MTOP-CON_RIO-2020-168-ME.pdf	13/05/2020
100	L1.- RESPALDO DE SOLICITUD DE DIRECTOR DISTRITAL AUTORIZACIÓN CAMBIO A FASE CONGELADO	mtop-ddr-2020-477-me.pdf	13/05/2020
101	L2.- RESPALDO DE SOLICITUD DEL SUBSECRETARIO AUTORIZACIÓN CAMBIO A FASE CONGELADO	2020.05.11_mtop-subz5-2020-710-me__solicita_congelar_k011__k013_ddlr.pdf	13/05/2020
102	L3.- RESPALDO AUTORIZACIÓN DE CAMBIO A FASE CONGELADO COORDINADORA	mtop-cgp-2020-670-me.pdf	13/05/2020
103	14.- SOLICITUD DICTAMEN DE ARRASTRE 141-ME	MTOP-DDR-2023-141-ME.pdf	22/04/2023
104	15.- Anexo Informe Técnico Puente Quevedo	informe_técnico_enero_27_2023-signed-signed.pdf	22/04/2023
105	16. Anexo Matriz de Arrastre	anexo_2_-_matriz_de_arrastre_2023-signed-signed-signed.pdf	22/04/2023
106	17.- Anexos de memo de Solicitud de Arrastre	pte_sobre_el_río_quevedo_2023(1).zip	22/04/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
107	I8.- SOLICITUD DICTAMEN DE ARRASTRE 244-ME	MTOP-SUBZ5-2023-244-ME.pdf	22/04/2023
108	I9.- DICTAMEN DE ARRASTRE DE PROYECTO	SNP-SNP-SGP-2023-0048-O_dictamen_de_arrastre.pdf	22/04/2023
109	M1.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROYECTO	MTOP-FINAN_RIO-2023-59-ME.pdf	22/04/2023
110	M2.- COMPROBANTE DE PAGO	Comprobante_de_pago.pdf	22/04/2023
111	M3.- "CAMBIO DE FASE A EJECUCIÓN".	ANEXO_(2).pdf	26/04/2023

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Alegría Bazante, Karen Kristhel	Administrador del proyecto	Directora de Transporte y Obras Públicas Distrital de los Rios	kalegría@mtop.gob.ec	
Alvarado, Gabriela	Supervisora de Financiero	Analista Financiera	galvarado@mtop.gob.ec	52312
Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 5 - Encargado	mhmayorga@mtop.gob.ec	-
Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	Lider del Proyecto	Experto de Infraestructura Provincial	vquezada@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
18193_1.jpg	19/02/2020
