

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1

Dirección Provincial Esmeraldas

PROYECTO: K037 MTOP - Mantenimiento Vial De La Provincia Del Esmeraldas

Líder del Proyecto:	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto (galdas@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Benavides Morillo, Omar Alexander	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, MTOP - RUTA DE SPONDYLUS, Provincia - Esmeraldas, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, STPE - Inversión en 40km de frontera norte
Titular:	Ortiz Campos, Lenin Herminio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3743	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	46,463,037.19
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2011 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	28/09/2018	Fecha de Fin Base:	26/05/2014
Modificado por:	Ortiz Campos, Lenin Herminio	Fecha del siguiente Hito:	28/09/2018

DATOS GENERALES

Descripción

La provincia de Esmeraldas tiene toda su red vial estatal contratadas, con proyectos que contemplan ampliaciones y que según su programación terminan de ejecutarse en el año 2012, es necesario la realización de este proyecto para el Mantenimiento de estos trabajos .

Montos:

Av. Colon: \$ 743981.30 USD. Contratista: SANCHEZ REAL ANGEL MARCELO
 Av. Eloy Alfaro: \$ 736015.36 USD. Contratista: ALARCON SORNOZA BELFORT ANDRES
 Esmeraldas - Súa: \$ 2072099.73 USD. Contratista: EDME S.A.

Mantenimiento rutinario y emergente por microempresas: \$ 501071.63 USD. Contratistas: Asociaciones de Mantenimiento Vial

Objetivo: Asfaltar las calles principales y los barrios que están afectadas sus vías para la circulación de vehículos (mal estado), siendo este el motivo que el Presidente de la República que comprometió con la provincia de Esmeraldas en intervenir en la ciudad, lo que se está realizando hasta la actualidad.

Línea Base: Estos proyectos se iniciaron con la venida del Señor Presidente de la República y al observar el estado deparado de las calles se comprometió asfaltar las misma, siendo un compromiso presidencial, por eso se intervino en las calles: Eloy Alfaro, Colón, 6 de Diciembre, Olmedo, Sucre, Av. Kennedy, Av. Libertad y en los Barrios Unidos Somos Más, 24 de Mayo y el 15 de Marzo que por motivos ajenos al Ministerio el Contratista no cumplió con el objeto del contrato, teniendo que terminar Unilateralmente.

Producto: Asfaltado, construcción de parterres, jardinería, instalaciones hidráulicas para agua potable y alcantarillado.

- 1.-Mantenimiento y reparación de gabarra propiedad del MTOP que se encuentra en el cantón Eloy Alfaro
- 2.- Pavimentación de las Calles "Padre Lino Campesano" y "Armada Nacional" del Cantón San Lorenzo
- 3.- Asfaltado de la calle Olmedo en la ciudad de Esmeraldas
- 4.- Mantenimiento del camino vecinal Limón-Zabaletita del Medio, en el Cantón Quinindé
- 5.-Asfaltado de la calle Colón en la ciudad de Esmeraldas

- 6.- Asfaltado de la calle Eloy Alfaro en la ciudad de Esmeraldas
- 7.- Lastrado de carretera LasPiedras- Barrio 21 de noviembre -Parroquia Tachina-ciudad de Esmeraldas
- 8.- Trabajo de Asfaltado de las Calles desde el León hasta la "Y" de Tabiazo, Avenida Libertad y Kennedy, Avenida Sucre, Avenida 6 de Diciembre, en el Cantón Esmeraldas
- 9.- Asfaltado de las calles del barrio 24 de Mayo de la ciudad de Esmeraldas


DATOS GENERALES

Descripción
10.- Asfaltado de las calles del barrio Unidos somos Más de la ciudad de Esmeraldas 11.- Señalización horizontal, vertical y seguridad vial de la via San Lorenzo- Mataje 12.- Señalización horizontal, vertical y seguridad vial de la via Y de Borbón- Borbón 13.- Señalización horizontal, vertical y seguridad vial de la via Paso Lateral de Atacames 14.- Mantenimiento del puente metálico ubicado sobre el rio Blanco en el cantón Quininde 15.- Mantenimiento del puente metálico ubicado sobre el rio Tululbí en el cantón San Lorenzo 16.-Mantenimiento del puente metálico ubicado sobre el rio Viche enel cantón Quinindé 17.-Mantenimiento del puente metálico ubicado sobre el rio Quinindé en el cantón Quinindé 18.- Mantenimiento del puente Calderón en el cantón Atacames
Beneficios Cualitativos
Mantener en buen estado las carreteras y puentes en los que intervengan el Ministerio de Transporte y Obra Públicas. con proyectos de arrastre
Tipo de Beneficiario
La comunidad en donde se ejecuta la obra y la Provincia de Esmeraldas
Restricciones
Costos: Todavía nos se asignan los recursos presupuestarios para Mantenimiento Vial Tiempo: Por falta de asignación de recursos no se cumpliría con el cronograma elaborado

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.85 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

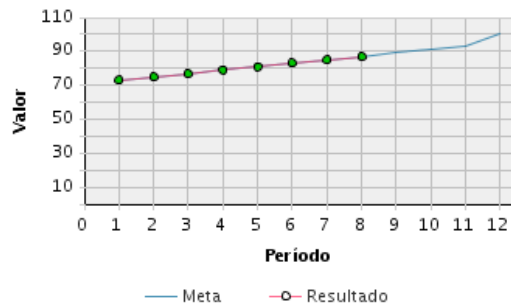

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	73 %	75 %	77 %	79 %	81 %	83 %	85 %	87 %	89 %	91 %	93 %	100 %
	Avance real acumulado											
	73 %	75 %	77 %	79 %	81 %	83 %	85 %	87 %				
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●				

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero 2014 : -Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Se encuentra culminada y en revisión planilla de liquidación para recepción provisional. -Asfaltado Av. Colón: Se encuentra culminada y en revisión planilla de liquidación para recepción provisional.	Ortiz Campos, Lenin Herminio	28/09/2018 - 09:18 AM
Diciembre 2013: -Asfaltado Av. Eloy Alfaro: colocación de adoquines decorativos en parterres.	Ortiz Campos, Lenin Herminio	28/09/2018 - 09:18 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Asfaltado Av. Colón: colocación de adoquines decorativos y colocación de plantas ornamentales en parterres.		
<p>Noviembre 2013:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Colocación de carpeta asfáltica; colocación de adoquines decorativos en parterres; hormigonado de aceras y bordillos.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Colocación de carpeta asfáltica; colocación de adoquines decorativos y colocación de plantas ornamentales en parterres; hormigonado de aceras y bordillos.</p> <p>-Se anexa contratos complementarios de la Av. colon y la Av. Eloy Alfaro, de igual manera los oficios de reinicio de obra por parte del fiscalizador</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	28/09/2018 - 09:18 AM
<p>Octubre 2013:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Colocación de carpeta asfáltica; colocación de adoquines decorativos en parterres; hormigonado de aceras y bordillos.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Colocación de carpeta asfáltica; colocación de adoquines decorativos y colocación de plantas ornamentales en parterres; hormigonado de aceras y bordillos.</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	28/09/2018 - 09:18 AM
<p>Septiembre 2013:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro : Se reanuda los trabajos, una vez que se entrego el anticipo del contrato complementario por rubros nuevos.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Se reanuda los trabajos, una vez que se entrego el anticipo del contrato complementario por rubros nuevos.</p> <p>Por lo que la terminación del asfaltado de estas obras o hitos será el 26 de noviembre; mas los 6 meses para su recepción definitiva.</p>		
<p>Agosto 2013:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro : Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos.</p>		
<p>AGOSTO 2018:</p> <p>Se cumple mes a mes con las labores y actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, se le ha realizado charlas a las asociaciones para que realicen de mejor manera su labor, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía.</p>	Estupiñan Echeverria, Victor Hugo	04/09/2018 - 09:22 AM
<p>JULIO 2018:</p> <p>Se cumple mes a mes con las labores y actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, se le ha realizado charlas a las asociaciones para que realicen de mejor manera su labor, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía.</p>	Estupiñan Echeverria, Victor Hugo	01/08/2018 - 11:11 AM
<p>JUNIO 2018:</p> <p>Se ha cumplido con el primer mes de labores con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía.</p>	Estupiñan Echeverria, Victor Hugo	05/07/2018 - 08:43 AM
<p>MAYO 2018:</p> <p>Se ha cumplido con el primer mes de labores con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/06/2018 - 02:59 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2018:</p> <p>Se ha cumplido con el primer mes de labores con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, también se realizó mantenimiento por administración directa.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	04/05/2018 - 05:44 PM
<p>MARZO 2018:</p> <p>Se ha cumplido con el primer mes de labores con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/04/2018 - 04:42 PM
<p>FEBRERO 2018:</p> <p>A inicios de febrero una vez contratadas las 17 microempresas de conservación vial las cuales cubren en su totalidad la red vial estatal en la Provincia de Esmeraldas, cada una cuenta con 10 personas y realizan trabajos de mantenimiento en un tramo de aproximadamente 30 km, la contratación de esta ha sido por 12 meses, estas iniciaron su trabajo con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	19/03/2018 - 08:49 AM
<p>ENERO 2018:</p> <p>No existió contratación por espera de asignación presupuestaria a partir de febrero se realizó las contrataciones de 17 microempresas para toda la red vial estatal.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	21/02/2018 - 02:33 PM
<p>DICIEMBRE 2017:</p> <p>El 27 de diciembre de 2017 se terminarán los contratos de 17 microempresas de conservación, en espera de recursos para contratar en el 2018</p> <p>Además en el sector de Tacusa hasta Río verde se continúan con las labores de limpieza de alcantarillas por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/01/2018 - 03:53 PM
<p>NOVIEMBRE 2017:</p> <p>Las 17 microempresas de conservación realizarán actividades de mantenimiento rutinario de roza mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, en todas las Red Vial Estatal de Esmeraldas a cargo de la Dirección Distrital de Esmeraldas.</p> <p>Además en el sector de Pegue se continúan con las labores de limpieza de alcantarillas por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital. Se esta por legalizar los contratos de mantenimiento vial (Señalización horizontal)</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/12/2017 - 03:09 PM
<p>OCTUBRE 2017:</p> <p>Las 17 microempresas de conservación realizarán actividades de mantenimiento rutinario de roza mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, en todas las Red Vial Estatal de Esmeraldas a cargo de la Dirección Distrital de Esmeraldas.</p> <p>Además en el sector de Pegue se continúan con las labores de limpieza de alcantarillas por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	01/11/2017 - 09:00 AM
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <p>Se realizó la orden de compra para los servicios de mantenimiento rutinario a 17 microempresas de conservación, las cuales realizarán actividades de roza mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas.</p> <p>Se dan mantenimiento por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/10/2017 - 03:36 PM
<p>AGOSTO 2017:</p> <p>Culminados los contratos vigentes de los mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación. Se espera presupuesto para recontractar las microempresas.</p> <p>Se dan mantenimiento por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/09/2017 - 03:39 PM
<p>JULIO 2017:</p> <p>Culminados los contratos vigentes de los mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizaron trabajos de rosa mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10.</p> <p>Se dan mantenimiento por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.</p>	Serrano Cedeño, Alex Ricardo	03/08/2017 - 04:57 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2017:</p> <p>Se realizan el mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizan trabajos de rosa mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10. En el sector de Pegue se realiza la limpieza de la alcantarilla con maquinaria del MTOP y de igual manera se hace limpieza de calzada en el sector de Camarones.</p> <p>Se dan mantenimiento a las vías afectadas a causa del terremoto de abril 2016.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/07/2017 - 08:58 AM
<p>MAYO 2017:</p> <p>Se realizan el mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizan trabajos de rosa mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10.</p> <p>Se dan mantenimiento a las vías afectadas a causa del terremoto de abril 2016.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	06/06/2017 - 04:00 PM
<p>ABRIL 2017:</p> <p>Se realizan el mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizan trabajos de rosa mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10.</p> <p>Se dan mantenimiento a las vías afectadas a causa del terremoto de abril 2016</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/05/2017 - 03:16 PM
<p>MARZO 2017:</p> <p>-Microempresas: En la actualidad realizan el mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizan trabajos de rosa mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, según especificaciones técnicas del MTOP, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/04/2017 - 05:02 PM
<p>FEBRERO 2017:</p> <p>-Microempresas: Se inicio la contratación de microempresas de conservación vial (13) por lapso de 4 meses.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	03/03/2017 - 05:15 PM
<p>ENERO 2017:</p> <p>-Microempresas: Se espera asignación presupuestaría para la contratación anual de microempresas de conservación vial en este año 2017.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	03/02/2017 - 04:14 PM
<p>DICIEMBRE 2016:</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 1 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales para el año 2017.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/01/2017 - 09:45 AM
<p>NOVIEMBRE 2016:</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 6 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, también existen 4 micro empresas de albergados , a las 9 anteriores ya se les esta realizando acta de recepción definitiva.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/12/2016 - 04:00 PM
<p>OCTUBRE 2016:</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 9 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, también existen 4 micro empresas de albergados , a las 6 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	01/11/2016 - 05:01 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 4 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, a las 4 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/10/2016 - 05:17 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2016:</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 4 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, a las 6 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/09/2016 - 03:47 PM
<p>JULIO 2016:</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 6 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, a las 6 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	08/08/2016 - 10:28 AM
<p>JUNIO 2016:</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 6 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, a las 4 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	04/07/2016 - 03:16 PM
<p>MAYO 2016:</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 4 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	08/06/2016 - 12:57 PM
<p>ABRIL 2016:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, Se suscribió el Acta recepción definitiva el 25 de abril de 2016.</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 4 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/05/2016 - 12:09 PM
<p>MARZO 2016:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de marzo 2016.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, en el mes de Abril se retomará la contratación ya fueron asignados los recursos para la contratación.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/04/2016 - 04:49 PM
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de marzo 2016.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	07/03/2016 - 12:26 PM
<p>ENERO 2016:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de marzo 2016.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/02/2016 - 02:59 PM
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de enero.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/01/2016 - 01:59 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de diciembre.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra está terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribió el Acta de Recepción Definitiva el 25 de noviembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>27/11/2015 - 10:34 AM</p>
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de noviembre.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra está terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva prevista para fines de noviembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>06/11/2015 - 03:29 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de octubre.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra está terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva prevista para fines de octubre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>05/10/2015 - 09:21 AM</p>
<p>AGOSTO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para los primeros días de octubre.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra está terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva con fecha 14 de septiembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>04/09/2015 - 11:58 AM</p>
<p>JULIO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para los primeros días de octubre.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, se están elaborando las Actas de recepción únicas.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>31/07/2015 - 12:05 PM</p>
<p>JUNIO 2015:</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>02/07/2015 - 09:14 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de julio de 2015.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva con fecha 14 de septiembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, se estan elaborabdo las Actas de recepción unicas.</p>		
<p>MAYO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de junio de 2015.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva con fecha 14 de septiembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	01/06/2015 - 11:57 AM
<p>ABRIL 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de mayo de 2015.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Se suscribio el Acta de Recepción Definitiva con fecha 17 de abril de 2015.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribio el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva con fecha 14 de septiembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría.</p>	Flores Zambrano, Boris Marcelo	07/05/2015 - 01:12 PM
<p>MARZO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de abril de 2015.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido, prevista para fines de abril de 2015</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de abril de 2015.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/04/2015 - 10:13 AM
<p>FEBRERO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de marzo de 2015.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido, prevista para fines de marzo de 2015</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de marzo de 2015.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	09/03/2015 - 01:40 PM
<p>ENERO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de febrero del 2015.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	09/02/2015 - 01:47 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido, prevista para el 04 de marzo de 2015</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La contratista esta en la construcción de las obras que se incrementaron y fueron aprobadas en la orden de Cambio N° 1 y también la ejecución del rubro nuevo de señalización (chevrones). La obra esta en etapa de terminación y tiene como plazo hasta el 17 de febrero de cumplir con el objeto del contrato.</p>		
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el mediados de enero del 2015.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido, prevista para el 04 de marzo de 2015.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/01/2015 - 08:58 AM
<p>NOVIEMBRE 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, en trámite Recepción Provisional, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/12/2014 - 01:24 PM
<p>OCTUBRE 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, en trámite Recepción Provisional, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, en trámite Recepción Provisional. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	10/11/2014 - 08:45 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: La obra no se entregó en el plazo establecido en el contrato de fecha 17 de noviembre de 2013, el contratista procedió a entregar la obra concluida el 22 de agosto del 2014, por lo que se procederá al cobro de la multa respectiva al presentar la planilla de liquidación.</p> <p>Está prevista suscribir el Acta recepción provisional hasta el 15 de octubre del 2014. El trámite del Acta recepción de definitiva se la realizara luego de los 6 meses según lo establece la Ley de Contratación Pública.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: El proyecto no se ha entregado en la fecha establecida en el contrato, se procederá al cobro de multa en la planilla de liquidación. La obra se terminó el 11 de enero del 2014, la contratista solicito el trámite del Acta de recepción provisional, que se elaborara hasta fines del mes de septiembre 2014.</p> <p>La suscripción del Acta recepción de definitiva se la realizará luego de los 6 meses según lo establece la Ley de Contratación Pública.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/10/2014 - 11:03 AM
<p>AGOSTO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Los trabajos no se entregaron a la fecha establecida en el contrato, por lo que se procederá al cobro de la multa respectiva al presentar la planilla de liquidación.</p> <p>La obra fue concluida 14 de agosto del 2014, está prevista el Acta Recepción Provisional hasta el 15 de septiembre del 2014. La suscripción del Acta Recepción de Definitiva se la realizara luego de los 6 meses según lo establece la Ley de Contratación Pública.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: El proyecto no fue entregado en la fecha establecida en el contrato, se procederá al cobro de multas en la planilla de liquidación. La obra se termino en enero del 2014,</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	09/09/2014 - 08:14 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>la contratista aun no ha solicitado Recepción Provisional, mediante conversación telefónica la contratista se comprometió a solicitar y presentar la documentación pertinente para elaborar el Acta de Recepción Provisional hasta mediados del mes de septiembre 2014.</p> <p>La suscripción del Acta Recepción de Definitiva se la realizará luego de los 6 meses según lo establece la Ley de Contratación Pública.</p>		
<p>JULIO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: En la actualidad el contratista a conseguido los adoquines de parterre que faltaban y los está colocando.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La obra está terminada, se ha conversado con el contratista vía telefónica para que solicite la recepción provisional la misma que se espera realizarla para el 8 de agosto.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	30/07/2014 - 02:14 PM
<p>JUNIO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: El contratista ha trasportado el adoquín que tiene que colocar en el proyecto.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La obra está terminada, se ha conversado con el contratista vía telefónica para que solicite la recepción provisional.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/07/2014 - 11:48 AM
<p>MAYO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: El contratista ha limpiado la obra para poner los adoquines que le faltan y sembrar las plantas que faltan, teniendo que presentar la planilla cuando termine la obra para poder cuantificar la multa correspondiente.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La obra está terminada, se ha hablado con el contratista para que solicite la recepción provisional.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/06/2014 - 01:18 PM
<p>ABRIL 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: El contratista está adquiriendo el resto de plantas faltantes en la Av. Eloy Alfaro para terminar con este ornato de la ciudad y los ladrillos peatonales en los parterres serán colocados antes del 15 de mayo.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La calle colón está terminada, teniendo que nombrarse la comisión para la recepción provisional cuando el contratista la solicite, caso contrario, le recomendaremos al contratista que la solicite.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	08/05/2014 - 01:23 PM
<p>MARZO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Falta el 1% para la culminación, el problema se presento por la falta de ladrillos que cumplan las especificaciones técnicas y el ornato de la ciudad.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La calle colón está terminada, teniendo que nombrarse la comisión para la recepción provisional.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	07/04/2014 - 01:56 PM
<p>FEBRERO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: La Fiscalización y la Contratista estan evaluando el avance de la obra para la liquidación económica.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La Fiscalización y la Contratista estan evaluando el avance de la obra para la liquidación económica.</p>	Dávila Cadena, Christian Roberto	07/03/2014 - 04:49 PM
<p>Julio 2013:</p> <p>- Se terminaron los trabajos de asfaltado del barrio Unidos Somos Más.</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro : Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos.</p> <p>- Asfaltado Barrio 24 de Mayo: Esta terminada con acta provisional: Se adjunta acta.</p>	Martínez Martínez, Jorge Aníbal	02/08/2013 - 12:14 PM
<p>Junio 2013:</p> <p>- Se continúa trabajando en el asfaltado del barrio Unidos Somos Más, colocación de carpeta asfáltica</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro : Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos.</p> <p>- Asfaltado Barrio 24 de Mayo: Esta terminada con acta provisional: Se adjunta acta.</p>	Martínez Martínez, Jorge Aníbal	05/07/2013 - 10:33 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mayo 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continúa trabajando en el asfaltado del barrio Unidos Somos Más, colocación de carpeta asfáltica -Asfaltado Av. Eloy Alfaro : construcción de Parterre y colocación de carpeta asfáltica -Asfaltado Av. Colón: Construcción de aceras y bordillos, parterres y colocación de carpeta asfáltica. <p>Abril 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asfaltado del Barrio Unidos Somos Más se encuentra colocando la carpeta asfáltica -Asfaltado de la Av. Eloy Alfaro : se construye los bordillos y aceras así como los bordillos para los parterres -.Asfaltado Av. Colón : Se construye los bordillos y aceras , así como los bordillos para los parterres <p>Marzo 2012:</p> <p>Se continua trabajando en los proyectos de asfaltado tales como :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asfaltado de la Y de León -Tabiazo-Avs. Kennedy-Libertad-6 de Diciembre- Sucre, esta obra se encuentra terminada -Asfaltado del Barrio 24 de Mayo: Se continua colocando carpeta asfáltica -Asfaltado del Barrio Unidos Somos Más se encuentra colocando la carpeta asfáltica -Asfaltado de la Av. Eloy Alfaro : se construye los bordillos y aceras así como los bordillos para los parterres .Asfaltado Av. Colón : Se construye los bordillos y aceras , así como los bordillos para los parterres 	<p>Martínez Martínez, Jorge Aníbal</p>	<p>05/07/2013 - 10:29 AM</p>
<p>Enero 2013: Se continua con la construcción de aceras , bordillos, colocación de subbase, sumideros en el barrio 24 de Mayo, avance físico de 52,13 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Barrio Unidos Somos Más, se está colocando subbase, construyendo aceras y bordillos, colocación de tirantes para sumideros, avance físico 40 % - El asfaltado de la avenida Eloy Alfaro, se está construyendo los bordillos y aceras , bordillos para parterre, avance físico del 15% -Asfaltado de las calles desde el León hasta la Y de Tabiazo, Av. Libertad y Kennedy, Av. Sucre, Av. 6 de Diciembre, colocación de la carpeta asfáltica, vance físico del 98 % -asfaltado del barrio 15 de Marzo, se encuentra con Terminación Unilateral -Mantenimiento puente Tulumbí, terminada la obra 100 % -Reconstrucción muro gavión puente Teaone 3, colocación de carpeta asfáltica al ingreso del puente, avance físico 100% -Mantenimiento puente Calderón, colocación de gaviones, avance físico 20 % - Mantenimiento puente Viche, trabajos de pintura para la estructura metálica, 95 % -Mantenimiento puente Quinindé, construcción de muro de gaviones, Samblasting, y pintura, avance físico 30 % -Mantenimiento CV Limón-Zabaletita, Quinindétrámite de Terminación Unilateral 	<p>Martínez Martínez, Jorge Aníbal</p>	<p>26/02/2013 - 06:13 PM</p>
<p>DICIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfaltado de calles del barrio Unidos Somos Más: se encuentra en ejecución , aceras, bordillos, excavación ,colocación de material de mejoramiento, subbase, domiciliarias, subidas de pozos. cajas, un avance físico del 30 % - Asfaltado de calles del barrio 24 de mayo : En etapa de ejecución , aceras, bordillos, colocación de material de mejoramiento, subbase, base, domiciliarias, subidas de pozos , cajas, avance físico 42 % -Mantenimiento camino vecinal Roto- Vinzade : Los trabajos se encuentran concluidos. 100 % -Mantenimiento de estructura metálica del puente sobre el rio Blanco : terminado 100 % - Mantenimiento de estructura metálica del puente sobre el rio Tululbí : etapa de construcción, samblassting y pintura, procura metálica, instalación de acometidas eléctricas, instalación de transformador , colocación de iluminarias., avance físico 65 % - Mantenimiento de estructura metálica del puente sobre el rio Viche : etapa de construcción, limpieza de maleza, samblassting y pintura, procura metálica, instalación de acometidas eléctricas,, avance físico 45 % 	<p>Martínez Martínez, Jorge Aníbal</p>	<p>10/01/2013 - 07:52 AM</p>

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Aprobacion de mantenimiento vial provincial realizada	4-Inicio de Trabajo	01/01/2011		01/01/2011		Sí	1.0
2	PLANEACION: Firma de contrato asfaltado de las calles del barrio 15 de Marzo firmado	1-Solicitud de Información	30/05/2011		30/05/2011		Sí	1.0
3	EJECUCION: Señalización de la vía El Salto- Muisne del Cantón Muisne ejecutados	5-Entregables Intermedios	23/08/2011		23/08/2011		Sí	1.0
4	EJECUCION: Rehabilitación y Mantenimiento del camino vecinal J3-Vinsade en el cantón Quinindé ejecutados	5-Entregables Intermedios	04/09/2011		04/09/2011		Sí	2.0
5	EJECUCION: Asfaltado de la venida principal de la Parroquia Sua realizada	5-Entregables Intermedios	30/09/2011		30/09/2011		Sí	1.0
6	EJECUCION: Elaboración y Colocación de 106 señales regulatorias para ser ubicadas antes y después de cada puente o viaducto en la Provincia de Esmeraldas. colocadas	5-Entregables Intermedios	05/11/2011		05/11/2011		Sí	1.0
7	EJECUCION: Construcción del puente sobre el río La Unión del paso Lateral de Atacames ejecutado	1-Solicitud de Información	20/11/2011		20/11/2011		Sí	1.0
8	EJECUCION: Señalización de la vía Esmeraldas- Atacames-Súa- Provincia de Esmeraldas realizado	5-Entregables Intermedios	22/11/2011		22/11/2011		Sí	1.0
9	EJECUCION: Trabajos de acceso a la Parroquia La Unión del cantón Atacames ejecutado	1-Solicitud de Información	30/03/2012		30/03/2012		Sí	4.0
10	EJECUCION: Mantenimiento y reparación de gabarra propiedad del MTOP que se encuentra en el cantón Eloy Alfaro realizado	1-Solicitud de Información	30/06/2012		30/06/2012		Sí	5.0
11	EJECUCION: Pavimentación de las Calles "Padre Lino Campesan" y "Armada Nacional" del Cantón San Lorenzo realizado	5-Entregables Intermedios	30/07/2012		30/07/2012		Sí	4.0
12	EJECUCION: Asfaltado de la calle Olmedo en la ciudad de Esmeraldas ejecutado	1-Solicitud de Información	30/08/2012		30/08/2012		Sí	2.0
13	EJECUCION: Lastrado de carretera LasPiedras- Barrio	5-Entregables Intermedios	25/09/2012		25/09/2012		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	21 de noviembre -Parroquia Tachina-ciudad de Esmeraldas terminado							
14	EJECUCION: Señalización horizontal, vertical y seguridad vial del la vía San Lorenzo - Mataje, Cantón San Lorenzo realizada	5-Entregables Intermedios	30/10/2012		30/10/2012		Sí	1.0
15	EJECUCION: Señalización horizontal, vertical y seguridad vial del la vía Y Borbón - Borbón, Cantón Eloy Alfaro realizada	5-Entregables Intermedios	30/10/2012		30/10/2012		Sí	3.0
16	EJECUCION: Señalización horizontal, vertical y seguridad vial del Paso Lateral de Atacames realizada	5-Entregables Intermedios	30/10/2012		30/10/2012		Sí	4.0
17	EJECUCION: Mantenimiento de puente metálico y obras civiles ubicado sobre el río Blanco , en el Cantón Quinindé realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	4.0
18	EJECUCION: Mantenimiento del camino vecinal Limón-Zabaletita del Medio, en el Cantón Quinindé ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	1.0
19	EJECUCION: Trabajo de Asfaltado de las Calles desde el León hasta la "Y" de Tabiázo, Avenida Libertad y Kennedy, Avenida Sucre, Avenida 6 de Diciembre, en el Cantón Esmeraldas ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/03/2013		30/03/2013		Sí	1.0
20	EJECUCION: Asfaltado de las calles del barrio 24 de Mayo de la ciudad de Esmeraldas realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	4.0
21	EJECUCION: Asfaltado de las calles del barrio Unidos somos Más de la ciudad de Esmeraldas ejecutado	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		31/07/2013		Sí	4.0
22	EJECUCION: Asfaltado de la calle Colón en la ciudad de Esmeraldas realizado	5-Entregables Intermedios	15/04/2014		15/02/2014		Sí	2.0
23	CIERRE Liquidación Económica Av. Colón	5-Entregables Intermedios	05/09/2014		05/09/2014		Sí	2.0
24	EJECUCION: Asfaltado de la calle Eloy Alfaro en la ciudad de Esmeraldas realizado	5-Entregables Intermedios	15/09/2014		15/10/2014		Sí	4.0
25	EJECUCION: Mantenimiento rutinario y emegente por microempresas	4-Inicio de Trabajo	17/09/2014		17/03/2015		Sí	1.0
26	CIERRE Liquidación Económica Av. Eloy Alfaro	5-Entregables Intermedios	26/12/2014		30/04/2015		Sí	1.0
27	COMPLETADO: Acta de entrega de Recepción firmada Av. Colón	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	17/02/2015		17/04/2015		Sí	2.0
28	EJECUCIÓN: Mantenimiento de la carretera Esmeraldas - Súa	5-Entregables Intermedios	17/02/2015		17/02/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
29	COMPLETADO: Acta de entrega de Recepción firmadas Mantenimientos rutinarios y emergentes por microempresas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	12/05/2015		06/04/2015		Sí	5.0
30	COMPLETADO: Acta de entrega de Recepción firmada Av. Eloy Alfaro	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2015		25/02/2016		Sí	1.0
31	COMPLETADO: Acta de entrega de Recepción firmada carretera Esmeraldas - Súa	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	14/09/2015		25/11/2015		Sí	4.0
32	EJECUCIÓN: Aprobación de asignación presupuestaria para el Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Enero 2018, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	3.0
33	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Febrero 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	2.0
34	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Marzo 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2018		30/03/2018		Sí	2.0
35	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Abril 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	2.0
36	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Mayo 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	2.0
37	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Junio 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	29/06/2018		29/06/2018		Sí	2.0
38	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Julio 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	2.0
39	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Agosto 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	2.0
40	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Septiembre 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	28/09/2018	28/09/2018			No	2.0
41	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Octubre 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2018	31/10/2018			No	2.0
42	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Noviembre 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018	30/11/2018			No	2.0
43	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Diciembre 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	28/12/2018	28/12/2018			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
44	CIERRE: Liquidación económica, realizada	9-Entregables Formales	31/12/2018	31/12/2018			No	3.0
45	COMPLETADO: Acta entrega recepción, firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018	31/12/2018			No	2.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	OBRA CON TRABAJOS TERMINADOS	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	31/05/2016
2	OBRA CON TRABAJOS TERMINADOS	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	17/03/2016
3	OBRA TERMINADA	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	27/01/2016
4	OBRA TERMINADA	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	25/11/2015
5	OBRA TERMINADA	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	22/09/2015
6	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	26/08/2015
7	OBRA CON TRABAJOS TERMINADOS	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	31/07/2015
8	OBRA TERMINADA	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	11/06/2015
9	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	30/04/2015
10	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	17/03/2015
11	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	15/12/2014
12	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	27/11/2014
13	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	20/10/2014
14	GOBERNACIÓN DE ESMERALDAS	Lemos Ramirez, Pablo Rafael	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	27/07/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de mantenimiento de la red Vial Estatal		102.54 %	0.96	0.9844	01/01/2017	Agosto

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	7,763,423.05
Estimado Al Fin Del Proyecto:	46,463,037.19 **
Costo Total:	16,078,289.11
Total Devengado:	39,894,580.46
% Costo Total Devengado:	248.13 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 248.13 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	29,927,961.77	10,319,371.90	0.00	40,247,333.67
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	27,286,174.94	0.00	0.00	27,286,174.94
Ppto. Codificado	48,161,483.53	0.00	0.00	48,161,483.53
Ppto. Comprometido	16,139,317.88	0.00	0.00	16,139,317.88
Planeado - Codificado (2018)		10,319,371.90		
Programado a Devengar	34,337,926.00	10,319,371.90	0.00	44,657,297.90
Ppto. Devengado	36,143,665.29	3,750,915.17	0.00	39,894,580.46
Pagado Real	13,017,698.50	0.00	0.00	13,017,698.50
Estimado a fin de año	* 36,143,665.29	0.00	0.00	36,143,665.29
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-1,805,739.29	10,319,371.90	0.00	8,513,632.61
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 105.26 %	36.35 %	0.00 %	89.33 %
Ppto. Codificado 998	1,372,766.56	0.00	0.00	1,372,766.56
Ppto. Devengado 998	1,370,959.88	0.00	0.00	1,370,959.88

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

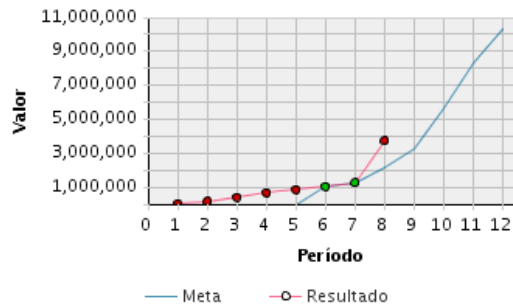

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	740.14	0.00	740.14	115.00 %		0.01 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	179,682.25	0.00	180,422.39	115.00 %		1.75 %
Mar	0.00	228,501.44	0.00	408,923.83	115.00 %		3.96 %
Abr	0.00	238,420.47	0.00	647,344.30	115.00 %		6.27 %
May	0.00	198,591.23	0.00	845,935.53	115.00 %		8.20 %
Jun	1,048,121.62	202,186.09	1,048,121.62	1,048,121.62	100.00 %		10.16 %
Jul	194,739.08	194,739.08	1,242,860.70	1,242,860.70	100.00 %		12.04 %
Ago	919,836.22	2,508,054.47	2,162,696.92	3,750,915.17	173.44 %		36.35 %
Sep	1,115,355.98		3,278,052.90				
Oct	2,377,979.58		5,656,032.48				
Nov	2,638,675.73		8,294,708.21				
Dic	2,024,663.69		10,319,371.90				
Total	10,319,371.90	3,750,915.17					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
17	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
18	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		IMG01998-20120707-1319.jpg	09/07/2012
2	01 -Acta Provisional del asfaltado barrio 24 de Mayo	Acta_de_recepcion_Prov._24_de_Mayo.pdf	05/07/2013
3	A1. INFORME DE SITOP MARZO 2014 AV. COLON	A1-INFORME_AV._COLON_SITOP_MARZO_2014.PDF	17/04/2014
4	A2. INFORME DE SITOP MARZO 2014 AV. ELOY ALFARO	A2-INFORME_AV._ELOY_ALFARO_SITOP_MARZO_2014.PDF	17/04/2014
5	A3. INFORME DE SITOP ABRIL 2014 AV. ELOY ALFARO	A3.INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AV._ELOY_ALFARO_ABRIL_2014.PDF	05/05/2014
6	A4. INFORME DE SITOP ABRIL 2014 AV. COLON	A4.INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AV._COLON_ABRIL_2014.PDF	06/05/2014
7	A5. INFORME DE SITOP MAYO 2014 AV. COLON	A5._INFORME_SITOP_MAYO_2014_AV._COLON_-_K037.PDF	06/06/2014
8	A6. INFORME DE SITOP MAYO 2014 AV. ELOY ALFARO	A6._INFORME_SITOP_MAYO_2014_AV._ELOY_ALFARO_-_K037.PDF	06/06/2014
9	A7. INFORME SITOP AV. COLON 2014	A7._5791_INFORME_SITOP_AV._COLON_JUNIO_2014.pdf	16/07/2014
10	A8. INFORME SITOP AV. ELOY ALFARO JUNIO 2014	A8._5687_INFORME_SITOP_AV._ELOY_ALFARO_JUNIO_2014.pdf	16/07/2014
11	A9. INFORME EJECUTIVO SITOP AV. COLON JULIO 2014	A9._5791_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AV._COLON_JULIO_2014.pdf	30/07/2014
12	aceras Av. Eloy Alfaro	SAM_1230.JPG	12/04/2013
13	aceras en av. Colón	SAM_0199.JPG	12/04/2013
14	aceras y bordillos barrio 24 de mayo	DSC01657.JPG	10/01/2013
15	archivo Informe ejecutivo desde nov 2011 hasta nov del 2012	INFORME_EJECUTIVO__NOV_2011_-_NOV_2012.docx	10/01/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	asesorios para tuberias de agua potable barrio 24 de mayo	DSC01741.JPG	10/01/2013
17	ASOCIACION HITO 30 - ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA AV. ELOY ALFARO	5687-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2016.pdf	06/05/2016
18	B1.INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2014	A11._5687_INFORME_EJECUTIVO_ELOY_ALFARO_AGOSTO2014.pdf	08/09/2014
19	B2. INFORME EJECUTIVO SITOP AV. ELOY ALFARO JULIO 2014	A10._5687_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AV._ELOY_ALFARO_JULIO_2014.pdf	08/09/2014
20	B3. INFORME EJECUTIVO AV. COLON AGOSTO 2014	A12._INFORME_SITOP_COLON_AGOSTO_2014.pdf	08/09/2014
21	B4. INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2014 AV. ELOY ALFARO	A13.5687_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPTIEMBRE_2014_AV._ELOY_ALFARO.pdf	08/09/2014
22	B5. INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2014 AV. COLON	A14._5791_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPTIEMBRE_2014_AV._COLON.pdf	08/09/2014
23	B6. 5687-INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2014 AV. ELOY ALFARO	B6._5687-INFORME_EJECUTIVO_SITOP_OCTUBRE_2014_AV._ELOY_ALFARO.pdf	10/11/2014
24	B7. 5791-INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2014 AV. COLON	B7._5791-INFORME_EJECUTIVO_SITOP_OCTUBRE_2014_AV._COLON.pdf	10/11/2014
25	B8.5687-INFORME EJECUTIVO NOV 2014 AV. ELOY ALFARO	B8.5687-INFORME_EJECUTIVO_NOV_2014_AV._ELOY_ALFARO.pdf	05/12/2014
26	B9.5791 INFORME EJECUTIVO NOV 2014 AV. COLON	B9.5791_INFORME_EJECUTIVO_NOV_2014_AV._COLON.pdf	05/12/2014
27	C1. 5687 INFORME EJECUTIVO SITOP DIC 2014 AV. ELOY ALFARO	C1._5687_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_DIC_2014.pdf	06/01/2015
28	C2. 5791 INFORME EJECUTIVO SITOP DIC 2014 AV. COLON	C2._5791_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_DIC_2014.pdf	06/01/2015
29	C3. 8695 INFORME EJECUTIVO SITOP DIC 2014 - EDME	C3._8695_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_DIC_2014.pdf	06/01/2015
30	C4. 5791 INFORME EJECUTIVO DE SITOP ENE 2015 AV. COLON	C4._5791_INFORME_EJECUTIVO_DE_SITOP_ENE_2015_AV._COLON.pdf	09/02/2015
31	C5. 5687 INFORME EJECUTIVO SITOP ENE 2015 AV. ELOY ALFARO	C5._5687_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ENE_2015_AV._ELOY_ALFARO.pdf	09/02/2015
32	C6. 8695-ORDEN DE CAMBIO N° 1-2015	C6._8695-ORDEN_DE_CAMBIO_N°_1-2015.pdf	09/02/2015
33	C7. 8695 INFORME EJECUTIVO ENE 2015	C7._8695_INFORME_EJECUTIVO_ENE_2015.pdf	09/02/2015
34	C8. 5687 INFORME EJECUTIVO FEB 2015 AV. ELOY ALFARO	C8._5687_INFORME_EJECUTIVO_FEB_2015.pdf	09/03/2015
35	C9. 5791 INFORME EJECUTIVO FEB 2015 AV. COLON	C9._5791_INFORME_EJECUTIVO_FEB_2015_AV._COLON.pdf	09/03/2015
36	CONTRATO COMPLEMENTARIO AV. COLON	COMPLEMENTARIO_COLON.pdf	02/12/2013
37	CONTRATO COMPLEMENTARIO AV. ELOY ALFARO	COMPLEMENTARIO_ELOY_ALFARO.pdf	02/12/2013
38	D1. INFORME SITOP MARZO 2015 - AV. COLON	D1._INFORME_SITOP_MARZO_2015_- _AV._COLON.pdf	07/04/2015
39	D2. INFORME EJECUTIVO SITOP MAR 2015 - AV. ELOY ALFARO	D2._INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAR_2015_- _AV._ELOY_ALFARO.pdf	07/04/2015
40	D3. INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2015 - EDME	D3._INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MARZO_2015_- _EDME.pdf	07/04/2015
41	D4. 5791-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2015- AV. COLON	D4._5791-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf	27/04/2015
42	D5._8849-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf	D5._8849-ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_2015.pdf	08/07/2015
43	D6. 8867-ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 2015	D6._8867-ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_2015.pdf	08/07/2015
44	D7. 8848-ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 2015	D7._8848-ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_2015.pdf	08/07/2015
45	D7. ORDEN DE COMPRA POR CATA LOGO ID 14232 AÑO - 2016	ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATA_LOGO_ID_14232_AÑO_2016.pdf	03/02/2017
46	D8. 8868-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2015	D8._8868-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf	08/07/2015
47	D9. 9314-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2015	D9._9314-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf	08/07/2015
48	E1-5687-ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL-2015 AV. ELOY ALFARO	E1-5687-ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL-2015.pdf	31/07/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
49	E2. 5687 INFORME EJECUTIVO JUL 2015 AV. ELOY ALFARO	E2._5687_INFORME_EJECUTIVO_JUL_2015_AV._ELOY_ALFARO.pdf	07/09/2015
50	E3. 5687 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2015 AV. ELOY ALFARO	E3._5687_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2015_AV._ELOY_ALFARO.pdf	07/09/2015
51	E4. 5687 INFORME EJECUTIVO OCT 2015 AV. ELOY ALFARO.pdf	E4._5687_INFORME_EJECUTIVO_OCT_2015_AV._ELOY_ALFARO.pdf	10/11/2015
52	E5. 8695-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2015	E5._8695-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf	26/11/2015
53	E6. ORDEN DE COMPRA POR CATA LOGO ID 14423 - AÑO 2016	ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATA_LOGO_ID_14423_-_AÑO_2016.pdf	03/02/2017
54	E7. ORDEN DE COMPRA POR CATA LOGO ID 14231 - AÑO 2016	ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATA_LOGO_ID_14231_-_AÑO_2016.pdf	03/02/2017
55	E8. ORDEN DE COMPRA POR CATA LOGO ID 14232 AÑO - 2016	ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATA_LOGO_ID_14233_-_AÑO_2016.pdf	03/02/2017
56	E9. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17639	E9._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17639.pdf	03/08/2017
57	EJECUCION DE GASTOS ENERO - JUNIO 2013	EJECUCION_DE_GASTOS_ENERO_-_JUNIO_2013.pdf	05/07/2013
58	excavación barrio Unidos Somos Más	2012-10-29_10.18.31.jpg	05/12/2012
59	F1. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17640	F1._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17640.pdf	03/08/2017
60	F2. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17641	F2._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17641.pdf	03/08/2017
61	F3. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17642	F3._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17642.pdf	03/08/2017
62	F4. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17644	F4._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17644.pdf	03/08/2017
63	F5. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17645	F5._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17645.pdf	03/08/2017
64	F6. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17646	F6._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17646.pdf	03/08/2017
65	F7 ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17647	F7_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17647.pdf	03/08/2017
66	F8. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17648	F8._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17648.pdf	03/08/2017
67	F9. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17649	F9._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17649.pdf	03/08/2017
68	FOTO ASFALTADO DE CALLE COLON	IMG00016-20130605-1803.jpg	05/06/2013
69	foto señalización paso lateral de atacames	DSCN1014.JPG	09/10/2012
70	fotos puente tululbi ejecución trabajos	DSC00149.JPG	10/01/2013
71	fotos asfaltado av. Olmedo	IMG01999-20120707-1319.jpg	09/07/2012
72	G1. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17650	G1._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17650.pdf	03/08/2017
73	G2. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17651	G2._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17651.pdf	03/08/2017
74	G3. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17652	G3._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17652.pdf	03/08/2017
75	G4. 19447_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	G4._19447_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
76	G5.19717_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	G5.19717_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
77	G6.19718_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	G6.19718_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
78	G7.19720_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	G7.19720_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
79	G8.19721_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	G8.19721_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
80	G9.19723_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	G9.19723_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
81	H1.19724_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	H1.19724_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
82	H2.19727_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	H2.19727_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
83	H3.19729_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	H3.19729_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
84	H4.19732_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	H4.19732_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
85	H5.19734_ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA	H5.19734_ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
86	H6.19736_ACTA ENTREGA RECEPCION	H6.19736_ACTA_ENTREGA_RECEPCION.pdf	05/01/2018
87	H7.19737_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	H7.19737_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
88	H8.19738_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	H8.19738_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
89	H9.19740_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	H9.19740_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
90	I1.19739_ACTA RECEPCION UNICA	I1.19739_ACTA_RECEPCION_UNICA.pdf	05/01/2018
91	I2.19745_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	I2.19745_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
92	I3. DEVENGADO ESIGEF ENERO 2018	I3._DEVENGADO_ESIGEF_ENERO_2018.pdf	28/09/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
93	I4. DEVENGADO ESIGEF FEBRERO 2018	I4._DEVENGADO_ESIGEF_FEBRERO_2018.pdf	28/09/2018
94	I5. DEVENGADO ESIGEF MARZO 2018	I5._DEVENGADO_ESIGEF_MARZO_2018.pdf	28/09/2018
95	I6. DEVENGADO ESIGEF ABRIL 2018	I6._DEVENGADO_ESIGEF_ABRIL_2018.pdf	28/09/2018
96	I7. DEVENGADO ESIGEF MAYO 2018	I7._DEVENGADO_ESIGEF_MAYO_2018.pdf	28/09/2018
97	I8. DEVENGADO ESIGEF JUNIO 2018	I8._DEVENGADO_ESIGEF_JUNIO_2018.pdf	28/09/2018
98	I9. DEVENGADO ESIGEF JULIO 2018	I9._DEVENGADO_ESIGEF_JULIO_2018.pdf	28/09/2018
99	INFORME ARCHIVO EJECUTIVO DEL NOV 2011 AL NOV 2012	RESUMEN_EJECUTIVO_____nov_2011_a_nov_2012.docx	28/01/2013
100	informe de gasto enero - diciembre 2013	informe_de_gasto_enero-_diciembre.pdf	08/01/2014
101	informe de gasto enero - noviembre 2013	informe_de_gasto_enero_-_noviembre_2013.pdf	09/12/2013
102	informe de gasto enero - septiembre 2013	informe_de_gasto_enero_-_septiembre_2013.pdf	07/10/2013
103	informe sitop octubre 2013 av. Eloy Alfaro	GestionReporteFN_elay_alfaro.pdf	05/11/2013
104	INFORME TECNICO DEL ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO 15 DE MARZO	INFORME_TECNICO_15_DE_MARZO_MTOP-CON_ESM-2013-177-ME.pdf	30/08/2013
105	informe tecnico sitop octubre 2013 av. Colón	GestionReporteF_Colon.pdf	05/11/2013
106	informe tecnico sitop septiembre 2013 av. Eloy Alfaro	informe_sitop_septiembre_2013_av._Eloy_Alfaro.pdf	07/10/2013
107	informe tecnico sitop septiembre 2013 av. Colón	informe_sitop_septiembre_2013_av._colón.pdf	07/10/2013
108	J1. DEVENGADO ESIGEF AGOSTO 2018	J1._DEVENGADO_ESIGEF_AGOSTO_2018.pdf	28/09/2018
109	MANTENIMIENTO MES DE JUNIO 2013	MANTENIMIENTO_VIAL_MES_DE_JUNIO.pdf	05/07/2013
110	Material de mejoramiento barrio 24 de mayo	DSC01859.JPG	05/12/2012
111	Material de mejoramiento barrio 24 de mayo	DSC01865.JPG	05/12/2012
112	muro gaviones protección puente sobre el rio blanco	DSC02615.JPG	10/01/2013
113	pintura estructura metálica del puente sobre el rio blanco	DSC02839.JPG	10/01/2013
114	REINICIO DE LOS TRABAJOS DE LA AV. COLON	REINICIO_COLON.pdf	02/12/2013
115	REINICIO DE LOS TRABAJOS EN LA AV. ELOY ALFARO	REINICIO_DE_ELOY_ALFARO.pdf	02/12/2013
116	Samblasting estructura metálica	DSC03998.JPG	10/01/2013
117	Samblasting estructura metálica puente	DSC03658.JPG	10/01/2013
118	Samblasting estructura metálica puente	DSC03998.JPG	10/01/2013
119	Samblasting estructura metálica puente viche	DSC00178.JPG	10/01/2013
120	señalización 24 mayo	IMG-20130605-00125.jpg	05/06/2013
121	tendido y compactación barrio 24 de mayo	DSC01798.JPG	10/01/2013
122	tirantes para sumidero	IMG-20130216-00459.jpg	12/04/2013
123	trabajos av. colon	SAM_0148.JPG	12/04/2013
124	trabajos Av. Colon	SAM_0008.JPG	12/04/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	Líder de Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	galdas@mtop.gob.ec	023974600
Ortiz Campos, Lenin Herminio	Administrador del Proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Esmeraldas	lortiz@mtop.gob.ec	
Rezabala Zamora, Maritza Del Carmen	Supervisora Financiera	Supervisora Financiera de Esmeraldas	mrezabala@mtop.gob.ec	0988270005

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
18111_1.jpg	06/10/2015
