

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 2**  
**Dirección Provincial Napo**

**PROYECTO: K048** MTOP - Mantenimiento vial de la provincia de Napo - Vía los Zorros correspondiente al tramo: Campococha y de Santa Rosa Alto Unión Lojana límite provincial de Orellana RVE E436 cantón Tena provincia de Napo.

|                                |  |                                 |                         |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Caiza Yungan, Klever Javier (kcaiza@mtop.gob.ec) |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Mieles Zambrano, Ramon Gonzalo                   | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Coello Lopez, German Vinicio                     | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura                                  | Retorno Económico:              | 1.26                    |
| CUP:                           | 175200000.0000.385247                            | TIR:                            | 21.41 %                 |
| Objetivos Operativos:          | 1  | VAN:                            | 425,500.07              |
| Viabilidad Técnica:            | Media  | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 1,845,213.92            |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                 |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |  | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 23/10/2019 - 31/12/2022 |
| Fecha de última actualización: | 02/09/2021                                       | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2021              |
| Modificado por:                | Caiza Yungan, Klever Javier                      | Fecha del siguiente Hito:       | 15/06/2021              |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN:**

El mantenimiento de la vía Los Zorros, es un importante instrumento, que permite mejorar las condiciones de la infraestructura vial, optimizando los niveles de servicio y estándar de la vía para beneficio de los usuarios.  
 Las vías en buenas condiciones ayudan a mejorar la seguridad vial; una cuestión que cada vez preocupa más en el país.  
 Las afectaciones del tramo vial de la vía E436 son ocasionadas por las condiciones climáticas propias de la región, pluviosidad muy alta en la mayor parte del año, identificándose problemas de socavación e inestabilidad a lo largo de toda la Red Vial Estatal, deterioro de la capa de rodadura, asentamientos y arrastre de material fino.

Contratista: CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y SERVICIOS YANOUCHE Y CIA "COMASEY Y CIA"

Representante Legal: Sr. Patricio Emilio Yanouch Páez

Fiscalizador: Ing. Patricio Jaime Ñamo Guamán

Supervisor: Ing. Klever Javier Caiza Yungán

Administrador del Contrato Ing. Esteban Alejandro Pita Suárez

Monto: USD. 1'611.467,25 (más IVA)

**LÍNEA BASE DEL PROYECTO:**

El ancho de la vía que se va a mejorar es de 6 metros aproximadamente.

El tiempo de viaje desde la "Y" de Ahuano hasta el Límite Provincial con Orellana es de 2 horas aproximadamente.

**OBJETIVO GENERAL:**

Mantener en buen estado la Red Vial Estatal RVE 436, correspondiente a los tramos: Campococha-"Y" de Santa Rosa Alto y Unión Lojana - Límite Provincial de Orellana.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- .Realizar trabajos de mantenimiento de la Vía, ya que debido al continuo tráfico vehicular pesado, se encuentran en mal estado.
- .Dar solución técnica de los puntos de intervención identificados.
- .Realizar trabajos de drenaje para que la afectación de la vía, sea mínima.
- .Mejorar el nivel de servicio que se brinda a los usuarios que hacen uso de la vía, para garantizar y recuperar los niveles de seguridad de la carretera y evitar posibles pérdidas humanas y económicas.
- .Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades asentadas en la franja de la vía, fomentar el desarrollo turístico e intercultural de la región amazónica.
- .Contribuir al desarrollo local, a través de la gestión del transporte multimodal, dinamizando los medios de movilidad terrestre, aérea y fluvial entre las provincias de Napo y Orellana, con los diferentes destinos locales e internacionales.

**PRODUCTO:**

Mejorar la infraestructura vial del TRAMO 1: CAMPOCOCHA - "Y" DE SANTA ROSA ALTO; TRAMO 2: UNIÓN LOJANA - LÍMITE PROVINCIAL CON ORELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL E436, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 53,90 KM UBICADA EN

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

EL CANTÓN TENA DE LA PROVINCIA DE NAPO" y mantener un tráfico permanente durante todo el año, permitiendo la integración regional y nacional de esta zona del país.

**ESTRATEGIA:**

- 1.- Supervisión técnica permanente.
- 2.- Disponibilidad de partida presupuestaria.
- 3.- Pago oportuno de las Planillas de Avance de Obra.
- 4.- Seguimiento al cronograma valorado de trabajos.
- 5.- Aseguramiento del control de calidad.

**Beneficios Cualitativos**

Se disminuirá el riesgo de accidentes debido a la vía angosta para el paso vehicular. La calidad de la infraestructura vial mejorará el servicio a la circulación vehicular. Influirá en beneficio del desarrollo de las comunidades del sector al disminuir los tiempos de movilización de mercadería, personal, turismo y comercio.

**Tipo de Beneficiario**

Del sector petrolero, agrónomo y ganadero. En beneficio de las comunidades de las parroquias de Puerto Napo, Puerto Misahuallí, Ahuano y Chontapunta.

**Restricciones**

**TIEMPO:** El proyecto tendrá una duración de 90 días calendario.

**COSTO:** Valor monetario del presupuesto límite previsto para su realización será de USD. 1'611.457,25 más IVA.


**ALCANCE:** Las especificaciones que regirán el Proyecto contratado por medio del MTOP Napo serán las "ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES" (MOP-001-F 2002).

**RECURSOS:** La mano de obra calificada requerida para la Ejecución del Proyecto considerando la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberán acreditar, ya sea en años o monto de proyectos en los que haya participado. Los Equipos y Materiales utilizados son de excelente calidad y rendimientos con el fin de desarrollar de manera efectiva y en el plazo estimado, contribuyendo al desarrollo del País con obras emblemáticas.

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



**Transcurrido:** 60.81 %  
**Fecha de Inicio:** 23/10/2019    **Fecha de Fin:** 31/12/2022

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



**Porcentaje de Avance**

| Año    | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
|--------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2021   | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|        | 80 %                        | 80 % | 80 % | 82 % | 86 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % |
|        | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|        | 80 %                        | 80 % | 80 % | 82 % | 86 % |      |      |      |      |      |      |      |
| Estado |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|        | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    |      |      |      |      |      |      |      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| <p>AGOSTO 2021: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-21-178-OF, de fecha 16 de agosto de 2021, suscrito por el Ing. German Vinicio Coello Lopez, en calidad de Administrador del Contrato, solicita a la Srta. Rita Irene Tunay Shiguango, Prefecta Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, se realice el trámite correspondiente ante el Ministerio Sectorial a fin de que se solicite la AMPLIACIÓN DEL OBJETO de las resoluciones otorgados a los libres aprovechamientos "NUEVO PARAISO GADP NAPO" CÓD. 100000525, "SAN CRISTÓBAL GADP DE NAPO" CÓD. 100000513 y "30 DE AGOSTO CÓD. 100000280, ubicados en la parroquia Chontapunta del cantón Tena, Provincia de Napo.</p> <p>Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-21-111-OF, de fecha 10 de junio de 2021, el Ing. Rolando Alberto Villacís Miranda, en calidad de Administrador del Contrato, notifica al Sr. Patricio Emilio Yanouch Páez, Representante Legal de la Empresa COMASEY Y CIA., la suspensión de plazo a partir del 28 de mayo de 2021 hasta que se autorice el ingreso a los libres aprovechamientos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo para realizar la extracción y procesamiento de los agregados pétreos necesarios para cumplir con el objeto del contrato.</p> | Caiza Yungan, Klever Javier | 02/09/2021 - 08:45 AM         |
| <p>JULIO 2021: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-21-111-OF, de fecha 10 de junio de 2021, el Ing. Rolando Alberto Villacís Miranda, en calidad de Administrador del Contrato, notifica al Sr. Patricio Emilio Yanouch Páez, Representante Legal de la Empresa COMASEY Y CIA., la suspensión de plazo a partir del 28 de mayo de 2021 hasta que se autorice el ingreso a los libres aprovechamientos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo para realizar la extracción y procesamiento de los agregados pétreos necesarios para cumplir con el objeto del contrato.</p> <p>Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-21-100-OF, de fecha 07 de junio de 2021, el Ing. Rolando Alberto Villacís Miranda, en calidad de Administrador del Contrato, solicita a la Srta. Rita Irene Tunay Shiguango, Prefecta Provincial, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, la autorización de la ampliación de plazo de los libres aprovechamientos "NUEVO PARAÍSO GADP NAPO" COD. 100000525, "SAN CRISTÓBAL GADP NAPO" COD. 100000513 Y "30 DE AGOSTO GAP NAPO" COD. 100000280</p>   | Caiza Yungan, Klever Javier | 03/08/2021 - 09:41 AM         |
| <p>JUNIO 2021: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-21-111-OF, de fecha 10 de junio de 2021, el Ing. Rolando Alberto Villacís Miranda, en calidad de Administrador del Contrato, notifica al Sr. Patricio Emilio Yanouch Páez, Representante Legal de la Empresa COMASEY Y CIA., la suspensión de plazo a partir del 28 de mayo de 2021 hasta que se autorice el ingreso a los libres aprovechamientos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo para realizar la extracción y procesamiento de los agregados pétreos necesarios para cumplir con el objeto del contrato.</p> <p>Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-21-100-OF, de fecha 07 de junio de 2021, el Ing. Rolando Alberto Villacís Miranda, en calidad de Administrador del Contrato, solicita a la Srta. Rita Irene Tunay Shiguango, Prefecta Provincial, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, la autorización de la ampliación de plazo de los libres aprovechamientos "NUEVO PARAÍSO GADP NAPO" COD. 100000525, "SAN CRISTÓBAL GADP NAPO" COD. 100000513 Y "30 DE AGOSTO GAP NAPO" COD. 100000280</p>   | Caiza Yungan, Klever Javier | 02/07/2021 - 10:48 AM         |
| <p>JUNIO 2021: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-21-95-OF, de fecha 02 de junio de 2021, el Ing. Rolando Alberto Villacís Miranda, en calidad de Administrador del Contrato, notifica al Sr. Patricio Emilio Yanouch Páez, Representante Legal de la Empresa COMASEY Y CIA., la suspensión temporal de plazo a partir del 28 de mayo de 2021 hasta que se autorice el ingreso a los libres aprovechamientos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo para realizar la extracción y procesamiento de los agregados pétreos necesarios para cumplir con el objeto del contrato.</p>   | Caiza Yungan, Klever Javier | 04/06/2021 - 03:54 PM         |
| <p>ABRIL 2021: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-21-71-OF, de fecha 28 de abril de 2021, el Ing. Patricio Jaime Ñamo Guamán, en calidad de Fiscalizador, devuelve al Sr. Patricio Emilio Yanouch Páez, Representante Legal de la Empresa COMASEY Y CIA., la Planilla de Avance de Obra No. 02 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del 2021 con la finalidad de que se realice las respectivas correcciones.</p> <p>Se realizó la Ampliación de Plazo No. 01 por un plazo de 60 días calendario, es decir, desde el 29 de abril hasta el 27 de junio de 2021.</p>   | Caiza Yungan, Klever Javier | 03/05/2021 - 04:08 PM         |
| <p>MARZO 2021: Mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2021-521-ME, de fecha 26 de marzo de 2021, el Ing. Esteban Alejandro Pita Suárez, Administrador del Contrato, tramita la Planilla de Avance de Obra No. 01 por el periodo del 10 al 15 de noviembre de 2020 y desde el 04 al 28 de febrero de 2021, y un monto que asciende a USD. 889.655,16 más IVA.</p> <p>Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-ALZ-2021-020-O, de fecha 03 de febrero de 2021, el Ing. Esteban Alejandro Pita Suárez, Administrador del Contrato, informa al Sr. Patricio Yanouch, Gerente COMASEY Cía. el reinicio de los trabajos toda vez que se encuentra acreditado el anticipo correspondiente al 40% del monto contractual.</p>   | Caiza Yungan, Klever Javier | 01/04/2021 - 09:34 AM         |
| <p>FEBRERO 2021: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-ALZ-2021-020-O, de fecha 03 de febrero de 2021, el Ing. Esteban Alejandro Pita Suárez, Administrador del Contrato, informa al Sr.</p>  | Caiza Yungan, Klever Javier | 05/03/2021 - 09:41 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| <p>Patricio Yanouch, Gerente COMASEY Cía. el reinicio de los trabajos toda vez que se encuentra acreditado el anticipo correspondiente al 40% del monto contractual.</p> <p>Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-ALZ-2020-001-O, de fecha 16 de noviembre de 2020, el Ing. Esteban Alejandro Pita Suárez, Administrador del Contrato, informa al Sr. Patricio Yanouch, Gerente COMASEY Cía. la suspensión del proyecto.</p> <p>Con fecha 09 de noviembre de 2020, se legaliza el contrato entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Contratista CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y SERVICIOS YANOUCI CIA. (COMASEY CIA.)</p> |                             |                               |
| <p>ENERO 2021: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-ALZ-2020-001-O, de fecha 16 de noviembre de 2020, el Ing. Esteban Alejandro Pita Suárez, Administrador del Contrato, informa al Sr. Patricio Yanouch, Gerente COMASEY Cía. la suspensión del proyecto.</p> <p>Con fecha 09 de noviembre de 2020, se legaliza el contrato entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Contratista CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y SERVICIOS YANOUCI CIA. (COMASEY CIA.)</p>  | Caiza Yungan, Klever Javier | 05/02/2021 - 12:57 PM         |

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

| Problema   | Fecha de última actualización | Responsable                | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| La temporada invernal CAUSARÍA retrasos en la ejecución de los trabajos programados. | 02/09/2021                    | Klever Javier Caiza Yungan | 10       | 40      | 4            | 0/1                         |

*Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1*

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

| Riesgo  | Fecha de última actualización | Responsable                | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <p><b>5- PROYECTO. Técnico.</b></p> <p>La falta de un estudio técnico CAUSARÍA retraso en la ejecución de los trabajos.</p> | 02/09/2021                    | Klever Javier Caiza Yungan | 20 %         | 30      | 6            | 0/1                         |

*Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1*

**LOCALIDADES**

| Localidad de Impacto |  |
|----------------------|--|
| 1                    | Zona 2 - Centro Norte > Napo > Archidona                 |
| 2                    | Zona 2 - Centro Norte > Napo > Carlos J. Arosamena Tola  |
| 3                    | Zona 2 - Centro Norte > Napo > Tena                      |
| 4                    | Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo |

**HITOS**

| Hito | Categoría  | Fecha Comprometida         | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo   | Hito Cumplido | Avance Físico |     |
|------|--|----------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-----|
| 1    | DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado | 1-Solicitud de Información | 23/10/2019     |            | 23/10/2019 |               | Sí            | 8.0 |
| 2    | DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado                         | 1-Solicitud de Información | 12/12/2019     |            | 12/12/2019 |               | Sí            | 2.0 |
| 3    | PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida                       | 1-Solicitud de Información | 28/01/2020     |            | 28/01/2020 |               | Sí            | 5.0 |
| 4    | PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido                             | 1-Solicitud de Información | 20/04/2020     |            | 20/04/2020 |               | Sí            | 2.0 |


HITOS

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 5  | PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados  | 1-Solicitud de Información             | 06/08/2020         |                | 06/08/2020 |          | Sí            | 3.0           |
| 6  | EJECUCIÓN: Especificaciones técnicas aprobadas  | 1-Solicitud de Información             | 29/08/2020         |                | 29/08/2020 |          | Sí            | 5.0           |
| 7  | EJECUCIÓN: Aval aprobado  | 1-Solicitud de Información             | 10/09/2020         |                | 10/09/2020 |          | Sí            | 10.0          |
| 8  | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada  | 1-Solicitud de Información             | 10/09/2020         |                | 10/09/2020 |          | Sí            | 10.0          |
| 9  | EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo)  | 1-Solicitud de Información             | 22/09/2020         |                | 22/09/2020 |          | Sí            | 5.0           |
| 10 | EJECUCIÓN: Adjudicación realizada   | 3-Adjudicación                         | 26/10/2020         |                | 26/10/2020 |          | Sí            | 10.0          |
| 11 | EJECUCIÓN: Contrato Principal suscrito  | 3-Adjudicación                         | 09/11/2020         |                | 09/11/2020 |          | Sí            | 20.0          |
| 12 | EJECUCIÓN: Ensanchamiento de vía realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 28/04/2021         |                | 28/04/2021 |          | Sí            | 2.0           |
| 13 | EJECUCIÓN: Cambio de suelo realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 20/05/2021         |                | 20/05/2021 |          | Sí            | 2.0           |
| 14 | EJECUCIÓN: Construcción de Gaviones realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 30/05/2021         |                | 30/05/2021 |          | Sí            | 2.0           |
| 15 | EJECUCIÓN: Instalación de alcantarillas realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 15/06/2021         | 15/06/2021     |            |          | No            | 2.0           |
| 16 | EJECUCIÓN: Mantenimiento de la infraestructura vial ejecutado   | 5-Entregables Intermedios              | 01/07/2021         | 01/07/2021     |            |          | No            | 2.0           |
| 17 | CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados   | 5-Entregables Intermedios              | 02/07/2021         | 02/07/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 18 | CIERRE: Liquidación Económica aprobada  | 5-Entregables Intermedios              | 05/07/2021         | 05/07/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 19 | CIERRE: Acta de Entrega - Recepción Provisional suscrita  | 5-Entregables Intermedios              | 05/07/2021         | 05/07/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 20 | CIERRE: Acta de Entrega - Recepción Definitiva suscrita   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 05/01/2022         | 05/01/2022     |            |          | No            | 1.0           |
| 21 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita   | 9-Entregables Formales                 | 12/01/2022         | 12/01/2022     |            |          | No            | 1.0           |
| 22 | CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado   | 9-Entregables Formales                 | 12/01/2022         | 12/01/2022     |            |          | No            | 2.0           |
| 23 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago, suscrito | 9-Entregables Formales                 | 14/01/2022         | 14/01/2022     |            |          | No            | 1.0           |
| 24 | CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar, suscrito MEF   | 9-Entregables Formales                 | 17/01/2022         | 17/01/2022     |            |          | No            | 1.5           |
| 25 | CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado   | 9-Entregables Formales                 | 19/01/2022         | 19/01/2022     |            |          | No            | 0.5           |

**HITOS**

|    | Hito  | Categoría              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 26 | COMPLETADO: Informe de Cierre de Proyectos (SENPLADES) aprobado | 9-Entregables Formales | 20/01/2022         | 20/01/2022     |            |  | No            | 0.0           |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador                      | Estado  | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--------------------------------|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de kilómetros atendidos |  | 100.00 %          | 2    | 2                     | 03/02/2021      | Abr-Jun                    |


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 644,586.90      |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,845,213.92 ** |
| Costo Total:                  | 1,845,213.92    |
| Total Devengado:              | 1,220,715.80    |
| % Costo Total Devengado:      | 66.16 %         |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 66.16 %

**Perfil Económico 2021**

|   | Años Previos | Año Actual (2021) | Años Futuros | Total        |
|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado  | 0.00         | 1,845,213.92      | 0.00         | 1,845,213.92 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 0.00         | 1,845,213.92      | 0.00         | 1,845,213.92 |
| Ppto. Codificado  | 1,845,213.92 | 1,845,213.92      | 0.00         | 3,690,427.84 |
| Ppto. Comprometido                                      | 1,804,843.32 | 0.00              | 0.00         | 1,804,843.32 |
| Planeado - Codificado (2021)                            |              | 0.00              |              |              |
| Programado a Devengar                                   | 1,845,213.92 | 1,845,213.92      | 0.00         | 3,690,427.84 |
| Ppto. Devengado   | 0.00         | 1,220,715.80      | 0.00         | 1,220,715.80 |
| Pagado Real   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Estimado a fin de año                                   | * 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 1,845,213.92 | 1,845,213.92      | 0.00         | 3,690,427.84 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 0.00 %     | 66.16 %           | 0.00 %       | 33.08 %      |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021**

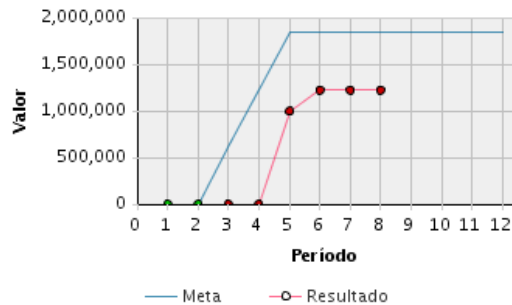

**Presupuesto Mensual 2021**

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 0.00 %       |



| Presupuesto Mensual 2021 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |
| Mar                      | 615,071.31                 | 0.00                | 615,071.31                   | 0.00                  | 0.00 %           |        | 0.00 %       |
| Abr                      | 615,071.31                 | 0.00                | 1,230,142.62                 | 0.00                  | 0.00 %           |        | 0.00 %       |
| May                      | 615,071.30                 | 996,413.78          | 1,845,213.92                 | 996,413.78            | 54.00 %          |        | 54.00 %      |
| Jun                      | 0.00                       | 224,302.02          | 1,845,213.92                 | 1,220,715.80          | 66.16 %          |        | 66.16 %      |
| Jul                      | 0.00                       | 0.00                | 1,845,213.92                 | 1,220,715.80          | 66.16 %          |        | 66.16 %      |
| Ago                      | 0.00                       | 0.00                | 1,845,213.92                 | 1,220,715.80          | 66.16 %          |        | 66.16 %      |
| Sep                      | 0.00                       |                     | 1,845,213.92                 |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 0.00                       |                     | 1,845,213.92                 |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 0.00                       |                     | 1,845,213.92                 |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 0.00                       |                     | 1,845,213.92                 |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>1,845,213.92</b>        | <b>1,220,715.80</b> |                              |                       |                  |        |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |  |
|----------------------|--|
| 13                   | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                      | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 1  | A1. CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA VÍA LOS ZORROS             | A1._CONTRATO_MANTENIMIENTO_DE_LA_VÍA_LOS_ZORROS.pdf             | 05/03/2021    |
| 2  | A2. MTOP-DDN-ALZ-2020-001-O (SUSPENSIÓN LOS ZORROS)         | A2._MTOP-DDN-ALZ-2020-001-O_(SUSPENSIÓN_LOS_ZORROS).pdf         | 05/02/2021    |
| 3  | A3. CÉDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2021                        | A3._CÉDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO_2021.pdf                        | 05/03/2021    |
| 4  | A4. CÉDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2021                      | A4._CÉDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO_2021.pdf                      | 05/03/2021    |
| 5  | A5. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN                              | A5._RESOLUCIÓN_DE_ADJUDICACIÓN.pdf                              | 05/03/2021    |
| 6  | A6. CÉDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2021                        | A6._CÉDULA_PRESUPUESTARIA_MARZO_2021.pdf                        | 01/04/2021    |
| 7  | A7. MTOP-DDN-2021-521-ME (PLANILLA No. 01)                  | A7._MTOP-DDN-2021-521-ME_(PLANILLA_No._01).pdf                  | 01/04/2021    |
| 8  | A8. CÉDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2021                        | A8._CÉDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL_2021.pdf                        | 03/05/2021    |
| 9  | A9. CONTRATO MODIFICATORIO MANTENIMIENTO VÍA LOS ZORROS     | A9._CONTRATO_MODIFICATORIO_MANTENIMIENTO_VÍA_LOS_ZORROS.pdf     | 03/05/2021    |
| 10 | Actualización de HITOS_20-04-2021                           | Actualización_de_HITOS_20-04-2021.pdf                           | 20/04/2021    |
| 11 | B1. INFORME EJECUTIVO VÍA LOS ZORROS ABRIL 2021 FIRMADO     | B1._INFORME_EJECUTIVO_VÍA_LOS_ZORROS_ABRIL_2021_FIRMADO.pdf     | 03/05/2021    |
| 12 | B2. CÉDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2021                         | B2._CÉDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL_2021.pdf                        | 04/06/2021    |
| 13 | B3. INFORME EJECUTIVO VÍA LOS ZORROS MAYO 2021 FIRMADO      | B3._INFORME_EJECUTIVO_VÍA_LOS_ZORROS_MAYO_2021_FIRMADO.pdf      | 04/06/2021    |
| 14 | B4. MTOP-DDN-21-100-OF (LIBRES APROVECHAMIENTOS)            | B4._MTOP-DDN-21-100-OF_(LIBRES_APROVECHAMIENTOS).pdf            | 02/07/2021    |
| 15 | B5. MTOP-DDN-21-111-OF (SUSPENSIÓN No. 3)                   | B5._MTOP-DDN-21-111-OF_(SUSPENSIÓN_No._3).pdf                   | 02/07/2021    |
| 16 | B6. CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2021                        | B6._CÉDULA_PRESUPUESTARIA_JUNIO_2021.pdf                        | 02/07/2021    |
| 17 | B7. CÉDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2021                        | B7._CÉDULA_PRESUPUESTARIA_JULIO_2021.pdf                        | 03/08/2021    |
| 18 | B8. MTOP-DDN-21-178-OF (AMPLIACIÓN LIBRES APROVECHAMIENTOS) | B8._MTOP-DDN-21-178-OF_(AMPLIACIÓN_LIBRES_APROVECHAMIENTOS).pdf | 02/09/2021    |
| 19 | B9. CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2021                       | B9._CÉDULA_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2021.pdf                       | 02/09/2021    |



**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                               | Rol                        | Puesto   | Correo Electrónico      | Teléfono(s) |
|--------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------|
| Caiza Yungan, Klever Javier          | Supervisor                 | Analista de Infraestructura Distrital 2                    | kcaiza@mtop.gob.ec      | Ext: 23912  |
| Coello Lopez, German Vinicio         | Administrador del Contrato | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Napo | gvcoello@mtop.gob.ec    |             |
| Mieles Zambrano, Ramon Gonzalo       | Ordenador de Gasto         | Subsecretario Zonal 2                                      | rmieles@mtop.gob.ec     |             |
| Velastegui Nagua, Jefferson Fabricio | Financiero (Encargado)     | Analista Administrativo Financiero, Encargado              | jvelastegui@mtop.gob.ec | 0992900275  |

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

| Archivo      | Fecha de Alta |
|--------------|---------------|
| 142958_1.jpg | 03/05/2021    |
