

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas

Dirección Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas

PROYECTO: K002 Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad

Líder del Proyecto:	Alvarez Ramos, Francisco Paul (falvarez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santamaria Loor, Kiura Ninoska	Programas Relacionados:	
Titular:	Santamaria Loor, Kiura Ninoska	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91400000.578.6088	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	25,556.75
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	06/05/2014 - 31/12/2024
Fecha de última actualización:	01/11/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2024
Modificado por:	Becerra Albuja, Carlos Javier	Fecha del siguiente Hito:	02/12/2022

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: El 13 de diciembre de 2010, la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato de Préstamo No. 2340/OC-EC por el valor de USD. \$79'560.000,00 para financiar el Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad, en el que se establece al Ministerio de Educación como Organismo Ejecutor.

Producto / Servicio: Reconstrucción, ampliación y equipamiento de 20 escuelas en las parroquias seleccionadas permitiendo con ello asegurar la oferta educativa completa e integral.

Línea Base: En función del re ordenamiento de la oferta educativa, el Ministerio de Educación ha definido la intervención en infraestructura educativa en todo el territorio nacional mediante la implementación de nuevas tipologías que determinan una intervención integral en los establecimientos ejes, que luego del proceso constructivo, funcionarán en su totalidad de acuerdo a su planificación.

El objetivo general del Programa es mejorar la oferta educativa del sistema educativo ecuatoriano en aquellas parroquias que presenten altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mayores déficits de oferta educativa, y ubicadas preferentemente en zonas rurales y urbano marginales.

El objetivo específico es el de ejecutar el Subcomponente 1.2 "Mejoramiento de la Oferta Educativa" financiado con el Contrato del Préstamo BID 2340/OC-EC, a través de la participación del SECOB en la ejecución de las etapas precontractual, contractual y administración de contratos, para la construcción, fiscalización y entrega de las obras de infraestructura física contempladas en el Programa.

Beneficios Cualitativos

Garantizar una oferta educativa completa, inclusiva, de calidad y eficiente en función de las características de la población, en base al nuevo Modelo de Gestión Educativa, impulsando un proceso de reordenamiento de la oferta educativa con la finalidad de mejorar la calidad, cobertura y eficiencia del servicio educativo en base a criterios y lineamientos técnicos.

Mejoramiento de la oferta educativa (infraestructura y equipamiento) en las parroquias priorizadas. Su objetivo es apoyar la reconstrucción, ampliación y equipamiento de 20 escuelas en las parroquias seleccionadas permitiendo con ello asegurar la oferta completa e integral.

Tipo de Beneficiario

El proyecto "Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad" esta destinado a la población de aquellas parroquias que presentan altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mayores déficits de oferta educativa, y ubicadas preferentemente en zonas rurales y urbano marginales.

La población de referencia en los circuitos pertenecientes a las parroquias seleccionadas por el Programa tiene un total de 262.678 habitantes entre hombres y mujeres en un rango de edad de 0 a 120 años.

Beneficiarios Programa:
 Beneficiarios Directos: 18.030 estudiantes.
 Beneficiarios Indirectos: 244.648 habitantes.

Tipo de Beneficiario

Fuente: PNIUECE

Restricciones

Tiempo: Se ha estimado su cierre para el año 2024 dando una vigencia para el proyecto de 10 años.

El proyecto estaba sujeto al plazo de vigencia del Contrato del Préstamo BID No. 2340/OC-EC para la ejecución del Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad. Por persistir las necesidades institucionales, fue necesario extender la vigencia del proyecto.

Costo: MINEDUC deberá gestionar y realizar la transferencia necesaria, oportuna y suficiente de los recursos para la contratación de estudios autorizados, obras y administración de contratos, más el valor correspondiente del 12% del Impuesto al Valor Agregado IVA.


Alcance: Asumir y ejecutar las etapas precontractual y contractual de los procedimientos de contratación de estudios (de ser del caso), construcción y fiscalización de 20 unidades educativas con recursos del Préstamo BID No. 2340/OC-EC, con apego a los diseños, términos de referencia y demás documentos aprobados por el MINEDUC, hasta la suscripción de actas de entrega recepción y liquidación de los contratos respectivos.

Recursos: Personal Técnico especializado.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 79.66 %
 Fecha de Inicio: 06/05/2014 Fecha de Fin: 31/12/2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

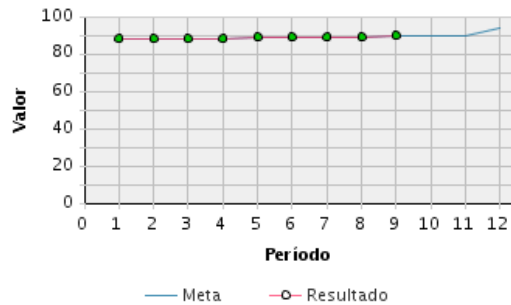

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	88 %	88 %	88 %	88 %	89 %	89 %	89 %	89 %	90 %	90 %	90 %	94 %
	Avance real acumulado											
	88 %	88 %	88 %	88 %	89 %	89 %	89 %	89 %	90 %			
2022	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2022:</p> <p>1. Anexo 6. Mediante memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0600-ME del 28 de septiembre de 2022 el Arq. Juan Carlos Prado Leverone, Director Nacional de Producción de Obras Públicas en función de sus competencias remitió la información correspondiente a los contratos de obra pública ligados a este proyecto de inversión. De la información remitida se destaca lo siguiente:</p> <p>HITO 6. Se adiciona a los 2 contratos de obra terminados por mutuo acuerdo correspondientes al Hito 6, el contrato No. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-009-2014 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MENOR EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 28 DE SEPTIEMBRE EN LA PARROQUIA MALIMPIA CANTON QUININDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDA cuya Resciliación: TERM. MUTUO-ACUERDO-SECOB-2015-022 fue suscrita el 10</p>	Alvarez Ramos, Francisco Paul	28/10/2022 - 04:32 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de julio de 2015 en base al oficio No. MINEDUC-ME-2015-00310-OF del 11 de junio de 2015 con el cual el MINEDUC solicitó no continuar con el proceso de licitación de la UEM 28 de Septiembre ya que tendrá otro tipo de inversión.</p> <p>Anexo 7. Mediante oficio Nro. MINEDUC-VGE-2019-00079-OF del 13 de noviembre de 2019, el Ing. Vinicio Napoleón Baquero Ordoñez entonces Viceministro de Gestión Educativa como pronunciamiento respecto a la construcción de la UEM Siberia informó: (") La Coordinación General de Planificación a través de la Dirección Nacional de Planificación en el ámbito de las competencias de oferta y demanda educativa, determina a esta Institución Educativa no priorizada para nueva infraestructura."</p> <p>A. Contratos de obra cerrados económica y administrativamente: A1. UEM MAYOR - JAIME ROLDOS - ORELLANA A2. UEM MENOR - CHONE - COTOPAXI A3. UEM MENOR - CHARLES DARWIN (CANCHAGUA) - COTOPAXI A4. UEM MENOR - 27 DE FEBRERO - CHIMBORAZO A5. UEM MENOR - CIUDAD DE PEDERNALES - MANABI A6. UEM MENOR - 28 DE SEPTIEMBRE - ESMERALDAS A7. UEM MENOR - LA SIBERIA - MANABI</p> <p>2.Anexo 8. Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-2108-ME del 18 de octubre de 2022, el Ing. Andrés Bayardo Estrella Jaramillo, Especialista de Estudios en representación de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas indicó: (") "me permito informar que una vez analizada, la información de la que se dispone dentro de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas y revisada la matriz de contratos de estudios no se encuentra proceso alguno vinculado al proyecto de inversión "Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad", y que tiene como número de CUP: 91400000.5786088.</p> <p>Es importante puntualizar que al momento no existe una designación por parte de la Dirección de Estudios en torno al nombramiento del Administrador de convenio del mencionado Proyecto."</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2022: 1. Antecedentes desde 2014.</p> <p>HITO 1. El 6 de mayo de 2014 se suscribe el Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Educación cuyo objeto es: "las partes convienen en aunar esfuerzos y cooperar en el ámbito de sus competencias a fin de ejecutar el Subcomponente 1.2 "Mejoramiento de la Oferta Educativa" financiado por el Contrato de Préstamo No. 2340/OC-EC con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (Anexo 1).</p> <p>HITO 2. Entre el 1 de abril y el 21 de septiembre del 2015 se suscriben 9 contratos de obra para la construcción de 9 Unidades Educativas del Milenio.</p> <p>HITO 3. Entre el 29 de septiembre del 2015 y el 25 de abril de 2017 se suscriben 9 contratos para la fiscalización de 9 Unidades Educativas del Milenio.</p> <p>2. RESUMEN - ESTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y FISCALIZACIÓN</p> <p>HITO 4. Recepción de Pleno Derecho de Obra: 02/OCT/2018 UEM MENOR - JOSE DE SAN MARTIN - LOS RIOS</p> <p>HITO 5. Terminación por Mutuo Acuerdo de Fiscalización: 30/SEPT/2017 UEM MENOR - 12 DE OCTUBRE - MANABI 04/OCT/2018 UEM MENOR - ALFREDO MONGUE VELA - CHIMBORAZO 15/OCT/2018 UEM MENOR - LA SIBERIA - MANABI</p> <p>HITO 6. Terminación por Mutuo Acuerdo de Obra: 27/AGO/2018 UEM MENOR - 12 DE OCTUBRE - MANABI 11/DIC/2018 UEM MENOR - LA SIBERIA - MANABI</p> <p>HITO 7. Recepción Definitiva de Obra: 30/JUN/2017 UEM MENOR - CHONE - COTOPAXI 29/MAR/2018 UEM MENOR - CIUDAD DE PEDERNALES - MANABI 10/MAY/2018 UEM MENOR - CHARLES DARWIN (CANCHAGUA) - COTOPAXI 07/JUN/2018 UEM MAYOR - JAIME ROLDOS - ORELLANA 28/SEPT/2018 UEM MENOR - 27 DE FEBRERO - CHIMBORAZO 28/ENE/2019 UEM MENOR - SIMON BOLIVAR (PIMOCHA) - LOS RIOS</p>	<p>Alvarez Ramos, Francisco Paul</p>	<p>05/10/2022 - 03:28 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>HITO 8. Recepción Única de Fiscalización: 12/JUN/2018 UEM MENOR - CHARLES DARWIN (CANCHAGUA) - COTOPAXI 05/JUL/2018 UEM MAYOR - JAIME ROLDOS - ORELLANA 01/MAY/2019 UEM MENOR - SIMON BOLIVAR (PIMOCHA) - LOS RIOS 11/JUN/2019 UEM MENOR - 27 DE FEBRERO - CHIMBORAZO</p> <p>HITO 9. El 19 de mayo de 2020, mediante Decreto Ejecutivo No. 1063, en la Disposición General Primera, establece: Una vez concluido el proceso de supresión, todas las competencias que le correspondían al Servicio de Contratación de Obras serán asumidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.</p> <p>3. El 8 de septiembre de 2020, mediante ACUERDO MINISTERIAL N° 23 - 2020, en el Artículo 1, se establece: "Delegar a los Subsecretarios Zonales, para que, designen los administradores, fiscalizadores y supervisores de los contratos del Servicio de Contratación de Obras SECOB que fueron absorbidos por esta Cartera de Estado, en las circunscripciones que correspondan;" (Anexo 2).</p> <p>4. El 20 de septiembre de 2021 mediante memorando Nro. MTOP-SOP-2021-0797-ME, el entonces Subsecretario de Obras Públicas designó a la Arq. María Cristina Junco Noboa como Administradora de los Convenios Interinstitucionales suscritos entre el ex SECOB y MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (Anexo 3).</p> <p>HITO 10. El 20 de mayo de 2022 mediante oficio Nro. SNP-SPN-2022-0789-OF la Secretaria Nacional de Planificación emite el criterio favorable de inclusión del proyecto de inversión "Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad", en el PAI 2022 del MTOP, así como para la transferencia de recursos por un monto de 389.576,52 USD.</p> <p>5. Acciones - Septiembre 2022: 5.1. Mediante memorando No. MTOP-SOP-2022-1211-ME del 06 de septiembre de 2022, se designa como líder del proyecto del Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad en la herramienta GPR, al Arq. Francisco Álvarez Ramos. (Anexo 4).</p> <p>HITO 11. Mediante memorando No. MTOP-SOP-2022-1276-M del 19 de septiembre de 2022, se solicitó información a las diferentes direcciones de la Subsecretaría de Obras Públicas referente al estado actualizado del Proyecto de Inversión con la finalidad de consolidar la información del estado los contratos y trámites pendientes para el cierre del proyecto.</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de información y documentos de respaldo del proyecto	05/10/2022	Francisco Paul Alvarez Ramos	10	10	1	1/2

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. Falta de gestión en territorio CAUSARÍA retraso en las liquidaciones y cierre del proyecto.	29/09/2022	Francisco Paul Alvarez Ramos	10 %	10	1	1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Quininde
2	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Loreto
3	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Colta
4	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Guamote
5	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Pujili
6	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Saquisilí
7	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales
8	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Babahoyo
9	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Ventanas

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Servicio de Contratación de Obras suscrito.	1-Solicitud de Información	06/05/2014		06/05/2014		Sí	10.0
2	EJECUCIÓN: 9 Unidades Educativas del Milenio - Contratos de Obra suscritos entre el 1 de abril y el 21 de septiembre del 2015.	4-Inicio de Trabajo	21/09/2015		21/09/2015		Sí	8.0
3	EJECUCIÓN: 9 Unidades Educativas del Milenio - Contratos de Fiscalización suscritos entre el 29 de septiembre del 2015 y el 25 de abril de 2017.	4-Inicio de Trabajo	25/04/2017		25/04/2017		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: UEM MENOR - JOSE DE SAN MARTIN - LOS RIOS Recepción de Pleno Derecho de Obra suscrita	5-Entregables Intermedios	02/10/2018		02/10/2018		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: 3 Unidades Educativas del Milenio - Terminación por Mutuo Acuerdo de contratos de fiscalización suscritas entre el 30 de septiembre de 2017 y el 15 de octubre de 2018.	5-Entregables Intermedios	15/10/2018		15/10/2018		Sí	0.5
6	EJECUCIÓN: 2 Unidades Educativas del Milenio - Terminación por Mutuo Acuerdo de contratos de Obra suscritas entre el 27 de agosto y el 11 de diciembre de 2018	5-Entregables Intermedios	11/12/2018		11/12/2018		Sí	15.5
7	CIERRE: 6 Unidades Educativas del Milenio - Acta de entrega recepción definitiva de los contratos de obra suscritos.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/01/2019		28/01/2019		Sí	45.0
8	CIERRE: 4 Unidades Educativas del Milenio - Actas de entrega recepción única de los contratos de fiscalización suscritas.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	11/06/2019		11/06/2019		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Decreto Ejecutivo No. 1063 suscrito, todas las competencias de	5-Entregables Intermedios	19/05/2020		19/05/2020		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	SECOB son asumidos por el MTOP.							
10	EJECUCIÓN: Recursos presupuestarios asignados para el año 2022.	5-Entregables Intermedios	20/05/2022		20/05/2022		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Solicitud de información y documentación de respaldo a las diferentes direcciones de la Subsecretaría de Obras Públicas.	5-Entregables Intermedios	19/09/2022		19/09/2022		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Avance económico 2022 de los contratos de fiscalización realizada	5-Entregables Intermedios	02/12/2022	02/12/2022			No	1.0
13	EJECUCIÓN: Avance económico 2022 de los contratos de obra realizada	5-Entregables Intermedios	02/12/2022	02/12/2022			No	3.0
14	CIERRE: Cierre administrativo de los contratos de fiscalización realizado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	20/04/2023	20/04/2023			No	1.0
15	CIERRE: Recursos presupuestarios asignados para el año 2023.	5-Entregables Intermedios	22/05/2023	22/05/2023			No	1.0
16	CIERRE: Liquidación económica de los contratos de fiscalización realizada	5-Entregables Intermedios	01/12/2023	01/12/2023			No	1.0
17	CIERRE: Liquidación económica de los contratos de obra realizada	5-Entregables Intermedios	01/12/2023	01/12/2023			No	2.0
18	CIERRE: Informe de cierre del proyecto de inversión suscrito.	9-Entregables Formales	05/12/2023	05/12/2023			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de informes de supervisión para el control y cumplimiento de los contratos de obra pública.		-	-	-	01/10/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	25,556.75 **
Costo Total:	389,576.52
Total Devengado:	14,499.28
% Costo Total Devengado:	3.72 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 3.72 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	389,576.52	0.00	389,576.52
Ppto. Externo Planeado	0.00	389,576.52	0.00	389,576.52
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	389,576.52	0.00	389,576.52
Ppto. Codificado	0.00	389,576.52	0.00	389,576.52
Ppto. Comprometido	0.00	14,499.28	0.00	14,499.28
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	25,556.75	0.00	25,556.75
Ppto. Devengado	0.00	14,499.28	0.00	14,499.28
Pagado Real	0.00	14,499.28	0.00	14,499.28
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	25,556.75	0.00	25,556.75
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	56.73 %	0.00 %	56.73 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

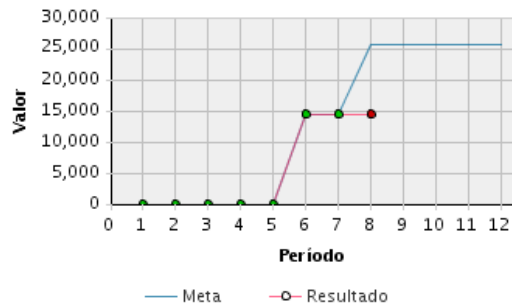

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	14,499.28	14,499.28	14,499.28	14,499.28	100.00 %		56.73 %
Jul	0.00	0.00	14,499.28	14,499.28	100.00 %		56.73 %
Ago	11,057.47	0.00	25,556.75	14,499.28	56.73 %		56.73 %
Sep	0.00		25,556.75				
Oct	0.00		25,556.75				
Nov	0.00		25,556.75				
Dic	0.00		25,556.75				
Total	25,556.75	14,499.28					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la fiscalización de los planes y proyectos de obra pública, MEDIANTE la implementación de procesos de control del cumplimiento del marco legal, normativo y cláusulas del contrato.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1. Hito 1. Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Servicio de Contratación de Obras suscrito.	BID_3_-_CONVENIO.pdf	08/09/2022
2	A.2. Anexo 1. Contrato de Préstamo No. 2340/OC-EC	Contrato-de-prestamo-2340-OC-EC.pdf	27/09/2022
3	A.3. Hito 2. Contrato de obra 1. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2015 UEM MENOR - JOSE DE SAN MARTIN - LOS RIOS	LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2015_Zapotal_Jose_de_San_Martin.pdf	27/09/2022
4	A.4. Hito 2. Contrato de obra 2. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-002-2015 UEM MENOR - SIMON BOLIVAR (PIMOCHA) - LOS RIOS	LPI-SECOB-MINEDUC-BID-002-2015_Simon_Bolivar_-_Pimocha.pdf	27/09/2022
5	A.5. Hito 2. Contrato de obra 3. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-001-2015 UEM MAYOR - JAIME ROLDOS - ORELLANA	CP_-_JAIME_ROLDOS_(1).pdf	30/09/2022
6	A.6. Hito 2. Contrato de obra 4. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014 UEM MENOR - CHONE - COTOPAXI	1.-_CONTRATO_LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014.pdf	30/09/2022
7	A.7. Hito 2. Contrato de obra 5. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-008-2014 UEM MENOR - 27 DE FEBRERO - CHIMBORAZO	1.-_CONTRATO_LPI-SECOB-MINEDUC-BID-008-2014.pdf	30/09/2022
8	A.8. Hito 2. Contrato de obra 6. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-006-2014 UEM MENOR - CIUDAD DE PEDERNALES - MANABI	CONTRATO_LPI-SECOB-MINEDUC-BID-006-2014_CIUDAD_PEDERNALES_(1).pdf	30/09/2022
9	A.9. Hito 2. Contrato de obra 7. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014 UEM MENOR - CHARLES DARWIN (CANCHAGUA) - COTOPAXI	1.-_CONTRATO_LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014.pdf	30/09/2022
10	B.1. Hito 2. Contrato de obra 8. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-009-2014 UEM MENOR - 28 DE SEPTIEMBRE MALIMPIA - ESMERALDAS	3.-LPI-SECOB-MINEDUC-BID-009-2014-28_DE_SEPTIEMBRE_MALIMPIA.pdf	30/09/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	B.2. Hito 2. Contrato de obra 9. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2015 UEM MENOR - 12 DE OCTUBRE - MANABI	CONTRATO_LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2015_12_DE_OCTUBRE.pdf	30/09/2022
12	B.3. Hito 2. Contrato de obra 10. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2014 UEM MENOR - LA SIBERIA - MANABI	CONTRATO_LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2014_LA_SIBERIA.pdf	30/09/2022
13	B.4. Hito 3. Contrato de fiscalización 1. LC-SECOB-BID-11-2015 UEM MAYOR - JAIME ROLDOS - ORELLANA	Contrato_Principal_compressed.pdf	27/09/2022
14	B.5. Hito 3. Contrato de fiscalización 2. LC-SECOB-BID-13-2015 UEM MENOR - 27 DE FEBRERO - CHIMBORAZO	CONTRATO_LC-SECOB-BID-13-2015_(FISC._27_FEBRERO)_102.pdf	27/09/2022
15	B.6. Hito 3. Contrato de fiscalización 3. LC-SECOB-BID-10-2015 UEM MENOR - CHARLES DARWIN (CANCHAGUA) - COTOPAXI	CONTRATO_LC-SECOB-BID-10-2015_compressed.pdf	27/09/2022
16	B.7. Hito 3. Contrato de fiscalización 4. LC-SECOB-BID-12-2015 UEM MENOR - ALFREDO MONGUE VELA - CHIMBORAZO	CONTRATO_LC-SECOB-BID-12-2015_compressed.pdf	27/09/2022
17	B.8. Hito 3. Contrato de fiscalización 5. LC-SECOB-BID-04-2015 UEM MENOR - CIUDAD DE PEDERNALES - MANABI	CONTRATO_LC-SECOB-BID-04-2015_(FISC._CIU._PEDERNALES).pdf	27/09/2022
18	B.9. Hito 3. Contrato de fiscalización 6. LC-SECOB-BID-017-2015 UEM MENOR - 12 DE OCTUBRE - MANABI	Z4_-_Contrato_UEM_12_de_Octubre.pdf	27/09/2022
19	C.1. Hito 3. Contrato de fiscalización 7. LC-SECOB-BID-003-2015 UEM MENOR - JOSE DE SAN MARTIN - LOS RIOS	CONTRATO_No._LC-SECOB-BID-003-2015.pdf	27/09/2022
20	C.2. Hito 3. Contrato de fiscalización 8. LC-SECOB-BID-15-2015 UEM MENOR - SIMON BOLIVAR (PIMOCHA) - LOS RIOS	CONTRATO_No._LC-SECOB-BID-15-2015_compressed.pdf	27/09/2022
21	C.3. Hito 3. Contrato de fiscalización 9. LC-SECOB-BID-01-2017 UEM MENOR - LA SIBERIA - MANABI	CONTRATO_N._LC-SECOB-BID-01-2017_compressed.pdf	27/09/2022
22	C.4. Hito 4. UEM MENOR - JOSE DE SAN MARTIN - LOS RIOS Recepción de Pleno Derecho de Obra suscrita	RECEPCIÓN_DEFINITIVA_PRESUNTA.pdf	30/09/2022
23	C.5. Hito 5. Terminación de Mutuo Acuerdo de fiscalización 1. LC-SECOB-BID-12-2015 UEM MENOR - ALFREDO MONGUE VELA - CHIMBORAZO	ACTA_DE_CONSTANCIA_TMA.pdf	27/09/2022
24	C.6. Hito 5. Terminación de Mutuo Acuerdo de fiscalización 2. LC-SECOB-BID-01-2017 UEM MENOR - LA SIBERIA - MANABI	ACTA_MUTUO_ACUERDO_SECOB-2018-0004.pdf	27/09/2022
25	C.7. Hito 5. Terminación de Mutuo Acuerdo de fiscalización 3. LC-SECOB-BID-017-2015 UEM MENOR - 12 DE OCTUBRE - MANABI	TERM._MUTUO_ACUERDO_No._SECOB-2016-011.pdf	27/09/2022
26	C.8. Hito 6. Terminación de Mutuo Acuerdo de obra 1. LC-SECOB-BID-003-2014 UEM MENOR - LA SIBERIA - MANABI	TMA_SECOB-2018-0006_LA_SIBERIA.pdf	30/09/2022
27	C.9. Hito 6. Terminación de Mutuo Acuerdo de obra 2. LC-SECOB-BID-003-2015 UEM MENOR - 12 DE OCTUBRE - MANABI	TMA_SECOB-2018-0013_12_DE_OCTUBRE.pdf	30/09/2022
28	D.1. Hito 6. Terminación de Mutuo Acuerdo de obra 3. LC-SECOB-BID-009-2014 UEM MENOR - 28 DE SEPTIEMBRE - MALIMPIA	4.-Terminación_Mutuo_Acuerdo.pdf	03/10/2022
29	D.2. Hito 7. Acta de entrega recepción definitiva de obra 1. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-001-2015 UEM MAYOR - JAIME ROLDOS - ORELLANA	3._ARD_-_JAIME_ROLDOS.pdf	03/10/2022
30	D.3. Hito 7. Acta de entrega recepción definitiva de obra 2. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014 UEM MENOR - CHONE - COTOPAXI	4._ARD_LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014.pdf	03/10/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
31	D.4. Hito 7. Acta de entrega recepción definitiva de obra 3. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-008-2014 UEM MENOR - 27 DE FEBRERO - CHIMBORAZO	5.-_ARD_LPI-SECOB-MINEDUC-BID-008-2014.pdf	03/10/2022
32	D.5. Hito 7. Acta de entrega recepción definitiva de obra 4. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014 UEM MENOR - CHARLES DARWIN (CANCHAGUA) - COTOPAXI	5.-_ARD_LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014.pdf	03/10/2022
33	D.6. Hito 7. Acta de entrega recepción definitiva de obra 5. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-006-2014 - UEM MENOR - CIUDAD DE PEDERNALES - MANABI	ARD_UEM_CIUADAD_PEDERNALES.pdf	03/10/2022
34	D.7. Hito 7. Acta de entrega recepción definitiva PARTE 1 de obra 6. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-002-2015 UEM MENOR - SIMON BOLIVAR (PIMOCHA) - LOS RIOS	RECEPCION_DEFINITIVA_PARTE_1_(1).pdf	03/10/2022
35	D.8. Hito 7. Acta de entrega recepción definitiva PARTE 2 de obra 6. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-002-2015 UEM MENOR - SIMON BOLIVAR (PIMOCHA) - LOS RIOS	RECEPCION_DEFINITIVA_PARTE_2_(1).pdf	03/10/2022
36	D.9. Hito 8. Recepción Única de fiscalización 1. LC-SECOB-BID-11-2015 UEM MAYOR - JAIME ROLDOS - ORELLANA	Acta_de_Recepción_Unica.pdf	27/09/2022
37	E.1. Hito 8. Recepción Única de fiscalización 2. LC-SECOB-BID-13-2015 UEM MENOR - 27 DE FEBRERO - CHIMBORAZO	ACTA_DE_RECEPCIÓN_ÚNICA_LC-SECOB-BID-13-2015.pdf	27/09/2022
38	E.2. Hito 8. Recepción Única de fiscalización 3. LC-SECOB-BID-10-2015 UEM MENOR - CHARLES DARWIN (CANCHAGUA) - COTOPAXI	ACTA_DE_ENTREGA_UNICA_LC-SECOB-BID-10-2015.pdf	27/09/2022
39	E.3. Hito 8. Recepción Única de fiscalización 4. LC-SECOB-BID-15-2015 UEM MENOR - SIMON BOLIVAR (PIMOCHA) - LOS RIOS	Recepcion_Unica.pdf	27/09/2022
40	E.4. Hito 9. Decreto Ejecutivo No. 1063 suscrito, todas las competencias de SECOB son asumidos por el MTOP.	Decreto-1063.pdf	28/09/2022
41	E.5. Anexo 2. ACUERDO MINISTERIAL N° 23 - 2020	acuerdo_ministerial_023-2020_-_Designaciones.pdf	27/09/2022
42	E.6. Anexo 3. Designación Administrador de los Convenios Interinstitucionales con MINEDUC	MTOP-SOP-2021-0797-ME_ADM_CONVENIO.pdf	27/09/2022
43	E.7. Hito 10. Recursos presupuestarios asignados para el año 2022.	SPN-SPN-2022-0789-OF_dictamen_de_inclusión_y_transferencia.pdf	28/09/2022
44	E.8. Anexo 4. Designación de LÍDERES DE PROYECTO Memorando No. MTOP-SOP-2022-1211-ME del 06 de septiembre de 2022	MTOP-SOP-2022-1211-ME.pdf	08/09/2022
45	E.9. Hito 11. Solicitud de información referente al estado actualizado del Proyecto de Inversión.	MTOP-SOP-2022-1276-ME_-_SOLICITUD_DE_INFORMACIÓN_SOP_19_SEPT.pdf	27/09/2022
46	F.1. Acción 1. Riesgo 1 - Solicitud de gestiones correspondientes para trámite y cancelación de planillas pendientes.	MTOP-SOP-2022-0688-ME_-_CRITERIO_FAVORABLE_PROYECTO_DE_INVERSIÓN.pdf	05/10/2022
47	F.2. Acción 1. Problema 1. - Solicitud de Informe de gestión a la Dirección Nacional de Producción, Dirección Nacional de Estudios y Dirección Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas	MTOP-SOP-2022-1276-ME_-_SOLICITUD_DE_INFORMACIÓN_SOP_19_SEPT.pdf	05/10/2022
48	F.3. Anexo 5. ACTUALIZACIÓN DE PRIORIDAD - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON CALIDAD Y EQUIDAD 2014	Proyecto-Programa-Nacional-Infraestructura.pdf	05/10/2022
49	F.4. Anexo 6. Memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0600-ME - Respuesta Dirección de Producción O.P.	MTOP-DNPOP-2022-0600-ME.pdf	31/10/2022
50	F.5. Anexo 7. Pronunciamiento MINEDUC respecto a la construcción de la UEM Siberia.	Oficio_Nro._MINEDUC-VGE-2019-00079-OF.pdf	31/10/2022
51	F.6. Anexo 8. Respuesta Dirección Nacional de Estudios	MTOP-DNEOP-2022-2108-ME.pdf	31/10/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Alvarez Ramos, Francisco Paul	Lider de Proyecto	Analista de Transporte Terrestre 2	falvarez@mtop.gob.ec	
Guaman Vargas, César Manuel	Director Nacional de Control y Fiscalización de Obras Publicas	Director/a Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas	cguaman@mtop.gob.ec	023974600
Santamaria Loor, Kiura Ninoska	Subsecretaria de Obras Públicas	Subsecretaria de Obras Publicas / Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte, Encargada	ksantamaria@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
150615_1.jpg	23/09/2022
