

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas
PROYECTO: K002 Nueva Infraestructura Educativa

Líder del Proyecto:	Estrella Jaramillo, Andres Bayardo (aestrella@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santamaría Loor, Kiura Ninoska	Programas Relacionados:	
Titular:	Romero Echeverria, Antonina de los Angeles	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91400000.78.6172	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,207,831.63
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/03/2009 - 26/12/2023
Fecha de última actualización:	03/07/2023	Fecha de Fin Base:	26/12/2023
Modificado por:	Becerra Albuja, Carlos Javier	Fecha del siguiente Hito:	05/07/2023

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:: Nueva Infraestructura Educativa: se ha ampliado y mejorado progresivamente la oferta de infraestructura escolar existente para niños, niñas, jóvenes y adolescentes en edad escolar en base al reordenamiento de la oferta educativa.

PRODUCTO / SERVICIO: Construcción y potenciación de Unidades Educativas y direcciones distritales a nivel Nacional en Ecuador

LÍNEA BASE: Ampliación de cobertura educativa: infraestructura, equipamiento y contratación de personal docente

OBJETIVO: Contratar los Estudios Obra y Fiscalización de las UEM , financiadas por el crédito CAF

OBJETIVO ESPECÍFICO: Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior.

RECURSOS: Humanos Materiales y Económicos.

Beneficios Cualitativos

Este proyecto propone el mejoramiento de accesibilidad a los distintos niveles de educación proponiendo para este fin la creación de infraestructura educativa adecuada y completa, brindando así una educación de calidad.

: Se ha ampliado y mejorado progresivamente la oferta de infraestructura escolar existente para niños, niñas, jóvenes y adolescentes en edad escolar en base al reordenamiento de la oferta educativa.

Tipo de Beneficiario

1.- Beneficiarios Directos 1,302,487.00

Beneficiarios Directos Femenino 664,270.00
 Beneficiarios Directos Masculino 638,217.00

2.- Beneficiarios Indirectos 3,279,960.00

Restricciones

TIEMPO: El tiempo de ejecución será el estipulado dentro del contrato CFA- 8741 y a lo determinado dentro del mismo aproximadamente 14 años de duración

COSTO : valor de la ficha SIPeIP 3'134,845,229.50 usd

RECURSO: Materiales, Humanos y materiales


Restricciones

ALCANCE: Cumplir con las fases precontractual y contractual de estudios, obra y fiscalización según sea del caso

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.73 %
 Fecha de Inicio: 03/03/2009 Fecha de Fin: 26/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

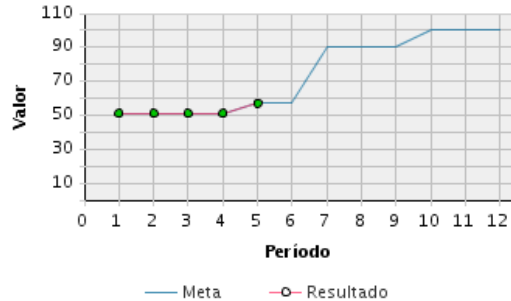

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	51 %	51 %	51 %	51 %	57 %	57 %	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	51 %	51 %	51 %	51 %	57 %							
Estado												
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2023 : HITO 25 - ESTUDIOS ESTUDIOS DE GEOTECNIA, MECÁNICA DE SUELOS Y PRUEBAS DE HORMIGÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA REPOTENCIACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS: 29 D AGOSTO PAQ. FEBRES CORDERO, BBHYO, PROV LOS RIOS DARIO GUEVARA	Estrella Jaramillo, Andres Bayardo	03/07/2023 - 10:09 AM
MAYO 2023 -UEM EUGENIO ESPEJO HITO 20 - FISCALIZACION PAGO DE PLANILLAS 5,6,7,8,9 Y 10 DE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESTANDARIZADA DEL MILENIO, TIPOLOGIA MAYOR, EUGENIO ESPEJO, UBICADA PARROQUIA SALINAS, CANTON SALINAS, PROV STA ELENA HITO 23 - COSTRUCCION PAGO DE PLANILLAS PAGO DE PLANILLA CC1 Y PLANILLAS 9, 10, 11 Y 12 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS UEM MAYOR OTTO AROSEMENA EN EL CANTON MILAGRO Y LA UEM SALITRE, UBICADA EN PARROQUIA JUQUILLAL CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESTANDARIZADA DEL MILENIO, TIPOLOGIA MAYOR, EUGENIO ESPEJO, UBICADA PARROQUIA SALINAS, CANTON SALINAS, PROV STA ELENA -UNIDAD EDUCATIVA OTTO AROSEMENA HITO 19 - FISCALIZACION PAGO DE PLANILLA CC1 Y PLANILLAS 5,6,7,8,9 Y 10 X FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS UEM TIPOLOGIA MAYOR OTTO AROSEMENA	Estrella Jaramillo, Andres Bayardo	05/06/2023 - 03:26 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>EN EL CANTON MILAGRO Y LA UEM DEL MILENIO MAYOR SALITRE, UBICADA EN PARROQUIA JUQUILLAL</p> <p>HITO 22 - COSTRUCCION PAGO DE PLANILLA 11 POR LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR OTTO AROSEMENA PARROQUIA MILAGRO CANTON MILAGRO PROVINCIA DE GUAYA</p> <p>- UEM VENTANAS ZAPOTAL VIEJO</p> <p>HITO 24 - COSTRUCCION PAGO DE PLANILLA 11 Y 12 POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA UEM VENTANAS ZAPOTAL VIEJO- CANTON VENTANAS, PROV.LOS RIOS</p> <p>-DIRECCION DISTRITAL 12D01 BABA_BABAHOYO_MONTALVO_LOS RIOS_MTOP SE PAGAN ESTUDIO DE GEOTECNIA EN VARIAS LOCALIDADES CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR REPOTENCIACIONES DE UNIDADES EDUCARTIVAS</p> <p>HITO 21 - ESTUDIOS ESTUDIOS DE GEOTECNIA, MECÀNICA DE SUELOS Y PRUEBAS DE HORMIGÒN DE ESTRUCTIURAS EXISTENTES PARA REPOTENCIACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS: 29 DE AGOSTO, PAQ. FEBRES CORDERO, BBHYO, PROV LOS RIOS DARIO GUEVARA, PAQ EL SALTO, BABAHOYO Y 24 DE MAYO, PAQ 24 DE MAYO.</p>		
<p>ABRIL 2023 :</p> <p>Se mantiene el estado de CONGELADO para el proyecto en conformidad a lo expresado en el MTOP-CGPGE-2023-67-ME del 14 de enero de 2023, pues no existe variación en su estatus.</p>	<p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p>	<p>05/05/2023 - 12:53 PM</p>
<p>MARZO 2023:</p> <p>Se mantiene el estado de CONGELADO para el proyecto en conformidad a lo expresado en el MTOP-CGPGE-2023-67-ME del 14 de enero de 2023, ya que hasta el momento no se han asignado recursos para su ejecución, esto se evidencia conforme a lo detallado en la cedula presupuestaria adjunta</p>	<p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p>	<p>03/04/2023 - 09:59 AM</p>
<p>FECRERO 2023:</p> <p>Se mantiene el estado de CONGELADO para el proyecto en conformidad a lo expresado en el MTOP-CGPGE-2023-67-ME de 14 de enero de 2023, ya que hasta el momento no se han asignado recursos para su ejecución</p>	<p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p>	<p>05/03/2023 - 08:13 PM</p>
<p>ENERO 2023:</p> <p>1.-Mediante Memorando Nro. MTOP-SOP-2023-0067-ME de 30 de enero del 2022, Se solicita el cambio de estado del proyecto a "CONGELADO", esto en conformidad a lo detallado en el documento presentado como líder de proyecto que en su parte pertinente detalla: (") "Mediante memorando Nro. MTOP-CGPGE-2023-67-ME de 14 de enero de 2023 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica (MTOP) remitió el POA de inversión 2023 de esta Cartera de Estado, aprobado por el Señor Ministro de Transporte y Obras Públicas; cuya información del POA 2023 ha sido definida conforme los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el ejercicio fiscal en curso. Al verificar el Plan Operativo Anual 2023 antes detallado se evidencia que la institución no ha recibido por parte del Ministerio de Educación, la asignación de recursos para financiar el proyecto de inversión en mención; causal para que el proyecto sea CONGELADO en la herramienta GPR."</p>	<p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p>	<p>03/02/2023 - 03:36 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2022</p> <p>Se da cumplimiento a los Hitos</p> <p>Hito 12 : Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (GUAYAS- NARNJITO).</p> <p>Hito 13: Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (PICHINCHA- INIAP).</p> <p>Hito 14: Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (PICHINCHA-ALOAG).</p> <p>Hito 15:</p>	<p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p>	<p>04/01/2023 - 12:05 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Pago de planilla de liquidación por la fiscalización de la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Naranjal - Naranjito - TARQUI-CHEMIS.</p> <p>Hito 16: Pago de la planilla No. 2 de contrato complementario n° 3 por la fiscalización de la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Naranjal - Naranjito - TARQUI-CHEMIS.</p> <p>Hito 17: Pago de la planilla No. 2 orden de trabajo por la fiscalización de la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Naranjal - Naranjito - TARQUI-CHEMIS.</p> <p>Hito 18: Pago de la planilla No. 20 y 21 por la fiscalización de la construcción de la Unidad Educativa Milenio Naranjal - Naranjito - TARQUI- CHEMIS.</p> <p>Esta ejecución se evidencia en conformidad a la información detallada en el Reportes - CUR de Ejecución del Gasto correspondiente al mes de diciembre del 2022.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2022</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA VENTANAS</p> <p>1.- PAGO DE PLANILLA 3 CC2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR VENTANAS ZAPOTAL VIEJO. MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2022-1652-ME PERIODO SEP 2022</p> <p>2.- - PAGO DE LA PLANILLA 4 CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 2 DE OBRA DE LA "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR VENTANAS ZAPOTAL VIEJO. MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2022-1817- ME OCT 2022</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA SAMANES</p> <p>1- PAGO DE PLANILLA No. 16 CONTRATO RE SECOB 034 2017 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SAMANES TERMINAL TERRESTRE UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI CANTON GUAYAQUIL.</p> <p>2,. PAGO DE PLANILLAS DE ORDEN DE CAMBIO No. 1 PLANILLA No. 1 Y 2 POR EL INCREMENTO DE CANTIDADES DE OBRA DENTRO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR SAMANES</p> <p>3,.PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDACION CONTRATO RE SECOB 034 2017 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SAMANES TERMINAL TERRESTRE UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI</p> <p>4.- PADO DE PLANILLA PLANILLA No. 12 C. COMPLEMENTARIO 1 RE SECOB 034 2017 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SAMANES TERMINAL TERRESTRE UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI CANTON GUAYAQUIL.</p> <p>5.- PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDACION CONT. COMPLEMENTARIO 1 RE SECOB 034 2017 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SAMANES TERMINAL TERRESTRE UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI CANTON GUAYAQUIL. MTOP-DDG-2022-2558-ME.</p>	<p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p>	<p>05/12/2022 - 09:12 PM</p>
<p>OCTUBRE</p> <p>Se da cumplimiento a los siguientes Hitos:</p> <p>Hito 6: Determinación de contratos cerrados de fiscalización:</p> <p>Con memorandos :</p> <p>MTOP-DNCFOP-2022-0449-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0451-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0473-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0467-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0472-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0453-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0469-ME</p> <p>Se receipta la información de la Dirección de Fiscalización para el análisis correspondiente sobre los contratos cerrado y el estado de los contratos abiertos o pendientes de cierre, paro lo cual en cada informe se adjunta un enlace de almacenamiento con la información disponible</p> <p>https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/pK7RNStiq7J6MYc https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/NrxagN4mNnEZTaF https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/5MBbpNFHjWX4fXi https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/5MBbpNFHjWX4fXi https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/e4rfRTrgtDYSN9D https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/AgdM4QTcw49Dtgx https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/CWw9SjAZkDwiDzB</p>	<p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p>	<p>01/11/2022 - 02:39 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hito 7: Determinación de contratos cerrados de obra</p> <p>Con memorando MTOP-DNPOP-2022-0585-ME , Se recepta la información de la Dirección de Obras para el análisis correspondiente sobre los contratos cerrado y el estado de los contratos abiertos o pendientes de cierre, paro lo cual en cada informe se adjunta un enlace de almacenamiento con la información disponible</p> <p>https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/c6Qofa7JjW44M6W</p> <p>Hito 8 : Determinación de contratos cerrados de estudios+</p> <p>Con memorando MTOP-DNEOP-2022-2105-ME , Se recepta la información de la Dirección de Estudios para el análisis correspondiente sobre los contratos cerrado y el estado de los contratos abiertos o pendientes de cierre, paro lo cual en cada informe se adjunta un enlace de almacenamiento con la información disponible</p> <p>https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/Z2Aw8SiffjbtbnH</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2022:</p> <p>1.-Mediante memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1211-ME de 06 de septiembre de 2022, remitido por la Ing. Kiura Ninoska Santamaria Loor, SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS se realiza la designación de LÍDERES DE PROYECTO para proyectos inversión Ex-SECOB y Ecuador Estratégico E.P. en la herramienta GPR.</p> <p>2.- Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1968-ME, de 20 de septiembre de 2022, se realiza la solicitud información a las distintas Direcciones de la SOP, correspondiente a los contratos parte del proyecto NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA .</p> <p>3.- Modificación de los datos económicos del proyecto, debido a un decremento en los valores asignados según cédula presupuestaria de septiembre 2022</p> <p>4.- Se da cumplimiento de los siguientes Hitos. Hito 1 : convenio Interinstitucional Hito 2: Identificación de recursos asignados Hito 3 : Solicitud de Información a las Direcciones de Fiscalización, Estudios y Obras perteneciente a la Subsecretaria de Obras Publica.</p> <p>5.- Se registra el devengado correspondiente al mes de Septiembre, se anexa Cedula Presupuestaria.</p>	<p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p>	<p>05/10/2022 - 08:57 PM</p>

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Espejo
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Otavalo
4	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Orellana
5	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > La Mana
6	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Saquisilí
7	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Sigchos
8	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta
9	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pajan
10	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales
11	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Santa Ana
12	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Chillanes

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
13	Zona 5 - Litoral > Guayas > Balao
14	Zona 5 - Litoral > Guayas > Daule
15	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Triunfo
16	Zona 5 - Litoral > Guayas > Milagro
17	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal
18	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjito
19	Zona 5 - Litoral > Guayas > Playas
20	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Palenque
21	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Quevedo
22	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Ventanas
23	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Santa Elena
24	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca
25	Zona 6 - Austro > Cañar > La Troncal
26	Zona 7 - Sur > Loja > Loja
27	Zona 8 - DMG > Guayas > Durán
28	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil
29	Zona 8 - DMG > Guayas > Samborondon
30	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Firma de convenio Interinstitucional	Z - Compromiso Ministerial	09/12/2014		09/12/2014		Sí	10.0
2	PLANEACION: Identificación de recursos asignados	9-Entregables Formales	20/12/2014		20/12/2014		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Solicitud de información de contratos de estudios	1-Solicitud de Información	20/09/2022		20/09/2022		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Solicitud de información de contratos de fiscalización	1-Solicitud de Información	20/09/2022		20/09/2022		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Solicitud de información de contratos de obras	1-Solicitud de Información	20/09/2022		20/09/2022		Sí	2.0
6	EJECUCION : Determinación de contratos cerrados de fiscalización	5-Entregables Intermedios	11/10/2022		07/11/2022		Sí	2.0
7	EJECUCION : Determinación de contratos cerrados de obra	5-Entregables Intermedios	11/10/2022		07/11/2022		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN Determinación de contratos cerrados de estudios	5-Entregables Intermedios	11/10/2022		07/11/2022		Sí	2.0
9	EJECUCIO0N : Pago de planillas de avance de obra pendientes, ordenes de cambio, contrato complementario y liquidación de contratos UNIDAD EDUCATIVA SAMANES	5-Entregables Intermedios	24/11/2022		06/12/2022		Sí	2.0
10	EJECUCIO0N : Pago de planillas 2 y 3 del contrato complementario para la UNIDAD EDUCATIVA VENTANAS	5-Entregables Intermedios	25/11/2022		06/12/2022		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	EJECUCION : PAGO DE PLANILLA No. 9 Y 10 CO POR LA "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR VENTANAS ZAPOTAL VIEJO	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		02/12/2022		Sí	2.0
12	EJECUCION : Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (GUAYAS- NARNJITO)	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		13/12/2022		Sí	2.0
13	EJECUCION : Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (PICHINCHA- INIAP)	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		22/12/2022		Sí	2.0
14	EJECUCION : Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (PICHINCHA-ALOAG)	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		22/12/2022		Sí	2.0
15	EJECUCION : PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION POR LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NARANJAL - NARANJITO - TARQUI-CHEMIS,	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		02/12/2022		Sí	1.0
16	EJECUCION :PAGO DE LA PLANILLA No. 2 DEL CINTRATO COMPLMRNTARIO N° 3 POR LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NARANJAL - NARANJITO - TARQUI-CHEMIS	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		02/12/2022		Sí	2.0
17	EJECUCION :PAGO DE LA PLANILLA No. 2 ORDEN DE TRABAJO POR LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NARANJAL - NARANJITO - TARQUI-CHEMIS,	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		02/12/2022		Sí	2.0
18	EJECUCION :PAGO DE LA PLANILLA No. 20 Y 21 POR LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILENIO NARANJAL - NARANJITO - TARQUI-CHEMIS	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		02/12/2022		Sí	2.0
19	EJECUCION : PAGO DE PLANILLA CC1 Y PLANILLAS 5,6,7,8,9 Y 10 X FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA	5-Entregables Intermedios	30/05/2023		30/05/2023		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	UEM OTTO AROSEMENA - CANTON MILAGRO Y UEM SALITRE, UBICADA EN PARROQUIA JUQUILLAL							
20	EJECUCION : PAGO DE PLANILLAS 5,6,7,8,9 Y 10 X FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UEM EUGENIO ESPEJO - CANTON SALINAS, PROV. SANTA ELENA	5-Entregables Intermedios	30/05/2023		30/05/2023		Sí	1.0
21	EJECUCION : PAGO DE ESTUDIO DE GEOTECNIA, MECÁNICA DE SUELOS Y PRUEBAS DE HORMIGÓN PARA REPOTENCIACIÓN DE LAS UEM: 29 DE AGOSTO, PAQ. FEBRES CORDERO, BBHYO, PROV LOS RIOS DARIO GUEVARA, PAQ EL SALTO, BABAHOYO Y 24 DE MAYO, PAQ 24 DE MAYO	5-Entregables Intermedios	30/05/2023		30/05/2023		Sí	1.0
22	EJECUCION : PAGO DE PLANILLA 11 X CONSTRUCCIÓN DE LA UEM OTTO AROSEMENA - CANTON MILAGRO Y UEM SALITRE, UBICADA EN PARROQUIA JUQUILLAL	5-Entregables Intermedios	30/05/2023		30/05/2023		Sí	1.0
23	EJECUCION : PAGO DE PLANILLA CC1 Y PLANILLAS 9, 10, 11 Y 12 X CONSTRUCCIÓN DE LA UEM EUGENIO ESPEJO - CANTON SALINAS, PROV. SANTA ELENA	5-Entregables Intermedios	30/05/2023		30/05/2023		Sí	1.0
24	EJECUCION : PAGO DE PLANILLAS , 11 Y 12 X CONSTRUCCIÓN DE LA UEM VENTANAS ZAPOTAL VIEJO- CANTON VENTANAS, PROV.LOS RIOS	5-Entregables Intermedios	30/05/2023		30/05/2023		Sí	1.0
25	CIERRE : Firma de actas definitivas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	08/07/2023	11/10/2023			No	10.0
26	EJECUCION : Determinación del estado de contratos pendientes	4-Inicio de Trabajo	31/07/2023	05/07/2023			No	23.0
27	CIERRE : Informe de cierre de proyecto de inversión suscrito	9-Entregables Formales	30/10/2023	05/12/2023			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de informes de monitoreo y control de los procesos .	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/10/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,207,831.63 **
Costo Total:	11,168,856.28
Total Devengado:	8,854,291.29
% Costo Total Devengado:	79.28 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 79.28 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	6,597,251.53	3,832,258.00	0.00	10,429,509.53
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	11,168,856.28	3,832,258.00	0.00	15,001,114.28
Ppto. Codificado	6,597,251.53	0.00	0.00	6,597,251.53
Ppto. Comprometido	6,146,825.39	0.00	0.00	6,146,825.39
Planeado - Codificado (2023)		3,832,258.00		
Programado a Devengar	6,597,251.53	3,832,258.00	0.00	10,429,509.53
Ppto. Devengado	5,375,573.63	3,478,717.66	0.00	8,854,291.29
Pagado Real	5,375,573.63	0.00	0.00	5,375,573.63
Estimado a fin de año	* 5,375,573.63	0.00	0.00	5,375,573.63
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,221,677.90	3,832,258.00	0.00	5,053,935.90
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 81.48 %	90.77 %	0.00 %	84.90 %
Ppto. Codificado 998	1,842,767.26	0.00	0.00	1,842,767.26
Ppto. Devengado 998	1,511,161.70	0.00	0.00	1,511,161.70

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023

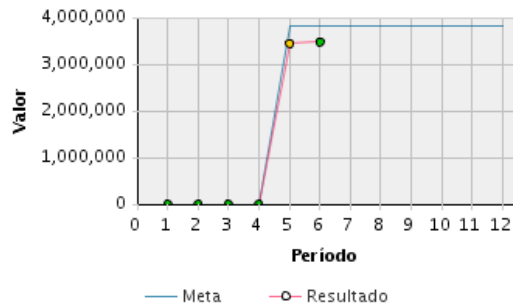

Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	3,820,794.00	3,436,717.66	3,820,794.00	3,436,717.66	89.95 %		89.68 %
Jun	0.00	42,000.00	3,820,794.00	3,478,717.66	91.05 %		90.77 %
Jul	0.00		3,820,794.00				
Ago	11,464.00		3,832,258.00				
Sep	0.00		3,832,258.00				
Oct	0.00		3,832,258.00				
Nov	0.00		3,832,258.00				
Dic	0.00		3,832,258.00				
Total	3,832,258.00	3,478,717.66					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar el desarrollo de estudios de Obras Públicas requeridos por las entidades de la administración gubernamental, MEDIANTE la administración y supervisión de los procesos en la fase preparatoria de contratación de obras publicas, bajo la normativa y especificaciones técnicas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Convenio interinstitucional	01._MINEDUC-_CAF-2014-0000075.pdf	08/09/2022
2	A.2.Detalle del proyecto de nueva infraestructura	02._proyecto-nueva-infraestructura.pdf	08/09/2022
3	A.3 Ficha SIPeIP	03.Ficha_Proyecto-91400000.78.6172.pdf	08/09/2022
4	A.4 Solicitud de información a las Direcciones de la SOP	MTOP-DNEOP-2022-1968-ME_(PEDIDO_DE_INFORMACION_).pdf	27/09/2022
5	A.5 CEDULA PRESUPUESTARIA A SEPT 2022 CAMBIO DE PRESUPUESTO CODIFICADO	Cedula_SEPTIEMBRE.pdf	03/10/2022
6	A.6 ENTREGA DE INFORMACION DIRECCION DE FISCALIZACION - ESTADO DE PROYECTO	01_fisca.rar	01/11/2022
7	A.7 ENTREGA DE INFORMACION DIRECCION DE OBRAS - ESTADO DE PROYECTO	02_obras.rar	01/11/2022
8	A.8 ENTREGA DE INFORMACION DIRECCION DE ESTUDIOS - ESTADO DE PROYECTO	03_estudios.rar	01/11/2022
9	A.9 RIESGO 1 ACCION 1 : CONSIDERACIÓN DE RECURSOS AL MINEDUC EN EL POA 2023,	MTOP-DNEOP-2022-2294-ME.pdf	01/12/2022
10	B.1 PAGOS UEM VENTANAS	UEM_VENTANAS.rar	05/12/2022
11	B.2 PAGO DE PLANILLAS Y LIQUIDACION UEM SAMANES	UEM_SAMANES.zip	05/12/2022
12	B.3.Reportes - CUR de Ejecución del Gasto - diciembre	Reportes_-_CUR_de_Ejecución_del_Gasto_-_diciembre.pdf	04/01/2023
13	B.4 CEDULA DE EJECUCIOM PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE	Nueva_Infraestructura_Educativa_-_Diciembre.pdf	04/01/2023
14	B.5 SOLICITU DE CAMBIO DE ESTADO DE PROYECTO A CONGELADO	INFORME_CONTROL_DE_PROYECTOS_INFRAESTRUCTURA_A_CONGELATIVA-signed-signed.pdf	03/01/2023
15	B.6 SOLICITUD DE LA SUBSECRETARIA (SOP), PARA CAMBIO DE FASE DE EJECUCIÓN A CONGELADO PARA FICHAS GPR	Memorando_Congelamiento_MTOP-SOP-2023-0067-ME_(SOP).pdf	03/02/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	B.7 NO INCLUCION EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL MES DE MARZO 2023	CEDULA_DE_MARZO_2023.pdf	03/04/2023
17	B.8 SOLICITU DE CAMBIO DE ESTADO DE PROYECTO Y APERTURA DE HITOS MAYO 2023	MTOP-DNEOP-2023-0512-ME_- _CUADRO.pdf	05/06/2023
18	B.9 CEDULA PRESUPUESTARIA Y DETALLE DE MOVIMIENTOS Y PAGOS -MAYO 2023	resumen_de_pagos_y__cedula.pdf	05/06/2023
19	C.01 CEDULA PRESUPUESTARIA Y DETALLE DE MOVIMIENTOS Y PAGOS -JUNIO 2023	nueva_infraestructura_Junio2023.pdf	03/07/2023
20	C.01 CUR DE PAGO 167 GEOSUELOS	cur_167_geosuelos.pdf	03/07/2023
21	Designación de Líder	MTOP-DNEOP-2023-0010-ME .pdf	21/06/2023

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Estrella Jaramillo, Andres Bayardo	LIDER DE PROYECTO	Servidor Publico 7	aestrella@mtop.gob.ec	
Romero Echeverria, Antonina de los Angeles	DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PUBLICAS	Director/a Nacional Estudios de Obras Públicas	Aaromero@mtop.gob.ec	
Santamaría Loor, Kiura Ninoska	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Subsecretaria de Obras Públicas	ksantamaria@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
150607_1.jpg	28/09/2022
