

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 5
Dirección Provincial Guayas

PROYECTO: K064 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia del Guayas

Líder del Proyecto:	Rocohano Granados, Maritza Alexandra (mrocohano@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Bastidas Izurieta, Álvaro Sebastián	Programas Relacionados:	Provincia - Guayas, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Delgado León, Andrés Glen	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3844	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	5	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,554,359.54
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2011 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	16/08/2019	Fecha de Fin Base:	02/07/2015
Modificado por:	Delgado León, Andrés Glen	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2019

DATOS GENERALES

Descripción

Actividades de mantenimiento vial de la DDG

La Vía Guayaquil-Salinas pasa debajo del puente del distribuidor de tráfico, a la altura de Progreso, cuyo gálibo actual es de 5.2 m. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas desea aumentar el gálibo del puente del distribuidor de tráfico de Progreso, a 6 m de altura como mínimo.

Se propone la elevación del puente mediante un sistema hidráulico de cilindros y bombas, para lograr la altura deseada, y fundición de muro complementario de apoyo para descanso definitivo.

Monto: \$ 3,175,103.57

Longitud: 3.5 km, incluye accesos

Plazo de ejecución: 6 Meses

Fecha de entrega de Anticipo: 22 de julio de 2014

Porcentaje de Anticipo Entregado: 7.50%

Fecha de inicio según contrato: 02 de Julio de 2014

Monto de Anticipo entregado: \$ 238,132.77

Total planillado a la fecha: \$ 0.00

Aporte Patronal

Combustibles y Lubricantes

Decimocuarto Sueldo

Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)

Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas

Fondo de Reserva

Horas Extraordinarias y Suplementarias

Infraestructura

Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas

Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas

Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)

Repuestos y Accesorios

Seguros

Servicio de Seguridad y Vigilancia

Servicios de Voluntariado

Servicios Personales por Contrato

Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes

Transporte y Vias

Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)

Beneficios Cualitativos

Los beneficios : ahorro en los costos de operación de vehículos, ahorro del costo de operación de vehículos y tiempo de viaje del trafico existente que son trasladados en forma directa a los usuarios de las vías de la Red Vial del Guayas.

Tipo de Beneficiario

Usuarios de las vías de la Red Vial del Guayas.

Restricciones

TIEMPO: este proyecto tiene un tratamiento diferente a otros, ya que al ser de mantenimiento constante año a año se incluye en el Plan anual de inversión (2011 a vigente)

COSTO: desde el año 2011 al 2019 se ha presupuestado \$52.832.570,56

ALCANCE: La operación se refiere a los trabajos de eliminación selectiva de vegetación existente dentro de la faja vial. La limpieza comprende además la eliminación de ramaje aéreo y el retiro de cualquier desecho, escombros u otro material en desuso que se encuentre dentro del área prescrita, cualquiera sea su procedencia. La vegetación en muchos casos resulta beneficiosa para el camino y mejora la estética general, permitiendo un viaje más placentero; por lo tanto, no es conveniente programar talas remociones indiscriminadas de toda vegetación existente dentro de la faja, si no que se debe realizar un estudio para establecer áreas o especies individuales que deben ser taladas. Los principales factores que se deben considerar para definir los requerimientos del trabajo son:

#Las señales camineras deben encontrarse completamente libres de cualquier vegetación que impida su visión desde, a lo menos, 100 m de distancia.

#La velocidad de diseño de la carretera y los radios de las curvas horizontales definen un despeje lateral mínimo, que asegure la distancia de visibilidad de parada o adelantamiento, tal como se especifica en los numerales 3.202.2 y 3.203.3 del Volumen 3 del NEVI - 12 La vegetación que arraiga en taludes de cortes y terraplenes es esencial para evitar deslizamientos y desprendimientos, por lo tanto sólo debe cortarse a una altura adecuada para que no obstruya la visibilidad en los términos anteriormente señalados.

#En áreas de seguridad, o encauzamiento del tránsito que vira o ingresa a la carretera, ninguna vegetación deberá quedar con una altura mayor que 0,20 m.

#Los arbustos que arraiguen dentro de elementos de drenaje, tales como fosos, contrafosos y otros deben retirarse completamente.

#Deben talarse los árboles o arbustos de tronco de 150 mm o más de diámetro, en la mediana y en las circunstanciales zonas despejadas, pues aumentan la severidad de un eventual accidente.


#La operación puede incluir también la aplicación de matamalezas. Se hará en los sectores definidos en los antecedentes del contrato o donde indique la Fiscalización y en los que previamente se efectuó una limpieza de faja manual o mecanizada.

RECURSOS: Este proyecto está compuesto por componentes: Infraestructura, Servicios de microempresas, Gastos operacionales, fiscalizaciones; dentro de estos componentes se ejecutan contratos por administración directa en donde interviene personal del MTOP y contratos de proveedores externos que cuentan con su personal

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.32 %
Fecha de Inicio: 01/01/2011 **Fecha de Fin:** 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS .La obra aún no se encuentra en ejecución debido a que se está tramitando la viabilidad con SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO).No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL .Servicios personales por contrato: \$ 12,860.00 (ingresos).Aporte Patronal: \$ 1,241.04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO.No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS.No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA .Fondos de Reserva: \$ 744.14</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA.Avance Físico: 37,14%.Monto Planilla #2: \$ 95.735,86.Fecha Inicio de trabajos: 22/11/2018.Fecha Fin de Trabajos: 25/08/2019.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.En proceso de recepción provisional.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-.No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL.El contrato tiene acta de recepción.</p> <p>11.- ADMINISTRACION, COBRO Y RECAUDACION DE Y DEPOSITO DE LA ESTACION DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS- Esta en procesos de contratación mediante el portal de compras públicas.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú. Consorcio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: La obra se encuentra terminada con fecha 12 de junio de 2019 y está en procesos al acta de recepción provisional. Galibo de Progreso: La obra está en etapa de mantenimiento por concepto de acta de recepción provisional.</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO CUARTO SUELDO.Décimo cuarto sueldo: \$ 65.66.</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.No se ha realizado el contrato todavía del servicio</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.La obra se concluyó el 13 mayo 2019, en trámite planilla 3 y Acta recepción provisional.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIO 7.Se firmó el Acta de Recepción Provisional el 14 de febrero del 2019, y actualmente se halla en proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSION DE 17.80 KM. En ejecución, se termina la primera semana de agosto.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO.Servicios personales por contrato: \$ 12,860.00, Aporte Patronal: \$ 1,241.04</p>	Rocohano Granados, Maritza Alexandra	05/08/2019 - 08:23 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO TERCER SUELDO.Décimo tercer sueldo: \$ 190.59</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL.Ya se firmó la recepción definitiva.</p> <p>23.- MICROEMPRESAS-PROVINCIA DEL GUAYAS.</p>		
<p>JUNIO 2019</p> <p>1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINAI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS La obra aún no se encuentra en ejecución debido a que se está tramitando la viabilidad con SENPLADES.</p> <p>2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO). No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL . Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos), \$1176.70 (9,15% patronal),\$64,34 (0,50% IECE) Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS. No se paga en gastos de inversión.</p> <p>6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA . Fondos de Reserva: \$1115,14 (ingresos).</p> <p>7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA. Al momento la obra se encuentra suspendida por lluvias desde el 03/03/2019, y con un avance del 25%.</p> <p>8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. En proceso de recepción provisional.</p> <p>9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)-. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>10.- ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VÍAS DE LA RED VIAL ESTATAL.</p> <p>11.- ADMINISTRACIÓN, COBRO Y RECAUDACIÓN DE Y DEPOSITO DE LA ESTACIÓN DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS- No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú. Consorcio ciclovías Guayaquil por el mantenimiento de la ciclovía segregada a la carretera e-40 tramo - Guayaquil- Chongon-Progreso: Los trabajos finalizaron el 17 de junio de 2019 al 100 %, se han presentado hasta la fecha 2 planillas por un monto de 844844.68 dólares. Galibo de Progreso: la obra está terminada y en funcionamiento dando servicio a la comunidad</p> <p>13.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO CUARTO SUELDO. Décimo cuarto sueldo: \$ 426,79 (ingresos).</p> <p>14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La vía se encuentra en proceso de concesión a la compañía Verdú.</p> <p>15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. No se ha realizado el contrato todavía del servicio</p> <p>16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RÍOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. La obra se concluyó el 13 mayo 2019, en trámite planilla 3 y Acta recepción provisional.</p> <p>17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIÓ 7. Se firmó el Acta de Recepción Provisional el 14 de febrero del 2019, y actualmente se halla en proceso de cumplimiento para la firma de Recepción Definitiva.</p> <p>18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSIÓN DE 17.80 KM.</p>	<p>Rocohano Granados, Maritza Alexandra</p>	<p>02/07/2019 - 01:57 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En ejecución, se termina la primera semana de agosto.</p> <p>19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO. Servicios personales por contrato: \$12860(ingresos), \$1176.70 (9,15% patronal), \$64,34(0,50% IECE). Aporte Patronal: \$1241,04</p> <p>20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. No se ha realizado el contrato todavía del servicio.</p> <p>21.- GASTOS OPERACIONALES: DÉCIMO TERCER SUELDO. Décimo tercer sueldo: \$1115,59 (ingresos)</p> <p>22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL. Ya se firmó la recepción definitiva.</p>		
<p>Mayo 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>	Salas Aragundi, Daniel	05/06/2019 - 09:16 AM
<p>Abril 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>	Salas Aragundi, Daniel	06/05/2019 - 04:42 PM
<p>Marzo 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>	Salas Aragundi, Daniel	05/04/2019 - 01:16 PM
<p>Febrero 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>	Salas Aragundi, Daniel	06/03/2019 - 08:12 AM
<p>Enero 2019.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>		
<p>Diciembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>	Salas Aragundi, Daniel	04/01/2019 - 12:39 PM
<p>Noviembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>	Salas Aragundi, Daniel	05/12/2018 - 08:16 AM
<p>OCTUBRE 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas obsevaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.</p>	Salas Aragundi, Daniel	05/11/2018 - 07:58 AM
<p>Septiembre 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.</p>	Salas Aragundi, Daniel	05/10/2018 - 05:16 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas observaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.		
Agosto 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador. Se comunico dentro del recorrido conjunto a la empresa estatal china Sinohydro contratista del proyecto algunas observaciones dentro del periodo de mantenimiento que tiene antes de recibir la obra definitivamente.	Salas Aragundi, Daniel	04/09/2018 - 09:04 AM
Julio 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.	Salas Aragundi, Daniel	06/08/2018 - 09:46 AM
Junio 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador	Salas Aragundi, Daniel	05/07/2018 - 08:43 AM
Mayo 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador	Salas Aragundi, Daniel	05/06/2018 - 09:22 AM
Abril 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador		
Enero 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad Febrero 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad Marzo 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Salas Aragundi, Daniel	05/04/2018 - 04:56 PM
Diciembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad Noviembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Salas Aragundi, Daniel	04/01/2018 - 08:48 AM
Octubre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Salas Aragundi, Daniel	01/11/2017 - 02:59 PM
Septiembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Salas Aragundi, Daniel	10/10/2017 - 09:21 AM
Agosto 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Mendoza Cedeno, José Eugenio	06/09/2017 - 11:58 AM
Julio 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	02/08/2017 - 04:04 PM
Junio 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	04/07/2017 - 02:14 PM
Mayo 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/06/2017 - 03:23 PM
Abril 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/06/2017 - 03:23 PM
Marzo 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	04/04/2017 - 11:21 AM
Febrero 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	06/03/2017 - 07:27 AM
Enero 2017.- Se terminan los trabajos relacionados con la señalización y el proyecto está terminado al 100% dando servicio a la comunidad.	Salas Aragundi, Daniel	06/02/2017 - 09:10 AM
Diciembre 2016.- Se realizan trabajos de señalización horizontal y vertical en los diferentes enlaces del distribuidor de tráfico. Se tiene en trámite Orden de cambio 7 y contrato complementario	Salas Aragundi, Daniel	05/01/2017 - 02:59 PM
Noviembre 2016.- Se realizan trabajos de señalización horizontal y vertical en los diferentes enlaces del distribuidor de tráfico	Salas Aragundi, Daniel	05/12/2016 - 04:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTubre 2016: Se terminan realizar el asfaltado dentro de todos los enlaces del distribuidor de tráfico, se comienza a colocar la pintura de tráfico para la señalización	Salas Aragundi, Daniel	07/11/2016 - 12:07 AM
Septiembre 2016: Se terminan de realizar los trabajos de movimiento de tierras, se procede a realizar asfaltado del enlace 2 3 4 5 6 7. Terminación de cunetas enlace 5		
Agosto 2016: Se terminan de realizar los trabajos de movimiento de tierras, se procede a realizar asfaltado del enlace 4 lado derecho; se terminan trabajos en el enlace 5. Terminación de cunetas enlace 3	Salas Aragundi, Daniel	09/09/2016 - 08:39 AM
JuLIO 2016: Una vez entregado el porcentaje de anticipo faltante, se procedió a realizar los trabajos de sub-base - base en los enlaces 3, 6 y 7; se comenzo a realizar la imprimación de el enlace 4 y 8.	Salas Aragundi, Daniel	09/09/2016 - 08:35 AM
Junio 2016: Según comunicación de las autoridades se ha entregado el 35% faltante del anticipo con credito chino, la contratista a partir del día lunes 11 de Julio de 2016, entrará a trabajar al 100% con su personal y maquinaria.	Salas Aragundi, Daniel	06/07/2016 - 11:09 AM
MAYO 2016: Continuan con los trabajos de fundición del hormigón de las alas del puente, que sirvan para contener relleno adicional como resultado de la elevación de 1 m del puente existente.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	07/06/2016 - 10:41 AM
ABRIL 2016: Continuan con los trabajos de fundición de los incrementos de los estribos en ambos lados del puente, producto de la elevación de 1 m del puente existente	Calderón Cañar, Edgar Miguel	06/05/2016 - 02:01 PM
MARZO 2016: Se han ejecutado trabajos de fundición de los incrementos de los estribos en ambos lados del puente, producto de la elevación de 1 m del puente existente	Calderón Cañar, Edgar Miguel	06/05/2016 - 01:56 PM
FEBRERO 2016: Los trabajos se encuentran suspendidos por la contratista por diferentes causas, entre ellas la etapa invernal y el no pago de planillas de obra.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/03/2016 - 09:04 AM
ENERO 2016: Colocación del material en los enlaces 6 y 7	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/03/2016 - 09:03 AM
DICIEMBRE 2015: Se realizaron trabajos de imprimación en el enlace 8 y se colocó material de base en el enlace 4	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/03/2016 - 09:01 AM
NOVIEMBRE 2015: La obra se encuentra con un ritmo bajo de avance de obra por motivos de pago de planillas, el MTOP no ha pagado ninguna de las 6 planillas presentadas por la contratista.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	24/12/2015 - 11:15 AM
OCTUBRE 2015: Levantamiento de los dos tramos del puente, colocación de mejoramiento, sub base y base en los ocho ramales del distribuidor de tráfico.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	24/12/2015 - 11:14 AM

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada	3-Adjudicación	02/07/2014		02/07/2014		Sí	1.0
2	EJECUCIÓN: Inicio de obra realizada	4-Inicio de Trabajo	02/07/2014		31/10/2014		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Movimiento de tierra realizada	5-Entregables Intermedios	15/09/2015		15/09/2015		Sí	30.0
4	EJECUCIÓN: Levantamiento del puente realizada	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	15.0


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	EJECUCIÓN: Obras de drenaje realizada	5-Entregables Intermedios	30/01/2016		30/04/2016		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Capa de rodadura de hormigón asfáltico realizada	5-Entregables Intermedios	14/06/2016		31/10/2016		Sí	20.0
7	EJECUCIÓN: Señalización vial realizada	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/01/2017		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: Señalización vial tramo 2 realizada	9-Entregables Formales	30/11/2016		30/01/2017		Sí	3.0
9	EJECUCIÓN: Señalización vial tramo 3 realizada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2016		30/01/2017		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Acta de recepción provisional realizada	9-Entregables Formales	30/07/2017		30/07/2017		Sí	5.0
11	CIERRE: Pago liquidación realizado	9-Entregables Formales	30/09/2017	31/12/2019			No	10.0
12	CIERRE: Recepción definitiva	9-Entregables Formales	30/09/2017	31/12/2019			No	5.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Se han realizado las reparaciones necesarias para tener en óptimas condiciones la vía, sin embargo hay desprendimientos de hitos de vía en el tramo 4	Monge Espinel, Luis Humberto	{PR} - Provincia - GUAYAS	30/06/2017
2	La obra presenta grandes daños, por tal razón solicitamos al MTOP oficie inmediatamente a la Contratista para que realice las reparaciones necesarias	Monge Espinel, Luis Humberto	{PR} - Provincia - GUAYAS	26/05/2017
3	La obra tiene un 99% de avance se espera que culmine los trabajos el 15 de enero de 2017	Monge Espinel, Luis Humberto	{PR} - Provincia - GUAYAS	13/01/2017
4	La obra presenta retrasos, la fecha de término de acuerdo a la ampliación era 30 de Nov. de 2016	Monge Espinel, Luis Humberto	{PR} - Provincia - GUAYAS	21/12/2016
5	Se cumplió el plazo que era el 31 de octubre de 2016 y la obra no está finalizada aun quedan rubros por ejecutar	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	10/11/2016
6	La obra presenta un gran avance, se espera que esté lista para el 31 de Octubre de 2016	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	14/10/2016
7	La obra presenta retrasos de acuerdo a la programación de la ficha GPR, se espera que la obra termine el 31 de octubre de 2016	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	25/08/2016
8	La obra permanece paralizada no se encontró personal en obra	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	23/05/2016
9	La obra se encuentra paralizada	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	19/02/2016
10	Debido a la etapa invernal los trabajos se han retrasado, se espera que la obra culmine el 15 de abril del 2016	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	28/01/2016
11	Debido a la etapa invernal los trabajos se han retrasado, se espera que la obra culmine el 15 de abril del 2016	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	28/01/2016
12	Los trabajos se ejecutan según lo programado, la obra culminaría a finales de diciembre del 2015	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	26/11/2015
13	Los trabajos se ejecutan según lo programado por la contratista, se solicita actualizar la ficha de GPR para conocer fechas de cumplimiento de hitos	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	11/09/2015
14	Se retoman los trabajos, se espera que la obra culmine el 15 de noviembre del 2015	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	24/06/2015
15	La obra se encuentra suspendida hasta que se realice la declaratoria de utilidad pública	Panchana Farra, Rolando José	{PR} - Provincia - GUAYAS	17/04/2015

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance físico.		100.00 %	95	95	01/01/2019	Julio


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,554,359.54 **
Costo Total:	18,854,333.80
Total Devengado:	11,506,992.23
% Costo Total Devengado:	61.03 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 61.03 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1.00	18,623,481.25	0.00	18,623,482.25
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	13,289,045.89	6,758,805.47	0.00	20,047,851.36
Ppto. Codificado	13,739,689.51	8,218,358.76	0.00	21,958,048.27
Ppto. Comprometido	9,913,927.29	1,334,466.34	0.00	11,248,393.63
Planeado - Codificado (2019)		10,405,122.49		
Programado a Devengar	13,739,689.51	6,332,189.19	0.00	20,071,878.70
Ppto. Devengado	7,222,170.35	4,284,821.88	0.00	11,506,992.23
Pagado Real	0.00	1,489,619,430.00	0.00	1,489,619,430.00
Estimado a fin de año	* 7,222,170.35	0.00	0.00	7,222,170.35
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	6,517,519.16	6,332,189.19	0.00	12,849,708.35
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 52.56 %	67.67 %	0.00 %	57.33 %
Ppto. Codificado 998	0.00	1,888,916.45	0.00	1,888,916.45
Ppto. Devengado 998	0.00	490,324.36	0.00	490,324.36

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

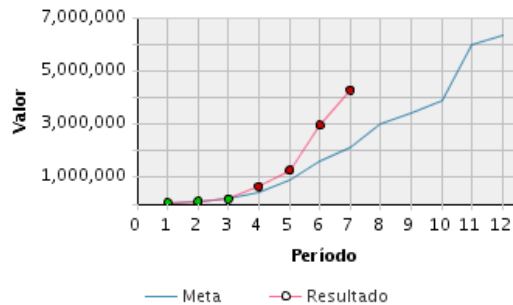

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	41,914.05	41,914.05	41,914.05	41,914.05	100.00 %	●	0.66 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	70,978.47	70,978.47	112,892.52	112,892.52	100.00 %		1.78 %
Mar	74,065.94	74,065.92	186,958.46	186,958.44	100.00 %		2.95 %
Abr	255,080.40	465,851.70	442,038.86	652,810.14	147.68 %		10.31 %
May	456,107.05	619,766.59	898,145.91	1,272,576.73	141.69 %		20.10 %
Jun	693,126.83	1,680,400.45	1,591,272.74	2,952,977.18	185.57 %		46.63 %
Jul	532,385.48	1,331,844.70	2,123,658.22	4,284,821.88	201.77 %		67.67 %
Ago	871,878.47		2,995,536.69				
Sep	435,124.41		3,430,661.10				
Oct	430,124.42		3,860,785.52				
Nov	2,116,440.72		5,977,226.24				
Dic	354,962.95		6,332,189.19				
Total	6,332,189.19	4,284,821.88					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
14	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
15	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
16	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo
17	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.
18	Reducir el índice de incumplimiento de las normativas de transporte pesado, MEDIANTE la implementación del sistema de control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1: Corrección geométrica.- orden de cambio	orden_de_cambio_no_1_varios_proyectos.pdf	06/07/2016
2	A2:Corrección geométrica.-Orden de cambio 2	ORDEN_DE_CAMBIO_No_2_FIRMADA.pdf	06/07/2016
3	A3 Corrección geométrica.-Orden de cambio 3	orden_de_cambio_nO_3.pdf	06/07/2016
4	A4 Corrección geométrica.-orden de cambio 4	orden_de_cambio_no_4_sinohydro_con_fecha.pdf	06/07/2016
5	A5 Corrección geométrica.-Orden de Cambio 5 Aumento de PLazo 30/11/2016	Orden_de_Cambio_5.pdf	11/11/2016
6	A6 Corrección geométrica.-Orden de cambio 6 - 30/01/2017	ORDEN_DE_CAMBIO_No_6_SINOHYDRO.pdf	06/02/2017
7	A7 Corrección geométrica.-Reanudación de trabajos	Reanudación_de_Trabajos.pdf	05/12/2017
8	A8 Corrección geométrica.-Acta de suspensión	Acta_de_Suspensión_Temporal_Galibo.pdf	05/12/2017
9	A9 Corrección geométrica.-Contrato complementario	COnttrato_complementario.pdf	05/12/2017
10	B1-JUNIO 2019- RECURSOS HUMANOS-GRUPO GASTO 71 INVERSIÓN.	Copia_de_MATRIZ_GRUPO_GASTO_71_INVERSIÓN-1.pdf	01/07/2019
11	B10-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2013.	CP_2013.pdf	02/07/2019
12	B11-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2014.	CP_2014.pdf	02/07/2019
13	B12-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2015.	CP_2015_PROGRAMA_25_Y_56.pdf	02/07/2019
14	B13-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2016.	CP_2016.pdf	02/07/2019
15	B14-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2017.	CP_2017.pdf	02/07/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	B15-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2018.	CP_2018.pdf	02/07/2019
17	B16-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2019.	CP_2019.pdf	02/07/2019
18	B17-JUNIO 2019-DICTAMEN DE PRIORIDAD-MANTENIMIENTO VÍAS GUAYAS..	dictamen_de_prioridad_mant._guayas.pdf	02/07/2019
19	B18-JUNIO 2019-INFORME DE MANTENIMIENTO VIAL-ACTUALIZACIÓN A MARZO 2017.	INFORMEINVERSIENMANTENIMIENTOVIALDELA PROVINCIA DE GUAYAS ACTUALIZACION_A_MARZO_2017..pdf	02/07/2019
20	B19-JUNIO 2019-CONTRATO VÍA SALITRE-VERNAZA.	Contrato_Salitre_-_Vernaza-2019..pdf	04/07/2019
21	B2-JUNIO 2019-INFORME EJECUTIVO-VÍA NARANJAL-RIÓ SIETE.	NARANJAL_-_RIO_SIETE-JUNIO-2019..pdf	01/07/2019
22	B20-JUNIO 2019-CONTRATO-VÍA PALESTINA-MACUL.	GestionReporteRH-CONTRATO-PALESTINA_-MACUL-2019..pdf	04/07/2019
23	B21-JUNIO 2019-CONTRATO-PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL.	GestionReporteRH-CONTRATO-PUENTES_DE_LA_UNIDAD_NACIONAL-2019..pdf	04/07/2019
24	B22-JUNIO 2019-CONTRATO-VÍA LA PUNTILLA.	GestionReporteRH-CONTRATO-VIA_LA_PUNTILLA_2019..pdf	04/07/2019
25	B23-JUNIO 2019-CONTRATO VÍA NARANJAL RIO 7.	contrato_protocolizado_naranjal_rio_siete.pdf	04/07/2019
26	B3-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-VALORES DEVENGADOS EN JUNIO.	CEDULA PRESUPUESTARIA-JUNIO-2019-MANTENIMIENTO_VIAL_GUAYAS..pdf	01/07/2019
27	B4-JUNIO 2019-ACTA DEFINITIVA DE LOS PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL.	ACTA_DEFINITIVA_DE_LOS_PUENTES_DE_LA_UNIDAD_NACIONAL-2019..pdf	02/07/2019
28	B5-JUNIO 2019-INFORME EJECUTIVO-VÍA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RÍOS.	GestionReporteFN-1-VIA_PALESTINA-LIMITE_GUAYAS-LOS_RIOS-JUNIO..pdf	02/07/2019
29	B6-JUNIO 2019-INFORME EJECUTIVO-VÍA PUNTILLA-LA AURORA.	GestionReporteFN-PUNTILLA-LA-AURORA-JUNIO-2019..pdf	02/07/2019
30	B7-JUNIO 2019-CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL-GUAYAS-2011 HASTA 2019.	CRONOGRAMA_DE_MANTENIMIENTO_VIAL-GUAYAS_DESDE_EL_2011_HASTA_EL_2019..xls	02/07/2019
31	B8-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2011.	CP_2011-1.pdf	02/07/2019
32	B9-JUNIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA 2012.	CP_2012.pdf	02/07/2019
33	C1-JULIO-2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-ENERO-2019	MTTOGUAYASENERO19.pdf	02/08/2019
34	C2-JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA - FEBRERO-2019.	MTTOGUAYASFEBRERO19.pdf	02/08/2019
35	C3-JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-MARZO-2019.	MTTOGUAYASMARZO19.pdf	02/08/2019
36	C4-JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA-ABRIL-2019.	MTTOGUAYASABRIL19.pdf	02/08/2019
37	C5-JULIO 2019-CEDULA PRESUPUESTARIA-MAYO-2019.	MTTOGUAYASMAYO19.pdf	02/08/2019
38	C6-JULIO 2019-CEDULA PRESUPUESTARIA-JUNIO-2019.	MTTOGUAYASJUNIO19.pdf	02/08/2019
39	C7-JULIO 2019-CEDULA PRESUPUESTARIA-JULIO-2019.	MTTOGUAYASJULIO19.pdf	02/08/2019
40	C8-JULIO 2019-CÉDULA PRESUPUESTARIA JULIO-998	MTTO._GUAYAS_JUL19_998.pdf	05/08/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Aguilar Ronquillo, Marco Antonio	Supervisor	Analista de Infraestructura Provincial 2	maaguilar@mtop.gob.ec	042068577
Bastidas Izurieta, Álvaro Sebastián	Subsecretario Regional 5	Subsecretario Zonal 5	asbastidas@mtop.gob.ec	042068542
Calderón Cañar, Edgar Miguel	Supervisor	Supervisor de Obra del Guayas - MTOP	ecalderon@mtop.gob.ec	023974600

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Delgado León, Andrés Glen	Director Distrital del Guayas	Director Distrital del Guayas	adelgado@mtop.gob.ec	
Montalván Rodríguez, Erwin Nicolas	Supervisor	Experto de Infraestructura provincial	emontalvan@mtop.gob.ec	0984061125
Paz Mora, Luis Alfredo	Supervisor	Administrador Vial - Construcciones Guayas	lpaz@mtop.gob.ec	
Perez Marcillo, Patricia Lisseth	Supervisor	Analista de Infraestructura 2	pperez@mtop.gob.ec	042068577
Rocohano Granados, Maritza Alexandra	Supervisor	Experto de Infraestructura Provincial	mrocohano@mtop.gob.ec	
Salas Aragundi, Daniel	Supervisor	Asistente de Estudios Zonal 5	dsalas@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
86622_1.jpg	05/12/2016
