

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Producción de Obras Públicas

PROYECTO: K113 MTOP - Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud

Líder del Proyecto:	Vaca Aguirre, Hugo Xavier (hvaca@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santamaría Loor, Kiura Ninoska	Programas Relacionados:	
Titular:	Prado Leverone, Juan Carlos	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	123200000.632.2477	TIR:	36.96 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	287,231,173.10
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	7,248,541.85
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	28/09/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2024
Modificado por:	Vaca Aguirre, Hugo Xavier	Fecha del siguiente Hito:	31/10/2022

DATOS GENERALES

Descripción

*DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El PIFEMEFS fue creado con objetivo de responder a las necesidades priorizadas por el Ministerio de Salud Pública, resultantes del diagnóstico situacional realizado en las unidades de salud de segundo y tercer nivel, las mismas que han experimentado desde el año 2.008 un incremento en la demanda de atención de los usuarios por la gratuidad progresiva de los servicios de salud, que a su vez determina que su infraestructura física, deba ser ampliada o remodelada, rediseñada y construida de acuerdo a las actuales necesidades de la población.

*PRODUCTO / SERVICIO: Incrementar la cobertura nacional de infraestructura de salud.
 Contratar las obras de infraestructura de la Entidad Requirente, así como todas las acciones que sean de competencia para contratar las obras de infraestructura del MSP.

1. Contratar/ Realizar estudios referente Infraestructura de Salud Pública, sean estos Hospitales o Centros de Salud.
2. Contratar la Construcción referente a Infraestructura de Salud Pública (Hospitales, Centros de Salud)
3. Contratar la Fiscalización para la construcción referente a Infraestructura de Salud Pública (Hospitales, Centros de Salud)

* LÍNEA BASE: Construcción de Infraestructura de Salud Pública (Hospitales y Centros de Salud), para aumentar la cobertura de salud a nivel nacional.

* OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:
 Mejorar la calidad de prestación de servicios, mediante el incremento de la cobertura nacional de infraestructura

- *OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Finalizar la contratación/diseño de estudios referente Infraestructura de Salud Pública, sean estos Hospitales o Centros de Salud.
 2. Finalizar la Construcción referente a Infraestructura de Salud Pública (Hospitales, Centros de Salud)
 3. Fiscalizar la construcción referente a Infraestructura de Salud Pública (Hospitales, Centros de Salud)

Beneficios Cualitativos

Contribuir a incrementar la esperanza y calidad de vida de la población, mediante el mejoramiento de la infraestructura, construcción de unidades nuevas a las unidades de salud a nivel nacional.

Tipo de Beneficiario

*DIRECTOS: Se beneficiara 14'048.900 habitantes dentro de las provincias de CARCHI, CHIMBORAZO, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GALAPAGOS, GUAYAS, LOJA, MANABI, MORONA SANTIAGO, ORELLANA, PICHINCHA, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SUCUMBIOS, TUNGURAHUA, ZAMORA CHINCHIPE, en donde se construirán las diferentes Infraestructuras de Salud Pública.

* INDIRECTOS: Aumentar la cobertura en los territorios que cuentan con déficit atención en el ámbito de la salud, y alcanzar a nivel nacional (17.888.474 Habitantes aproximadamente por cumplimiento de instructivo)

Restricciones

TIEMPO: El proyecto estará una duración de 13 años aproximadamente
 COSTO: \$ 18.891.149,66 monto de inversión del proyecto. 2022


Restricciones

ALCANCE: Mejorar la calidad de prestación de servicios, mediante el incremento de la cobertura nacional de infraestructura de salud.
 RECURSOS:
 - Humanos: Profesionales en la rama de la Construcción para la ejecución de las obras.
 - Materiales: Es la materia Prima para la construcción como pétreos, cementos, hierre, etc.,
 - Equipos: La maquinaria que este presente en la construcción de cada una de la Infraestructura Pública de Salud.
 - Otros: Disponibilidad de terrenos para construcción de la nueva infraestructura de salud pública
 - El crecimiento poblacional se mantengan de acuerdo a los indicadores.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 76.81 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

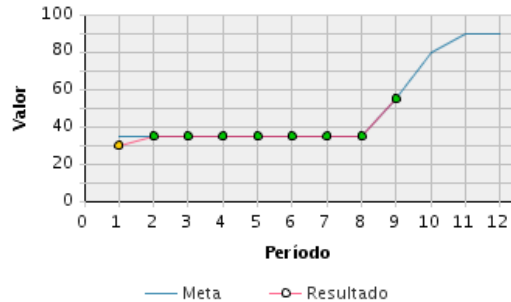

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	55 %	80 %	90 %	90 %
	Avance real acumulado											
	30 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	55 %			
Estado												
	▼	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2022:</p> <p>1. Este proyecto de inversión tiene como ejecutor y entidad requirente al Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO) actúa exclusivamente como co-ejecutor, una vez que se realiza la transferencia de recursos por parte del MSP (conforme convenio interinstitucional). Además, el MTO actúa como co-ejecutor a partir de la supresión del Servicio de Contratación de Obras (SECOB) a través del D.E. 1063 de 19 de mayo de 2020.</p> <p>2. La presente ficha denominada "K113 MTO - Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud" fue creada por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica conforme con lo señalado en el memorando Nro. MTO-CGPGE-2022-1040-ME de 02 de septiembre de 2022; en virtud de lo cual, no hay registros de valores devengados de años previos. (Anexo 1)</p> <p>3. Mediante Memorando Nro. MTO-SOP-2022-1211-ME de 06 de septiembre de 2022, suscrito por la Ing. Kiura Ninoska Santamaría Loor., Subsecretaria de Obras Públicas, designó al Arq. Hugo Xavier Vaca Aguirre, Analista de Transporte Terrestre 2, como Líder del proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud. (Anexo 2)</p> <p>4. Mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2022-1215-OF de 09 de septiembre de 2022, el SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el dictamen favorable a la modificación presupuestaria de transferencia de recursos a favor del favor del proyecto: "INFRAESTRUCTURA FISICA, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD " con CUP 123200000.632.2477, por un monto de 11.642.607,81 USD (HITO 4)</p> <p>5. El contrato Nro. SECOB-036-2017., que pertenece al proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud que corresponde a la</p>	Vaca Aguirre, Hugo Xavier	28/09/2022 - 02:26 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS DE DURAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, suscribió el Acta de Recepción Provisional el 09 de septiembre de 2022. (Anexo 3)</p> <p>6. A través del memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1286-ME de 21 de septiembre de 2022, Ing. Kiura Ninoska Santamaria Loor, Subsecretaria de Obras Públicas, solicitó al Sr. Mgs. Carlos Javier Becerra Albuja en calidad de Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, se realice la capacitación en el uso del sistema GPR a los nuevos líderes de proyecto, señalando lo siguiente: "se realiza una insistencia para que se realice la capacitación pertinente y oportuna, así como, el acompañamiento en el manejo de la herramienta de Gobierno por Resultados - GPR para el correcto registro de información"; así mismo, se solicitó que se entregue el Dictamen de Prioridad emitido por la Secretaría Nacional de Planificación, el documento del Proyecto, la Cédula Presupuestaria y la Matriz de Marco Lógico por cada proyecto de inversión asignado; sin embargo, en el presente periodo sólo se proporcionó las cédulas presupuestarias. (Anexo 4)</p> <p>7. La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica realizó la capacitación a los líderes de proyecto el 22 de septiembre de 2022 , en la cual se emitieron algunos lineamientos bajo los cuales se procedió a completar la información en la presente ficha denominada "K113 MTOP - Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud". (Anexo 5)</p> <p>8. Mediante Memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0592-ME de 26 de septiembre de 2022, el Arq. Juan Carlos Prado Leverone como DIRECTOR NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS solicitó la información técnica, correspondiente al proyecto de inversión Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud con la finalidad de recopilar la mayor cantidad de información que permita registrar el avance real del proyecto de inversión y registrarlo mediante los hitos, los mismos que podrían variar de acuerdo con la información que proporcione cada una de las áreas. HITO 5</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Recursos económicos insuficientes asignados al MTOP para el proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud.	28/09/2022	Hugo Xavier Vaca Aguirre	10	30	3	0/1
No se cuenta con Actas de Recepción Definitiva suscritas.	28/09/2022	Hugo Xavier Vaca Aguirre	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 2

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. Limitada asignación de recursos por parte de las Entidades Requirentes CAUSARÍA el retraso en los procesos de ejecución y entrega de obras de infraestructura pública.	28/09/2022	Juan Carlos Prado Leverone	10 %	10	1	1/3

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Montufar
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Lago Agrío

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Shushufindi
5	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Orellana
6	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pto. Quito
7	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
8	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Colta
9	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
10	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
11	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Chone
12	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pichincha
13	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > La Concordia
14	Zona 5 - Litoral > Galápagos > San Cristóbal
15	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
16	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Convenio Interinstitucional suscrito	1-Solicitud de Información	01/01/2012		01/01/2012		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Recursos Presupuestarios asignados	1-Solicitud de Información	01/01/2012		28/02/2022		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Contrato No. RE-SECOB-036-2017, suscrito.	4-Inicio de Trabajo	24/05/2017		24/05/2017		Sí	20.0
4	EJECUCIÓN: Modificación presupuestaria de transferencia de recursos solicitado 2022 (Dictamen Favorable)	1-Solicitud de Información	09/09/2022		09/09/2022		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Solicitud de información realizada.	5-Entregables Intermedios	26/09/2022		26/09/2022		Sí	15.0
6	EJECUCIÓN: Contratos de Obra Suscritos.	5-Entregables Intermedios	31/10/2022	31/10/2022			No	10.0
7	EJECUCIÓN: Recopilación de información realizada.	5-Entregables Intermedios	31/10/2022	31/10/2022			No	15.0
8	EJECUCIÓN: Contratos de Estudios Suscritos	5-Entregables Intermedios	30/11/2022	30/11/2022			No	5.0
9	EJECUCIÓN: Contratos de Fiscalización Suscritos	5-Entregables Intermedios	30/11/2022	30/11/2022			No	5.0
10	CIERRE: Actas de entrega recepción provisional de los contratos de obra suscritas.	5-Entregables Intermedios	02/01/2023	02/01/2023			No	2.0
11	CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva de los contratos de obra, fiscalización y estudios suscritas.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2023	31/03/2023			No	4.0
12	CIERRE: Terminaciones anticipadas unilaterales y de mutuo acuerdo suscritas	5-Entregables Intermedios	01/01/2024	01/01/2024			No	2.0
13	CIERRE: Informe de Cierre del Proyecto de inversión suscrito.	Z - Compromiso Ministerial	31/08/2025	31/08/2025			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de actas de entrega - recepción de obras públicas co-ejecutadas a nivel nacional conforme la normativa legal vigente.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/10/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	7,248,541.85 **
Costo Total:	7,248,541.85
Total Devengado:	2,892,715.82
% Costo Total Devengado:	39.91 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 39.91 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	7,248,541.85	0.00	7,248,541.85
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	7,248,541.85	0.00	7,248,541.85
Ppto. Codificado	0.00	7,248,541.85	0.00	7,248,541.85
Ppto. Comprometido	0.00	1,313,975.75	0.00	1,313,975.75
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	7,248,541.85	0.00	7,248,541.85
Ppto. Devengado	0.00	2,892,715.82	0.00	2,892,715.82
Pagado Real	0.00	1,537,955.58	0.00	1,537,955.58
Estimado a fin de año	* 0.00	4,355,826.03	0.00	4,355,826.03
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	2,892,715.82	0.00	2,892,715.82
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	39.91 %	0.00 %	39.91 %
Ppto. Codificado 998	0.00	1,368,106.29	0.00	1,368,106.29
Ppto. Devengado 998	0.00	1,368,106.29	0.00	1,368,106.29

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	1,862,281.45	1,558,918.19	1,862,281.45	1,558,918.19	83.71 %		21.51 %
Ago	1,351,323.73	1,333,797.63	3,213,605.18	2,892,715.82	90.01 %		39.91 %
Sep	980,072.60		4,193,677.78				
Oct	962,392.34		5,156,070.12				
Nov	942,949.34		6,099,019.46				
Dic	1,149,522.39		7,248,541.85				
Total	7,248,541.85	2,892,715.82					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar procesos de ejecución y entrega de obras de infraestructura pública a nivel nacional, MEDIANTE el desarrollo de herramientas de supervisión y control de proyectos de conformidad con la normativa legal vigente aplicable a los procesos de contratación de obra pública.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 HITO 1. Convenio Interinstitucional entre ICO - MSP. Suscrito.	convenio_interinstitucional_ico_ministerio_de_salud.pdf	08/09/2022
2	A.2 HITO 2. Recursos Presupuestarios asignados	MTOP-SOP-2022-0176-EXT_asignación_de_recursos_del_msp.pdf	08/09/2022
3	A.3 HITO 3. Contrato No. RE-SECOB-036-2017, suscrito.	CONTRATO_N_RE-SECOB-036-2017-1.pdf	08/09/2022
4	A.4 Anexo 1. CREACIÓN DE FICHA GPR. Memorando Nro. MTOP-CGPGE-2022-1040-ME	mtop-cgpge-2022-1040-me.pdf	28/09/2022
5	A.5 Anexo 2. Designación de Líder del Proyecto. Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1211-ME	MTOP-SOP-2022-1211-ME.pdf	08/09/2022
6	A.6 HITO 4. Dictamen favorable a la modificación presupuestaria de transferencia de recursos	4_SNP-SGP-SPN-2022-1215-OF.pdf	28/09/2022
7	A.7 Anexo 3. Acta de Recepción Provisional CONTRATO N. RE-SECOB-036-2017	2_Anexo_3.-_ACTA_PROVISIONAL_DURAN-_ULTIMA-signed-signed-signed.pdf	28/09/2022
8	A.8 Anexo 4. Capacitación GPR	MTOP-SOP-2022-1286-ME.pdf	28/09/2022
9	A.9 Anexo 5. Capacitación	Acta_de_asistencia_a_la_capacitación.pdf	28/09/2022
10	B.1 HITO 5. Solicitud de Información. MTOP-DNPOP-2022-0592-ME	3_MTOP-DNPOP-2022-0592-ME.pdf	28/09/2022
11	B.2 Ficha del Proyecto SENPLADES	Ficha_Proyecto-123200000.632.2477_(1).pdf	28/09/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Prado Leverone, Juan Carlos	Titular	Director Nacional de Producción de Obras Públicas	jprado@mtop.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Santamaría Loor, Kiura Ninoska	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria de Obras Públicas	ksantamaria@mtop.gob.ec	
Vaca Aguirre, Hugo Xavier	Lider de Proyecto	Analista de Transporte Terrestre 2	hvaca@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
150609_1.jpg	08/09/2022
