

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Producción de Obras Públicas

PROYECTO: K113 MTOP - Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud

Líder del Proyecto:	Vaca Aguirre, Hugo Xavier (hvaca@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santamaría Loor, Kiura Ninoska	Programas Relacionados:	
Titular:	Prado Leverone, Juan Carlos	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	123200000.632.2477	TIR:	36.96 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	287,231,173.10
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,527,271.47
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	01/12/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2024
Modificado por:	Vaca Aguirre, Hugo Xavier	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2022

DATOS GENERALES

Descripción

*DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El PIFEMEFS fue creado con objetivo de responder a las necesidades priorizadas por el Ministerio de Salud Pública, resultantes del diagnóstico situacional realizado en las unidades de salud de segundo y tercer nivel, las mismas que han experimentado desde el año 2.008 un incremento en la demanda de atención de los usuarios por la gratuidad progresiva de los servicios de salud, que a su vez determina que su infraestructura física, deba ser ampliada o remodelada, rediseñada y construida de acuerdo a las actuales necesidades de la población.

*PRODUCTO / SERVICIO: Incrementar la cobertura nacional de infraestructura de salud.
 Contratar las obras de infraestructura de la Entidad Requirente, así como todas las acciones que sean de competencia para contratar las obras de infraestructura del MSP.

1. Contratar/ Realizar estudios referente Infraestructura de Salud Pública, sean estos Hospitales o Centros de Salud.
2. Contratar la Construcción referente a Infraestructura de Salud Pública (Hospitales, Centros de Salud)
3. Contratar la Fiscalización para la construcción referente a Infraestructura de Salud Pública (Hospitales, Centros de Salud)

* LÍNEA BASE: Construcción de Infraestructura de Salud Pública (Hospitales y Centros de Salud), para aumentar la cobertura de salud a nivel nacional.

* OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:
 Mejorar la calidad de prestación de servicios, mediante el incremento de la cobertura nacional de infraestructura

- *OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Finalizar la contratación/diseño de estudios referente Infraestructura de Salud Pública, sean estos Hospitales o Centros de Salud.
 2. Finalizar la Construcción referente a Infraestructura de Salud Pública (Hospitales, Centros de Salud)
 3. Fiscalizar la construcción referente a Infraestructura de Salud Pública (Hospitales, Centros de Salud)

Beneficios Cualitativos

Contribuir a incrementar la esperanza y calidad de vida de la población, mediante el mejoramiento de la infraestructura, construcción de unidades nuevas a las unidades de salud a nivel nacional.

Tipo de Beneficiario

*DIRECTOS: Se beneficiara 14'048.900 habitantes dentro de las provincias de CARCHI, CHIMBORAZO, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GALAPAGOS, GUAYAS, LOJA, MANABI, MORONA SANTIAGO, ORELLANA, PICHINCHA, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SUCUMBIOS, TUNGURAHUA, ZAMORA CHINCHIPE, en donde se construirán las diferentes Infraestructuras de Salud Pública.

* INDIRECTOS: Aumentar la cobertura en los territorios que cuentan con déficit atención en el ámbito de la salud, y alcanzar a nivel nacional (17.888.474 Habitantes aproximadamente por cumplimiento de instructivo)

Restricciones

TIEMPO: El proyecto estará una duración de 13 años aproximadamente
 COSTO: \$ 18.891.149,66 monto de inversión del proyecto. 2022


Restricciones

ALCANCE: Mejorar la calidad de prestación de servicios, mediante el incremento de la cobertura nacional de infraestructura de salud.
 RECURSOS:
 - Humanos: Profesionales en la rama de la Construcción para la ejecución de las obras.
 - Materiales: Es la materia Prima para la construcción como pétreos, cementos, hierre, etc.,
 - Equipos: La maquinaria que este presente en la construcción de cada una de la Infraestructura Pública de Salud.
 - Otros: Disponibilidad de terrenos para construcción de la nueva infraestructura de salud pública
 - El crecimiento poblacional se mantengan de acuerdo a los indicadores.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 77.96 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

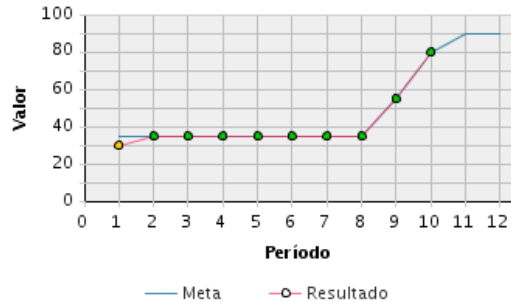

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	55 %	80 %	90 %	90 %
	Avance real acumulado											
	30 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	55 %	80 %		
Estado												
	▼	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recopilación de información de los todos los contratos de ESTUDIOS que forman parte del PROYECTO "INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD" (cumplimiento Hito 7) Se realizó el informe de los Contratos de Estudios del Proyecto INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD", del estado en que se encuentra cada estudio que pertenece a este proyecto (Anexo 17). Recopilación de información de los todos los contratos de FISCALIZACIÓN que forman parte del PROYECTO "INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD" (cumplimiento Hito 8) Se realizó el informe de los Contratos de Fiscalización del Proyecto INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD", del estado en que se encuentra cada estudio que pertenece a este proyecto (Anexo 18). Mediante Memorando Nro. Oficio Nro. MTOP-CGAF-22-413-OF de 19 de noviembre de 2022, la Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, entrego la información (CURS de pagos) respecto al proyecto PIFEMEFS. Anexo 19 Mediante Memorando Nro. MTOP-DDT-2022-2277-ME de 22 noviembre de 2022 suscrito por la Administradora de Contrato solicitó la AUTORIZACION DE PAGO LIQUIDACION DE REAJUSTES DEL CONTRATO RE-ICO-023-2013 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE BAÑOS 20 CAMAS " Anexo 20. Mediante Memorando Nro. MTOP-DDT-2022-2284-ME de 22 noviembre de 2022 suscrito por la Administradora de Contrato solicitó la AUTORIZACION DE PAGO LIQUIDACION DE 	Vaca Aguirre, Hugo Xavier	01/12/2022 - 11:46 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>REAJUSTES DEL CONTRATO RE-ICO-023-2013 "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE BAÑOS 20 CAMAS " Anexo 21.</p> <p>8. Mediante Memorando Nro. MTOP-DDT-2022-2288-ME de 23 noviembre de 2022 suscrito por la Administradora de Contrato solicitó la AUTORIZACION DE PAGO LIQUIDACION DE REAJUSTES DEFINITIVOS DEL CONTRATO RE-ICO-007-2013 "CONSTRUCCIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO" Anexo 22</p>		
<p>OCTUBRE:</p> <p>1. Recopilación de información de los contratos de OBRA que forman parte del PROYECTO "INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD" (cumplimiento Hito 6)</p> <p>2. Mediante Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1361-ME de 06 de octubre de 2022, la Ing. Kiura Ninoska Santamaria Loor, Subsecretaria de Obras Públicas solicitó al Subsecretario Zonal 3 y al Director de Transporte y Obras Públicas de Tungurahua y Cotopaxi, que se realicen las acciones dentro de su competencia para cumplir con la ejecución presupuestaria de los recursos asignados. Anexo 7</p> <p>3. Se gestionó para obtener la ficha del proyecto "INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD", que esta siendo usada por el Ministerio de Salud Pública el año 2022. Anexo 8</p> <p>4. Se realizó el informe de los Contratos de Obra del Proyecto INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD", del estado en que se encuentra cada obra que pertenece a este proyecto (cumplimiento Hito 7).</p> <p>5. Mediante Memorando Nro. MTOP-DDT-2022-1965-ME DE 17 DE octubre de 2022 AUTORIZACION DE PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO RE-ICO-007-2013 "CONSTRUCCIÓN Y RE POTENCIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE AMBATO", por parte de la Directora Distrital de Tungurahua y Administradora de Contrato. Anexo 9</p> <p>6. Mediante Memorando Nro. MTOP-DDT-2022-1993-ME de 21 de octubre de 2022, se solicitó la AUTORIZACION DE PAGO DE LA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO RE-ICO-007-2013 "CONSTRUCCIÓN Y RE POTENCIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE AMBATO", por parte de la Directora Distrital de Tungurahua y Administradora de Contrato. Anexo 10</p> <p>7. Mediante Oficio Nro. MTOP-CGPGE-22-261-OF de 26 de octubre de 2022, el Coordinador General De Planificación Y Gestión Estratégica, solcito a la Gerente del Proyecto de Reingeniería de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario Para los Servicios de Salud del Segundo y Tercer Nivel de Atención en Salud, autorizar el uso recursos en necesidades emergentes. Anexo 11</p> <p>8. Mediante Memorando Nro. Oficio Nro. MSP-SGOLS-2022-0211-O de 21 de octubre de 2022, la Mgs. Verónica Elizabeth Rosero Pazmiño. Subsecretaria de Gestión De Operaciones Y Logística En Salud, señaló que el monto de 15.103.758,97, para financiar las obligaciones pendientes del Hospital General de 400 Camas de Monte Sinaí, solicitado por el MTOP, y que se encuentra dentro del proyecto PIFEMEFS, ya no cuenta con el presupuesto solicitado para el presente ejercicio fiscal; sin embargo, se gestionará ante la Secretaría Nacional de Planificación la asignación e inclusión en la ejecución del ejercicio fiscal 2023. Anexo 12</p> <p>9. Mediante Oficio Nro. MSP-PRIEHSSTNAS-2022-0087-O de 31 de octubre de 2022 la Arq. Vanessa Mishel Mosquera Sevilla en calidad de Gerente del Proyecto de Reingeniería de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario Para los Servicios de Salud del Segundo y Tercer Nivel de Atención en Salud, recomendó al Coordinador General De Planificación Y Gestión Estratégica del MTOP: "considerar y dar prioridad al requerimiento del MTOP, en el cual se solicitó el valor de USD 15.103.758,97. Por lo expuesto; y dejando constancia de la obligación legal y cierre de los contratos de ejecución de obra, me permito autorizar el uso del recurso solicitado, sin perjuicio de las acciones de control que por las acciones u omisiones que se deriven, a consecuencia de las gestiones que se desarrollen para el cierre de los procesos con obligaciones pendientes de pago hasta la fecha." Anexo 13</p> <p>10. Se gestionó internamente con personal del MSP la siguiente información del Poryecto PIFEMEFS:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Dictamen de Prioridad SENPLADES: Oficio Nro. MSP-SDM-10-2014-3765-E_DICTAMEN_PRIORIDAD Anexo 14. . Dictamen de Arrastre PIFEMEFS. Oficio Nro. SNP-SNP-2022-0600-OF Anexo 15. . Dictamen Favorable PIFEMEFS. Oficio Nro. SNP-SNP-2022-0712-OF Anexo 16. 	<p>Vaca Aguirre, Hugo Xavier</p>	<p>01/11/2022 - 03:27 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2022:</p> <p>1. Este proyecto de inversión tiene como ejecutor y entidad requirente al Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) actúa exclusivamente como co-ejecutor, una vez que se realiza la transferencia de recursos por parte del MSP (conforme</p>	<p>Vaca Aguirre, Hugo Xavier</p>	<p>04/10/2022 - 09:09 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>convenio interinstitucional). Además, el MTOP actúa como co-ejecutor a partir de la supresión del Servicio de Contratación de Obras (SECOB) a través del D.E. 1063 de 19 de mayo de 2020.</p> <p>2. La presente ficha denominada "K113 MTOP - Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud" fue creada por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica conforme con lo señalado en el memorando Nro. MTOP-CGPGE-2022-1040-ME de 02 de septiembre de 2022; en virtud de lo cual, no hay registros de valores devengados de años previos. (Anexo 1)</p> <p>3. Mediante Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1211-ME de 06 de septiembre de 2022, suscrito por la Ing. Kiura Ninoska Santamaría Loor., Subsecretaria de Obras Públicas, designó al Arq. Hugo Xavier Vaca Aguirre, Analista de Transporte Terrestre 2, como Líder del proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud. (Anexo 2)</p> <p>4. Mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2022-1215-OF de 09 de septiembre de 2022, el SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el dictamen favorable a la modificación presupuestaria de transferencia de recursos a favor del favor del proyecto: "INFRAESTRUCTURA FISICA, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD " con CUP 123200000.632.2477, por un monto de 11.642.607,81 USD (HITO 4)</p> <p>5. El contrato Nro. SECOB-036-2017,, que pertenece al proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud que corresponde a la CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS DE DURAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, suscribió el Acta de Recepción Provisional el 09 de septiembre de 2022. (Anexo 3)</p> <p>6. A través del memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1286-ME de 21 de septiembre de 2022, Ing. Kiura Ninoska Santamaria Loor, Subsecretaria de Obras Públicas, solicitó al Sr. Mgs. Carlos Javier Becerra Albuja en calidad de Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, se realice la capacitación en el uso del sistema GPR a los nuevos líderes de proyecto, señalando lo siguiente: "se realiza una insistencia para que se realice la capacitación pertinente y oportuna, así como, el acompañamiento en el manejo de la herramienta de Gobierno por Resultados - GPR para el correcto registro de información"; así mismo, se solicitó que se entregue el Dictamen de Prioridad emitido por la Secretaría Nacional de Planificación, el documento del Proyecto, la Cédula Presupuestaria y la Matriz de Marco Lógico por cada proyecto de inversión asignado; sin embargo, en el presente periodo sólo se proporcionó las cédulas presupuestarias. (Anexo 4)</p> <p>7. La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica realizó la capacitación a los líderes de proyecto el 22 de septiembre de 2022 , en la cual se emitieron algunos lineamientos bajo los cuales se procedió a completar la información en la presente ficha denominada "K113 MTOP - Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud". (Anexo 5)</p> <p>8. Mediante Memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0592-ME de 26 de septiembre de 2022, el Arq. Juan Carlos Prado Leverone como DIRECTOR NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS solicitó la información técnica, correspondiente al proyecto de inversión Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud con la finalidad de recopilar la mayor cantidad de información que permita registrar el avance real del proyecto de inversión y registrarlo mediante los hitos, los mismos que podrían variar de acuerdo con la información que proporcione cada una de las áreas. HITO 5.</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Recursos económicos insuficientes asignados al MTOP para el proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud.	30/11/2022	Hugo Xavier Vaca Aguirre	10	30	3	0/1
No se cuenta con Actas de Recepción Definitiva suscritas.	30/11/2022	Hugo Xavier Vaca Aguirre	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 2

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. Limitada asignación de recursos por parte de las Entidades Requirentes CAUSARÍA el retraso en los procesos de ejecución y entrega de obras de infraestructura pública.	30/11/2022	Juan Carlos Prado Leverone	10 %	10	1	1/3

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Montufar
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Lago Agrio
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Shushufindi
5	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Orellana
6	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pto. Quito
7	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
8	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Colta
9	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
10	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
11	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Chone
12	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pichincha
13	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > La Concordia
14	Zona 5 - Litoral > Galápagos > San Cristóbal
15	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
16	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipec > Toda la Provincia de Zamora Chinchipec


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Convenio Interinstitucional suscrito	1-Solicitud de Información	01/01/2012		01/01/2012		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Recursos Presupuestarios asignados	1-Solicitud de Información	01/01/2012		28/02/2022		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Contrato No. RE-SECOB-036-2017, suscrito.	4-Inicio de Trabajo	24/05/2017		24/05/2017		Sí	20.0
4	EJECUCIÓN: Modificación presupuestaria de transferencia de recursos solicitado 2022 (Dictamen Favorable)	1-Solicitud de Información	09/09/2022		09/09/2022		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Solicitud de información realizada.	5-Entregables Intermedios	26/09/2022		26/09/2022		Sí	15.0
6	EJECUCIÓN: Contratos de Obra Suscritos.	5-Entregables Intermedios	31/10/2022		31/10/2022		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Recopilación de información realizada.	5-Entregables Intermedios	31/10/2022		31/10/2022		Sí	15.0
8	EJECUCIÓN: Contratos de Estudios Suscritos	5-Entregables Intermedios	30/11/2022	30/11/2022			No	5.0
9	EJECUCIÓN: Contratos de Fiscalización Suscritos	5-Entregables Intermedios	30/11/2022	30/11/2022			No	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
10	CIERRE: Actas de entrega recepción provisional de los contratos de obra suscritas.	5-Entregables Intermedios	02/01/2023	02/01/2023			No	2.0
11	CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva de los contratos de obra, fiscalización y estudios suscritas.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2023	31/03/2023			No	4.0
12	CIERRE: Terminaciones anticipadas unilaterales y de mutuo acuerdo suscritas	5-Entregables Intermedios	01/01/2024	01/01/2024			No	2.0
13	CIERRE: Informe de Cierre del Proyecto de inversión suscrito.	Z - Compromiso Ministerial	31/08/2025	31/08/2025			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de actas de entrega - recepción de obras públicas co-ejecutadas a nivel nacional conforme la normativa legal vigente.		-	-	-	01/10/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,527,271.47 **
Costo Total:	20,198,568.31
Total Devengado:	15,150,524.16
% Costo Total Devengado:	75.01 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 75.01 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	20,527,271.47	0.00	20,527,271.47
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	20,527,271.47	0.00	20,527,271.47
Ppto. Codificado	0.00	20,527,271.47	0.00	20,527,271.47
Ppto. Comprometido	0.00	1,313,975.75	0.00	1,313,975.75
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	20,527,271.47	0.00	20,527,271.47
Ppto. Devengado	0.00	15,150,524.16	0.00	15,150,524.16
Pagado Real	0.00	1,537,955.58	0.00	1,537,955.58
Estimado a fin de año	* 0.00	4,355,826.03	0.00	4,355,826.03
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	16,171,445.44	0.00	16,171,445.44
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	73.81 %	0.00 %	73.81 %
Ppto. Codificado 998	0.00	1,368,106.29	0.00	1,368,106.29
Ppto. Devengado 998	0.00	1,368,106.29	0.00	1,368,106.29

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

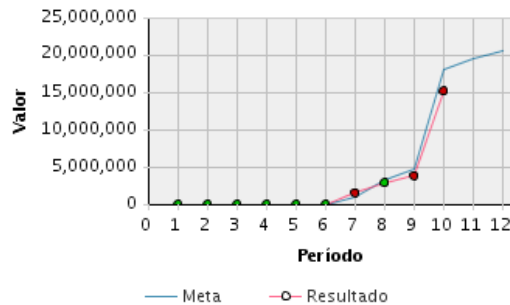

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	853,950.02	1,558,918.19	853,950.02	1,558,918.19	182.55 %		7.59 %
Ago	2,359,655.16	1,333,797.63	3,213,605.18	2,892,715.82	90.01 %		14.09 %
Sep	1,429,875.92	941,589.62	4,643,481.10	3,834,305.44	82.57 %		18.68 %
Oct	13,338,623.99	11,316,218.72	17,982,105.09	15,150,524.16	84.25 %		73.81 %
Nov	1,395,643.99		19,377,749.08				
Dic	1,149,522.39		20,527,271.47				
Total	20,527,271.47	15,150,524.16					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar procesos de ejecución y entrega de obras de infraestructura pública a nivel nacional, MEDIANTE el desarrollo de herramientas de supervisión y control de proyectos de conformidad con la normativa legal vigente aplicable a los procesos de contratación de obra pública.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 HITO 1. Convenio Interinstitucional entre ICO - MSP. Suscrito.	convenio_interinstitucional_ico_ministerio_de_salud.pdf	08/09/2022
2	A.2 HITO 2. Recursos Presupuestarios asignados	MTOP-SOP-2022-0176-EXT_asignación_de_recursos_del_msp.pdf	08/09/2022
3	A.3 HITO 3. Contrato No. RE-SECOB-036-2017, suscrito.	CONTRATO_N._RE-SECOB-036-2017-1.pdf	08/09/2022
4	A.4 Anexo 1. CREACIÓN DE FICHA GPR. Memorando Nro. MTOP-CGPGE-2022-1040-ME	mtop-cgpgge-2022-1040-me.pdf	28/09/2022
5	A.5 Anexo 2. Designación de Líder del Proyecto. Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1211-ME	MTOP-SOP-2022-1211-ME.pdf	08/09/2022
6	A.6 HITO 4. Dictamen favorable a la modificación presupuestaria de transferencia de recursos	4._SNP-SGP-SPN-2022-1215-OF.pdf	28/09/2022
7	A.7 Anexo 3. Acta de Recepción Provisional CONTRATO N. RE-SECOB-036-2017	2._Anexo._3.-_ACTA_PROVISIONAL_DURAN-_ULTIMA-signed-signed-signed.pdf	28/09/2022
8	A.8 Anexo 4. Capacitación GPR	MTOP-SOP-2022-1286-ME.pdf	28/09/2022
9	A.9 Anexo 5. Capacitación	Acta_de_asistencia_a_la_capacitación.pdf	28/09/2022
10	B.1 HITO 5. Solicitud de Información. MTOP-DNPOP-2022-0592-ME	3._MTOP-DNPOP-2022-0592-ME.pdf	28/09/2022
11	B.2 Anexo 6. Ficha del Proyecto SENPLADES	Ficha_Proyecto-123200000.632.2477_(1).pdf	28/09/2022
12	B.3 HITO 6. Contratos De Obra Firmado	CONTRATOS_DE_OBRA-signed-signed.pdf	01/11/2022
13	B.4 Anexo 7. Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1361-ME	7._MTOP-SOP-2022-1361-ME.pdf	01/11/2022
14	B.5 Anexo 8. Ficha del PROYECTO MSP - PIFMEFS 2022	8._Ficha_Proyecto_actual_2022.pdf	01/11/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	B.6 HITO 7. Recopilación de información realizado	INFORME_Infraestructura_Fisica_Equipamiento_Mantenimiento_01102022 signed.pdf	01/10/2022
16	B.7 Anexo 9. Memorando Nro. MTOP-DDT-2022-1965-ME	MTOP-DDT-2022-1965-ME.pdf	01/11/2022
17	B.8 Anexo 10. Memorando Nro. MTOP-DDT-2022-1993-ME	MTOP-DDT-2022-1993-ME.pdf	01/11/2022
18	B.9 Anexo 11. Oficio Nro. MTOP-CGPGE-22-261-OF	11._MTOP-CGPGE-22-261-OF.pdf	01/11/2022
19	C.1 Anexo 12. Oficio Nro. MSP-SGOLS-2022-0211-O	Oficio_Nro._MSP-SGOLS-2022-0211-O.pdf	01/11/2022
20	C.2 Anexo 13. Oficio Nro. MSP-PRIEHSSTNAS-2022-0087-O	12._Oficio_Nro._MSP-PRIEHSSTNAS-2022-0087-O.pdf	01/11/2022
21	C.3 Anexo 14. Dictamen de Prioridad SENPLADES: Oficio Nro. MSP-SDM-10-2014-3765-E_DICTAMEN_PRIORIDAD	14._MSP-SDM-10-2014-3765-E_DICTAMEN_PRIORIDAD.pdf	01/11/2022
22	C.4 Anexo 15. Dictamen de Arrastre PIFEMEFS. Oficio Nro. SNP-SNP-2022-0600-OF	15._SNP-SNP-2022-0600-OF_DICTAMEN_ARRASTRE_2022_PIFEMEFS.pdf	01/11/2022
23	C.5 Anexo 16. Dictamen Favorable PIFEMEFS. Oficio Nro. SNP-SNP-2022-0712-OF	16._OFICIO_SNP_SNP_712.pdf	01/11/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Prado Leverone, Juan Carlos	Titular	Director Nacional de Producción de Obras Públicas	jprado@mtop.gob.ec	
Santamaría Loor, Kiura Ninoska	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria de Obras Públicas	ksantamaria@mtop.gob.ec	
Vaca Aguirre, Hugo Xavier	Lider de Proyecto	Analista de Transporte Terrestre 2	hvaca@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
150609_1.jpg	08/09/2022
