

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de Obras Públicas**  
**Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas**  
**PROYECTO: K002 Nueva Infraestructura Educativa**

|                                |  |                                 |                         |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Estrella Jaramillo, Andres Bayardo (aestrella@mtop.gob.ec) |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Santamaría Loor, Kiura Ninoska                             | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Romero Echeverría, Antonina de los Angeles                 | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura  | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 91400000.78.6172   | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 1  | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Media  | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 9,207,831.63            |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                           |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |  | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 03/03/2009 - 26/12/2023 |
| Fecha de última actualización: | 03/08/2023   | Fecha de Fin Base:              | 26/12/2023              |
| Modificado por:                | Estrella Jaramillo, Andres Bayardo                         | Fecha del siguiente Hito:       | 27/10/2023              |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:: Nueva Infraestructura Educativa: se ha ampliado y mejorado progresivamente la oferta de infraestructura escolar existente para niños, niñas, jóvenes y adolescentes en edad escolar en base al reordenamiento de la oferta educativa.

PRODUCTO / SERVICIO: Construcción y potenciación de Unidades Educativas y direcciones distritales a nivel Nacional en Ecuador

LÍNEA BASE: Ampliación de cobertura educativa: infraestructura, equipamiento y contratación de personal docente

OBJETIVO: Contratar los Estudios Obra y Fiscalización de las UEM , financiadas por el crédito CAF

OBJETIVO ESPECÍFICO: Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior.

RECURSOS: Humanos Materiales y Económicos.

**Beneficios Cualitativos**

Este proyecto propone el mejoramiento de accesibilidad a los distintos niveles de educación proponiendo para este fin la creación de infraestructura educativa adecuada y completa, brindando así una educación de calidad.

: Se ha ampliado y mejorado progresivamente la oferta de infraestructura escolar existente para niños, niñas, jóvenes y adolescentes en edad escolar en base al reordenamiento de la oferta educativa.

**Tipo de Beneficiario**

1.- Beneficiarios Directos 1,302,487.00

Beneficiarios Directos Femenino 664,270.00  
 Beneficiarios Directos Masculino 638,217.00

2.- Beneficiarios Indirectos 3,279,960.00

**Restricciones**

TIEMPO: El tiempo de ejecución será el estipulado dentro del contrato CFA- 8741 y a lo determinado dentro del mismo aproximadamente 14 años de duración

COSTO : valor de la ficha SIPeIP 3'134,845,229.50 usd

**Restricciones**


RECURSO: Materiales, Humanos y materiales

ALCANCE: Cumplir con las fases precontractual y contractual de estudios, obra y fiscalización según sea del caso

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 97.32 %  
 Fecha de Inicio: 03/03/2009 Fecha de Fin: 26/12/2023

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

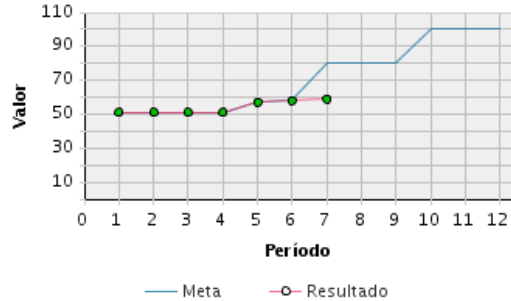

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct   | Nov   | Dic   |
| 2023                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|                      | 51 %                        | 51 % | 51 % | 51 % | 57 % | 58 % | 80 % | 80 % | 80 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|                      | 51 %                        | 51 % | 51 % | 51 % | 57 % | 58 % | 59 % |      |      |       |       |       |
| Estado               |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |      |      |       |       |       |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                     | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| <p>JULIO 2023 :</p> <p>Se realiza el pago a los técnicos que ejecutaron el Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (MANABI). GUALE - PRIMER GRUPO .</p> <p>Dicha actividad se evidencia en los documentos adjuntos correspondientes a CEDULA PRESUPUESTARIA DEL PERIODO DE JULIO 2023 y CUR de pagos adjuntos</p>   | Estrella Jaramillo, Andres Bayardo | 03/08/2023 - 02:51 PM         |
| <p>JUNIO 2023 :</p> <p>HITO 25 - ESTUDIOS</p> <p>ESTUDIOS DE GEOTECNIA, MECÁNICA DE SUELOS Y PRUEBAS DE HORMIGÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA REPOTENCIACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS: 29 D AGOSTO PAQ. FEBRES CORDERO, BBHYO, PROV LOS RIOS DARIO GUEVARA</p>   | Estrella Jaramillo, Andres Bayardo | 04/07/2023 - 09:27 AM         |
| <p>MAYO 2023</p> <p>-UEM EUGENIO ESPEJO</p> <p>HITO 20 - FISCALIZACION</p> <p>PAGO DE PLANILLAS 5,6,7,8,9 Y 10 DE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESTANDARIZADA DEL MILENIO, TIPOLOGIA MAYOR, EUGENIO ESPEJO, UBICADA PARROQUIA SALINAS, CANTON SALINAS, PROV STA ELENA</p> <p>HITO 23 - COSTRUCCION</p> <p>PAGO DE PLANILLAS PAGO DE PLANILLA CC1 Y PLANILLAS 9, 10, 11 Y 12 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS UEM MAYOR OTTO AROSEMENA</p> | Estrella Jaramillo, Andres Bayardo | 05/06/2023 - 03:26 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                            | Fecha de última actualización |
|--|---|-------------------------------|
| <p>EN EL CANTON MILAGRO Y LA UEM SALITRE, UBICADA EN PARROQUIA JUQUILLAL CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESTANDARIZADA DEL MILENIO, TIPOLOGIA MAYOR, EUGENIO ESPEJO, UBICADA PARROQUIA SALINAS, CANTON SALINAS, PROV STA ELENA</p> <p>-UNIDAD EDUCATIVA OTTO AROSEMENA</p> <p>HITO 19 - FISCALIZACION<br/>PAGO DE PLANILLA CC1 Y PLANILLAS 5,6,7,8,9 Y 10 X FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS UEM TIPOLOGIA MAYOR OTTO AROSEMENA EN EL CANTON MILAGRO Y LA UEM DEL MILENIO MAYOR SALITRE, UBICADA EN PARROQUIA JUQUILLAL</p> <p>HITO 22 - COSTRUCCION<br/>PAGO DE PLANILLA 11 POR LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR OTTO AROSEMENA PARROQUIA MILAGRO CANTON MILAGRO PROVINCIA DE GUAYA</p> <p>- UEM VENTANAS ZAPOTAL VIEJO</p> <p>HITO 24 - COSTRUCCION<br/>PAGO DE PLANILLA 11 Y 12 POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA UEM VENTANAS ZAPOTAL VIEJO- CANTON VENTANAS, PROV.LOS RIOS</p> <p>-DIRECCION DISTRITAL 12D01 BABA_BABAHOYO_MONTALVO_LOS RIOS_MTOP SE PAGAN ESTUDIO DE GEOTECNIA EN VARIAS LOCALIDADES CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR REPOTENCIACIONES DE UNIDADES EDUCARTIVAS</p> <p>HITO 21 - ESTUDIOS<br/>ESTUDIOS DE GEOTECNIA, MECÀNICA DE SUELOS Y PRUEBAS DE HORMIGÒN DE ESTRUCTIURAS EXISTENTES PARA REPOTENCIACIÒN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS: 29 DE AGOSTO, PAQ. FEBRES CORDERO, BBHYO, PROV LOS RIOS DARIO GUEVARA, PAQ EL SALTO, BABAHOYO Y 24 DE MAYO, PAQ 24 DE MAYO.</p> |   |                               |
| <p>ABRIL 2023 :</p> <p>Se mantiene el estado de CONGELADO para el proyecto en conformidad a lo expresado en el MTOP-CGPGE-2023-67-ME del 14 de enero de 2023, pues no existe variación en su estatus.</p>  | <p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p> | <p>05/05/2023 - 12:53 PM</p>  |
| <p>MARZO 2023:</p> <p>Se mantiene el estado de CONGELADO para el proyecto en conformidad a lo expresado en el MTOP-CGPGE-2023-67-ME del 14 de enero de 2023, ya que hasta el momento no se han asignado recursos para su ejecución, esto se evidencia conforme a lo detallado en la cedula presupuestaria adjunta</p>  | <p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p> | <p>03/04/2023 - 09:59 AM</p>  |
| <p>FECHERO 2023:</p> <p>Se mantiene el estado de CONGELADO para el proyecto en conformidad a lo expresado en el MTOP-CGPGE-2023-67-ME de 14 de enero de 2023, ya que hasta el momento no se han asignado recursos para su ejecución</p>  | <p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p> | <p>05/03/2023 - 08:13 PM</p>  |
| <p>ENERO 2023:</p> <p>1.-Mediante Memorando Nro. MTOP-SOP-2023-0067-ME de 30 de enero del 2022, Se solicita el cambio de estado del proyecto a "CONGELADO", esto en conformidad a lo detallado en el documento presentado como líder de proyecto que en su parte pertinente detalla:<br/>(")<br/>"Mediante memorando Nro. MTOP-CGPGE-2023-67-ME de 14 de enero de 2023 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica (MTOP) remitió el POA de inversión 2023 de esta Cartera de Estado, aprobado por el Señor Ministro de Transporte y Obras Públicas; cuya información del POA 2023 ha sido definida conforme los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el ejercicio fiscal en curso.<br/>Al verificar el Plan Operativo Anual 2023 antes detallado se evidencia que la institución no ha recibido por parte del Ministerio de Educación, la asignación de recursos para financiar el proyecto de inversión en mención; causal para que el proyecto sea CONGELADO en la herramienta GPR."</p>  | <p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p> | <p>03/02/2023 - 03:36 PM</p>  |
| <p>DICIEMBRE 2022<br/>Se da cumplimiento a los Hitos<br/>Hito 12 :</p>   | <p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p> | <p>04/01/2023 - 12:05 PM</p>  |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                            | Fecha de última actualización |
|--|---|-------------------------------|
| <p>Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (GUAYAS- NARNJITO).<br/>                     Hito 13:<br/>                     Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (PICHINCHA- INIAP).<br/>                     Hito 14:<br/>                     Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (PICHINCHA-ALOAG).<br/>                     Hito 15:<br/>                     Pago de planilla de liquidación por la fiscalización de la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Naranjal - Naranjito - TARQUI-CHEMIS.<br/>                     Hito 16:<br/>                     Pago de la planilla No. 2 de contrato complementario n° 3 por la fiscalización de la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Naranjal - Naranjito - TARQUI-CHEMIS.<br/>                     Hito 17:<br/>                     Pago de la planilla No. 2 orden de trabajo por la fiscalización de la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Naranjal - Naranjito - TARQUI-CHEMIS.<br/>                     Hito 18:<br/>                     Pago de la planilla No. 20 y 21 por la fiscalización de la construcción de la Unidad Educativa Milenio Naranjal - Naranjito - TARQUI- CHEMIS.<br/>                     Esta ejecución se evidencia en conformidad a la información detallada en el Reportes - CUR de Ejecución del Gasto correspondiente al mes de diciembre del 2022.</p>  |   |                               |
| <p>NOVIEMBRE 2022</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA VENTANAS</p> <p>1.- PAGO DE PLANILLA 3 CC2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR VENTANAS ZAPOTAL VIEJO. MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2022-1652-ME PERIODO SEP 2022</p> <p>2.- - PAGO DE LA PLANILLA 4 CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 2 DE OBRA DE LA "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR VENTANAS ZAPOTAL VIEJO. MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2022-1817- ME OCT 2022</p> <p>UNIDAD EDUCATIVA SAMANES</p> <p>1- PAGO DE PLANILLA No. 16 CONTRATO RE SECOB 034 2017 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SAMANES TERMINAL TERRESTRE UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI CANTON GUAYAQUIL.</p> <p>2., PAGO DE PLANILLAS DE ORDEN DE CAMBIO No. 1 PLANILLA No. 1 Y 2 POR EL INCREMENTO DE CANTIDADES DE OBRA DENTRO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDEM EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR SAMANES</p> <p>3.,PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDACION CONTRATO RE SECOB 034 2017 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SAMANES TERMINAL TERRESTRE UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI</p> <p>4.- PADO DE PLANILLA PLANILLA No. 12 C. COMPLEMENTARIO 1 RE SECOB 034 2017 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SAMANES TERMINAL TERRESTRE UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI CANTON GUAYAQUIL. CANTON GUAYAQUIL. MTOP-DDG-2022-2079-ME</p> <p>5.- PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDACION CONT. COMPLEMENTARIO 1 RE SECOB 034 2017 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SAMANES TERMINAL TERRESTRE UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI CANTON GUAYAQUIL. MTOP-DDG-2022-2558-ME.</p> | <p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p> | <p>05/12/2022 - 09:12 PM</p>  |
| <p>OCTUBRE</p> <p>Se da cumplimiento a los siguientes Hitos:</p> <p>Hito 6: Determinación de contratos cerrados de fiscalización:</p> <p>Con memorandos :</p> <p>MTOP-DNCFOP-2022-0449-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0451-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0473-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0467-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0472-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0453-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0469-ME</p> <p>Se receipta la información de la Dirección de Fiscalización para el análisis correspondiente sobre los contratos cerrado y el estado de los contratos abiertos o pendientes de cierre, para lo cual en cada informe se adjunta un enlace de almacenamiento con la información disponible</p>  | <p>Estrella Jaramillo, Andres Bayardo</p> | <p>01/11/2022 - 02:39 PM</p>  |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                                | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| <p> <a href="https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/pK7RNSTiq7J6MYc">https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/pK7RNSTiq7J6MYc</a><br/> <a href="https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/NrxagN4mNnEZTaF">https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/NrxagN4mNnEZTaF</a><br/> <a href="https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/5MBbpNFHjWX4fXi">https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/5MBbpNFHjWX4fXi</a><br/> <a href="https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/5MBbpNFHjWX4fXi">https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/5MBbpNFHjWX4fXi</a><br/> <a href="https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/e4rfRTrgtDYSN9D">https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/e4rfRTrgtDYSN9D</a><br/> <a href="https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/AgdM4QTcw49Dtgx">https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/AgdM4QTcw49Dtgx</a><br/> <a href="https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/CWl9SjAZkDwiDzB">https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/CWl9SjAZkDwiDzB</a> </p> <p>Hito 7: Determinación de contratos cerrados de obra</p> <p>Con memorando MTOP-DNPOP-2022-0585-ME , Se recepta la información de la Dirección de Obras para el análisis correspondiente sobre los contratos cerrado y el estado de los contratos abiertos o pendientes de cierre, paro lo cual en cada informe se adjunta un enlace de almacenamiento con la información disponible</p> <p><a href="https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/c6Qofa7JjW44M6W">https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/c6Qofa7JjW44M6W</a></p> <p>Hito 8 : Determinación de contratos cerrados de estudios+</p> <p>Con memorando MTOP-DNEOP-2022-2105-ME , Se recepta la información de la Dirección de Estudios para el análisis correspondiente sobre los contratos cerrado y el estado de los contratos abiertos o pendientes de cierre, paro lo cual en cada informe se adjunta un enlace de almacenamiento con la información disponible</p> <p><a href="https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/Z2Aw8SiffjbtbnH">https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/Z2Aw8SiffjbtbnH</a></p> |   |                               |
| <p>SEPTIEMBRE 2022:</p> <p>1.-Mediante memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1211-ME de 06 de septiembre de 2022, remitido por la Ing. Kiura Ninoska Santamaria Loor, SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS se realiza la designación de LÍDERES DE PROYECTO para proyectos inversión Ex-SECOB y Ecuador Estratégico E.P. en la herramienta GPR.</p> <p>2.- Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1968-ME, de 20 de septiembre de 2022, se realiza la solicitud información a las distintas Direcciones de la SOP, correspondiente a los contratos parte del proyecto NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA .</p> <p>3.- Modificación de los datos económicos del proyecto, debido a un decremento en los valores asignados según cédula presupuestaria de septiembre 2022</p> <p>4.- Se da cumplimiento de los siguientes Hitos.<br/>                     Hito 1 : convenio Interinstitucional<br/>                     Hito 2: Identificación de recursos asignados<br/>                     Hito 3 : Solicitud de Información a las Direcciones de Fiscalización, Estudios y Obras perteneciente a la Subsecretaría de Obras Publica.</p> <p>5.- Se registra el devengado correspondiente al mes de Septiembre, se anexa Cedula Presupuestaria.</p>   | <p>Estrella Jaramillo,<br/>Andres Bayardo</p> | <p>05/10/2022 - 08:57 PM</p>  |

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

|   | Localidad de Impacto                        |
|---|---|
| 1 | Zona 1 - Norte > Carchi > Espejo            |
| 2 | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas    |
| 3 | Zona 1 - Norte > Imbabura > Otavalo         |
| 4 | Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Orellana |
| 5 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > La Mana        |

**LOCALIDADES**

|    | Localidad de Impacto                         |
|----|--|
| 6  | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Saquisilí       |
| 7  | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Sigchos         |
| 8  | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta           |
| 9  | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pajan           |
| 10 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales      |
| 11 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Santa Ana       |
| 12 | Zona 5 - Litoral > Bolívar > Chillanes       |
| 13 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Balao            |
| 14 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Daule            |
| 15 | Zona 5 - Litoral > Guayas > El Triunfo       |
| 16 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Milagro          |
| 17 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal         |
| 18 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjito        |
| 19 | Zona 5 - Litoral > Guayas > Playas           |
| 20 | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Palenque       |
| 21 | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Quevedo        |
| 22 | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Ventanas       |
| 23 | Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Santa Elena |
| 24 | Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca             |
| 25 | Zona 6 - Austro > Cañar > La Troncal         |
| 26 | Zona 7 - Sur > Loja > Loja                   |
| 27 | Zona 8 - DMG > Guayas > Durán                |
| 28 | Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil            |
| 29 | Zona 8 - DMG > Guayas > Samborombón          |
| 30 | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito             |

**HITOS**

|   | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICION: Firma de convenio Interinstitucional   | Z - Compromiso Ministerial | 09/12/2014         |                | 09/12/2014 |          | Sí            | 10.0          |
| 2 | PLANEACION: Identificación de recursos asignados   | 9-Entregables Formales     | 20/12/2014         |                | 20/12/2014 |          | Sí            | 10.0          |
| 3 | EJECUCIÓN: Solicitud de información de contratos de estudios                             | 1-Solicitud de Información | 20/09/2022         |                | 20/09/2022 |          | Sí            | 2.0           |
| 4 | EJECUCIÓN: Solicitud de información de contratos de fiscalización                        | 1-Solicitud de Información | 20/09/2022         |                | 20/09/2022 |          | Sí            | 2.0           |
| 5 | EJECUCIÓN: Solicitud de información de contratos de obras                                | 1-Solicitud de Información | 20/09/2022         |                | 20/09/2022 |          | Sí            | 2.0           |
| 6 | EJECUCION : Determinación de contratos cerrados de fiscalización                         | 5-Entregables Intermedios  | 11/10/2022         |                | 07/11/2022 |          | Sí            | 2.0           |
| 7 | EJECUCION : Determinación de contratos cerrados de obra                                  | 5-Entregables Intermedios  | 11/10/2022         |                | 07/11/2022 |          | Sí            | 2.0           |
| 8 | EJECUCIÓN Determinación de contratos cerrados de estudios                                | 5-Entregables Intermedios  | 11/10/2022         |                | 07/11/2022 |          | Sí            | 2.0           |
| 9 | EJECUCIOON : Pago de planillas de avance de obra pendientes, ordenes de cambio, contrato | 5-Entregables Intermedios  | 24/11/2022         |                | 06/12/2022 |          | Sí            | 2.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | complementario y liquidación de contratos UNIDAD EDUCATIVA SAMANES   |                           |                    |                |            |   |               |               |
| 10 | EJECUCIOON : Pago de planillas 2 y 3 del contrato complementario para la UNIDAD EDUCATIVA VENTANAS   | 5-Entregables Intermedios | 25/11/2022         |                | 06/12/2022 |    | Sí            | 2.0           |
| 11 | EJECUCIOM : PAGO DE PLANILLA No. 9 Y 10 CO POR LA "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR VENTANAS ZAPOTAL VIEJO  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         |                | 02/12/2022 |    | Sí            | 2.0           |
| 12 | EJECUCION : Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (GUAYAS- NARNJITO)  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         |                | 13/12/2022 |    | Sí            | 2.0           |
| 13 | EJECUCION : Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (PICHINCHA- INIAP)  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         |                | 22/12/2022 |    | Sí            | 2.0           |
| 14 | EJECUCION : Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (PICHINCHA-ALOAG)   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         |                | 22/12/2022 |   | Sí            | 2.0           |
| 15 | EJECUCION : PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION POR LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NARANJAL - NARANJITO - TARQUI-CHEMIS,                         | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         |                | 02/12/2022 |  | Sí            | 1.0           |
| 16 | EJECUCION :PAGO DE LA PLANILLA No. 2 DEL CINTRATO COMPLMRNTARIO N° 3 POR LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NARANJAL - NARANJITO - TARQUI-CHEMIS | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         |                | 02/12/2022 |  | Sí            | 2.0           |
| 17 | EJECUCION :PAGO DE LA PLANILLA No. 2 ORDEN DE TRABAJO POR LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NARANJAL - NARANJITO - TARQUI-CHEMIS,               | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         |                | 02/12/2022 |  | Sí            | 2.0           |
| 18 | EJECUCION :PAGO DE LA PLANILLA No. 20 Y 21 POR LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022         |                | 02/12/2022 |  | Sí            | 2.0           |



HITOS


|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | MILENIO NARANJAL - NARANJITO - TARQUI-CHEMIS  |                           |                    |                |            |   |               |               |
| 19 | EJECUCION : PAGO DE PLANILLA CC1 Y PLANILLAS 5,6,7,8,9 Y 10 X FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UEM OTTO AROSEMENA - CANTON MILAGRO Y UEM SALITRE, UBICADA EN PARROQUIA JUQUILLAL  | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2023         |                | 30/05/2023 |    | Sí            | 1.0           |
| 20 | EJECUCION : PAGO DE PLANILLAS 5,6,7,8,9 Y 10 X FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UEM EUGENIO ESPEJO - CANTON SALINAS, PROV. SANTA ELENA  | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2023         |                | 30/05/2023 |    | Sí            | 1.0           |
| 21 | EJECUCION : PAGO DE ESTUDIO DE GEOTECNIA, MECÁNICA DE SUELOS Y PRUEBAS DE HORMIGÓN PARA REPOTENCIACIÓN DE LAS UEM: 29 DE AGOSTO, PAQ. FEBRES CORDERO, BBHYO, PROV LOS RIOS DARIO GUEVARA, PAQ EL SALTO, BABAHOYO Y 24 DE MAYO, PAQ 24 DE MAYO | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2023         |                | 30/05/2023 |    | Sí            | 1.0           |
| 22 | EJECUCION : PAGO DE PLANILLA 11 X CONSTRUCCIÓN DE LA UEM OTTO AROSEMENA - CANTON MILAGRO Y UEM SALITRE, UBICADA EN PARROQUIA JUQUILLAL  | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2023         |                | 30/05/2023 |  | Sí            | 1.0           |
| 23 | EJECUCION : PAGO DE PLANILLA CC1 Y PLANILLAS 9, 10, 11 Y 12 X CONSTRUCCIÓN DE LA UEM EUGENIO ESPEJO - CANTON SALINAS, PROV. SANTA ELENA   | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2023         |                | 30/05/2023 |  | Sí            | 1.0           |
| 24 | EJECUCION : PAGO DE PLANILLAS , 11 Y 12 X CONSTRUCCIÓN DE LA UEM VENTANAS ZAPOTAL VIEJO- CANTON VENTANAS, PROV.LOS RIOS   | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2023         |                | 30/05/2023 |  | Sí            | 1.0           |
| 25 | EJECUCION : PAGO D PLANILLA UNICA GEOSUELOS CIA LTDA.- ESTUDIOS D GEOTECNIA, MECÁNICA DE SUELOS Y PRUEBAS D HORMIGÓN D ESTRUCTIURAS EXISTENTES PARA REPOTENCIACIÓN D UEMs 29 D AGOSTO PAQ. FEBRES CORDERO, BBHYO, PROV LOS RIOS DARIO GUEVARA | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023         |                | 15/06/2023 |  | Sí            | 1.0           |
| 26 | EJECUCION : Levantamiento técnico para cierre de  | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2023         |                | 28/07/2023 |  | Sí            | 1.0           |



**HITOS**

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (MANABI) - GUALE - GRUPO 01 |  |                    |                |            |   |               |               |
| 27 | EJECUCION : Determinación del estado de contratos pendientes  | 4-Inicio de Trabajo                    | 31/07/2023         | 22/12/2023     |            |  | No            | 21.0          |
| 28 | CIERRE : Firma de actas definitivas   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/10/2023         | 27/10/2023     |            |  | No            | 10.0          |
| 29 | CIERRE : Informe de cierre de proyecto de inversión suscrito  | 9-Entregables Formales                 | 30/10/2023         | 05/12/2023     |            |  | No            | 10.0          |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador   | Estado  | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de informes de monitoreo y control de los procesos . |  | 100.00 %          | 1    | 1                     | 01/10/2022      | Abr-Jun                    |


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00            |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 9,207,831.63 ** |
| Costo Total:                  | 11,168,856.28   |
| Total Devengado:              | 8,885,775.29    |
| % Costo Total Devengado:      | 79.56 %         |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 79.56 %

**Perfil Económico 2023**

|   | Años Previos   | Año Actual (2023) | Años Futuros | Total         |
|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado  | 6,597,251.53   | 3,832,258.00      | 0.00         | 10,429,509.53 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| <b>Ppto. Aprobado Inicial</b>                           | 11,168,856.28  | 3,832,258.00      | 0.00         | 15,001,114.28 |
| Ppto. Codificado  | 6,597,251.53   | 0.00              | 0.00         | 6,597,251.53  |
| Ppto. Comprometido                                      | 6,146,825.39   | 0.00              | 0.00         | 6,146,825.39  |
| Planeado - Codificado (2023)                            |                | 3,832,258.00      |              |               |
| <b>Programado a Devengar</b>                            | 6,597,251.53   | 3,832,258.00      | 0.00         | 10,429,509.53 |
| Ppto. Devengado   | 5,375,573.63   | 3,510,201.66      | 0.00         | 8,885,775.29  |
| Pagado Real   | 5,375,573.63   | 0.00              | 0.00         | 5,375,573.63  |
| Estimado a fin de año                                   | * 5,375,573.63 | 0.00              | 0.00         | 5,375,573.63  |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 1,221,677.90   | 3,832,258.00      | 0.00         | 5,053,935.90  |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 81.48 %      | 91.60 %           | 0.00 %       | 85.20 %       |
| <b>Ppto. Codificado 998</b>                             | 1,842,767.26   | 0.00              | 0.00         | 1,842,767.26  |
| <b>Ppto. Devengado 998</b>                              | 1,511,161.70   | 0.00              | 0.00         | 1,511,161.70  |

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023**

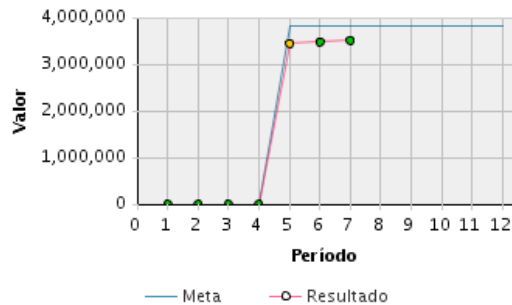

**Presupuesto Mensual 2023**

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 0.00 %       |



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 16 | B.7 NO INCLUCION EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL MES DE MARZO 2023           | CEDULA_DE_MARZO_2023.pdf                        | 03/04/2023    |
| 17 | B.8 SOLICITU DE CAMBIO DE ESTADO DE PROYECTO Y APERTURA DE HITOS MAYO 2023 | MTOP-DNEOP-2023-0512-ME_- _CUADRO.pdf           | 05/06/2023    |
| 18 | B.9 CEDULA PRESUPUESTARIA Y DETALLE DE MOVIMIENTOS Y PAGOS -MAYO 2023      | resumen_de_pagos_y__cedula.pdf                  | 05/06/2023    |
| 19 | C.1 CEDULA PRESUPUESTARIA Y DETALLE DE MOVIMIENTOS Y PAGOS -JUNIO 2023     | nueva_infraestructura_Junio2023.pdf             | 03/07/2023    |
| 20 | C.2 CUR DE PAGO 167 GEOSUELOS  | cur_167_geosuelos.pdf                           | 03/07/2023    |
| 21 | C.3 CEDULA Y CUR DE PAGOS - PERIODO JULIO 2023                             | cedula__y_cur_de_pagos_-_periodo_JULIO_2023.pdf | 03/08/2023    |
| 22 | Designación de Líder   | MTOP-DNEOP-2023-0010-ME.pdf                     | 21/06/2023    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                                     | Rol  | Puesto   | Correo Electrónico      | Teléfono(s) |
|--|--|--|-------------------------|-------------|
| Estrella Jaramillo, Andres Bayardo         | LIDER DE PROYECTO                                | Servidor Publico 7                             | aestrella@mtop.gob.ec   |             |
| Romero Echeverria, Antonina de los Angeles | DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PUBLICAS | Director/a Nacional Estudios de Obras Públicas | Aaromero@mtop.gob.ec    |             |
| Santamaría Loor, Kiura Ninoska             | SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS                  | Subsecretaria de Obras Públicas                | ksantamaria@mtop.gob.ec |             |

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

| Archivo      | Fecha de Alta |
|--------------|---------------|
| 150607_1.jpg | 28/09/2022    |
