

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 4**  
**Dirección Provincial Manabí**

**PROYECTO: K051** MTOP-Construcción del puente Bahía sobre el estuario del río Chone. (Mantenimiento durante 2 años del Puente Los Caras de Bahía de Caraquez y San Vicente.

Líder del Proyecto:	Pita Asan, Arturo Sebastian (apita@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Herrera Falcones, José Ricardo	Programas Relacionados:	MTOP - RUTA DE SPONDYLUS, Provincia - Manabí, Proyectos Emblemáticos, PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO RIO CHONE, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.766.2760	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	114,133,651.09
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	11/09/2007 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	12/10/2017	Fecha de Fin Base:	19/04/2013
Modificado por:	Molina Ormaza, Carlos Ignacio	Fecha del siguiente Hito:	

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCION: Proyecto anterior a formato SENPLADES, no se tiene toda la información requerida.

Realizar los trabajos de Construcción del Puente Bahía, con una longitud total de 1980 metros, ubicado sobre el Estuario del Río Chone, que une las poblaciones de Bahía y San Vicente, Provincia de Manabí. (Contratista: Cuerpo de Ingenieros del Ejercito)  
 Costo total contractual de la obra: \$102,054,088.42  
 Monto contrato de mantenimiento \$855,239.48  
 Contratista: Cuerpo Ingenieros del Ejercito

**Beneficios Cualitativos**

Mejorar el desplazamiento y la comunicación entre los cantones Sucre - San Vicente - Jama - Pedernales.

**Tipo de Beneficiario**

Agricultores  
 Pescadores  
 Turistas  
 Operadores Turisticos


**Restricciones**

Tiempo: cumplir con los plazos establecidos

Fase Actual:  Anteproyecto  Definición  Planeación  Ejecución  Cierre  **Completado**  Congelado  Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 11/09/2007 Fecha de Fin: 31/12/2017

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2017: Con memorando No. MTOP-SUBSZ4-15-253-OF, de fecha 01 de octubre del 2015 se aprueba el acta de recepción única definitiva, con esta fecha paso a etapa de COMPLETADO.	Pita Asan, Arturo Sebastian	06/06/2017 - 09:44 AM
Abril 2017  Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de aceras, cunetas, mantenimiento de los barandales, espaldones, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento de las señales horizontales y verticales	Alvarez Villacres, Hernán Roberto	05/05/2017 - 09:37 AM
Septiembre 2015.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de aceras, cunetas, mantenimiento de los barandales, espaldones, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento de las señales horizontales y verticales. El plazo del contrato de mantenimiento finalizó el 18 de mayo del 2015. Con memorando No. MTOP-SUBSZ4-15-253-OF, de fecha 01 de octubre del 2015 se aprueba el acta de recepción única definitiva.	Pita Asan, Arturo Sebastian	05/10/2015 - 08:52 AM
Agosto 2015.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de aceras, cunetas, mantenimiento de los barandales, espaldones, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento de las señales horizontales y verticales. El plazo del contrato de mantenimiento finalizó el 18 de mayo del 2015. El contratista está solicitando la recepción definitiva única de los trabajos.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/09/2015 - 03:27 PM
Julio 2015.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de aceras, cunetas, mantenimiento de los barandales, espaldones, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento de las señales horizontales y verticales. El plazo del contrato de mantenimiento finalizó el 18 de mayo del 2015.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/08/2015 - 01:28 PM
Junio 2015.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de aceras, cunetas, mantenimiento de los barandales, espaldones, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento de las señales horizontales y verticales. El plazo del contrato de mantenimiento finalizó el 18 de mayo del 2015.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/07/2015 - 02:36 PM
Mayo 2015.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de aceras, cunetas, mantenimiento de los barandales, espaldones, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento de las señales horizontales y verticales. El plazo del contrato de mantenimiento finalizó el 18 de mayo del 2015.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/06/2015 - 02:51 PM
Abril 2015.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de aceras, cunetas, mantenimiento de los barandales, espaldones, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento de las señales horizontales y verticales.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/05/2015 - 11:42 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo 2015.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de aceras, cunetas, mantenimiento de los barandales, espaldones, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento de las señales horizontales y verticales.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/04/2015 - 09:33 AM
Febrero 2015.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de aceras, cunetas, mantenimiento de los barandales, espaldones, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento de las señales horizontales y verticales.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/03/2015 - 08:59 AM
Enero 2015.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de aceras, cunetas, mantenimiento de los barandales, espaldones, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento de las señales horizontales y verticales.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/02/2015 - 02:27 PM
Diciembre 2014.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de aceras, cunetas, mantenimiento de los barandales, espaldones, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento de las luminarias.	Pita Asan, Arturo Sebastian	06/01/2015 - 04:19 PM
Noviembre 2014.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de aceras, cunetas, mantenimiento de los barandales, espaldones y mantenimiento de las áreas verdes.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/12/2014 - 08:48 AM
Octubre 2014.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Mantenimiento de la red eléctrica, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, limpieza de aceras, cunetas, mantenimiento de los barandales y espaldones.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/11/2014 - 10:12 AM
Septiembre 2014.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Mantenimiento de la red eléctrica, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, limpieza de aceras, cunetas y espaldones.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/10/2014 - 09:21 AM
Agosto 2014.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Mantenimiento de barandales, mantenimiento áreas verdes, limpieza de aceras, cunetas y espaldones.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/09/2014 - 10:11 AM
Julio 2014.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Mantenimiento de las luminarias, limpieza de cunetas y espaldones, limpieza de los sumideros.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/08/2014 - 08:59 AM
Junio 2014.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Mantenimiento de las luminarias, limpieza de cunetas y espaldones, limpieza de los sumideros.	Pita Asan, Arturo Sebastian	04/08/2014 - 08:58 AM
Junio 2014.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Se realizan trabajos de mantenimiento de las luminarias, limpieza de las áreas verdes y limpieza de barandales.	Pita Asan, Arturo Sebastian	01/07/2014 - 02:20 PM
Mayo 2014.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Se realizan trabajos de limpieza de la ciclovía, de cunetas y espaldones.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/06/2014 - 02:54 PM
Abril 2014.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Se realizan trabajos de mantenimiento de lámparas, limpieza de espaldones y limpieza de ciclovía.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/05/2014 - 10:28 AM
Marzo 2014.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de espaldones y barandales.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/04/2014 - 02:10 PM
Febrero 2014.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza y mantenimiento de los barandales, mantenimiento de las luminarias, limpieza de cunetas y espaldones.	Pita Asan, Arturo Sebastian	27/02/2014 - 11:07 AM
Enero 2014.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de las áreas verdes, espaldones y cunetas; Mantenimiento de las luminarias.	Pita Asan, Arturo Sebastian	03/02/2014 - 03:17 PM
Diciembre 2013.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Trabajos de limpieza de cunetas y espaldones; mantenimiento de las luminarias y pintados de barandales	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/01/2014 - 10:47 AM
Noviembre 2013.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Mantenimiento de las juntas de dilataciones del puente y limpieza de cunetas y espaldones.	Pita Asan, Arturo Sebastian	02/12/2013 - 10:36 AM
Octubre 2013.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Trabajos de limpieza y mantenimiento del área infantil y revisión de sumideros.	Pita Asan, Arturo Sebastian	20/11/2013 - 09:51 AM
Septiembre 2013.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Se realizan trabajos de ajustes de las juntas de dilatación y revisión de los cajetines electrónicos.	Pita Asan, Arturo Sebastian	20/11/2013 - 09:50 AM
Agosto 2013.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejército.- Limpieza de los barandales de la ciclovía y mantenimiento de las áreas verdes.	Pita Asan, Arturo Sebastian	20/11/2013 - 09:49 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2013.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejercito.- Se realizan trabajos de limpieza de los postes de alumbrado eléctrico y mantenimiento de la luminaria.	Pita Asan, Arturo Sebastian	20/11/2013 - 09:47 AM
Junio 2013.- Mantenimiento Puente Los Caras por dos años a cargo de Cuerpo de Ingeniero del Ejercito.- Se realizan trabajos de limpieza de espaldones, cunetas y barandales.	Pita Asan, Arturo Sebastian	20/11/2013 - 09:43 AM
Noviembre 2012.- El Cuerpo de Ingenieros del Ejercito Contratista de la Obra, realiza trabajos de limpieza en los espaldones de acceso al puente.	Pita Asan, Arturo Sebastian	30/11/2012 - 11:32 AM
Octubre 2012.- Se realizaron trabajos de la señalización horizontal y pintada de los barandales del Puente.	Pita Asan, Arturo Sebastian	05/11/2012 - 03:12 PM
Realizar los trabajos de Construcción del Puente Bahía, con una longitud total de 1980 metros, ubicado sobre el Estuario del Río Chone, que une las poblaciones de Bahía y San Vicente, Provincia de Manabí.  El Puente Bahía de 1980 metros pertenece a la Ruta del Espondylus (Proyecto Emblematico), es este proyecto se suscribió un contrato complementario y tres ordenes de cambio. El 15 de Abril de 2011 se realizo la Recepción Provisional, actualmente se encuentra en Mantenimiento Rutinario hasta la Recepción Definitiva, la misma que se encuentra en elaboración.  Septiembre 2012.- Manteneimto de las luminarias. Agosto 2012.- Manteneimto Rutinario, limpieza de areas verdes. Julio 2012.- Mantenimiento Rutinario, limpieza de cunetas y espaldones Junio 2012.- Mantenimiento Rutinario, limpieza y mantenimiento del campamento. Mayo 2012.- Mantenimiento Rutinario, limpieza de las alcantarillas. Abril 2012.- Mantenimiento Rutinario, revision y mantenimiento de las luminarias. Marzo 2012.- Mantenimiento Rutinario, mantenimiento de las areas verdes. Febrero 2012.- Mantenimiento Rutinario, limpieza de barandales. Enero 2012.- Mantenimiento Rutinario, limpieza de cunetas y espaldones.	Pita Asan, Arturo Sebastian	17/10/2012 - 11:30 AM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>2- NACIONAL. Ambiental.</b> Fuerte estación invernal CAUSARÍA que se suspendan los trabajos	19/04/2017	Arturo Sebastian Pita Asan	10 %	10	1	0/3

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

	Localidad de Impacto
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jama
2	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales
3	Zona 4 - Pacífico > Manabí > San Vicente
4	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Sucre

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Aprobación de Estudios - Terminado	3-Adjudicación	11/09/2007		11/09/2007		Sí	3.0
2	PLANEACIÓN: Acta de Adjudicación - Terminado	3-Adjudicación	11/09/2007		11/09/2007		Sí	3.0

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria - Terminado	3-Adjudicación	11/09/2007		11/09/2007		Sí	3.0
4	EJECUCIÓN: Plan de Manejo Ambiental - Terminado	5-Entregables Intermedios	15/01/2010		15/01/2010		Sí	1.02
5	EJECUCIÓN: Pilotes - Terminado	5-Entregables Intermedios	20/07/2010		20/07/2010		Sí	7.18
6	EJECUCIÓN: Obras Estructurales - Terminado	5-Entregables Intermedios	08/08/2010		08/08/2010		Sí	17.15
7	EJECUCIÓN: Superestructura - Terminado	5-Entregables Intermedios	15/09/2010		15/09/2010		Sí	18.45
8	EJECUCIÓN: Obras en Muelles y Malecon - Terminado	5-Entregables Intermedios	20/10/2010		20/10/2010		Sí	6.15
9	EJECUCIÓN: Iluminación - Terminado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2010		30/10/2010		Sí	2.04
10	CIERRE: Acta de Recepción Provisional - Finalizado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/04/2011		15/04/2011		Sí	3.0
11	CIERRE: Liquidación del Contrato de la obra. Finalizado.	9-Entregables Formales	15/12/2012		19/04/2013		Sí	3.0
12	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario contrato de la obra - Terminado.	9-Entregables Formales	15/12/2012		19/04/2013		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Mantenimiento 2013 (Contrato nuevo) - Terminado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Mantenimiento 2014 (Contrato nuevo) - Realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Mantenimiento 2015 (Contrato nuevo) - Realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	5.0
16	CIERRE: Liquidación económica del contrato de mantenimiento, Realizada	9-Entregables Formales	24/07/2015		01/10/2015		Sí	8.0
17	COMPLETADO: Acta de Recepción definitiva - Realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/09/2015		01/10/2015		Sí	8.01

### SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	18/09/2015
2	Proyecto en funcionamiento	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	22/01/2015
3	Obra totalmente terminado en funcionamiento y buen estado	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	30/06/2014

### INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Avance físico de la obra según cronograma de trabajo.	—	-	-	-	02/05/2013	-

**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	28,509,442.66
Estimado Al Fin Del Proyecto:	114,133,651.09 **
Costo Total:	107,408,758.85
Total Devengado:	114,391,646.22
% Costo Total Devengado:	106.50 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 106.50 %

**Perfil Económico 2016**

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	100,601,022.40	1.00	6,718,830.55	<b>107,319,853.95</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	<b>106,143,112.07</b>	<b>326,822.65</b>	<b>326,822.65</b>	<b>106,796,757.37</b>
Ppto. Codificado	107,414,820.54	4,589,293.96	5,270,025.15	<b>117,274,139.65</b>
Ppto. Comprometido	7,522,247.85	1,706,800.53	5,270,025.15	<b>14,499,073.53</b>
Planeado - Codificado (2016)		-4,589,292.96		
<b>Programado a Devengar</b>	<b>100,820,894.44</b>	<b>0.00</b>	<b>6,718,830.55</b>	<b>107,539,724.99</b>
Ppto. Devengado	107,414,820.54	1,706,800.53	5,270,025.15	<b>114,391,646.22</b>
Pagado Real	7,522,247.85	1,706,800.53	5,270,025.15	<b>14,499,073.53</b>
Estimado a fin de año	* 107,414,820.54	0.00	0.00	<b>107,414,820.54</b>
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-6,593,926.10	0.00	6,718,830.55	<b>124,904.45</b>
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 106.54 %	-	78.44 %	<b>106.37 %</b>
<b>Ppto. Codificado 998</b>	<b>2,645,017.99</b>	<b>3,632,461.81</b>	<b>2,304,822.12</b>	<b>8,582,301.92</b>
<b>Ppto. Devengado 998</b>	<b>2,645,017.99</b>	<b>749,968.38</b>	<b>2,304,822.12</b>	<b>5,699,808.49</b>

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016**

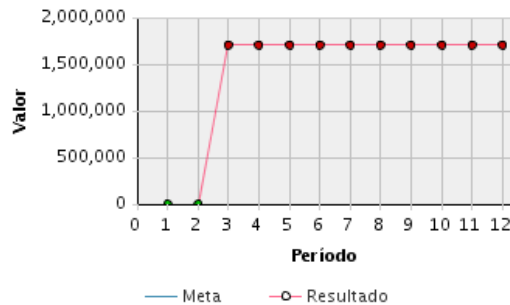

**Presupuesto Mensual 2016**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	1,706,800.53	0.00	1,706,800.53	115.00 %		115.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	1,706,800.53	115.00 %		115.00 %
May	0.00	0.00	0.00	1,706,800.53	115.00 %		115.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	1,706,800.53	115.00 %		115.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	1,706,800.53	115.00 %		115.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	1,706,800.53	115.00 %		115.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	1,706,800.53	115.00 %		115.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	1,706,800.53	115.00 %		115.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	1,706,800.53	115.00 %		115.00 %
Dic	0.00	0.00	0.00	1,706,800.53	115.00 %		115.00 %
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,706,800.53</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
7	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
8	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
10	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo
11	Incrementar la eficiencia de control para el cumplimiento de los contratos MEDIANTE un plan de verificación y coordinación de acciones paralelas con la administración, la fiscalización y supervisión acorde al cronograma de obra y económico

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		Inf_Enero2012_PuenteBahia.pdf	13/08/2012
2		Inf_Febrero2012_PuenteBahia.pdf	13/08/2012
3		Inf_Marzo2012_PuenteBahia.pdf	13/08/2012
4		Inf_Abril2012_PuenteBahia.pdf	13/08/2012
5		Inf_Junio2012_PuenteBahia.pdf	13/08/2012
6		Inf_Julio2012_PuenteBahia.pdf	13/08/2012
7		Fotos_Enero2012.pdf	13/08/2012
8		FOTOS_Febrero2012.pdf	13/08/2012
9		FOTOS_Marzo2012.pdf	13/08/2012
10		FOTOS_Abril2012.pdf	13/08/2012
11		FOTOS_Mayo2012.pdf	13/08/2012
12		FOTOS_Junio2012.pdf	13/08/2012
13		FOTOS_Julio2012.pdf	13/08/2012
14		Inf_Ejecutivo_Agosto2012_Puente_Bahia.pdf	31/08/2012
15		FOTOS_PuenteBahia_Agosto2012.pdf	31/08/2012
16		Inf_Ejecutivo_SEPTIEMBRE_PuenteBahia.pdf	01/10/2012
17		FOTOS_Septiembre2012_PuenteBahia.pdf	01/10/2012

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA PUENTE LOS CARAS	Puente_Los_Caras_Acta_Entrega_Recepción_2013.pdf	09/04/2014
19	Acta de Recepción Única Definitiva	ACTA_UNICA_MTTO._PUENTE_LOS_CARAS.pdf	05/10/2015
20	FOTOS ABRIL 2014	B.3.pdf	02/05/2014
21	Fotos Agosto 2013 Mantenimiento durante 2 años del Puente Los Caras de Bahía de Caraquez y San Vicente.	FOTOS_Puente_Los_Caras_Agosto2013.pdf	20/11/2013
22	FOTOS DICIEMBRE 2013	A.4.pdf	08/04/2014
23	FOTOS ENERO 2014	A.6.pdf	08/04/2014
24	FOTOS FEBRERO 2014	A.8.pdf	08/04/2014
25	Fotos Julio 2013 Mantenimiento durante 2 años del Puente Los Caras de Bahía de Caraquez y San Vicente.	Fotos_Puente_Los_Caras_Julio2013.pdf	20/11/2013
26	FOTOS JULIO 2014	B.9.pdf	04/08/2014
27	Fotos Junio 2013 Mantenimiento durante 2 años del Puente Los Caras de Bahía de Caraquez y San Vicente.	FOTOS_Puente_Los_Caras_Junio2013.pdf	20/11/2013
28	FOTOS JUNIO 2014	B.7.pdf	01/07/2014
29	FOTOS MARZO 2014	B.1.pdf	08/04/2014
30	FOTOS MAYO 2014	B.5.pdf	02/06/2014
31	FOTOS NOVIEMBRE 2013	A.2.pdf	08/04/2014
32	Fotos Octubre 2013 Mantenimiento durante 2 años del Puente Los Caras de Bahía de Caraquez y San Vicente.	FOTOS_Puente_Los_Caras_Octubre2013.pdf	20/11/2013
33	Fotos Octubre2012- PuenteBahía	FOTOS_Octubre2012-PuENTE_BAHIA.pdf	05/11/2012
34	Fotos Septiembre 2013 Mantenimiento durante 2 años del Puente Los Caras de Bahía de Caraquez y San Vicente.	FOTOS_Puente_Los_Caras_Septiembre2013.pdf	20/11/2013
35	Fotos_Noviembre2012	FOTOS_PuenteBahía_Noviembre2012.pdf	30/11/2012
36	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	B.2.pdf	02/05/2014
37	Informe Ejecutivo Agosto 2013 Mantenimiento durante 2 años del Puente Los Caras de Bahía de Caraquez y San Vicente.	Inf-Ejecutivo-PuenteLosCaras-Agosto2013.pdf	20/11/2013
38	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	A.3.pdf	08/04/2014
39	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	A.5.pdf	08/04/2014
40	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	A.7.pdf	08/04/2014
41	Informe Ejecutivo Julio 2013 Mantenimiento durante 2 años del Puente Los Caras de Bahía de Caraquez y San Vicente.	Inf-Ejecutivo_PuenteLos_Carast_Julio_2013.pdf	20/11/2013
42	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	B.8.pdf	04/08/2014
43	Informe Ejecutivo Junio 2013 Mantenimiento durante 2 años del Puente Los Caras de Bahía de Caraquez y San Vicente.	Inf-Ejecutivo_PuenteLos_Carast_Junio_2013.pdf	20/11/2013
44	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	B.6.pdf	01/07/2014
45	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	A.9.pdf	08/04/2014
46	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	B.4.pdf	02/06/2014
47	Informe Ejecutivo Noviembre 2012	Inf.Ejecutivo.PuenteBahía-Noviembre2012.pdf	30/11/2012
48	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	A.1.pdf	08/04/2014
49	Informe Ejecutivo Octubre 2013 Mantenimiento durante 2 años del Puente Los Caras de Bahía de Caraquez y San Vicente.	Inf._Ejec.Puente_Los_Caras_OCTUBRE2013.pdf	20/11/2013
50	Informe Ejecutivo Septiembre 2013 Mantenimiento durante 2 años del Puente Los Caras de Bahía de Caraquez y San Vicente.	Inf-Ejectivo-PuenteLosCaras-Sept2013.pdf	20/11/2013
51	Informe Ejecutivo Sitop Mayo 2012	Inf_Mayo2012_PuenteBahía.pdf	13/08/2012
52	Informe Ejecutivo Sitop Octubre 2012	Informe_Ejecutivo_Sitop_PuenteBahía_Octubre2012.pdf	05/11/2012
53	Oficio de aprobación de Acta Única Definitiva	oficio_de_aprobacion_del_acta_definitiva.pdf	05/10/2015



## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
54	Oficio de Aprobación del Acta Definitiva.	MTOP-SUBSZ4-13-219-OF.pdf	03/06/2013
55	P.1- Informe Ejecutivo Sitop Agosto 2014	C.1.pdf	05/09/2014
56	P.2- Fotos Agosto 2014	C.2.pdf	05/09/2014
57	P.3.- Informe Ejecutivo Sitop Septiembre 2014	C.3.pdf	02/10/2014
58	P.4.- Fotos Septiembre 2014	C.4.pdf	02/10/2014
59	P.5.- Informe Ejecutivo Sitop Octubre 2014	C.5.pdf	04/11/2014
60	P.6.- Fotos Octubre 2014	C.6.pdf	04/11/2014
61	P.7.- Informe Ejecutivo Sitop Noviembre 2014	C.7.pdf	03/12/2014
62	P.8.- Fotos Noviembre 2014	C.8.pdf	03/12/2014
63	P.9.- Informe Ejecutivo Sitop Diciembre 2014	C.9.pdf	06/01/2015
64	Q.1.- Fotos Diciembre 2014	D.1.pdf	06/01/2015
65	Q.2 Informe Ejecutivo Enero 2015	D.2.pdf	03/02/2015
66	Q.3. Fotos Enero 2015	D.3.pdf	03/02/2015
67	Q.4 Informe Ejecutivo Febrero 2015	D.4.pdf	02/03/2015
68	Q.5. Fotos Febrero 2015	D.5.pdf	02/03/2015
69	Q.6 Informe Ejecutivo Marzo 2015	D.6.pdf	01/04/2015
70	Q.7. Fotos Marzo 2015	D.7.pdf	01/04/2015
71	Q.8 Informe Ejecutivo Abril 2015	D.8.pdf	04/05/2015
72	Q.9 Fotos Abril	D.9.pdf	04/05/2015
73	R.1 Informe Ejecutivo Mayo 2015	E.1.pdf	01/06/2015
74	R.2 Fotos Mayo 2015	E.2.pdf	01/06/2015
75	R.3.- Informe Ejecutivo Junio 2015	E.3.pdf	02/07/2015
76	R.4 Fotos Junio 2015	E.4.pdf	02/07/2015
77	R.5 contrato mantenimiento puente los caras	R.5.pdf	17/07/2015
78	R.6 ORDEN DE CAMBIO No1	R.6.pdf	17/07/2015
79	R.7 ORDEN DE CAMBIO No2	R.7.pdf	17/07/2015
80	R.8.- Informe Ejecutivo Julio 2015	R.8.pdf	03/08/2015
81	R.9 Fotos Julio 2015	R.9.pdf	03/08/2015
82	S.1.- Informe Ejecutivo Agosto 2015	S.1.pdf	01/09/2015
83	S.2 Fotos Agosto 2015	S.2.pdf	01/09/2015
84	S.3.- Informe Ejecutivo Septiembre 2015	S.3.pdf	05/10/2015
85	S.4 Fotos Septiembre 2015	S.4.pdf	05/10/2015

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Briones Ibarra, José Edelberto	Patrocinador Ejecutivo		salio@mtop.gob.ec	
Navia Gallardo, Xavier Eduardo	Administrador del Contrato.		salio@mtop.gob.ec	
Pita Asan, Arturo Sebastian	Lider de Proyecto	Supervisor de Obras de Manabí	apita@mtop.gob.ec	023974600
Solórzano Vélez, César Augusto	Supervisor de Conservación.		salio@mtop.gob.ec	

## FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
50825_1.jpg	05/10/2015
