

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1

Dirección Provincial Imbabura

PROYECTO: K004 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de Imbabura

Líder del Proyecto:	Vásquez Rivera, José Elías (jvasquez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ordoñez Zuñiga, Alfonso Vicente	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA, Provincia - Imbabura, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, STPE - Inversión en 40km de frontera norte
Titular:	Maldonado Saravino, Toa Priscila	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3747	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	2.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,312,399.23
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	03/08/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Maldonado Saravino, Toa Priscila	Fecha del siguiente Hito:	31/08/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: Mantener la red vial en buen estado
 Se propende tener toda la Red Provincial en estado óptimo para la circulación vehicular, tos tramos que se trabajan ACTUALMENTE en este objetivo son:

- 1.- Carretera Otavalo - Las Golondrinas 172,38 KM Administración Directa-DD-I USD. 934.890,585
- 2.- Carretera Salinas-Lita 76.79 Km. Administración Directa-DD-I USD. 934.890,585

.PRODUCTO / SERVICIO: Mantener la Red Vial Provincial en buen Estado

*LÍNEA BASE: 249.17 Km. Mantenimiento periódico y rutinario

.OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICO: Incrementar la calidad de prestación de servicios en la movilidad del transporte

Se incrementó el costo considerando la contratación de 4 microempresas de conservación vial para el mantenimiento rutinario en el año 2.018

Beneficios Cualitativos

Reducir los costos operativos de los vehículos, brindar seguridad en la Vía, reducir los tiempos de viaje, incrementar el turismo provincial.

Tipo de Beneficiario

Sector, industrial , Agropecuario y turístico.

Restricciones

En mantenimiento vial, existen varios factores que componen este proyecto, por tanto se establecen prioridades para la normal ejecución de las actividades, el factor económico es determinante así como la asignación en los tiempos indicados, el retraso en dicho trámite restringe el funcionamiento y ejecución del mantenimiento vial.

TIEMPO: ESTE PROYECTO SE EJECUTA DURANTE TODO EL 2018 CON CADA UNO DE SUS ITEMS

COSTO: 1'869.781,17


RECURSOS: SE EJECUTARAN CON CARGO A RECURSOS FISCALES

ALCANCE: ESTE PROYECTO GLOBAR ABARCA TODOS LOS GASTOS OPERACIONALES QUE SE UTILIZAN EN EL MANTENIMIENTO VIAL PARA LOS TRAMOS BAJO EL MODELO DE GESTIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OTAVALO - SELVA ALEGRE - SAGUANGAL - LAS GOLONDRINAS Y Y DE SALINAS - LITA

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 95.31 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

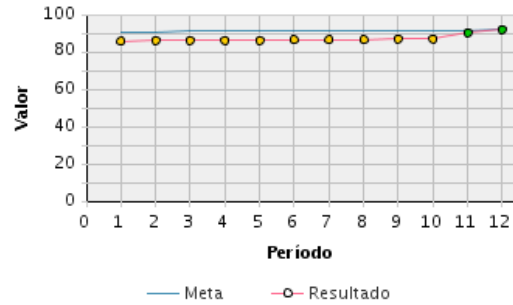

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	90 %	91 %	91 %	91 %	91 %	91 %	91 %	91 %	91 %	92 %	92 %	92 %
	Avance real acumulado											
	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	87 %	87 %	87 %	87 %	90 %	92 %
Estado												
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO -2018</p> <p>En la Red Vial Estatal E35, el tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavaló-Cajas de 84.9 Kms. perteneciente a la Red Vial Estatal E35, se encuentra concesionada a PANAVIAL S.A, se mantiene en óptimo estado de circulación, la administración esta a cargo de la Sub-Secretaría de Delegaciones y Concesiones.</p> <p>La Dirección Distrital realiza el mantenimiento de las vías de la Red Vial Estatal , Otavaló-Quinindé E-29 y la vía Salinas-Lita E-10; mediante administración directa</p> <p>En la vía Otavaló-Quinindé E-29, se realizan trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado, desde el km 27 al km 65, en el marco de cooperación entre la Dirección Distrital de Imbabura, la cementera UNACEM, transportistas y moradores del lugar, ha permitido conservar en buen estado la vía, el tramo desde Otavaló al Km. 27 se encuentra asfaltado con bacheo mayor y a permitido mantener en estado óptimo la circulación vehicular.</p> <p>La Micro Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " realiza trabajos en el Km.20+000 al 24+000 con 4.0 km. de avance</p> <p>En la vía Salinas-Lita E-10, se realizan trabajos de mantenimiento rutinario como son la poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, se intervino con la maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de materiales de distinta magnitud,</p> <p>las Micro-Empresas que se encuentran en la vía E-10 han realizado los siguiente trabajos</p> <p>MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas con avance de 5.0 Km. del 126+500 al 129+000</p> <p>MICRO EMPRESA " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, con un avance de 2.9 Km. 97+300 al 100+200.</p> <p>MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, con un avance 5.0 km. 84+600 al 89+600</p> <p>El contrato suscrito con la Empresa Pública IMBAVIAL EP para la intervención de Bacheo Mayor de puntos críticos en la vía Otavaló Selva Alegre, se encuentra en etapa del acta de entrega recepción provisional</p>	<p>Maldonado Saravino, Toa Priscila</p>	<p>03/08/2018 - 02:48 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continuo de las vías dentro de la jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA.</p> <p>JUNIO -2018</p> <p>El tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 84.9 Kms. perteneciente a la Red Vial Estatal E35, se encuentra concesionada a PANAVIAL S.A, se mantiene en óptimo estado de circulación, la administración esta a cargo de la Sub-Secretaría de Delegaciones y Concesiones.</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de las vías de la RVE., Otavalo-Quinindé E-29 y la vía Salinas-Lita E-10;</p> <p>En la vía E-29, se realizan trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado, desde el km 27 al km 65, en el marco de cooperación entre la Dirección Distrital de Imbabura, la cementera UNACEM, transportistas y moradores del lugar, ha permitido conservar el tramo desde Otavalo al Km. 27 y a permitido mantener en estado estado óptimo la circulación vehicular.</p> <p>La Micro Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " realiza trabajos en el Km. 98+000 al 98+800 con 0.8 km. de avance</p> <p>Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario en la vía E-10 como son la poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, se intervino con la maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de materiales de distinta magnitud, en el sector Peña Negra se realiza limpieza de alcantarilla taponada con maquinaria de la DDI.</p> <p>las Micro-Empresas que se encuentran en la vía E-10 han realizado los siguiente trabajos</p> <p>MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas con avance de 0.8 Km.</p> <p>MICRO EMPRESA " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, con un avance de 0.6 Km.</p> <p>MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, con un avance 0.8 km.</p> <p>De acuerdo al contrato suscrito con la Empresa Pública IMBAVIAL EP se realizó la intervención de Bacheo Mayor de puntos críticos en la vía Otavalo Selva Alegre, se encuentra en etapa del acta de entrega recepción provisional</p> <p>La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continuo de las vías dentro de la jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA.</p>	<p>Maldonado Saravino, Toa Priscila</p>	<p>04/07/2018 - 10:16 AM</p>
<p>MAYO -2018</p> <p>La Red Vial Estatal E35 tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 93.72 Kms. que se encuentra concesionada, se encuentra en óptimo estado de circulación, la administración esta a cargo de la Sub-Secretaría de Delegaciones y Concesiones.</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Otavalo Quinindé E-29 y la vía Salinas-Lita E-10;</p> <p>En la vía E-29, se realizan trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado que va desde el km 27 al km 65, en el marco de cooperación entre la Dirección Distrital de Imbabura, la cementera UNACEM, transportistas y moradores del lugar, ha permitido conservar el tramo de Otavalo al Que. 27 y a permitido mantener en estado estado óptimo la circulación vehicular.</p> <p>El 15 de febrero se contrata la Micro Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " que realiza trabajos en el Km. 28+000 al 32+000 con 4 km. de avance</p> <p>Se realizan de manera constante trabajos de mantenimiento en la vía E-10 como son la poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, señales verticales, de igual manera; se intervino con la maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de materiales de distinta magnitud, en el sector peña negra, y Guallupe, se realiza limpieza de alcantarilla taponada con colaboración de maquinaria de la Dirección Distrital de Esmeraldas</p> <p>las Micro-Empresas que se encuentran en la vía E-10 han realizado los siguiente trabajos</p>	<p>Maldonado Saravino, Toa Priscila</p>	<p>04/06/2018 - 09:47 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 142+000 al 149+000 avance 7 Km. MICRO EMPRESA " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 109+000 al 112 +000 avance de 3 Km. MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 94+100 al 103+140 avance 9.04 km.</p> <p>De acuerdo al contrato suscrito con la Empresa Pública IMBAVIAL EP se realizó la intervención de Bacheo Mayor de puntos críticos en la vía Otavalo Selva Alegre, se encuentra en etapa del acta de entrega recepción provisional</p> <p>La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continuo de las vías dentro de la jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA.</p>		
<p>ABRIL -2018</p> <p>La Red Vial Estatal E35 tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 93.72 Kms. se encuentra concesionada razón por la cual se encuentra en óptimo estado de circulación, la misma que se encuentra administrada por la Sub-Secretaría de Delegaciones y Concesiones.</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Otavalo Quinindé E-29 y la vía Salinas-Lita E-10;</p> <p>En la vía E-29, se continúan los trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado que va desde el km 27 al km 72 en el marco de cooperación entre la Dirección Distrital de Imbabura, la cementera UNACEM, transportistas y moradores del lugar, lo que ha permitido conservar este tramo en estado óptimo para la circulación vehicular, se realiza mantenimiento y limpieza de derrumbes</p> <p>El 15 de febrero se contrata la Micro Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " que realiza trabajos en el Km. 12+000 al 16+000 con 4 km. de avance</p> <p>Se realizan de manera constante trabajos de mantenimiento en la vía E-10 como son la poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, señales verticales, de igual manera; se intervino con la maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de materiales de distinta magnitud, en el sector peña negra, y Gualupe, se realiza limpieza de alcantarilla taponada con colaboración de maquinaria de la Dirección Distrital de Esmeraldas</p> <p>Se contrató micro empresas para mantenimiento vial el 15 de febrero-2018 para la RVE E 10:</p> <p>MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 142+000 a 136+000 avance 6.000 mts. MICRO EMPRESA " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 109+100 al 94+160 avance 8.800 mts. MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 94+100 al 94+100 avance 4.62 km..</p> <p>De acuerdo al contrato suscrito con la Empresa Pública IMBAVIAL EP se realizó la intervención de Bacheo Mayor de puntos críticos en la vía Otavalo Selva Alegre, se encuentra en etapa del acta de entrega recepción provisional</p> <p>La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continuo de las vías dentro de la jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA, que por temas sociales se torna en un problema cada vez más preocupante y que deberá ser abordado en su momento, por las autoridades del MTOP.</p>	<p>Maldonado Saravino, Toa Priscila</p>	<p>04/05/2018 - 03:47 PM</p>
<p>MARZO -2018</p> <p>El mantenimiento de la E35 está concesionado por lo tanto se ejecutan trabajos de en el tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas y se mantiene en estado óptimo de circulación.</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Otavalo Quinindé E-29 y la vía Salinas-Lita E-10; en la vía E-29, se continúan los trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado que va desde el km 27 al km 65 en el marco de cooperación entre la DDI, la cementera UNACEM, transportistas y moradores del lugar, lo que ha permitido conservar este tramo en estado óptimo para la circulación vehicular, se realiza mantenimiento y limpieza de derrumbes Kmm. 16+800; 12+100;16+400, el 15 de febrero se contrata la Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " que realiza trabajos en el Km. 10+000 y 12+000</p>	<p>Maldonado Saravino, Toa Priscila</p>	<p>05/04/2018 - 04:20 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se realizan de manera constante trabajos de mantenimiento en la vía E-10 como son de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, señales verticales, de igual manera; se intervino con en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de distinta magnitud en las absisas 129+800; 128+500 y 130+000 Y 136+100 , 108+940</p> <p>Se contrata micro empresas para mantenimiento vial el 15 de febrero-2018 : EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 146+200 Y 150+000 EMPRESA VIAL " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 110+200, 111+600 EMPRESA VIAL " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 87+000, 89+480.</p> <p>Se contrata con la Empresa Pública IMBAVIAL EP la intervención de Bacheo Mayor de puntos crítico en la vía Otavalo Selva Alegre, tramo que va de Otavalo del 1+500 al km 27 (asfaltado).</p> <p>El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía Otavalo-Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé.,</p> <p>La Dirección Distrital de Imbabura continúa con el patrullaje continuo de las vías dentro de la jurisdicción de la provincia de Imbabura, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA, que por temas sociales se torna en un problema cada vez más preocupante y que se deberá de abordar en su momento, por parte de las autoridades del MTOP, para buscar soluciones globales e integrales, considerando las problemáticas sociales</p>		
<p>FEBRERO-2018</p> <p>El mantenimiento de la E35 está concesionado por lo tanto se ejecutan trabajos de en el tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas y se mantiene en estado óptimo de circulación.</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Otavalo Quinindé E-29 y la via Salinas-Lita E-10; en la vía E-29, se continúan los trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado que va desde el km 27 al km 65 en el marco de cooperación entre la DDI, la cementera UNACEM, transportistas y moradores del lugar, lo que ha permitido conservar este tramo en estado óptimo para la circulación vehicular, se realiza trabajos en la mesa de la vía en el Km. 22+000, el 15 de febrero se contrata la Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " que realiza trabajos en el Km. 8+000 y 10+000</p> <p>Se realizan de manera constante trabajos de mantenimiento en la vía E-10 como son de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, señales verticales, de igual manera; se intervino con en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de distinta magnitud en las absisas 12+00; 128+700 y 136+000.</p> <p>Se contrata micro empresas para mantenimiento vial el 15 de febrero-2018 : EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 142+00 y 146+200. EMPRESA VIAL " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 109+000, 110+200. EMPRESA VIAL " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 84+600Y 87+000.</p> <p>Se contrata con la Empresa Pública IMBAVIAL EP la intervención de Bacheo Mayor de puntos crítico en la vía Otavalo Selva Alegre, tramo que va de Otavalo del 1+500 al km 27 (asfaltado),</p> <p>El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía Otavalo-Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé.,</p> <p>La Dirección Distrital de Imbabura continúa con el patrullaje continuo de las vías dentro de la jurisdicción de la provincia de Imbabura, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA, que por temas sociales se torna en un problema cada vez más preocupante y que se deberá de abordar en su momento, por parte de las autoridades del MTOP, para buscar soluciones globales e integrales, considerando las problemáticas sociales</p>	<p>Maldonado Saravino, Toa Priscila</p>	<p>05/04/2018 - 03:50 PM</p>
<p>ENERO 2018</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Otavalo Quinindé E-29 y la via Salinas-Lita E-1; en la vía E-29, se continúan los trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado que va desde el km 27 al km 65 en el marco de cooperación entre la DDI, la cementera</p>	<p>Maldonado Saravino, Toa Priscila</p>	<p>05/04/2018 - 03:29 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>UNACEM, transportistas y moradores del lugar, lo que ha permitido conservar este tramo en estado óptimo para la circulación vehicular.</p> <p>Se realizan de manera constante trabajos de mantenimiento en la vía E-10 como son de poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, señales verticales, de igual manera; se intervino con en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de distinta magnitud en las absizas 12610; 132+050 y 136+300.</p> <p>Se contrata con la Empresa Pública IMBAVIAL EP la intervención de Bacheo Mayor de puntos crítico en la vía Otavalo Selva Alegre, tramo que va de Otavalo del 1+500 al km 27 (asfaltado),</p> <p>El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía Otavalo-Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé.,</p> <p>La Dirección Distrital de Imbabura continúa con el patrullaje continuo de las vías dentro de la jurisdicción de la provincia de Imbabura, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA, que por temas sociales se torna en un problema cada vez más preocupante y que se deberá de abordar en su momento, por parte de las autoridades del MTOP, para buscar soluciones globales e integrales, considerando las problemáticas sociales</p>		
<p>DICIEMBRE 2017</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Otavalo Quinindé y la via Salinas-Lita, en la que se atienden trabajos de limpieza con microempresas asi como en la vía E-29, se continúan los trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado que va desde el km 27 al km 72 en el marco de cooperación entre la DDI, la cementera UNACEM, transportistas y moradores del lugar, lo que ha permitido conservar este tramo en estado óptimo para la circulación vehicular. Estos trabajos se encuentran en la abscisa 50+000. Además con maquinaria de la DDI se realiza actualmente la limpieza de alcantarillas desde la 56+000 a la 65+000</p> <p>En las vías bajo administración directa de la DDI, se continúa con las actividades para su adecuada conservación. Se produjo varias averías al Equipo Caminero, lo que provocó reprogramar los trabajos de mantenimiento rutinario que se realizan de manera constante a lo largo de todos los tramos y que consisten en la poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, señales verticales, etc. En este mes se continuó los trabajos con 4 microempresas; tres en la vía E-10 tramo Salinas -Lita (VIA LIMPIA, NUEVA LITA, PROGRESO DE LITA) y una en la vía E-29 tramo Selva Alegre-Saguangal (INTAG VIAL), para atender los requerimientos de estas importantes arterias viales; igualmente se intervino con recursos propios, en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de distinta magnitud.</p> <p>En el tramo que va de Otavalo al km 27 (asfaltado), se realizó el proceso para contratar la intervención de Bacheo Mayor de puntos críticos, proceso que se tuvo que decalrar DESIERTO mediante RESOLUCIÓN N°107-MTOPI-AJP-2017 de 13 de noviembre de 2017. Se está gestionando a fin de realizar estos trabajos a través de Regimen Especial de acuerdo a la base legal correspondiente.</p> <p>El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía OTavalo-Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé., hasta ese momento la DDI actuaba con mantenimiento vial en el tramo Selva Alegre-Saguangal (lastrado). Para el mes de noviembre se lanzara un proceso de Contratación para Bacheo Mayor por 27 km en el tramo Otavalo - Sel va Alegre.Actualmente se encuentra realizando trabajos de Mantenimiento Rutinario la Microempresa Intag Vial, con una capacidad productiva de 15 personas, cubriendo mensualmente 3.75 km</p> <p>La Dirección Distrital de Imbabura continúa con el patrullaje continuo de las vías dentro de la jurisdicción de la provincia de Imbabura, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA, que por temas sociales se torna en un problema cada vez más preocupante y que se deberá de abordar en su momento, por parte de las autoridades del MTOP, para buscar soluciones globales e integrales, considerando las problemáticas sociales</p>	<p>Maldonado Saravino, Toa Priscila</p>	<p>05/01/2018 - 08:36 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2017</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Otavalo Quinindé y la via Salinas-Lita, en la que se atienden trabajos de limpieza con microempresas asi como en la vía E-29, se continúan los trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado que va desde el km 27 al km 72 en el marco de cooperación entre la DDI, la cementera UNACEM, transportistas y moradores del lugar, lo que ha permitido conservar este tramo en estado óptimo para la circulación vehicular.</p>	<p>Maldonado Saravino, Toa Priscila</p>	<p>04/12/2017 - 10:39 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Estos trabajos se encuentran en la abscisa 50+000. Además con maquinaria de la DDI se realiza actualmente la limpieza de alcantarillas desde la 56+000 a la 65+000</p> <p>En el tramo que va de Otavalo al km 27 (asfaltado), se realizó el proceso para contratar la intervención de Bacheo Mayor de puntos críticos, proceso que se tuvo que decalrar DESIERTO mediante RESOLUCIÓN N°107-MTOPI-AJP-2017 de 13 de noviembre de 2017. Se está gestionando a fin de realizar estos trabajos a través de Regimen Especial de acuerdo a la base legal correspondiente.</p> <p>El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía OTavalo-Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé., hasta ese momento la DDI actuaba con mantenimiento vial en el tramo Selva Alegre-Saguangal (lastrado). Para el mes de noviembre se lanzara un proceso de Contratación para Bacheo Mayor por 27 km en el tramo Otavalo - Sel va Alegre.Actualmente se encuentra realizando trabajos de Mantenimiento Rutinario la Microempresa Intag Vial, con una capacidad productiva de 15 personas, cubriendo mensualmente 3.75 km</p> <p>Dentro del marco de actividades a nivel nacional, sobre los eventos realizados por la jornada en Conmemoración a las Víctimas por Siniestros de Tránsito la DDI realizó una jornada de actividades del 16 al 19 de noviembre de 2017, cuyo Informe se remitió por parte del Ing. Luis Salgado a la Directora Distrital mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_IMB-2017-220-ME de 23 de noviembre de 2017.Salinas Lita</p> <p>Se realiza mantenimiento rutinario por parte de tres microempresas de conservación vial, Vía Limpia, Progreso de Lita, Nueva Lita con un avance de 32 km en los dos tramos.</p> <p>En las vías bajo administración directa de la DDI, se continúa con las actividades para su adecuada conservación. Los trabajos de mantenimiento rutinario se realizan de manera constante a lo largo de todos los tramos y consisten en la poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, señales verticales, etc. Actualmente, se amplió a 4 microempresas; tres en la vía E-10 tramo Salinas -Lita y una en la vía E-29 tramo Selva Alegre-Saguangal, para atender los requerimientos de estas importantes arterias viales; igualmente se intervino con recursos propios, en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de distinta magnitud.</p>		
<p>OCTUBRE 2017</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Otavalo Quinindé y la via Salinas-Lita, en la que se atienden trabajos emergentes por deslizamientos.</p> <p>Otavalo - Quinindé:</p> <p>El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía OTavalo-Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé., hasta ese momento la DDI actuaba con mantenimiento vial en el tramo Selva Alegre-Saguangal (lastrado). Para el mes de noviembre se lanzara un proceso de Contratación para Bacheo Mayor por 27 km en el tramo Otavalo - Sel va Alegre.Actualmente se encuentra realizando trabajos de Mantenimiento Rutinario la Microempresa Intag Vial, con una capacidad productiva de 15 personas, cubriendo mensualmente 3.75 km</p> <p>Salinas Lita</p> <p>Se realiza mantenimiento rutinario por parte de tres microempresas de conservación vial, Vía Limpia, Progreso de Lita, Nueva Lita con un avance de 32 km en los dos tramos.</p> <p>Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades. Está en tramite la recepción única, prevista para finales de diciembre 2017.</p>	<p>Maldonado Saravino, Toa Priscila</p>	<p>10/11/2017 - 03:07 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2017</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via Salinas-Lita, en la que se atienden trabajos emergentes por deslizamientos.</p> <p>Selva Alegre Saguangal:</p> <p>El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía OTavalo-Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé., hasta ese momento la DDI actuaba con mantenimiento vial en el tramo Selva Alegre-Saguangal (lastrado). Se continúa desalojando material de derrumbe en km 20+300 y trasladando el mismo al relleno para recuperación de la mesa del camino en el km 24+730; la vía se encuentra en estado regular, para el mes de octubre se lanzó un proceso de Contratación para Bacheo Mayor por 27 km en el tramo Otavalo - Sel va Alegre.</p>	<p>Maldonado Saravino, Toa Priscila</p>	<p>05/10/2017 - 12:22 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Salinas Lita Derrumbes esporádicos en sectores de San Jerónimo, Lita; se realiza mantenimiento rutinario por parte de la microempresa de conservación vial, en el mes de agosto se trabaja con 11 personas.</p> <p>Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades. Está en tramite la recepción única, prevista para finales de diciembre 2017.</p>		
<p>AGOSTO 2017</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita, en la que se atienden trabajos emergentes por deslizamientos.</p> <p>Selva Alegre Saguangal:</p> <p>El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía OTavalo-Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé., hasta ese momento la DDI actuaba con mantenimiento vial en el tramo Selva Alegre-Saguangal (lastrado). Se continúa desalojando material de derrumbe en km 20+300 y trasladando el mismo al relleno para recuperación de la mesa del camino en el km 24+730; la vía se encuentra en regular estado en general, por lo que actualmente se cuenta con maquinaria que realiza el resanteo y compactación de la calzada, además de la limpieza continua de derrumbes de diversa magnitud. En el mes de julio se continuó, trabajos por administración directa.La Microempresa de conservación vial continua con mantenimiento rutinario con 10 personas.</p> <p>Salinas Lita Derrumbes esporádicos en sectores de San Jerónimo, Lita; se realiza mantenimiento rutinario por parte de la microempresa de conservación vial, en el mes de agosto se trabaja con 11 personas.</p> <p>Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades. Está en tramite la recepción única, prevista para finales de diciembre 2017.</p>	<p>Pérez Hinojosa, Jaime Mauricio</p>	<p>05/09/2017 - 02:07 PM</p>
<p>JULIO 2017</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita, en la que se atienden trabajos emergentes por deslizamientos.</p> <p>Selva Alegre Saguangal:</p> <p>Se continúa trabajando en el relleno y reconformación de la mesa de la vía que colapso en el km 24+730</p> <p>El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía OTavalo-Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé., hasta ese momento la DDI actuaba con mantenimiento vial en el tramo Selva Alegre-Saguangal (lastrado). Se continúa desalojando material de derrumbe en km 20+300 y trasladando el mismo al relleno para recuperación de la mesa del camino en el km 24+730; la vía se encuentra en regular estado en general, por lo que actualmente se cuenta con maquinaria que realiza el resanteo y compactación de la calzada, además de la limpieza continua de derrumbes de diversa magnitud. En el mes de julio se continuó, trabajos por administración directa.La Microempresa de conservación vial continua con mantenimiento rutinario con 10 personas. Se realizó trabajos de voladura de rocas que afectaban a la vía y ponían en riesgo a los usuarios por peligro de colapso.</p> <p>Salinas Lita Derrumbes esporádicos en sectores de San Jerónimo, Lita; Se pinta los reductores de velocidad existentes en Lita por desgaste; Se interviene en socavón producido en el puente de San Pedro; se realiza mantenimiento rutinario por parte de la microempresa de conservación vial, en el mes de julio se trabaja con 11 personas. Se realizó el repintado de los reductores de velocidad ubicados en Lita.</p> <p>Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades. Está en tramite la recepción única, prevista para finales de diciembre 2017.</p>	<p>Pérez Hinojosa, Jaime Mauricio</p>	<p>03/08/2017 - 04:08 PM</p>
<p>JUNIO 2017</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita, en la que se atienden trabajos emergentes por deslizamientos.</p>	<p>Pérez Hinojosa, Jaime Mauricio</p>	<p>05/07/2017 - 05:36 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El Proyecto adoquinado de las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional, en revisión la liquidación económica, nos encontramos a la espera de que el contratista elabore el acta entrega recepción definitiva, con la cual se procederá a la liquidación económica.</p> <p>Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades. Está en trámite la recepción única, prevista para finales de diciembre 2017.</p> <p>Se incrementó a la RVE de Imbabura para mantenimiento por administración directa el tramo Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas en la vía E29 además se realiza mantenimiento para el tramo Lita - San Lorenzo en la vía E10</p> <p>Se realiza mantenimiento rutinario de la RVE por parte de dos microempresas de conservación vial "Via Limpia" para el tramo E10 e Intag Vial para la vía E29</p>		
<p>MAYO 2017</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita, en la que se atienden trabajos emergentes por deslizamientos.</p> <p>El Proyecto adoquinado de las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional, en revisión la liquidación económica, nos encontramos a la espera de que el contratista elabore el acta entrega recepción definitiva, con la cual se procederá a la liquidación económica.</p> <p>Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades. Está en trámite la recepción única, prevista para finales de diciembre 2017.</p> <p>Se incrementó a la RVE de Imbabura para mantenimiento por administración directa el tramo Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas en la vía E29 además se realiza mantenimiento para el tramo Lita - San Lorenzo en la vía E10</p> <p>Se realiza mantenimiento rutinario de la RVE por parte de dos microempresas de conservación vial "Via Limpia" para el tramo E10 e Intag Vial para la vía E29</p>	<p>Pérez Hinojosa, Jaime Mauricio</p>	<p>05/06/2017 - 03:46 PM</p>
<p>ABRIL 2017</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita, trabajos emergentes.</p> <p>El Proyecto adoquinado de las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional, en revisión la liquidación económica, una vez la fiscalización apruebe procederá con la suscripción del acta de recepción definitiva , para dar por terminado el proyecto.</p> <p>Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades. Está en trámite la recepción única, prevista para finales de mayo 2017.</p> <p>Se incrementó a la RVE de Imbabura para mantenimiento por administración directa el tramo Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas en la vía E29 además se realiza mantenimiento para el tramo Lita - San Lorenzo en la vía E10</p> <p>Se realiza mantenimiento rutinario de la RVE por parte de dos microempresas de conservación vial "Via Limpia" para el tramo E10 e Intag Vial para la vía E29</p>	<p>Pérez Hinojosa, Jaime Mauricio</p>	<p>04/05/2017 - 02:58 PM</p>
<p>MARZO 2017</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita, trabajos emergentes.</p> <p>El Proyecto adoquinado de las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional, en revisión la liquidación económica, una vez la fiscalización apruebe procederá con la suscripción del acta de recepción definitiva , para dar por terminado el proyecto.</p> <p>Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades. Está en trámite la recepción única, prevista para finales de mayo 2017.</p> <p>Se incrementó a la RVE de Imbabura para mantenimiento por administración directa el tramo Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas en la vía E29 además se realiza mantenimiento para el tramo Lita - San Lorenzo en la vía E10</p>	<p>Pérez Hinojosa, Jaime Mauricio</p>	<p>05/04/2017 - 11:25 AM</p>
<p>FEBRERO 2017</p>	<p>Pérez Hinojosa, Jaime Mauricio</p>	<p>06/03/2017 - 08:40 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita, trabajos emergentes. El Proyecto adoquinado de las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional, en revisión la liquidación económica, una vez la fiscalización apruebe procederá con la suscripción del acta de recepción definitiva, para dar por terminado el proyecto. Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades. Está en trámite la recepción única, prevista para finales de mayo 2017.</p>		
<p>ENERO 2017</p> <p>Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita, trabajos emergentes. El Proyecto adoquinado de las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional, en revisión la liquidación económica, una vez la fiscalización apruebe procederá con la suscripción del acta de recepción definitiva, para dar por terminado el proyecto. Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades. Está en trámite la recepción única, prevista para finales de mayo 2017.</p>	<p>Pérez Hinojosa, Jaime Mauricio</p>	<p>06/03/2017 - 08:37 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, en elaboración del acta de recepción definitiva y liquidación económica del proyecto. Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita. El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definitiva, Proyecto Terminado. Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción del acta definitiva, terminado. El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional, se procederá con la liquidación económica una vez el contratista concluya obras adicionales dispuestas por fiscalización y elaboración del acta de recepción definitiva del proyecto, para dar por terminado el proyecto. Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados. Los estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran aprobada, luego de lo cual se procederá con el Acta de Recepción de los Estudios prevista para el mes de diciembre de 2015.</p>	<p>Páez Salaza, Marco Antonio</p>	<p>07/12/2015 - 04:21 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, en elaboración del acta de recepción definitiva y liquidación económica del proyecto. Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita. El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definitiva, Proyecto Terminado. Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción del acta definitiva, terminado. El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional, se procederá con la liquidación económica una vez el contratista concluya obras adicionales dispuestas por fiscalización y elaboración del acta de recepción definitiva del proyecto, para dar por terminado el proyecto. Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados. Los estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran aprobada, luego de lo cual se procederá con el Acta de Recepción de los Estudios prevista para el mes de octubre de 2015</p>	<p>Páez Salaza, Marco Antonio</p>	<p>08/10/2015 - 04:42 PM</p>
<p>AGOSTO 2015</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, en elaboración del acta de recepción definitiva y liquidación económica del proyecto. Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita. El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definitiva, Proyecto Terminado. Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción del acta definitiva, terminado. El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional, se procederá con la liquidación económica una vez el contratista concluya obras adicionales dispuestas por fiscalización y elaboración del acta de recepción definitiva del proyecto. Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados. Los estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran aprobada, luego de lo cual se procederá con el Acta de Recepción de los Estudios prevista para el mes de octubre de 2015.</p>	<p>Páez Salaza, Marco Antonio</p>	<p>08/09/2015 - 12:11 PM</p>
<p>JULIO 2015</p>	<p>Páez Salaza, Marco Antonio</p>	<p>11/08/2015 - 01:59 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, en elaboración del acta de recepción definitiva y liquidación económica del proyecto. Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita. El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definitiva, Proyecto Terminado. Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción definitiva, terminado. El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional, se procede con la liquidación económica y elaboración del acta de recepción definitiva del proyecto. Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados. Los estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran aprobada, luego de lo cual se procederá con el Acta de Recepción de los Estudios</p>		
<p>JUNIO 2015 Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, se procede a la recepción definitiva y liquidación económica del proyecto. Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita. El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definitiva, Proyecto Terminado. Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción definitiva, terminado. El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional, se procede con la liquidación económica y recepción definitiva del proyecto. Estudios Definitivos de la carretera Otavalo Selva Alegre, estudios entregados y aprobados. Los estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran aprobada, luego de lo cual se procederá con el Acta de Recepción de los Estudios</p>	<p>Páez Salaza, Marco Antonio</p>	<p>08/07/2015 - 10:27 AM</p>
<p>MAYO 2015 Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, se procede a la recepción definitiva y liquidación económica del proyecto. Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita. El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definitiva, Proyecto Terminado. Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción definitiva, terminado. El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional, se procede con la liquidación económica y recepción definitiva del proyecto. Estudios Definitivos de la carretera Otavalo Selva Alegre, estudios entregados y aprobados. Los estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran aprobada, luego de lo cual se procederá con el Acta de Recepción de los Estudios</p>	<p>Páez Salaza, Marco Antonio</p>	<p>05/06/2015 - 06:21 PM</p>
<p>ABRIL 2015 Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, se procede a la recepción definitiva y liquidación económica del proyecto. Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita. El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definitiva, Proyecto Terminado. Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción definitiva, terminado. El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional, se procede con la liquidación económica y recepción definitiva del proyecto. Estudios Definitivos de la carretera Otavalo Selva Alegre, estudios entregados y aprobados. Los estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran en revisión, luego de lo cual se procederá con el Acta de Recepción de los Estudios.</p>	<p>Páez Salaza, Marco Antonio</p>	<p>07/05/2015 - 10:25 AM</p>
<p>MARZO 2015 Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, se procede a la recepción definitiva y liquidación económica del proyecto. Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita. El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definitiva, Proyecto Terminado. Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción definitiva, se encuentra en liquidación económica, pagada la planilla de liquidación. El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional, se procede con la liquidación económica y recepción definitiva del proyecto.</p>	<p>Páez Salaza, Marco Antonio</p>	<p>07/05/2015 - 10:25 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Estudios Definitivos de la carretera Otavalo Selva Alegre, estudios entregados y aprobados. Los estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran en revisión, luego de lo cual se procederá con el Acta de Recepción de los Estudios.		
<p>AGOSTO/2014</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto y se elaboró el acta de recepción provisional. Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita. El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definitiva, Proyecto Terminado El proyecto Cotacachi cuicocha, se realiza mantenimiento por administración Directa. El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional.</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	06/09/2014 - 01:36 PM
<p>JULIO/2014</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto y se elaboró el acta de recepción provisional. Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita. El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definitiva, Proyecto Terminado El proyecto Cotacachi cuicocha, se realiza mantenimiento por administración Directa. El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción provisional.</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	06/09/2014 - 01:34 PM
<p>JUNIO/2014</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto y se encuentra elaborando el acta de recepción provisional. Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Selva Alegre-Saguangal y la vía Salinas-Lita</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	09/07/2014 - 07:23 PM
<p>MAYO/2014</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto y se encuentra elaborando el acta de recepción provisional. Terminación del Adoquinado de las avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard de Ibarra: Se encuentra con recepción provisional con la Empresa IMBAVIAL EP.</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	06/06/2014 - 02:35 PM
<p>ABRIL/2014</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto y se encuentra elaborando el acta de recepción provisional. Adoquinado de las avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard de Ibarra: Se encuentra en liquidación económica y técnica por la rescisión unilateral. Terminación del Adoquinado de las avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard de Ibarra: Se encuentra con recepción provisional con la Empresa IMBAVIAL EP.</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	07/05/2014 - 04:53 PM
<p>MARZO/2014</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra en trámite el acta de recepción provisional. Adoquinado de las avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard de Ibarra: Se encuentra en liquidación económica y técnica por la rescisión unilateral. Terminación del Adoquinado de las avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard de Ibarra: Se encuentra realizando la liquidación económica para la recepción provisional del Proyecto.</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	17/04/2014 - 09:35 AM
<p>FEBRERO/2014</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra en trámite el acta de recepción provisional. Adoquinado de las avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard de Ibarra: Se encuentra en liquidación económica y técnica por la rescisión unilateral. Terminación del Adoquinado de las avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard de Ibarra: Se encuentra realizando la liquidación económica para la recepción provisional del Proyecto.</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	08/03/2014 - 10:42 AM
<p>ENERO/2014</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para la construcción de obras complementarias en el Proyecto (Puente Chalguayacu).</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	07/02/2014 - 02:15 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se encuentra terminada la construcción del puente, se presenta planilla No. 2 CC. por USD. 248.289,61 Y 1 CO Liquidación Por 196.841,64 por los periodos Junio/Abril/2013 y Sept./Noviembre/2013 .</p> <p>El proyecto de Terminación del adoquinado del Parque Céntrica Bulevar en la ciudad de Ibarra, se encuentra contratado con IMBAVIAL EP y presenta la planilla No. 1 por USD. 1.454.027,19 correspondiente a enero/2014</p>		
<p>DICIEMBRE 2013:</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para la construcción de obras complementarias en el Proyecto (Puente Chalguayacu). Se encuentra terminada la construcción del puente, no se presenta planilla del mes de Diciembre /2013 por cuanto en el contrato no constan rubros componentes de compra, fabricación, transporte y montaje de la estructura metálica del puente, por cuanto se presentará una sola planilla y su liquidación final.</p> <p>El proyecto de Terminación del adoquinado del Parque Céntrica Bulevar en la ciudad de Ibarra, se encuentra contratado con IMBAVIAL EP.</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	07/01/2014 - 02:12 PM
<p>NOVIEMBRE 2013:</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para la construcción de obras complementarias en el Proyecto (Puente Chalguayacu). Se encuentra montada la superestructura del puente., no se presenta planilla del mes de Noviembre/2013 por cuanto en el contrato no consta rubros componentes de compra, fabricación, transporte y montaje de la estructura metálica del puente.</p> <p>El proyecto de adoquinado del Parque Céntrica Bulevar en la ciudad de Ibarra, se encuentra notificado la terminación unilateral del contrato ,se presenta las planillas No. 5 CO. 3CC y 1 C+% por el periodo Septiembre/2013, hasta su liquidación.</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	06/12/2013 - 03:03 PM
<p>OCTUBRE 2013:</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para la construcción de obras complementarias en el Proyecto (Puente Chalguayacu). Se encuentra en fabricación la superestructura del puente de acuerdo al informe presentato por IMBAVIAL EP mediante Oficio No. IMBV-126-GG-2013, no se presenta planilla del mes de Octubre/2013 por cuanto en el contrato no consta rubros componentes de compra, fabricación, transporte y montaje de la estructura metálica del puente y se realizó el acta de suspensión de trabajos.</p> <p>El contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial, se encuentra legalizada el acta entrega-recepción provisional de la obra.</p> <p>El proyecto de adoquinado del Parque Céntrica Bulevar en la ciudad de Ibarra, se encuentra notificado la terminación unilateral del contrato ,razón por la cual no existe planilla por el periodo octubre/2013 hasta su liquidación.</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	11/11/2013 - 12:00 PM
<p>SEPTIEMBRE 2013:</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para la construcción de obras complementarias en el Proyecto (Puente Chalguayacu). Se encuentra en fabricación la superestructura del puente de acuerdo al informe presentato por IMBAVIAL EP mediante Oficio No. IMBV-126-GG-2013, no se presenta planilla del mes de Septiembre/2013 por cuanto en el contrato no consta rubros componentes de compra, fabricación, transporte y montaje de la estructura metálica del puente.</p> <p>El contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial, se encuentra solicitado por parte de Imbavial realizar el acta entrega-recepción provisional de la obra, mediante Oficio No.IMB-093-66-2013, la misma que se encuentra en trámite.</p> <p>Se encuentra presentadas las planillas No.4 C.O. por un monto de USD. 378.386.96 y 2 CC y por un valor de USD.216.676,44 del proyecto de adoquinado del Parque Céntrica Bulevar en la ciudad de Ibarra, se encuentra notificado el incumplimiento del contrato razón por la cual no existe planilla por el periodo septiembre/2013 hasta su liquidación.</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	07/10/2013 - 03:26 PM
<p>AGOSTO 2013:</p> <p>Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para la construcción de obras complementarias en el Proyecto (Puente Chalguayacu).</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	06/09/2013 - 02:58 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se encuentra suspendidas las obras de construcción del puente debido a que no se encuentran los predios expropiados en el sitio de construcción, por eso no se presenta planilla del mes de Agosto/2013.</p> <p>El contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial, se encuentra solicitado por parte de Imbavial realizar el acta entrega-recepción provisional de la obra, mediante Oficio No.IMB-093-66-2013</p> <p>Se encuentra presentadas las planillas No.3 C.O. por un monto de USD. 290.305,00 y 1 CC y por un valor de USD.329.593,96 del proyecto de adoquinado del Parque Céntrica Bulevar en la ciudad de Ibarra.</p>		
<p>JULIO 2013: Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para la construcción de obras complementarias en el Proyecto (Puente Chalguayacu). Se encuentra presentada la Planilla No. 02 CC por un monto de USD. 10.733, 83 y sus respectivo reajuste de precios.</p> <p>El contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial, se encuentra en la fase de liquidación de trabajos razón por la cual no se presenta planillas, el avance físico es del 100%</p> <p>Se encuentra presentadas las planillas No. 1 por un monto de USD. 44.313,66 y 2 por un valor de USD. 55.110.49 del proyecto de adoquinado del Parque Céntrica Bulevar en la ciudad de Ibarra.</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	07/08/2013 - 02:57 PM
<p>JUNIO 2013: Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra legalizada la Orden de cambio No. 01 de ampliación de plazo a 60 días hasta el 13 de abril del 2013, existen aprobados los estudios del puente Chalguayacu, Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para la construcción de obras complementarias en el Proyecto (Puente Chalguayacu). Se encuentra presentada la Planilla No. 01 CC por un monto de USD. 162.191.68 y sus respectivo reajuste de precios.</p> <p>Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 8 correspondiente al mes de Junio 2013 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial por un monto de USD. 388.543,16 y su respectivo reajuste de precios.</p> <p>Se encuentra legalizada el acta de recepción provisional de trabajos de la via Pinsaqui-Cotacachi.</p> <p>MAYO 2013: Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra legalizada la Orden de cambio No. 01 de ampliación de plazo a 60 días hasta el 13 de abril del 2013, existen aprobados los estudios del puente Chalguayacu, Se encuentra en trámite el contrato complementario para la construcción de obras complementarias en el Proyecto (Puente Chalguayacu).</p> <p>Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No.7 correspondiente al mes de mayo 2013 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial por un monto de USD. 158372.92 y su respectivo reajuste de precios.</p> <p>Se encuentra en tramite de aprobación el acta de recepción provisional de trabajos de la via Pinsaqui-Cotacachi.</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	05/07/2013 - 03:21 PM
<p>Abril 2013: Se encuentra legalizada la Orden de cambio No. 01 de ampliación de plazo a 60 días hasta el 13 de abril del 2013, se encuentran aprobados los estudios del puente Chalguayacu. Se encuentra en trámite el contrato complementario para la construcción de obras complementarias en el Proyecto Juncal-Pimampiro (Puente Chalguayacu)</p> <p>Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 6 correspondiente al mes de abril 2013 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial por un monto de USD. 432.096,94 y su respectivo reajuste de precios.</p> <p>Se encuentra aprobada la planilla No. 06 del proyecto Pinsaqui-Cotacachi por un monto de USD. y su respectivo reajuste de precios.</p>	Páez Salaza, Marco Antonio	08/05/2013 - 10:23 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO2013: Se encuentra en trámite el contrato complementario para la construcción de obras complementarias en el Proyecto Juncal-Pimampiro (Puente Chalguyacu)</p> <p>Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 4 correspondiente al mes de Febrero 2013 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial por un monto de USD. 279816.42 y su respectivo reajuste de precios.</p>	<p>Páez Salaza, Marco Antonio</p>	<p>07/03/2013 - 05:08 PM</p>
<p>ENERO 2013: Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 7 correspondiente al mes de enero 2013 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Juncal-Pimampiro con la Empresa Imbavial. por un monto de USD. 234.056,61 y su respectivo reajuste de precios.</p> <p>Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 3 correspondiente al mes de enero 2013 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial por un monto de USD. 474.401,52 y su respectivo reajuste de precios.</p> <p>trámite de pago la planilla No. 3 correspondiente al mes de enero 2013 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Pinsaqui-Cotacachi con la Empresa Imbavial por un monto de USD.183.504.59 y su respectivo reajuste de precios.</p>	<p>Páez Salaza, Marco Antonio</p>	<p>07/02/2013 - 04:45 PM</p>
<p>DICIEMBRE/2012: Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 6 correspondiente al mes de diciembre/2012 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Juncal-Pimampiro con la Empresa Imbavial. por un monto de USD. 321.714,44 y su respectivo reajuste de precios.</p> <p>Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 2 correspondiente al mes de Diciembre/2012 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial por un monto de USD.225.522,21y su respectivo reajuste de precios.</p> <p>Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 2 correspondiente al mes de Diciembre/2012 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Pinsaqui-Cotacachi con la Empresa Imbavial por un monto de USD.289.773,06y su respectivo reajuste de precios.</p> <p>Con fecha 14 de diciembre/2012 se encuentra suscrita el acta entrega-recepcion provisional del contrato de construcción de cunetas revestidas con el Ing. Alfonso Cevallos de la carretera Ibarra-Urcuquí.</p> <p>Con fecha 14 de diciembre/2012 se encuentra suscrita el acta entrega-recepcion provisional del contrato de construcción de cunetas revestidas con el Ing. Pablo Almeida de la carretera Cotacachi-Cuicocha.</p> <p>NOVIEMBRE: Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 5 correspondiente al mes de Noviembre/2012 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Juncal-Pimampiro con la Empresa Imbavial. por un monto de USD. 340.230,32 y su respectivo reajuste de precios.</p> <p>Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 1 correspondiente al mes de Noviembre/2012 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial por un monto de USD. 54.079,69 y su respectivo reajuste de precios.</p> <p>Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 1 correspondiente al mes de Noviembre/2012 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Pinsaqui-Cotacachi con la Empresa Imbavial por un monto de USD. 129.264,89 y su respectivo reajuste de precios.</p> <p>Se encuentra aprobada y en trámite de pago la planilla No. 03 correspondiente al mes de Noviembre/2012 del contrato de construcción de cunetas revestidas suscrito con el Ing. Alfonso Cevallos de la carretera Ibarra-Urcuquí por un monto de USD. 102.758,37.</p>	<p>Páez Salaza, Marco Antonio</p>	<p>07/01/2013 - 04:37 PM</p>
<p>OCTUBRE 2012:</p> <p>n fecha 27-09-2012, mediante CUR NO: 2494 se solicitó el pago del anticipo a IMBAVIAL EP. por el mantenimiento rutinario de la carretera Pinsaqui-Cotacachi, con Oficio No. 003-PC-DPI-2012 de fecha 15/10/2012 se comunica a la contratista la disponibilidad del anticipo y con Memorando No. MTOP-DPI-2012-1411-ME de fecha 23/10/2012 se comunica a la Directora Provincial que la empresa no inicia los trabajos.</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con fecha 27-09-2012, mediante CUR. No. 2495, se solicitó el pago del anticipo a IMBAVIAL EP. por el mantenimiento rutinario de la carretera Ibarra-Urcuquí, con Oficio No. No. 009-SC-DP-I de fecha 15/10/2012, se comunica a la contratista la disponibilidad del anticipo y con Memorando No. MTOP-DPI-2012-1426-ME de fecha 26/10/2012, se comunica a la Directora Provincial que la empresa no inicia los trabajos, por lo tanto no existe avance de obra.</p> <p>Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 4 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Juncal-Pimampiro con la Empresa Imbavial. por un monto de USD. 281.075,24 y su respectivo reajuste de precios.</p> <p>Se encuentra aprobada y en trámite de pago la planilla No. 02 del contrato de construcción de cunetas revestidas suscrito con el Ing. Alfonso Cevallos para la carretera Ibarra-Urcuquí</p> <p>Se encuentra aprobada y en trámite de pago la planilla No. 02 del contrato de construcción de cunetas revestidas suscrito con el Ing. Pablo Almeida para la carretera Cotacachi-Cuicocha.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2012: Con fecha 27-09-2012, mediante CUR NO: 2494 se solicitó el pago del anticipo a IMBAVIAL EP. por el mantenimiento de la carretera Pinsaqui-Cotacachi, por un monto de USD: 515.485,22 Con fecha 27-09-2012, mediante CUR. No. 2495, se solicitó el pago del anticipo a IMBAVIAL EP. por el mantenimiento de la carretera Ibarra-Urcuquí, por un monto de USD: 943.893,89 Se encuentra tramitada y cancelada la planilla No. 2 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Juncal-Pimampiro con la Empresa Imbavial. por un monto de USD. 196.199,16 y su respectivo reajuste de precios. Se encuentra en trámite la planilla No. 01 del contrato de construcción de cunetas revestidas suscrito con el Ing. Alfonso Cevallos para la carretera Ibarra-Urcuquí Se encuentra en trámite la planilla No. 01 del contrato de construcción de cunetas revestidas suscrito con el Ing. Pablo Almeida para la carretera Cotacachi-Cuicocha.</p> <p>AGOSTO/2012: Con fecha 28 de Agosto del 2012 se firmaron los contratos de reposición de cunetas en las vías Ibarra-Urcuquí y Cotacachi Cuicocha, Se han realizado trabajos de bacheo, limpieza de derrumbes y desbroce a mano en la vía Cotacachi-Cuicocha por administración directa. Se encuentra tramitada y cancelada la planilla No. 1 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Juncal-Pimampiro con la Empresa Imbavial. por un monto de USD. 49.480,41 y su respectivo reajuste de precios. El proyecto de mantenimiento Periódico de la vía Ibarra-Urcuquí, Tramo Imbaya-Urcuquí, se encuentra listo para el proceso de contratación, al igual que el proyecto de mantenimiento periódico de la vía Pinsaquí-Cotacachi.</p> <p>JULIO 2012: La falta de asignaciones presupuestarias a tiempo, incide en el cumplimiento de la programación operativa anual de la Dirección y el retraso en el avance de mantenimiento vial de la Provincia. Con cargo al programa de mantenimiento vial en la provincia de Imbabura, se ha previsto, en calidad de compromisos presidenciales el mejoramiento de los accesos a las ciudades de Cotacachi, Urcuquí y Pimampiro. Para el acceso a la ciudad de Cotacachi se encuentran terminados los estudios del tramo Pinsaquí - Cotacachi por parte del Gobierno Provincial de Imbabura en tanto que la Dirección Provincial subió al Portal de Compras Públicas el proceso de la construcción de cunetas en el tramo Cotacachi - Cuicocha por un valor de \$ 202.406,06 el mismo que se encuentra en proceso de adjudicación. Para el acceso a la ciudad de Urcuquí se encuentran terminados y entregados por parte del Gobierno Provincial de Imbabura los estudios para el mejoramiento de la carpeta asfáltica del tramo Imbaya - Urcuquí, en tanto que la Dirección Provincial subió al Portal de Compras Públicas el proceso de construcción de cunetas por el valor de \$ 249.316,28 el mismo que se encuentra en proceso de adjudicación. Por administración directa se están realizando trabajos de recapeo desde el mes de julio para el tramo Ibarra - Imbaya. Para el acceso a la ciudad de Pimampiro con cargo al respectivo contrato la empresa pública IMBAVIAL en el presente mes ha ejecutado los rubros de limpieza de derrumbes, escarificación de la obra básica, transporte de material de base clase 2 y señalización preventiva habiéndose planillado un valor total equivalente al 2.61% del monto contratado.</p>	<p>Páez Salaza, Marco Antonio</p>	<p>07/11/2012 - 09:08 AM</p>

Problemas cerrados: 7, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. La época invernal podría causar interrupción en el tránsito vehicular	02/07/2018	José Elías Vázquez Rivera	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Imbabura > Cotacachi
2	Zona 1 - Norte > Imbabura > Ibarra
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Pimampiro
4	Zona 1 - Norte > Imbabura > Sn. Miguel de Urququi

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Aprobación Interna Proyecto Juncal-Pimampiro; Ibarra-Urcuqui, Cotacachi-Cuicocha; Pinsaqui-Cotacachi.Realizado	1-Solicitud de Información	15/02/2012		15/02/2012		Sí	0.25
2	PLANEACION: Certificación Presupuestaria Proyecto Juncal-Pimampiro.Realizado	1-Solicitud de Información	04/05/2012		04/05/2012		Sí	0.25
3	PLANEACION: Resolución contratación Régimen Especial Proyecto Juncal-Pimampiro, Realizado	1-Solicitud de Información	04/05/2012		04/05/2012		Sí	0.25
4	PLANEACION: Acta Adjudicación contrato Proyecto Juncal-Pimampiro,Realizado	3-Adjudicación	17/05/2012		17/05/2012		Sí	0.25
5	PLANEACION: Certificación Presupuestaria Proyecto; Ibarra-Urcuqui, Cotacachi-Cuicocha; Pinsaqui-Cotacachi,Realizado	1-Solicitud de Información	26/05/2012		26/05/2012		Sí	0.25
6	PLANEACION: Contrato suscrito Proyecto Juncal-Pimampiro,Realizado	3-Adjudicación	28/05/2012		28/05/2012		Sí	0.25
7	PLANEACION: Publicación Cotización Obras - cunetas Proyecto Ibarra-Urcuqui y Cotacachi Cuicocha,Realizado	1-Solicitud de Información	24/07/2012		24/07/2012		Sí	0.25
8	PLANEACION: Acta Adjudicación Subasta Inversa Cunetas Proyectos, Ibarra-Urcuqui y Cotacachi-Cuicocha,Realizado	1-Solicitud de Información	20/08/2012		20/08/2012		Sí	0.25
9	PLANEACION: Resolución Contratación Regimen Especial Proyecto Mantenimiento Periódico Proyecto Ibarra-Urcuqui,Realizado	1-Solicitud de Información	25/08/2012		25/08/2012		Sí	0.25
10	PLANEACION: Contrato suscrito Subasta Inversa	1-Solicitud de Información	28/08/2012		28/08/2012		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	cuneta Proyecto Cotacachi-Cuicocha, Firmado							
11	PLANEACION: Contrato suscrito Subasta Inversa cuneta Proyecto Ibarra-Urcuqui, Firmado	1-Solicitud de Información	28/08/2012		28/08/2012		Sí	0.25
12	EJECUCION: Movimiento de tierras cunetas Proyecto Cotacachi-Cuicocha, Terminado	1-Solicitud de Información	03/09/2012		03/09/2012		Sí	0.12
13	EJECUCION: Movimiento de tierras, cunetas Proyecto Ibarra- Urcuqui, Terminado	1-Solicitud de Información	03/09/2012		03/09/2012		Sí	0.12
14	EJECUCION: Limpieza , Desbroce, Limpieza Calzada Proyecto Cotacachi-Cuicocha Administración Directa, Terminado	1-Solicitud de Información	05/09/2012		05/09/2012		Sí	0.12
15	EJECUCION: Terracería Proyecto Juncal-Pimampiro, Terminado	1-Solicitud de Información	13/09/2012		13/09/2012		Sí	0.12
16	PLANEACION: Resolución Contratación Régimen Especial Proyecto Pinsaqui-Cotacachi, Realizado	1-Solicitud de Información	14/09/2012		14/09/2012		Sí	0.25
17	PLANEACION: Contrato suscrito Proyecto Pinsaqui-Cotacachi, Firmado	1-Solicitud de Información	26/09/2012		26/09/2012		Sí	0.25
18	PLANEACION: Contrato suscrito Régimen Especial Mantenimiento Periódico Proyecto Ibarra-Urcuqui, Realizado	1-Solicitud de Información	26/09/2012		26/09/2012		Sí	0.25
19	EJECUCION: Obras preliminares Mantenimiento periódico proyecto Ibarra-Urcuqui, Terminado	1-Solicitud de Información	27/09/2012		27/09/2012		Sí	2.12
20	EJECUCION: Recapeo Administración Directa Proyecto-Ibarra Urcuquí, Terminado	1-Solicitud de Información	30/11/2012		30/11/2012		Sí	2.12
21	EJECUCION: Acta Recepción Provisional cunetas Proyecto Cotacachi-Cuicoch, Elaborado	1-Solicitud de Información	14/12/2012		14/12/2012		Sí	0.8
22	EJECUCION: Acta Recepción Provisional Cunetas Proyecto-Ibarra Urcuquí, Elaborado	1-Solicitud de Información	14/12/2012		14/12/2012		Sí	0.8
23	EJECUCION: Cierre cunetas Proyecto Cotacachi-Cuicocha, Terminado	1-Solicitud de Información	17/12/2012		17/12/2012		Sí	0.8
24	EJECUCION: Cierre de Cunetas Proyecto-Ibarra Urcuquí, Terminado	1-Solicitud de Información	17/12/2012		17/12/2012		Sí	0.8
25	EJECUCION: Mantenimiento Proyecto Cotacachi-Cuicocha Administración Directa, Realizado	1-Solicitud de Información	28/12/2012		28/12/2012		Sí	2.12
26	EJECUCION: Terracería Proyecto Pinsaqui-Cotacachi, Terminado	1-Solicitud de Información	30/12/2012		30/12/2012		Sí	2.12

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	EJECUCION: Muros Infraestructura Proyecto Juncal-Pimampiro, Realizado	1-Solicitud de Información	12/01/2013		12/01/2013		Sí	2.12
28	EJECUCION: Impacto Ambiental Proyecto Juncal-Pimampiro, Realizado	1-Solicitud de Información	02/02/2013		02/02/2013		Sí	2.12
29	EJECUCION: Calzada Proyecto Juncal-Pimampiro, Terminado	1-Solicitud de Información	12/02/2013		12/02/2013		Sí	2.12
30	EJECUCION: Señalización Proyecto Juncal-Pimampiro, Terminado	1-Solicitud de Información	12/02/2013		12/02/2013		Sí	2.12
31	EJECUCION: Drenaje Proyecto Juncal-Pimampiro, Terminado	1-Solicitud de Información	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.12
32	EJECUCION: Drenaje Proyecto Pinsaquí-Cotacachi, Terminado	1-Solicitud de Información	20/03/2013		20/03/2013		Sí	2.12
33	EJECUCION: Señalización Proyecto Pinsaquí-Cotacachi, Terminado	1-Solicitud de Información	07/04/2013		07/04/2013		Sí	2.12
34	EJECUCION: Calzada Proyecto Pinsaquí-Cotacachi, Terminado	1-Solicitud de Información	09/04/2013		09/04/2013		Sí	2.12
35	EJECUCION: Impacto Ambiental Proyecto Pinsaquí-Cotacachi, Terminado	1-Solicitud de Información	09/04/2013		09/04/2013		Sí	2.12
36	EJECUCION: Acta Recepción Provisional Proyecto Pinsaquí-Cotacachi, Elaborado	1-Solicitud de Información	15/06/2013		15/06/2013		Sí	2.12
37	EJECUCION: Calzada Mantenimiento Periódico Proyecto Ibarra-Urcuqui, Terminado	1-Solicitud de Información	20/06/2013		20/06/2013		Sí	2.12
38	CIERRE: Cierre Proyecto Pinsaquí-Cotacachi, Terminado	1-Solicitud de Información	30/06/2013		30/06/2013		Sí	0.8
39	EJECUCION: Movimiento de tierras -sub rasante del Proyecto Adoquinado calles parque bulevar-ibarra, Realizado	1-Solicitud de Información	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.12
40	EJECUCION: Señalización Mantenimiento Periódico Proyecto Ibarra-Urcuqui, Realizado	1-Solicitud de Información	10/07/2013		10/07/2013		Sí	2.12
41	EJECUCION: Colocación base del Proyecto Adoquinado calles Parque Bulevar-Ibarra, Ejecutado	1-Solicitud de Información	20/08/2013		20/08/2013		Sí	2.12
42	CIERRE:Cierre Mantenimiento Periódico Proyecto Ibarra-Urcuqui, Terminado	1-Solicitud de Información	15/09/2013		15/09/2013		Sí	0.8
43	EJECUCION: Construcción Puente Chalguayacu Proyecto Juncal-Pimampiro, Terminado	1-Solicitud de Información	26/12/2013		26/12/2013		Sí	2.12
44	CIERRE: Recepción Proyecto Juncal-Pimampiro, Terminado	1-Solicitud de Información	30/12/2013		30/12/2013		Sí	0.8
45	EJECUCION: Liquidación tecnico-economica del Proyecto Adoquinado calles Parque Bulevar-Ibarra, Ejecutado	1-Solicitud de Información	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.12

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
46	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa Limpieza de derrumbes Salinas-Lita , Realizado	1-Solicitud de Información	30/03/2014		30/03/2014		Sí	2.12
47	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa Limpieza de derrumbes Selva Alegre-Saguangal, Ejecutado	1-Solicitud de Información	30/03/2014		30/03/2014		Sí	2.12
48	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa Recapeo Asfalto en frío Cotacachi-Ciucocha	1-Solicitud de Información	30/03/2014		30/03/2014		Sí	2.12
49	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa Limpieza de cunetas, alcantarillas y espaldones Salinas-Lita, Realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	2.12
50	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa Limpieza de alcantarillas, cunetas y espaldones Selva Alegre-Saguangal, Realizado	5-Entregables Intermedios	29/07/2014		29/07/2014		Sí	2.12
51	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa Limpieza de cunetas, alcantarillas y espaldones Salinas-Lita, Ejecutado	5-Entregables Intermedios	29/07/2014		29/07/2014		Sí	2.12
52	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa Limpieza de alcantarillas, cunetas y espaldones Selva Alegre-Saguangal	5-Entregables Intermedios	30/07/2014		30/07/2014		Sí	2.12
53	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Limpieza de cunetas, alcantarillas y espaldones, Cotacachi-Ciucocha, Ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/07/2014		30/07/2014		Sí	2.12
54	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Limpieza de cunetas, alcantarillas y espaldones, Cotacachi-Ciucocha, Ejecutado	5-Entregables Intermedios	29/08/2014		29/08/2014		Sí	2.12
55	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa Limpieza de derrumbes Selva Alegre-Saguangal, Ejecutado	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	2.12
56	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa Limpieza de derrumbes Salinas-Lita, Ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	2.12
57	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa Recapeo Asfalto en frío Cotacachi-Ciucocha, Realizado	1-Solicitud de Información	30/09/2014		30/09/2014		Sí	2.12
58	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa limpieza de derrumbes Selva Alegre-Saguangal, Ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2014		30/12/2014		Sí	2.77
59	PLANEACION: Invitación a Microempresas para mantenimiento Salinas - Lita	1-Solicitud de Información	01/07/2015		31/03/2016		Sí	0.25
60	PLANEACION: Invitación a Microempresas para	1-Solicitud de Información	10/07/2015		29/07/2016		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mantenimiento Selva Alegre - Saguangal							
61	CIERRE: Acta de recepción de los Estudios Otavalo- Selva Alegre	1-Solicitud de Información	31/07/2015		29/12/2017		Sí	0.8
62	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa Limpieza de derrumbes Salinas-Lita.	1-Solicitud de Información	31/07/2015		30/04/2016		Sí	0.25
63	PLANEACION: Conformación de las Microempresas Selva Alegre - Saguangal	1-Solicitud de Información	31/07/2015		31/08/2016		Sí	0.25
64	CIERRE: Acta de Recepción definitiva Mantenimiento Juncal- Pimampiro	1-Solicitud de Información	31/08/2015		29/01/2016		Sí	0.8
65	CIERRE: Cierre del Mantenimiento Juncal Pimampiro	1-Solicitud de Información	31/08/2015		29/01/2016		Sí	0.8
66	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa limpieza de derrumbes Selva Alegre-Saguangal.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		30/11/2017		Sí	3.31
67	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa Limpieza de derrumbes Salinas-Lita.	1-Solicitud de Información	31/10/2015		01/05/2016		Sí	2.25
68	EJECUCION: Acta de Recepción definitiva Adoquinado calles parque Boulevard-Ibarra	1-Solicitud de Información	31/12/2015		29/05/2015		Sí	0.6
69	EJECUCION: Liquidación económica de construcción Selva Alegre - Saguangal	1-Solicitud de Información	31/12/2015		29/12/2017		Sí	0.6
70	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa Limpieza de derrumbes Salinas-Lita.	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.05
71	PLANEACION: Actualización de Microempresas para mantenimiento Salinas - Lita	1-Solicitud de Información	15/02/2017		15/02/2017		Sí	0.05
72	PLANEACION: Actualización de Microempresas para mantenimiento Selva Alegre - Saguangal	1-Solicitud de Información	15/02/2017		15/02/2017		Sí	0.05
73	EJECUCION: Mantenimiento Adm. Directa Limpieza de derrumbes Salinas-Lita.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.05
74	PLANEACION: Habilitación de la Microempresa vía Selva Alegre - Saguangal	3-Adjudicación	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.05
75	PLANEACIÓN: Habilitación de Microempresa vía salinas - Lita	3-Adjudicación	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.05
76	EJECUCION: Mantenimiento a través de Microempresas Salinas-Lita.	4-Inicio de Trabajo	01/03/2017		01/03/2017		Sí	0.05
77	EJECUCION: Mantenimiento a través de Microempresas Selva Alegre - Saguangal	4-Inicio de Trabajo	10/03/2017		10/03/2017		Sí	0.05
78	EJECUCION: Mantenimiento a través de Microempresas Salinas-Lita.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		30/06/2017		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
79	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Selva Alegre - Saguangal	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		30/06/2017		Sí	0.05
80	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Salinas-Lita.	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/06/2017		Sí	0.05
81	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Selva Alegre - Saguangal	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/06/2017		Sí	0.05
82	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Salinas-Lita.	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		30/06/2017		Sí	0.05
83	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Selva Alegre - Saguangal	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		30/06/2017		Sí	0.05
84	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Salinas-Lita.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.05
85	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Selva Alegre - Saguangal	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.05
86	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Salinas-Lita.	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.05
87	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Selva Alegre - Saguangal	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.05
88	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Salinas-Lita.	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.05
89	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Selva Alegre - Saguangal	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.05
90	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Salinas-Lita. Fase 1	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	0.05
91	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Selva Alegre - Saguangal	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	0.05
92	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Salinas-Lita.	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.05
93	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Selva Alegre - Saguangal Fase 1	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.05
94	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Salinas-Lita. Fase 1	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.05
95	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Selva Alegre - Saguangal Fase 1	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.05
96	EJECUCION: Acta Entrega Recepción definitiva de Trabajos a traves de Microempresas Selva Alegre - Saguangal Fase I, realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.05
97	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción definitiva de Trabajos a traves de	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Microempresas Salinas-Lita. Fase I, realizado							
98	EJECUCIÓN: Liquidación Económica Acta Entrega Recepción Definitiva Fase I, realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.15
99	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Salinas-Lita. Fase II, realizado	4-Inicio de Trabajo	15/02/2018		15/02/2018		Sí	0.05
100	EJECUCION: Mantenimiento a traves de Microempresas Selva Alegre - Saguangal Fase II, realizado	4-Inicio de Trabajo	15/02/2018		15/02/2018		Sí	0.03
101	EJECUCION: Mantenimiento Adinistración Directa Gastos Operacionales	5-Entregables Intermedios	29/06/2018		29/06/2018		Sí	1.0
102	EJECUCION: Bacheo Mayor y Menor 27 Km. E29	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2018		30/06/2018		Sí	1.0
103	EJECUCION: Colocación Slurry E10 10Km	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/08/2018	31/08/2018			No	1.0
104	EJECUCION: Acta entrega recepción Definitiva Recapeo 1.5 Km. E29	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/09/2018	28/09/2018			No	1.0
105	EJECUCION: Acta entrega recepción Definitiva, Ampliación Oficinas Subsecretaría	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/09/2018	28/09/2018			No	1.0
106	EJECUCION: Acta Entrega Recepción Definitiva Mantenimiento a traves de Microempresas Salinas-Lita. Fase II	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018	31/12/2018			No	1.01
107	EJECUCION: Acta Entrega Recepción Definitiva Mantenimiento a traves de Microempresas Selva Alegre - Saguangal. Fase II	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018	31/12/2018			No	1.01
108	EJECUCION: Acta entrega recepción Mantenimiento Adinistración Directa Gastos Operacionales	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018	31/12/2018			No	1.0


SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Mantenimiento Vial de la Provincia de Imbabura	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	10/05/2016
2	Mantenimiento Vial de la Provincia de Imbabura	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	20/04/2016
3	Supervisión Mantenimiento Vial de la Provincia de Imbabura	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	19/01/2016
4	Supervisión Mantenimiento Vial de la Provincia de Imbabura	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	14/10/2015
5	Supervisión-Mantenimiento Vial de la Provincia de Imbabura	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	14/09/2015
6	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	24/10/2014

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
7	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	24/08/2014
8	Supervisor	Taboada Salazar, Wilmer Roberto	{PR} - Provincia - IMBABURA	30/06/2014
9	SUPERVISIÓN	Taboada Salazar, Wilmer Roberto	{PR} - Provincia - IMBABURA	29/04/2014
10	SUPERVISION	Taboada Salazar, Wilmer Roberto	{PR} - Provincia - IMBABURA	31/03/2014
11	Supervisión de proyecto	Villamarin Carrascal, Julio Marcelo	{PR} - Provincia - IMBABURA	03/12/2013
12	Supervisión de la obra	Villamarin Carrascal, Julio Marcelo	{PR} - Provincia - IMBABURA	09/09/2013
13	Supervisión	Villamarin Carrascal, Julio Marcelo	{PR} - Provincia - IMBABURA	31/07/2013
14	Vía Pimampiro-Juncal	Villamarin Carrascal, Julio Marcelo	{PR} - Provincia - IMBABURA	26/04/2013
15	Inspección de la obra	Villamarin Carrascal, Julio Marcelo	{PR} - Provincia - IMBABURA	12/04/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de intervención de mantenimiento de la Red Vial Provincial		100.20 %	0.6	0.6012	01/01/2015	Oct-Dic


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	194,869.82
Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,312,399.23 **
Costo Total:	13,621,220.51
Total Devengado:	14,865,640.80
% Costo Total Devengado:	109.14 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 109.14 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	17,177,752.20	1,200,000.00	1,869,781.17	20,247,533.37
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	11,854,135.25	1,200,000.00	1,869,781.17	14,923,916.42
Ppto. Codificado	13,010,196.59	1,090,206.26	2,781,067.91	16,881,470.76
Ppto. Comprometido	4,308,696.81	797,140.87	1,386,514.37	6,492,352.05
Planeado - Codificado (2017)		109,793.74		
Programado a Devengar	12,838,922.33	544,838.10	1,869,781.17	15,253,541.60
Ppto. Devengado	12,897,779.96	587,644.97	1,380,215.87	14,865,640.80
Pagado Real	4,267,820.78	587,644.97	430,604.62	5,286,070.37
Estimado a fin de año	* 12,897,779.96	1,216,714.81	0.00	14,114,494.77
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-58,857.63	-671,876.71	1,869,781.17	1,139,046.83
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.46 %	107.86 %	73.82 %	97.46 %
Ppto. Codificado 998	1,487,828.25	22,148.61	208,219.72	1,718,196.58
Ppto. Devengado 998	1,465,678.64	0.00	138,079.54	1,603,758.18

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

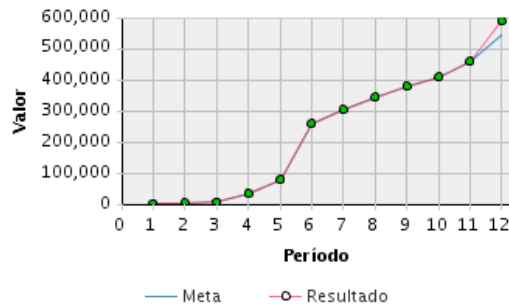

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	1,328.96	1,328.96	1,328.96	1,328.96	100.00 %	●	0.24 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	1,429.92	1,429.92	2,758.88	2,758.88	100.00 %		0.51 %
Mar	2,660.93	2,660.93	5,419.81	5,419.81	100.00 %		0.99 %
Abr	28,712.26	28,712.26	34,132.07	34,132.07	100.00 %		6.26 %
May	45,619.99	45,619.99	79,752.06	79,752.06	100.00 %		14.64 %
Jun	178,459.92	178,459.92	258,211.98	258,211.98	100.00 %		47.39 %
Jul	44,898.22	44,898.22	303,110.20	303,110.20	100.00 %		55.63 %
Ago	39,911.74	39,911.74	343,021.94	343,021.94	100.00 %		62.96 %
Sep	35,975.65	35,975.65	378,997.59	378,997.59	100.00 %		69.56 %
Oct	29,473.05	29,473.05	408,470.64	408,470.64	100.00 %		74.97 %
Nov	49,537.47	49,537.47	458,008.11	458,008.11	100.00 %		84.06 %
Dic	86,829.99	129,636.86	544,838.10	587,644.97	107.86 %		107.86 %
Total	544,838.10	587,644.97					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.-Informe Ejecutivo mes de enero 2015 Mantenimiento Ibarra-Urcuqui	Informe_Ejecutivo_mes_de_enero_2015_Mantenimiento_Ibarra-Urcuqui.pdf	02/02/2015
2	A1 Informe ejecutivo mes de enero 2015 Mantenimiento Rutinario Juncal-Pimampiro	Informe_ejecutivo_mes_enero_2015_Mantenimiento_Rutinario_Pimampiro.pdf	02/02/2015
3	A2. Informe Ejecutivo mes de febrero 2015 Mantenimiento Luncal Pimampiro.	Informe_Ejecutivo_mes_de_febrero_2015_Juncal_-_Pimampiro..pdf	06/03/2015
4	Acta de recepción definitiva Caminos Vecinales	Acta_recepción_definitiva_caminos_vecinales_mp.pdf	04/06/2015
5	Acta de Recepción Provisional de la vía Pinsaqui-Cotacachi	Acta_de_Recepcion_Provisional_via_Pinsaqui-Cotacachi.pdf	05/07/2013
6	Acta Provisional del contrato de construcción de cunetas de la Carretera Ibarra-Urcuqui.	acta_cunetas_ibarra-urcuqui.pdf	07/01/2013
7	Acta Provisional Mantenimiento Juncal - Pimampiro	Acta_Recepcion_provisional_mantenimiento_Juncal_Pimampiro_MP.pdf	10/12/2014
8	ACTA RECEPCION PROVISIONAL DEL MANTENIMIENTO DE LA VIA IBARRA-URCUQUI	acta_recepción_provisional_mantenimiento_ibarra_urcuqui.pdf	07/11/2013
9	Acta Recepción Definitiva Mantenimiento Ibarra - Cotacachi	Acta_Recepción_Definitiva_Pinsaquí_Cotacachi_mp.pdf	10/11/2014
10	Acta Recepción Definitiva Mantenimiento Ibarra - Urcuqui	Acta_Recepción_definitiva_mantenimiento_ibarra_-_Urcuqui_mp.pdf	10/11/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	Acta Recepción Provisional Terminación Adoquinado Ave. Galo PLaza Y Camilo Ponce IMBAVIAL	Acta_Recepción_provisional_Terminación_Adoquinado_Av.	30/01/2014
12	Actas del Contrato de construcción de Cunetas de la Vía. Cotacachi-Cuicocha.	acta_cunetas_Cotacachi-Cuicocha.pdf	07/01/2013
13	CONTRATACION DE MICROEMPRESAS ENERO - MARZO 2017	CONTRATACION_DE_MICROEMPRESAS.pdf	05/04/2017
14	Contratacion Microempresa Conservación Vía Salinas Lita	Contrato_Microempresa_Conservación_Vía_Limpia.pdf	05/04/2017
15	Croquis Carretera Pinsaqui-Cotacachi	croquis_pinsaqui_-_cotacachi.dwg	09/10/2012
16	Croquis Ibarra Urcuquí	Croquis_Urcuqui_-_Imbaya.jpg	09/10/2012
17	Croquis Proyecto Construcción Cunetas Ibarra-Urcuqui	croquis_CUNETAS_IBARRA-URCUQUI-4.xlsx	09/10/2012
18	Croquis proyecto Cunetas Cotacachi-Cuicocha.	Croquis_CUNETAS_CUICOCHA-COTACACHI.xlsx	09/10/2012
19	Croquis Proyecto Juncal-Pimampiro	img026.jpg	04/07/2012
20	Cunetas terminadas carretera Ibarra-urcuqui	cunetas_terminadas_carretera_Ibarra-Urcuqui.jpg	07/01/2013
21	Cunetas terminadas del contrato Cotacachi-Cuicocha	Cunetas_terminadas_contrato_Cotacachi-cuicocha.pdf	07/01/2013
22	Cur de pago del Anticipo por el contrato de mantenimiento de la carretera Juncal-Pimampiro	Cur_No._31922653.jpg	09/07/2012
23	CUR de pagos de anticipos de las vías Ibarra-Urcuquí , Pinsaquí -Cotacachi.	CURS_Pagos_anticipos_Pinsaqui-Cuicocha_y_Ibarra-Urcuquí.pdf	08/10/2012
24	EQUIPO CAMINERO REQUERIDO PARA TRABAJOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DDI	solicitud_equipo_2017__ddi.pdf	03/08/2017
25	Estado Administración Directa Diciembre 2017	INFORME_ESTADO_AD_IMBABURA_DICIEMBRE_2017-1.docx	06/01/2018
26	Fotografías del proyecto adoquindao de las calles del ParqueCéntrica Bulevar-Ibarra	img221.jpg	07/08/2013
27	Fotografías proyecto Ibarra-Urcuqui abril/2013	img157.jpg	07/05/2013
28	Fotografías trabajos Juncal-Pimampiro	Juncal_Julio_2012_(2).jpg	09/08/2012
29	Fotografías trabajos Juncal-Pimampiro	Juncal_Julio_2012_(3).jpg	09/08/2012
30	Fotos de los trabajos de la vía Juncal Pimampiro del mes de noviembre/2012	Juncal_noviembre_(2).jpg	07/12/2012
31	Fotos mantenimiento vía Pinsaqui-Cotacachi	foto_de_la_via_pinsaqui-cotacachi.jpg	07/12/2012
32	INFOGRAFIA INICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIA SELVA ALEGRE - SAGUANGAL JUNIO - 2017	INFOGRAFIA_INICIOS_DE_TRABAJOS_DE_MANTENIMIENTO_VIA_SELVA_ALEGRE.pdf	06/07/2017
33	INFOGRAFIA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TRAMO SELVA ALEGRE SAGUANGAL 2017	INFOGRAFIA_MANTENIMIENTO_VIAL_TRAMO_SELVA_ALEGRE_AGO	06/08/2017
34	INFOGRAFIA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIA E10 SALINAS - LITA	MANTENIMIENTO_SALINAS_-_LITA.pdf	03/08/2017
35	INFOGRAFIA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL VIA SALINAS - LITA AGOSTO 2017	INFOGRAFIA_MANTENIMIENTO_VIAL_TRAMO_SALINAS_-_LITA_AGOSTO_2017.pdf	05/09/2017
36	INFOGRAFIA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL VIA SALINAS - LITA JUNIO 2017	INFOGRAFIA_TRABAJOS_DE_MANTENIMIENTO_VIAL_VIA_SALINAS_-_LITA_JUNIO_2017.pdf	06/07/2017
37	Informe Ejecutivo mes de abril 2015 Auditoría Ambiental Selva Alegre - Saguangal.	Informe_Ejecutivo_mes_de_abril_2015_Auditoría_Ambiental_Saguangal...pdf	06/05/2015
38	Informe Ejecutivo mes de abril 2015 Estudios Otavalo - Selva Alegre	Informe_Ejecutivo_me_sde_abril_2015_Estudios_Otavalo_-_Selva_Alegre..pdf	06/05/2015
39	Informe Ejecutivo mes de marzo 2015 Estudios Piñán	Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2015_Estudios_Piñán.pdf	08/04/2015
40	Informe Administración Directa Diciembre/2017	INFORME_FOTOGRAFICO_ADM_DIRECTA_IMBABURA_DICIEMBRE_2017.docx	01/01/2018
41	Informe de actividades en Mantenimiento Rutinario Selva Alegre - Saguangal.	Informe_actividades_de_Mantenimiento_Rutinario_Salinas_-_Lita_mes_de_febrero_2015.pdf	06/03/2015
42	Informe de actividades en Mantenimiento Rutinario Selva Alegre - Saguangal. cuarta semana mes de octubre 2014	Informe_de_actividades_Mantenimiento_Rutinario_Selva_Alegre_-_Saguangal_cuarta_semana.pdf	10/11/2014
43	Informe de Ejecución presupuesto febrero 2015	Informe_de_Ejecución_de_presupuesto_febrero_2015..pdf	11/03/2015
44	Informe de mantenimiento Febrero-2018	Informe_de_trabajos_de_mantenimiento_FEBRERO-2018.pdf	05/04/2018
45	Informe de trabajos de mantenimiento Marzo-2018	Informe_de_trabajos_de_mantenimiento_MARZO-2018.pdf	05/04/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
46	Informe de trabajos de mantenimiento rutinario de la via Cotacachi-Cuicocha.	informe_mantenimiento_via_cotacachi-cuicocha.jpg	07/01/2013
47	INFORME DE TRABAJOS MICROEMPRESA INTAG VIAL VIA SELVA ALEGRE SAGUANGAL JULIO 2017	MTOP-CON_IMB-2017-188-ME.PDF	03/08/2017
48	INFORME DE TRABAJOS MICROEMPRESA INTAG VIAL VIA SELVA ALEGRE SAGUANGAL JULIO 2017	MTOP-CON_IMB-2017-168-ME.PDF	03/08/2017
49	Informe Ejecutivo mes de diciembre 2016 Fiscalización Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce.	Informe_Ejecutivo_mes_de_diciembre_2016_Fiscalización_Ave_Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce.pdf	05/03/2017
50	Informe Ejecutivo mes de diciembre 2016 Fiscalización Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce.	Informe_Ejecutivo_mes_de_diciembre_2016_Adoquinado_Ave_Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce.pdf	05/03/2017
51	Informe ejecutivo mes de marzo/2014 Adoquinado Avenidas Parque Boulevard	A.5_GestionReporteFN_marzo_Adoquinado_Parque_Boulevard.pdf	07/04/2014
52	Informe ejecutivo Abril-2014 Juncal-Pimampiro	A.7_GestionReporteFN_Abril-2014_Juncal.pdf	08/05/2014
53	Informe ejecutivo abril-2014 Terminacion adoquinado PARque Boulevard Cia. IMBAVIAL EP.	A.9_GestionReporteFN_Abril-2014_Terminacion_adoquinado_Parque_Boulevard.pdf	08/05/2014
54	Informe ejecutivo abril/2013 proyecto Ibarra-Urcuqui	GestionReporteFN_ibarra-urcuqui_abril-2013.pdf	07/05/2013
55	Informe ejecutivo abril/2014 Adoquinado PARque Boulevard Cia. Tapia y Mera	A.8_GestionReporteFN_Abril-2014_adoquinado_boulevard.pdf	08/05/2014
56	Informe ejecutivo Adoquinado Avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard de Ibarra	GestionReporteFN_noviembre_adoquinado_parque_boulevard.pdf	06/12/2013
57	Informe ejecutivo agosto proyecto Ibarra-Urcuqui	GestionReporteFN_agosto_2013-Ibarra-Urcuqui.pdf	06/09/2013
58	Informe Ejecutivo Agosto/2012	Informe_ejecutivo_Juncal_agosto_2012.PDF	07/09/2012
59	Informe ejecutivo carretera Ibarra-Urcuqui marzo-2013	GestionReporteFN_ibarra-Urcuqui-marzo-2013.pdf	05/04/2013
60	Informe Ejecutivo carretera Ibarra-Urcuqui, mayo 2013	GestionReporteFN_ibarra-urcuqui_mayo-2013.pdf	06/06/2013
61	Informe ejecutivo carretera Juncal -Pimampiro abril-2013	GestionReporteFN_juncal-Pimampiro_abril-2013.pdf	08/05/2013
62	Informe ejecutivo carretera Pinsaqui-Cotacachi Diciembre/2012	GestionReporteFN_pinsaqui_diciembre-2012.pdf	08/01/2013
63	Informe ejecutivo cunetas Ibarra-Urcuqui Noviembre-2012	GestionReporteFN_cunetas_ibarra-urcuqui_noviembre-2012.pdf	07/12/2012
64	Informe ejecutivo de diciembre/2012 de la carretera Juncal-Pimampiro	GestionReporteFN_juncal_diciembre.pdf	07/01/2013
65	Informe ejecutivo de la carretera Juncal-Pimampiro Septiembre/2012	informe_ejecutivo_juncal-pimampiro_septiembre-2012.pdf	08/10/2012
66	Informe ejecutivo de la construccion cunetas en la via Cuicocha-Cotacachi correspondiente al mes de octubre/2012	GestionReporteFN_cuicocha-Cotacachi_octubre_2012.pdf	08/11/2012
67	Informe ejecutivo diciembre del Proyecto adoquinado avenidas Parque Boulevard	A.2_GestionReporteFN_diciembre-2013-Adoquinado_Parque_Boulevard.pdf	14/03/2014
68	Informe Ejecutivo Diciembre/2013 Juncal-Pimampiro	A.1_GestionReporteFN_diciembre-2013_Juncal-Pimampiro.pdf	14/03/2014
69	Informe ejecutivo enero/2014 juncal-Pimampiro	A.3_GestionReporteFN_enero_2014_juncal-pimampiro.pdf	14/03/2014
70	Informe ejecutivo estudios caminos vecinales de cuellar-Rio Verde marzo-2014	A.4_GestionReporteFN_Estudios_caminos_vecinales_de_cuellar-Rio_Verde.pdf	07/04/2014
71	Informe Ejecutivo Febrero 2013	GestionReporteFN_Juncal-Pimampiro_febrero-2013.pdf	07/03/2013
72	Informe ejecutivo Febrero/2013	GestionReporteFN_ibarra-urcuqui-febrero-2013.pdf	07/03/2013
73	Informe ejecutivo Febrero/2013 Carretera Pinsaqui-Cotacachi	GestionReporteFN_Pinsaqui-Cotacachi_Febrero-2013.pdf	08/03/2013
74	Informe Ejecutivo Fiscalización Adoquinado Avenidas Parque Boulevard de Ibarra	GestionReporteFN_noviembre_fiscalizacion_Parque_boulevard.pdf	06/11/2013
75	Informe ejecutivo Ibarra-Urcuqui enero 2013	GestionReporteFN_urcuqui-ibarra_enero_2013.pdf	07/02/2013
76	Informe ejecutivo julio Adoquinado Avenidas del Parque Boulevard de Ibarra.	GestionReporteFN_Julio_adoquinado_avenidas_Parque_Boulevard.pdf	09/08/2013
77	Informe ejecutivo julio/2013 carretera Ibarra-Urcuqui	GestionReporteFN-2_Ibarra-urcuqui_julio-2013.pdf	07/08/2013
78	Informe ejecutivo julio/2013 carretera Juncal-Pimampiro	GestionReporteFN_juncal-Pimampiro_julio-2013.pdf	07/08/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
79	Informe ejecutivo Juncal Pimampiro marzo-2014	A.6_GestionReporteFN_Juncal_Pimampiro_marzo-2014.pdf	09/04/2014
80	Informe ejecutivo Juncal Pimampiro-Noviembre/2013	GestionReporteFN_noviembre_Juncal-Pimampiro.pdf	06/12/2013
81	Informe ejecutivo Juncal-Pimampiro enero 2013	GestionReporteFN_Juncal-Pimampiro_enero_2013.pdf	07/02/2013
82	Informe Ejecutivo Juncal-Pimampiro Julio-2012	informe_ejecutivo_julio-2012_juncal-pimampiro.pdf	08/08/2012
83	Informe ejecutivo Juncal-Pimampiro mayo/2013	GestionReporteFN_juncal-Pimampiro_mayo-2013.pdf	06/06/2013
84	Informe ejecutivo Juncal-Pimampiro Octubre-2013	GestionReporteFN_juncal-pimampiro_octubre-2013.pdf	12/11/2013
85	Informe Ejecutivo Mantenimeinto Pimampiro mes de octubre 2014	Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2014_Mantenimiento_Pimampiro.pdf	07/11/2014
86	Informe ejecutivo mantenimiento Ibarra-Urcuqui Diciembre/2012	GestionReporteFN_urcuqui_diciembre.pdf	07/01/2013
87	Informe ejecutivo mantenimiento periódico carretera Ibarra-Urcuqui noviembre/2012	GestionReporteFN_mantenimiento_Ibarra-Urcuqui_noviembre-2012.pdf	07/12/2012
88	Informe ejecutivo mantenimiento rutinario carretera Ibarra-Urcuqui Octubre/2012	GestionReporteFNmantenimiento_rutinario_ibarra-urcuqui_octubre_2012.pdf	07/11/2012
89	Informe Ejecutivo Mantenimiento Urcuqui mes de agosto 2014	Informe_ejecutivo_mes_de_agosto_2014_Ibarra_-_Urcuqui.pdf	07/11/2014
90	informe ejecutivo marzo/2013 proyecto Pinsaqui-Cotacachi	GestionReporteFN_pinsaqui-cotacachi_marzo-2013.pdf	07/05/2013
91	Informe ejecutivo mayo/2013 Proyecto adoquinado calles Parque céntrica Bulevar-Ibarra	GestionReporteFN-1_parque_Céntrica__Bulevard_Mayo-2013.pdf	07/08/2013
92	Informe ejecutivo mayo/2014- Juncal-Pimampiro	B.1_GestionReporteFN_mayo-2014_Juncal-Pimampiro.pdf	06/06/2014
93	Informe Ejecutivo mes de Abril 2016 Avenida Parque Boulevard	Informe_Ejecutivo_mes_de_abril_2016_Avenidas_Parque_Boulevard.pdf	05/05/2016
94	Informe Ejecutivo mes de abril 2016 Mantenimiento Juncal - Pimampiro	Informe_Ejecutivo_mes_de_abril_2016_Mantenimiento_Juncal_Pimampiro.pdf	05/05/2016
95	Informe Ejecutivo mes de abril 2016, Estudios Otavalo-Selva Alegre.	Informe_Ejecutivo_mes_de_abril_de_2016__Estudios_Otavalo-Selva_Alegre..pdf	05/05/2016
96	Informe Ejecutivo mes de abril de 2016, Estudios Ciclovías de la ciudad de Ibarra.	Informe__mes_de_abril_de_2016__Estudios_Ciclovias_de_la_ciudad_de_Ibarra..pdf	05/05/2016
97	Informe Ejecutivo mes de agosto 2015, Adoquinado Parque Céntrica Boulevard.	Informe__Ejecutivo_mes_de_agosto_2015__Adoquinado_Parque_Céntrica_Boelevard..pdf	08/09/2015
98	Informe Ejecutivo mes de agosto 2015, Mantenimiento Juncal Pimampiro.	Informe_Ejecutivo_mes_de_agosto_2015__Mantenimiento_Juncal_Pimampiro..pdf	08/09/2015
99	Informe Ejecutivo mes de agosto 2016 Adoquinado Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce Centrica Boulevard	Informe_Ejecutivo_mes_de_agosto_2016_Adoquinado_Centrica_Boulevard.pdf	08/09/2016
100	Informe Ejecutivo mes de agosto 2016 Adoquinado Parque Boulevard.	Informe_Ejecutivo_mes_de_agosto_2016_Adoquinado_Parque_Boulevard.pdf	05/09/2016
101	Informe Ejecutivo mes de agosto 2016 Estudios Otavalo - Selva Alegre.	Informe_Ejecutivo_mes_de_agosto_2016_Estudios_Otavalo_Selva_Alegre..pdf	05/09/2016
102	Informe Ejecutivo mes de agosto 2016 Estudios Piñán.	Informe_Ejecutivo_mes_de_agosto_2016_Estudios_Piñán.pdf	05/09/2016
103	Informe Ejecutivo mes de agosto 2016 Fiscalización Adoquinado.	Informe_Ejecutivo_mes_de_agosto_2016_Fiscalización_Adoquinado.pdf	05/09/2016
104	Informe Ejecutivo mes de agosto 2016 Mantenimiento Juncal - Pimampiro.	Informe_Ejecutivo_mes_de_agosto_2016_Mantenimiento_Pimampiro.pdf	05/09/2016
105	Informe Ejecutivo mes de diciembre 2014 Mantenimiento Ibarra - Urcuqui	Informe_Ejecutivo_mes_de_diciembre_2014_Mantenimiento_Urcuqui.pdf	09/01/2015
106	Informe Ejecutivo mes de Diciembre 2014 Mantenimiento Juncal - Pimampiro	Informe_Ejecutivo_mes_de_diciembre_2014_Mantenimiento_Pimampiro.pdf	09/01/2015
107	Informe Ejecutivo mes de diciembre 2015 Estudios Selva Alegre - Otavalo	Informe_Ejecutivo_mes_de_diciembre_2015_Estudios_Otavalo_Selva_Alegre..pdf	05/01/2016
108	Informe Ejecutivo mes de diciembre 2015 Mantenimiento Juncal Pimampiro	Informe__Ejecutivo_mes_de_diciembre_2015_Mantenimiento_Juncal_Pimampiro..pdf	05/01/2016
109	Informe Ejecutivo mes de diciembre 2016 Estudios Selva Alegre - Otavalo	Informe_Ejecutivo_mes_de_diciembre_2016_Estudios_Selva_Alegre_Otavalo.pdf	05/01/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
110	Informe Ejecutivo mes de enero 2015 Estudios carretera Otavalo-Selva Alegre.	A3_Informe_Ejecutivo_mes_de_enero_2015_Rstudios_carretera_Otavalo-Selva_Alegre..pdf	10/02/2015
111	Informe Ejecutivo mes de enero 2016 Mantenimiento Juncal Pimampiro	Informe_Ejecutivo_mes_de_enero_2016_Mantenimiento_Juncal_Pimampiro.pdf	18/02/2016
112	Informe Ejecutivo mes de febrero 2015 Mantenimiento Urququi	Informe_Ejecutivo_mes_de_febrero_2015_Mantenimiento_Urququi.pdf	06/03/2015
113	INFORME EJECUTIVO MES DE FEBRERO 2016 ADOQUINADO PARQUE BULEVARD	INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_FEBRERO_2016_ADOQUINADO_PARQUE_BULEVARD.pdf	10/04/2016
114	Informe Ejecutivo mes de febrero 2016 Estudios Ciclovías Ibarra	Informe_Ejecutivo_mes_de_febrero_2016_Estudios_ciclovías_ciudad_de_ibarra.pdf	08/02/2016
115	Informe Ejecutivo mes de febrero 2016 Estudios Otavalo - Selva Alegre	Informe_Ejecutivo_mes_de_febrero_2016_Estudios_Selva_Alegre-Otavalo.pdf	08/03/2016
116	Informe Ejecutivo mes de febrero 2016 Mantenimiento Juncal - Pimampiro	Informe_Ejecutivo_mes_de_enero_2016_Mantenimiento_Juncal_Pimampiro.pdf	08/03/2016
117	Informe Ejecutivo mes de Julio 2015 Estudios Ciclovías Ibarra	Informe_Ejecutivo_Mes_de_Julio_2015_Estudios_de_Ciclovías_ciudad_de_ibarra.pdf	10/08/2015
118	Informe Ejecutivo mes de Julio 2015 Mantenimiento Selva Alegre-Saguangal	Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2015_Selva_Alegre-_Saguangal..pdf	10/08/2015
119	Informe Ejecutivo mes de Julio 2015 Selva Alegre-Otavalo	Informe_Ejecutivo_Mes_de_Julio_2015_Estudios_Otavalo_Selva_Alegre.pdf	10/08/2015
120	Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Adoquinado Avenidas Galo Plazo y Camilo Ponce	Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016__Terminación_Adoquinado_Avenidas_Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce.pdf	05/08/2016
121	Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Adoquinado parque Boulevard Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce.	Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Adoquinado__parque_Boulevard_Ave._Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce.pdf	05/08/2016
122	Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Estudios de Ciclovías ciudad de Ibarra.	Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Estudios_Ciclovías_ciudad_de_ibarra.pdf	05/08/2016
123	Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Estudios ingreso Piñán	Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Estudios_ingreso__Piñán.pdf	05/08/2016
124	Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Estudios Selva Alegre - Otavalo	Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Estudios_Selva_Alegre-Otavalo.pdf	05/08/2016
125	Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Fiscalización Adoquinado Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce.	Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Fiscalización_Adoquinado_Ave._Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce.pdf	05/08/2016
126	Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Mantenimiento Juncal - Pimampiro.	Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Mantenimiento_Juncal_Pimampiro.pdf	05/08/2016
127	Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Microempresa Progreso de Lita	Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Microempresa_Progreso_de_Lita.pdf	05/08/2016
128	Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Microempresa Vía Limpia	Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Microempresa_Vía_Limpia.pdf	05/08/2016
129	Informe Ejecutivo mes de Julio del 2015 Piñán	Informe_Ejecutivo_Julio_2015_Estudios_Piñán.pdf	10/08/2015
130	Informe Ejecutivo mes de junio 2016 Adoquinado Avenidas Camilo Ponce y Camilo Plaza	Informe_Ejecutivo_mes_de_junio_2016_Adoquinado_Avenidas_Camilo_Ponce_y_Camilo_Plaza.pdf	06/07/2016
131	Informe Ejecutivo mes de junio 2016 Estudios Acceso Comunidad de Piñán	Informe_Ejecutivo_mes_de_junio_2016_Estudios_Acceso_Comunidad_de_Piñán.pdf	06/07/2016
132	Informe Ejecutivo mes de junio 2016 Estudios Ciclovías ciudad de Ibarra	Informe_Ejecutivo_mes_de_junio_2016_Estudios_Ciclovías_ciudad_de_ibarra.pdf	06/07/2016
133	Informe Ejecutivo mes de junio 2016 Estudios Selva Alegre - Otavalo	Informe_Ejecutivo_mes_de_junio_2016_Estudios_Selva_Alegre-Otavalo.pdf	06/07/2016
134	Informe Ejecutivo mes de junio 2016 Mantenimiento Juncal - Pimampiro	Informe_ejecutivo_mes_de_junio_2016_Mantenimiento_Juncal_Pimampiro.pdf	06/07/2016
135	Informe Ejecutivo mes de junio 2016 Microempresa Progreso de Lita.	Informe_Ejecutivo_mes_de_junio_2016_Microempresa_Progreso_de_Lita..pdf	06/07/2016
136	Informe Ejecutivo mes de junio 2016 Microempresa Vía Limpia.	Informe_Ejecutivo_mes_de_junio_2016_Microempresa_Vía_Limpia.pdf	06/07/2016
137	Informe Ejecutivo mes de marzo 2015 Estudios Otavalo Selva Alegre.	Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_Estudios_Otavalo_Selva_Alegre.pdf	10/04/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
138	Informe Ejecutivo mes de marzo 2015 Mantenimiento Ibarra - Urcuqui	Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2015_Mantenimiento_Ibarra_Urcuqui..pdf	08/04/2015
139	Informe Ejecutivo mes de marzo 2015 Mantenimiento Juncal Pimampiro	Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2015_Mantenimiento_Juncal_Pimampiro..pdf	08/04/2015
140	Informe Ejecutivo mes de marzo 2016 Adoquinado Ave. Galo Plaza Parque Boulevard.	Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2016_Adoquinado_Ave_Galo_Plaza_Parque_Boulevard..pdf	05/04/2016
141	Informe Ejecutivo mes de marzo 2016 Estudios acceso a Piñán	Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2016_Estudios_acceso_a_Piñán..pdf	05/04/2016
142	Informe Ejecutivo mes de marzo 2016 Estudios Otavalo - Selva Alegre	Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2016_Estudios_Otavalo_Selva_Alegre..pdf	04/04/2016
143	Informe Ejecutivo mes de marzo 2016 Mantenimiento Juncal - Pimampiro	Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2016_Adoquinado_Ave_Galo_Plaza_Parque_Boulevard..pdf	04/04/2016
144	Informe Ejecutivo mes de mayo 2015 Adoquinado Parque Boulevard.	Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2015_Adoquinado_Parque_Boulevard..pdf	05/06/2015
145	Informe Ejecutivo mes de mayo 2015 Auditoría Ambiental Selva Alegre - Saguangal	Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2015_Auditoría_Ambiental_Selva_Alegre_Saguangal..pdf	05/06/2015
146	Informe Ejecutivo mes de mayo 2015 Estudios Otavalo - Selva Alegre.	Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2015_Estudios_Otavalo_Selva_Alegre..pdf	04/06/2015
147	Informe Ejecutivo mes de mayo 2015 Mantenimiento Juncal - Pimampiro.	Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2015_Juncal_Pimampiro..pdf	04/06/2015
148	Informe Ejecutivo mes de mayo 2015 Mantenimiento Selva Alegre - saguangal.	Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2015_Selva_Alegre_Saguangal..pdf	04/06/2015
149	Informe Ejecutivo mes de mayo 2016 Adoquinado Ave. Camilo Ponce y Galo PLaza	Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2016_Adoquinado_Ave_Camilo_Ponce_y_Galo_PLaza..pdf	06/06/2016
150	Informe Ejecutivo mes de mayo 2016 Estudios Ciclovías ciudad de Ibarra.	Informe_mes_de_mayo_2016_Estudios_ciclovías_ciudad_de_Ibarra..pdf	07/06/2016
151	Informe Ejecutivo mes de mayo 2016 Estudios de Ciclovías ciudad de Ibarra.	Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2016_Estudios_Ciclovías_ciudad_de_Ibarra..pdf	07/06/2016
152	Informe Ejecutivo mes de mayo 2016 Estudios Selva Alegre - Otavalo.	Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2016_Estudios_Selva_Alegre_Otavalo.pdf	06/06/2016
153	Informe Ejecutivo mes de mayo 2016 Mantenimiento Juncal - Pimampiro	Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2016_Mantenimiento_Juncal_Pimampiro.pdf	08/06/2016
154	Informe Ejecutivo mes de noviembre 2014 - Ibarra - Urcuqui.	Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2014_-Ibarra_Urcuqui..pdf	08/12/2014
155	Informe Ejecutivo mes de noviembre 2014 - Juncal - Pimampiro.	Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2014_Mantenimiento_Juncal_Pimampiro..pdf	08/12/2014
156	Informe Ejecutivo mes de noviembre 2014 -Adoquinado Parque Bulevard.	Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2014_-Adoquinado_Parque_Bulevard.pdf	08/12/2014
157	Informe Ejecutivo mes de noviembre 2015 Adoquinado Parque Boulevard.	Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2015_Adoquinado_Parque_Boulevard..pdf	09/12/2015
158	Informe Ejecutivo mes de noviembre 2015 Estudios Otavalo - Selva Alegre.	Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2015_Estudios_Otavalo_Selva_Alegre..pdf	09/12/2015
159	Informe Ejecutivo mes de noviembre 2015 Mantenimiento Juncal Pimampiro	Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2015_Mantenimiento_Juncal_Pimampiro..pdf	07/12/2015
160	Informe Ejecutivo mes de noviembre 2016 Adoquinado Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce.	Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2016_Adoquinado_Ave_Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce..pdf	05/12/2016
161	Informe Ejecutivo mes de noviembre 2016 Estudios Acceso a Piñán.	Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2016_Estudios_Piñán..pdf	05/12/2016
162	Informe Ejecutivo mes de noviembre 2016 Estudios Selva Alegre - Saguangal	Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2016_Estudios_Selva_Alegre_Saguangal..pdf	05/12/2016
163	Informe Ejecutivo mes de noviembre 2016 Fiscalización Adoquinado Ave. Camilo Ponce y Galo Plaza	Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2016_Fiscalización_Adoquinado_Ave_Camilo_Ponce_y_Galo_Plaza..pdf	05/12/2016
164	Informe Ejecutivo mes de octubre 2014 Manatenimiento Urcuqui	Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2014_Manatenimiento_Urcuqui..pdf	07/12/2014
165	Informe Ejecutivo mes de Octubre 2015 Adoquinqdo Parque Boulevard.	Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2015_Adoquinado_Parque_Boulevard..pdf	06/12/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
166	Informe Ejecutivo mes de Octubre 2015 Estudios Otavalo -Selva Alegre	Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2015_Estudios_Otavalo_Selva_Alegre.pdf	06/11/2015
167	Informe Ejecutivo mes de Octubre 2015 Mantenimiento Juncal - Pimampiro	Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2015_Mantenimiento_Juncal_Pimampiro.pdf	06/11/2015
168	Informe Ejecutivo mes de octubre 2016 Estudios Acceso a Piñán.	Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2016_Estudios_Acceso_a_Piñan.pdf	07/11/2016
169	Informe Ejecutivo mes de octubre 2016 Estudios Acceso a Piñán.	Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2016_Estudios_Acceso_a_Piñan.mp.pdf	07/11/2016
170	Informe Ejecutivo mes de octubre 2016 Estudios Selva Alegre-Otavalo	Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2016_Estudios_Selva_Alegre-Otavalo.pdf	08/11/2016
171	Informe Ejecutivo mes de octubre 2016 Fiscalización Adoquinado Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce.	Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2016_Fiscalización_Adoquinado_Ave._Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce.pdf	07/11/2016
172	Informe Ejecutivo mes de octubre 2016 Juncal - Pimampiro	Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2016_Juncal_-_Pimampiro..pdf	07/11/2016
173	Informe Ejecutivo mes de septiembre 2014, Mantenimiento Urcuqui.	Informe_Ejecutivo_mes_de_septiembre_2014_Mantenimiento_Urcuqui.pdf	01/10/2014
174	Informe Ejecutivo mes de septiembre 2016 Adoquinado Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce.	Informe_Ejecutivo_mes_de_septiembre_2016_Adoquinado_Ave._Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce.pdf	05/10/2016
175	Informe Ejecutivo mes de septiembre 2016 Estudios Otavalo - Selva Alegre.	Informe_Ejecutivo_mes_de_septiembre_2016_Estudios_Otavalo_Selva_Alegre..pdf	05/10/2016
176	Informe Ejecutivo mesa de marzo 2016 Estudios acceso a Piñán	Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2016_Estudios_Acceso_a_Piñan.pdf	05/04/2016
177	Informe ejecutivo noviembre/2012 carretera Juncal-Pimampiro	GestionReporteFN_juncal_noviembre.pdf	07/12/2012
178	Informe ejecutivo octubre/2012 cunetas ibarra-urcuqui	GestionReporteFNcunetas_urcuqui_octubre_2012.pdf	07/11/2012
179	Informe ejecutivo Parque Bolulevard Ibarra, Octubre-2013	GestionReporteFN_Parque_Boulevard_octubre-2013.pdf	12/11/2013
180	Informe ejecutivo Pinsaqui-Cotacachi Octubre 2012	GestionReporteFN_Pinsaqui-Cotacachi_Octubre-2012.pdf	07/11/2012
181	Informe ejecutivo Pinsaqui-Cotacachi enero/2013	GestionReporteFN_pinsaqui-cotacachi_Enero-2013.pdf	07/02/2013
182	Informe ejecutivo septiembre/2013	GestionReporteFN_Septiembre-2013_Juncal_-_Pimampiro.pdf	07/10/2013
183	Informe ejecutivo Via Ibarra-urcuqui Junio/2013	GestionReporteFN_Ibarra-Urcuqui_Junio-2013.pdf	05/07/2013
184	Informe ejecutivo via Pinsaqui-Cotacachi Noviembre/2012	GestionReporteFN_via_pinsaqui-cotacahi_noviembre-2012.pdf	07/12/2012
185	Informe ejecutivo vía Juncal-Pimampiro Junio-2013	GestionReporteFN_Juncal-Pimampiro_junio-2013.pdf	05/07/2013
186	Informe Ejecutivo, mes de abril 2016, Estudios Acceso a Piñán.	Informe_Ejecutivo_mes_de_abril_de_2016_Estudios_Acceso_a_Piñan.pdf	05/07/2016
187	Informe estado Red Vial Estatal de Imbabura Abril 2018	INFORME_ESTADO_RVE_-_IMBABURA_-_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
188	INFORME FOTOGRAFICO ADMINISTRACION DIRECTA NOVIEMBRE/2017	INFORME_FOTOGRAFICO_ADMIN_DIRECTA_IMBABURA_NOVIEMBRE_2017.docx	04/05/2018
189	Informe fotográfico de mantenimiento administración directa enero-2018	INFORME_FOTOGRAFICO_TRABAJOS_ENERO_2018.pdf	05/04/2018
190	Informe fotográfico de mantenimiento administración directa febrero-2018	Informe_Fotografico_Mantenimiento_FEBRERO-2018.pdf	05/04/2018
191	Informe indicador " tiempo Promedio de desplazamiento"	informe_indicador_tiempo_promedio_desplazamiento.jpg	07/01/2013
192	INFORME INICIO DE TRABAJOS MICROEMPRESA INTAG VIAL VIA SELVA ALEGRE SAGUANGAL	MTOP-DDI-2017-473-ME_INFORME_INICIO_DE_TRABAJOS_MICROEMPRESA_INTAG_VIAL_VIA_SELVA_ALEGRE.pdf	05/07/2017
193	Informe Mantenimiento Vial Imbabura Julio-2012	Memo_035-SM-2012-DP-l.jpg	08/08/2012
194	informe mantenimiento vial octubre2017	INFORME_ESTADO_RVE_IMBABURA_OCTUBRE_2017-1.docx	08/11/2017
195	Informe sobre fabricación de la Superestructura metálica del puente chalguayaco OF. IMBV-126-GG-2013 del 17/09/2013	Oficio_No._IMBV-126-GG-2013.pdf	07/10/2013
196	Informe sobre Indicador Proyecto Mantenimiento Vial Juni-2013 Tiempo Promedio de Desplazamiento	Informe_Indicador_GPR_Tiempo_Promedio_Desplazamiento.pdf	05/07/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
197	INFORME TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL PROGRAMADOS SEPTIEMBRE 2017	INFORME_TRABAJOS_DE_MANTENIMIENTO_PROGRAMADOS_SEPTIEMBRE_2017.pdf	03/09/2017
198	INFORME TRABAJOS MANTENIMIENTO ENERO-2018	informe_trabajos_enero-2018_mantenimiento.pdf	05/04/2018
199	INFORME TRABAJOS MANTENIMIENTO JULIO-2018	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_07/07/2018	07/07/2018
200	INFORME TRABAJOS MANTENIMIENTO JUNIO-2018	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_06/06/2018	06/06/2018
201	INFORME TRABAJOS MANTENIMIENTO MAYO-2018	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_RVE_IMBABURA_MAYO_2018	05/06/2018
202	INFORME VIAS ADMINISTRACION DIRECTA NOVIEMBRE/2017	INFORME_ESTADO_ADMIN_DIRECTA_IMBABURA_NOVIEMBRE_2017.docx	05/07/2017
203	Memorando Aprobación Palnilla 02 Juncal-Pimampiro	Memorando_Aprobación_planilla_2_Juncal-Pimampiro.pdf	07/09/2012
204	Notificación a Tapia Mera - Adoquinada Avdas.PARque Boulevard	Notificacion_a_Cia._Tapia_Mera.pdf	08/10/2013
205	Oficio No. 009-SC-DP-I de 15/10/2012 comunicando disponibilidad anticipo y Memorando No. MTOP-DPI-2012-1426-ME del 26/10/2012 comunicando el no inicio de trabajos en el proyecto Mantenimiento rutinario Ibarra-Urcuqui.	Oficio__entrega_anticipo_y_no_inicio_trabajos.pdf	07/11/2012
206	Oficios de comunicación de disponibilidad del anticipo y Memorando comunicando el no inicio de trabajos del proyecto Pinsaqui-Cotacachi	oficio_anticipo_disponible_y_comunic_no_inicio_trabajos.pdf	07/11/2012
207	Orden de cambio No. 1 carretera juncal Pimampiro.	Orden_de_cambio_1_Juncal_Pimampiro.pdf	08/05/2013
208	ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESA MANTENIMIENTO INTAG VIAL TRAMO SELVA ALEGRE - SAGUANGAL PERIODO MAYO - DICIEMBRE 2017	ORDEN_DE_COMPRA_MICROEMPRESA_INTAG_VIAL_20170621	20170621
209	ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESA MANTENIMIENTO VIAL E10 LITA PERIODO MAYO - DICIEMBRE 2017	ORDEN_DE_COMPRA_MICROEMPRESA_LITA_MAYO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/06/2017
210	PLANILLA AGOSTO MANTENIMIENTO VIA SALINAS - LITA MICROEMPRESA VIA LIMPIA	Planilla_Nº_5_julio_-_agosto_2017_MANTENIMIENTO_VIA_SALINAS_-_LITA.pdf	05/09/2017
211	PLANILLA MANTENIMIENTO VIA SELVA ALEGRE - SAGUANGAL MICROEMPRESA INTAG VIAL	Planilla_05_Intag_Vial_MANTENIMIENTO_VIA_SELVA_ALEGRE_SAGUANGAL.pdf	05/09/2017
212	Reporte ejecutivo Proyecto Juncal Pimampiro Octubre 2012 Planilla 4	GestionReporteFN_Juncal_octubre_2012.pdf	07/11/2012
213	REQUERIMIENTO EQUIPO CAMINERO NUEVO PARA TRABAJOS DE CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MTOP-DDI-2017-1187-ME.pdf	03/08/2017
214	RESUMEN EJECUTIVO MANTENIMIENTO VIAL DE SEP. 2014 A FEBRERO 2015	RESUMEN_EJECUTIVO_DE_SEPTIEMBRE_2014_A_FEBRERO_2015.docx	03/05/2015
215	Solicitud de ampliación de plazo del adoquinado de las avenidas del parque boulevard	SOLICITUD_DE_AMPLIACION_DE_PLAZO_ADOQUINADO_DE_AVENIDAS_PARQUE_BOULEVARD	06/09/2013
216	Solicitud de recepción provisional de trabajos de la via Ibarra-Urcuqui	img228.pdf	06/09/2013
217	Trabajos proyecto Juncal Pimampiro	Juncal_Julio_2012.jpg	09/08/2012

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Supervisor del Proyecto			
	Supervisor Financiero DPI			
	Supervisor de Talento Humano			
Hoyos Peñaherrera, Angel Alfonso	Supervisor de Equipo	Jefe de Trabajos	ahoyos@mtop.gob.ec	023974600

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Vásquez Rivera, José Elías	Administrador del Proyecto	Supervisor de Construcciones	jvasquez@mtop.gob.ec	023974600
Vásquez Rivera, José Elías	Fiscalizador del Proyecto	Supervisor de Construcciones	jvasquez@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
44809_1.jpg	10/11/2017
