

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Napo

PROYECTO: K044 MTOP - Estudio definitivo para el Puente Reventador

Líder del Proyecto:	Adrian Imbaquingo, Marco Antonio (madrian@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Programas Relacionados:	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE REVENTADOR
Titular:	Zambrano Vacacela, José Gabriel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.860.7126	TIR:	90.40 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	17,426.17
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	60,436.50
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	31/05/2011 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	27/11/2019	Fecha de Fin Base:	30/12/2017
Modificado por:	Adrian Imbaquingo, Marco Antonio	Fecha del siguiente Hito:	05/08/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Estudios para la posterior construcción del Puente sobre el Río Reventador de 115 metros de longitud y sus accesos viales, con el fin de verificar mediante normas técnicas del MTOP para beneficio de los usuarios de la carretera Baeza - Chaco - Reventador, actualmente se encuentran realizando trabajos de construcción del Puente Reventador.

PRODUCTO/SERVICIO:

Los habitantes de la zona de influencia del proyecto serán los beneficiarios directos, con la construcción del Puente Reventador y contar con accesos asfaltados, transitables todos los meses del año. Los costos de operación y transporte se reducirán así como los tiempos de viaje que permitirá mejorar las condiciones para implementar el turismo nacional y extranjero, fomentar el desarrollo empresarial y micro empresarial.

Beneficios Cualitativos

Enlazar y mejorar las vías de la Red Vial Estatal y a su vez la comunicación con las Provincias de Napo y Sucumbios.

Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios es la Población en general de la Provincia 103.696 hab.

Restricciones

TIR, VAN

Me permito indicar que la Tasa interna de retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN) considerado en el programa de la referencia fue considerado del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO REVENTADOR DE 115 METROS DE LONGITUD".

TIEMPO: 04 meses para culminación del Estudio.

RECURSOS:

La mano de obra calificada requerida para la Ejecución del Proyecto considerando la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

Los Equipos y Materiales utilizados deben ser de excelente calidad y rendimiento con el fin de desarrollar de manera afectiva y en el plazo estimado sumando al desarrollo del País con obras emblemáticas.


ALCANCE:

Las especificaciones técnicas que regirán cada uno de los Proyectos contratados por medio del MTOP Napo serán las "Especificaciones generales para la ejecución de puentes y caminos MOP-001-F 2002", del MTOP del Ecuador.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 99.04 %
 Fecha de Inicio: 31/05/2011 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

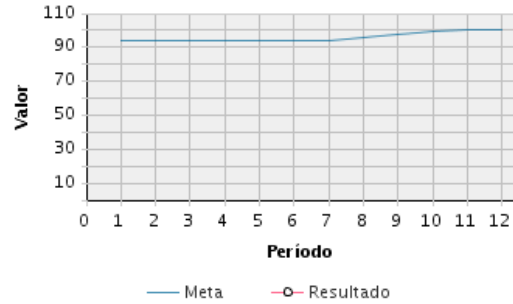

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	96 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2019: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012. Con Oficio S/N de fecha 06 de febrero de 2019 e ingresado mediante documento Nro. MTOP-RRHH_NAP-2019-18-EXT de fecha 12 de febrero de 2019 la COMPAÑÍA SISMOTEC ingresa la Planilla Única. Con Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-1911-ME de fecha 26 de julio de 2019 se remite para su respectivo trámite de pago de la Planilla única.	Adrian Imbaquingo, Marco Antonio	05/11/2019 - 04:12 PM
SEPTIEMBRE 2019: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012. Con Oficio S/N de fecha 06 de febrero de 2019 e ingresado mediante documento Nro. MTOP-RRHH_NAP-2019-18-EXT de fecha 12 de febrero de 2019 la COMPAÑÍA SISMOTEC ingresa la Planilla Única. Con Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-1911-ME de fecha 26 de julio de 2019 se remite para su respectivo trámite de pago de la Planilla única.	Adrian Imbaquingo, Marco Antonio	03/10/2019 - 05:48 PM
ENERO 2019: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una Planilla de Liquidación. Actualmente la Planilla se encuentra en Matriz para su respectivo criterio Jurídico.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	01/10/2019 - 12:03 PM
DICIEMBRE 2018: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una Planilla de Liquidación. Actualmente la Planilla se encuentra en Matriz para su respectivo criterio Jurídico.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	01/10/2019 - 12:03 PM
AGOSTO 2019: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012. Con Oficio S/N de fecha 06 de febrero de 2019 e ingresado mediante documento Nro. MTOP-RRHH_NAP-2019-18-EXT de fecha 12 de febrero de 2019 la COMPAÑÍA SISMOTEC ingresa la Planilla Única. Con Memorando Nro. MTOP-DDN-2019-1911-ME de fecha 26 de julio de 2019 se remite para su respectivo trámite de pago de la Planilla única.	Adrian Imbaquingo, Marco Antonio	04/09/2019 - 06:39 PM
JULIO 2019: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012. Con Oficio S/N de fecha 06 de febrero de 2019 e ingresado mediante documento Nro. MTOP-RRHH_NAP-2019-18-EXT de fecha 12 de febrero de 2019 la COMPAÑÍA SISMOTEC ingresa la Planilla Única. Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0196-M de fecha 18 de febrero de 2019 el área legal de la Subsecretaría Zonal 2 entrega el criterio jurídico al Administrador del Contrato.	Adrian Imbaquingo, Marco Antonio	05/08/2019 - 03:32 PM
JUNIO 2019: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012. Con Oficio S/N de fecha 06 de febrero de 2019 e ingresado mediante documento Nro. MTOP-RRHH_NAP-2019-18-EXT de fecha 12 de febrero de 2019 la COMPAÑÍA SISMOTEC	Adrian Imbaquingo, Marco Antonio	04/07/2019 - 05:39 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ingresa la Planilla Única. Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0196-M de fecha 18 de febrero de 2019 el área legal de la Subsecretaría Zonal 2 entrega el criterio jurídico al Administrador del Contrato.		
MAYO 2019: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012. Con Oficio S/N de fecha 06 de febrero de 2019 e ingresado mediante documento Nro. MTOP-RRHH_NAP-2019-18-EXT de fecha 12 de febrero de 2019 la COMPAÑÍA SISMOTEC ingresa la Planilla Única. Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0196-M de fecha 18 de febrero de 2019 el área legal de la Subsecretaría Zonal 2 entrega el criterio jurídico al Administrador del Contrato.	Adrian Imbaquingo, Marco Antonio	03/06/2019 - 03:40 PM
ABRIL 2019: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012. Actualmente la Planilla de liquidación ingresada por el Contratista mediante Oficio Nro. REV-057 SISMOTEC S.A-2017 se ha enviado mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2017-0035-E a al MTOP Matriz para su respectivo criterio Jurídico. Se remite planilla alconsultor para realizar las correcciones.	Adrian Imbaquingo, Marco Antonio	02/05/2019 - 10:38 AM
MARZO 2019: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012. Actualmente la Planilla de liquidación ingresada por el Contratista mediante Oficio Nro. REV-057 SISMOTEC S.A-2017 se ha enviado mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2017-0035-E a al MTOP Matriz para su respectivo criterio Jurídico. Se remite planilla alconsultor para realizar las correcciones.	Adrian Imbaquingo, Marco Antonio	03/04/2019 - 02:18 PM
FEBRERO 2019: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una Planilla de Liquidación. Actualmente la Planilla se encuentra en Matriz para su respectivo criterio Jurídico.	Adrian Imbaquingo, Marco Antonio	01/03/2019 - 03:23 PM
NOVIEMBRE 2018: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una Planilla de Liquidación. Actualmente la Planilla se encuentra en Matriz para su respectivo criterio Jurídico.	Mora Orozco, Fabián Alberto	03/12/2018 - 10:10 AM
OCTUBRE 2018: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una Planilla de Liquidación. Actualmente la Planilla se encuentra en Matriz para su respectivo criterio Jurídico.	Mora Orozco, Fabián Alberto	05/11/2018 - 08:58 AM
SEPTIEMBRE 2018: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una Planilla de Liquidación. Actualmente la Planilla se encuentra en Matriz para su respectivo criterio Jurídico.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/10/2018 - 10:27 AM
AGOSTO 2018: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una Planilla de Liquidación. Actualmente la Planilla se encuentra en Matriz para su respectivo criterio Jurídico.	Mora Orozco, Fabián Alberto	04/09/2018 - 05:49 PM
JULIO 2018: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una Planilla de Liquidación. Actualmente la Planilla se encuentra en Matriz para su respectivo criterio Jurídico.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 05:36 PM
JUNIO 2018: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una Planilla de Liquidación. Actualmente la Planilla se encuentra en Matriz para su respectivo criterio Jurídico.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 05:36 PM
MAYO 2018: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una Planilla de Liquidación. Actualmente la Planilla se encuentra en Matriz para su respectivo criterio Jurídico.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 05:36 PM
ABRIL 2018: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una Planilla de Liquidación. Actualmente la Planilla se encuentra en Matriz para su respectivo criterio Jurídico.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 05:36 PM
MARZO 2018: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una Planilla de Liquidación. Actualmente la Planilla se encuentra en Matriz para su respectivo criterio Jurídico.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 05:35 PM
FEBRERO 2018: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una Planilla de Liquidación. Actualmente la Planilla se encuentra en Matriz para su respectivo criterio Jurídico.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 05:35 PM
ENERO 2018: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una Planilla de Liquidación. Actualmente la Planilla se encuentra en Matriz para su respectivo criterio Jurídico.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 05:32 PM
DICIEMBRE 2017: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Única y Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una planilla pendiente, actualmente el estudio se encuentra en la Dirección de Estudios del Transporte Central.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	02/01/2018 - 04:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2017: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Única y Definitiva de fecha 15 de marzo de 2012, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago de una planilla pendiente, actualmente el estudio se encuentra en la Dirección de Estudios del Transporte Central.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/12/2017 - 07:39 PM
OCTUBRE 2017: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Única y Definitiva del Estudio, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago pendiente de Planillas, actualmente el estudio se encuentra en la Dirección de Estudios del Transporte Central.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/12/2017 - 07:37 PM
SEPTIEMBRE 2017: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Única y Definitiva del Estudio, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago pendiente de Planillas, actualmente el estudio se encuentra en la Dirección de Estudios del Transporte Central.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/10/2017 - 07:46 PM
AGOSTO 2017: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Única y Definitiva del Estudio, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago pendiente de Planillas, actualmente el estudio se encuentra en la Dirección de Estudios del Transporte Central.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	05/09/2017 - 12:17 PM
JULIO 2017: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Única y Definitiva del Estudio, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago pendiente de Planillas, actualmente el estudio se encuentra en la Dirección de Estudios del Transporte Central.	Solano Pineda, Oscar Santiago	03/08/2017 - 06:45 PM
JUNIO 2017: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Única y Definitiva del Estudio, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago pendiente de Planillas, actualmente el estudio se encuentra en la Dirección de Estudios del Transporte Central.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/07/2017 - 03:51 PM
MAYO 2017: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Única y Definitiva del Estudio, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago pendiente de Planillas, actualmente el estudio se encuentra en la Dirección de Estudios del Transporte Central.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/06/2017 - 05:50 PM
ABRIL2017: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Única y Definitiva del Estudio, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago pendiente de Planillas, actualmente el estudio se encuentra en la Dirección de Estudios del Transporte Central.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/05/2017 - 11:35 PM
MARZO 2017: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Única y Definitiva del Estudio, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago pendiente de Planillas, actualmente el estudio se encuentra en la Dirección de Estudios del Transporte Central.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/04/2017 - 04:17 PM
FEBRERO 2017: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Única y Definitiva del Estudio, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago pendiente de Planillas, actualmente el estudio se encuentra en la Dirección de Estudios del Transporte Central.	Zarate Iñiguez, Luis Santiago	02/03/2017 - 09:04 AM
ENERO 2017: El Estudio cuenta con el Acta de Recepción Única y Definitiva del Estudio, se está a la espera de asignación de los recursos económicos para el pago pendiente de Planillas, actualmente el estudio se encuentra en la Dirección de Estudios del Transporte Central.	Zarate Iñiguez, Luis Santiago	21/02/2017 - 05:27 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Revisión de la documentación para realizar la liquidación económica pendiente.	04/04/2019	Marco Antonio Adrian Imbaquingo	50	50	25	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. La falta de Recursos economicos CAUSARÍA el retraso del cierre el proyecto en General.	04/04/2019	Marco Antonio Adrian Imbaquingo	50 %	50	25	1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
No hay información disponible	

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Contrato del Estudio definitivo Puente Reventador firmado.	3-Adjudicación	30/05/2011		30/05/2011		Sí	0.0
2	PLANEACIÓN: Anticipo del Estudio definitivo Puente Reventador.	3-Adjudicación	06/06/2011		07/06/2011		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Estudio de Evaluación y Mitigación de Impactos ambientales realizados.	5-Entregables Intermedios	12/06/2011		13/06/2011		Sí	10.0
4	EJECUCIÓN: Estudio de Factibilidad. Realizado.	4-Inicio de Trabajo	15/06/2011		17/06/2011		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Estudio Pre-Preliminar. Realizado.	5-Entregables Intermedios	19/06/2011		20/06/2011		Sí	10.0
6	EJECUCIÓN: Estudio Preliminar. Realizado.	5-Entregables Intermedios	24/06/2011		24/06/2011		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Estudio de Ingeniería Definitivos Realizado.	5-Entregables Intermedios	01/08/2011		05/08/2011		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Obras Complementarias. Realizado.	5-Entregables Intermedios	10/08/2011		12/08/2011		Sí	10.0
9	EJECUCIÓN: Presentación del Informe Final. Realizado.	9-Entregables Formales	15/08/2011		18/08/2011		Sí	10.0
10	EJECUCIÓN: Aprobación del Informe Final. Realizado.	9-Entregables Formales	28/08/2011		28/08/2011		Sí	10.0
11	EJECUCIÓN: Reproducciones. Realizado.	5-Entregables Intermedios	06/09/2011		10/09/2011		Sí	7.0
12	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/03/2012		15/03/2012		Sí	1.0
13	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	15/03/2012		15/03/2012		Sí	1.0
14	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	5-Entregables Intermedios	05/08/2019	05/08/2019			No	2.0
15	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	16/09/2019	16/09/2019			No	1.0
16	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	30/09/2019	30/09/2019			No	1.0
17	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	07/10/2019	07/10/2019			No	1.5
18	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	04/11/2019	04/11/2019			No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	60,436.50 **
Costo Total:	110,775.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	130,777.00	81,082.00	0.00	211,859.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	60,436.50	0.00	60,436.50
Ppto. Codificado	0.00	60,436.50	0.00	60,436.50
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		20,645.50		
Programado a Devengar	0.00	60,436.50	0.00	60,436.50
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	60,436.50	0.00	60,436.50
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	60,436.50	0.00	60,436.50	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	60,436.50	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	60,436.50	0.00	0.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	60,436.50	0.00	0.00 %		0.00 %
Nov	0.00		60,436.50				
Dic	0.00		60,436.50				
Total	60,436.50	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de Recepción Unica y Definitiva del Estudio definitivo del Puente Reventador	A5.pdf	21/02/2017
2	C1.CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2019 NAPO	C1.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
3	C10.CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2019 NAPO	C10.CEDULA_PRESUPUESTARIA_OCTUBRE_2019_NAPO.pdf	05/11/2019
4	C2.CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2019 NAPO	C2.CEDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
5	C3.CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2019 NAPO	C3.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MARZO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
6	C4.CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2019 NAPO	C4.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
7	C5.CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2019 NAPO	C5.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
8	C6.CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2019 NAPO	C6.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JUNIO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
9	C7.CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2019 NAPO	C7.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JULIO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
10	C8.CEDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019 NAPO	C8.CEDULA_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
11	C9.CEDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2019 NAPO	C9.CEDULA_PRESUPUESTARIA_SEPTIEMBRE_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
12	Contrato del Estudio definitivo del Puente Reventador	A2.pdf	21/02/2017
13	COSTO TOTAL K044	COSTO_TOTAL_K044.pdf	27/11/2019
14	Designación de funciones del Estudio definitivo del Puente Reventador	A3.pdf	21/02/2017
15	Dictamen de Prioridad del Estudio definitivo del Puente Reventador	A1.pdf	21/02/2017
16	DISPOSICIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-DDN-2019-1911-ME	MTOP-DDN-2019-1911-ME.pdf	04/09/2019
17	Informe Ejecutivo Sitop-Abril 2017	A8.pdf	05/06/2017
18	Informe Ejecutivo Sitop-Febrero 2017	A6.pdf	02/03/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	Informe Ejecutivo Sitop-Marzo 2017	A7.pdf	06/04/2017
20	Informe Ejecutivo Sitop-Mayo 2017	A9.pdf	05/06/2017
21	Planilla Unica e Informes	A4.pdf	21/02/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Adrian Imbaquingo, Marco Antonio	Supervisor	Especialista Técnico de Infraestructura Zonal 2	madrian@mtop.gob.ec	23974798
Calero Cordonez, Olga Margarita	Directora Distrital de Transporte y Obras Públicas del Napo	Directora Distrital de Transporte y Obras Públicas Del Napo	ocalero@mtop.gob.ec	0979242916
Granda Sarango, Rosa Consuelo	Financiera (Encargada)	Analista Administrativo Financiero Distrital (Encargada)	rgranda@mtop.gob.ec	0998627926
Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Subsecretario Zonal 2	Subsecretario Zonal 2	rramirez@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
119371_1.jpg	06/06/2018
