

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte**  
**Dirección de Construcciones del Transporte**

**PROYECTO: K027 MTOP - Expropiaciones e indemnizaciones varias carreteras**

Líder del Proyecto:	Lara Chavez, Fernando Fabian (flara@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Medina Galarza, César Augusto	Programas Relacionados:	EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS, Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - Imbabura, Provincia - Manabí, Provincia - Santa Elena, Provincia - Tungurahua
Titular:	Ocampo Andrade, Christian Patricio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.860.7238	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,762,946.28
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	04/01/2020	Fecha de Fin Base:	30/12/2017
Modificado por:	Lara Chavez, Fernando Fabian	Fecha del siguiente Hito:	28/06/2019


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
Pago de Indemnizaciones a las propiedades afectadas por el desarrollo de los diferentes proyectos de Infraestructura Vial
<b>Beneficios Cualitativos</b>
Consolidar el Trazado Geométrico de los Proyectos Integrar a los habitantes del sector a los beneficios de los Proyectos Generar mejor movilidad y disminución de tiempos de traslado en áreas cercanas a los proyectos
<b>Tipo de Beneficiario</b>
Provincias involucradas: Bolívar, Guayas, Imbabura, Esmeraldas, Pichincha
<b>Restricciones</b>
TIEMPO: 4 años COSTO: USD

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	<b>Congelado</b>	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------------------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2019

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

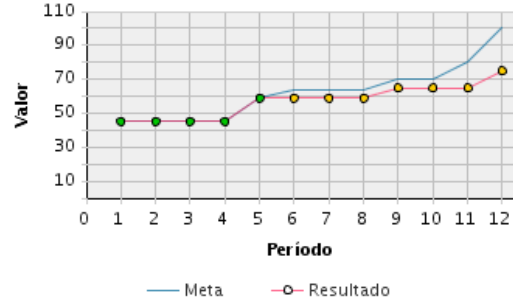

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	45 %	45 %	45 %	45 %	59 %	64 %	64 %	64 %	70 %	70 %	80 %	100 %
	Avance real acumulado											
	45 %	45 %	45 %	45 %	59 %	59 %	59 %	59 %	65 %	65 %	65 %	75 %
Estado												
	●	●	●	●	●	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2019</p> <p>1) Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ1-2019-2049-ME DEL 09 de diciembre 2019 se solicitó Aval para el pago de expropiaciones por el valor de \$ 249.759,29 correspondiente al proyecto Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Santo Domingo Esmeraldas</p>	Lara Chavez, Fernando Fabian	03/01/2020 - 03:55 PM
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>1) Con Memorando Nro. MTOP-DPP2019-1548-ME de fecha 5 de noviembre 2019 la Dirección Distrital de Pichincha indica que no ha existido ningún pago por expropiaciones correspondiente al mes de octubre 2019</p> <p>2) Según Memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-1527-ME de fecha 6 de noviembre 2019 la Subsecretaría Zonal 2 solicita aval pra el pago de expropiaciones e indemnizaciones dentro del proyecto de Rehabilitación del acceso Sur de Quito por un valor de \$ 21.936,07</p> <p>3) Mediante Memorando Nro. MTOP-DF-2019-1043-ME de fecha 7 de noviembre 2019 la Dirección Financiera designa a la Econ. Silvana Ayala como la funcionaria que proporcionará la información mensual de presupuesto ejecutado dentro del proyecto</p> <p>4) A través de Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2019-1838-ME de fecha 15 de noviembre 2019 la Subsecretaría Zonal 6 solicita aval pra el pago de expropiaciones e indemnizaciones dentro del proyecto de Mantenimiento Vial de la Provincia de Cañar ( Paso Lateral de la Troncal) por un valor de \$ 110.741,89</p> <p>5) De acuerdo al Memorando Nro. MTOP-GINCE -2019-1250-ME de fecha 26 de noviembre 2019 se solicita al Subsecretario de Infraestructra realizar el trámite para la inclusión de la nueva subactividad dentro del proyecto de Expropiaciones e Indemnizaciones varias carreteras.</p> <p>6)De acuerdo al Memorando Nro. MTOP-SUBZ1 -2019-1975-ME de fecha 28 de noviembre 2019 la Subsecretaría de Imbabura solicita aval para trámite de expropiaciones "APERTURA Y RECTIFICACIÓN DE LA CARRETERA SAGUANGAL-LAS GOLONDRINAS DE 64,2 KM (PLURIANUAL).</p> <p>7)De acuerdo al Memorando Nro. MTOP-SUBZ7 -2019-1710-ME de fecha 29 de noviembre 2019 la Subsecretaria del Oro solicita aval para la cancelación de expedientes de indemnización en la rectificación y mejoramiento de la carretera BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA-ZARUMA</p>	Lara Chavez, Fernando Fabian	02/12/2019 - 10:06 AM
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>1 . En referencia al memorandum número MTOP- GINCE- 2019-768 de fecha 30 de Octubre 2019 se solicita al director financiero encargado el registro de los valores mensuales debengados en el proyecto y la inclusión de una persona del área financiera para formara parte del equipo del proyecto, quien será encargada de proporcionar la información respecto al presupuesto</p> <p>2. Con memorandum número MTOP- FINAN_ IMB-2019-142-ME de fecha 24 de octubre 2019 el supervisor financiero informa que la direccioón distrital de Imbavura no a cancelado valor alguno por concepto de expropiaciones durante el mes de Octubre de 2019</p>	Lara Chavez, Fernando Fabian	27/11/2019 - 10:31 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>SEPTIEMBRE 2019</b></p> <p>1. Con Memorando Nro. MTOP-GINCE-2019-503-ME, de fecha 30 de agosto de 2019, se solicitó a los Directores Distritales de: Guayas, Bolívar, Esmeraldas, Pichincha e Imbabura información correspondiente al presupuesto, aspectos técnicos, legales y de tipo económico así como los nombres de los funcionarios que serán los encargados de enviar la información mensualmente para su consolidación en planta central.</p> <p>2. Con Memorando Nro. MTOP-GINCE-2019-505-ME, de fecha 30 de agosto de 2019, se solicitó un informe a la Dirección de Construcciones sobre el estado del manejo de la herramienta GPR que estuvo a cargo de dicha Dirección en años anteriores, con la finalidad de cumplir las observaciones remitidas en el Memorando Nro. MTOP-DISE-19-0108-ME, de fecha 17 de junio de 2019.</p> <p>3. Con Memorando Nro. MTOP-GINCE-2019-504-ME, de fecha 30 de agosto de 2019, se solicita a la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica el Dictamen de Prioridad y Formato Semplades del proyecto o a la vez en caso de no existir dichos documentos se remita las directrices para solucionar las observaciones que tiene el proyecto en la herramienta GPS.</p>	<p>Lara Chavez, Fernando Fabian</p>	<p>03/10/2019 - 10:41 AM</p>
<p><b>AGOSTO 2019</b></p> <p>Aval Pago Expropiaciones-Indemnizaciones Ruta del Spondylus. La Gestión Interna Nacional de Caminos y Expropiaciones, en base a los lineamientos emitidos efectúa la revisión en el formato respectivo para el trámite de Solicitud de Aval para el pago de 13 expropiaciones del proyecto de ensanchamiento ruta del Spondylus; el cual ha sido solicitado con el siguiente documento: Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2019-1110-ME.</p>	<p>Lara Chavez, Fernando Fabian</p>	<p>05/09/2019 - 03:42 PM</p>
<p><b>JULIO 2019</b></p> <p>Proyecto de Inversión: K027 MTOP-Expropiaciones e indemnizaciones varias carreteras, cúmpleme manifiestar:</p> <p>La Dirección Distrital de Transporte y Obras Públicas de Pichincha con memorando No. MTOP-DDP-2019-1059-ME de fecha 02 de agosto de 2019, manifiesta que no se ha efectuado pago alguno, por concepto de expropiación del proyecto Acceso Sur, durante el mes de julio de 2019. La Gestión Interna Nacional de Caminos y Expropiaciones, con memorando No. MTOP-GINCE-2019-340-ME de fecha 19 de julio de 2019, solicita a la Subsecretaría Zonales, que en base a las directrices de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, se remita el presupuesto que se requerirá para los procesos de expropiación para el PAI 2020; por lo cual las Subsecretarías remiten lo siguiente:</p> <p>.Subsecretaría Zonal 7, con memorando No. MTOP-SUBZ7-2019-1068-ME de fecha 23 de julio de 2019, informa indicando que en las direcciones distritales de ésta zonal, no existe trámites pendientes de pago por expropiaciones.</p> <p>.Subsecretaría Zonal 1, con memorando No. MTOP-SUBZ-2019-1183-ME de 23 de julio de 2019, postula el proyecto de Ampliación a seis carriles de la autovía Otavalo-Ibarra, para el año 2020. Adicionalmente con memorando No. MTOP-SUBZ1-2019-1177-ME de 22 de julio de 2019, postula para el proyecto de Expropiaciones e Indemnizaciones varias carreteras CUP 175200000.860.7238 correspondiente a la provincia de Esmeraldas.</p> <p>.Subsecretaría Zonal 5, con memorando No. MTOP-SUBZ-2019-1051-ME de fecha 24 de julio de 2019, manifiesta que las Direcciones Distritales de: Bolívar, Guayas y Santa Elena postulan los montos de: USD 110.137,25; USD 400.000 y USD 300.000 respectivamente.</p> <p>La Subsecretaría Zonal del Guayas con memorando No. MTOP-SUBZ5-2019-989-ME de fecha 16 de julio de 2019, solicita el aval para el proyecto: la Construcción del Polo de Desarrollo Industrial Posorja, por un monto de USD 752,844.55.</p> <p>La Subsecretaría Zonal 4 con memorando No. MTOP-SUBZ4-2019-0991-ME de fecha 04 de julio de 2019, solicita el aval perteneciente al proceso de expropiación de los esposos Basabe Bustos Luis Eduardo y Gloria Magdalena Moreno, del proyecto "Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento del Acceso a la ciudad de Manta de la provincia de Manabí", por un valor \$ 24.000,00; igualmente con memorando No. MTOP-SUBZ4-2019-0940-ME de 01 de julio de 2019, solicita el Aval para la expropiación de la construcción de la carretera Paso Lateral de Chone; adicionalmente con memorando No. MTOP-SUBZ4-2019-0936-ME de 01 de julio de 2019, solicita el Aval para proyecto de expropiación del Paso Lateral de El Carmen.</p> <p>La Subsecretaría Zonal 1 con memorando No. MTOP-SUBZ1-2019-1050-ME de fecha 05 de julio de 2019, solicita el aval para el proceso Expropiaciones Varias Carreteras por un monto de USD 8.389,69.</p>	<p>Lara Chavez, Fernando Fabian</p>	<p>05/08/2019 - 12:27 PM</p>
<p><b>JUNIO 2019</b></p>	<p>Lara Chavez, Fernando Fabian</p>	<p>05/07/2019 - 10:00 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización																																																
<p>Proyecto de Inversión: K027 MTOP-Expropiaciones e indemnizaciones varias carreteras, cúmpleme manifestar:</p> <p>La Subsecretaría Distrital 5 con memorando No. MTOP-SUBZ5-2019-714-ME de fecha 04 de junio de 2019, solicita el Aval para pagos de expropiaciones del proyecto construcción del Paso Lateral de Guaranda de 13.29 Km de longitud, ubicado en la provincia de Bolívar, para el pago por concepto de 4 indemnizaciones por un monto de USD 5.941.822,25.</p> <p>La Subsecretaría Distrital 1, con memorando No. MTOP-SUBZ1-2019-0870-ME de fecha 07 de junio de 2019, solicita el aval para pago de expropiaciones para el proyecto construcción del Puerto Providencia, por el valor de USD 18.871,53.</p> <p>Con memorando No. MTOP-SUBZ7-2019-0810-ME de fecha 11 de junio la Subsecretaría Distrital 7, solicita aval para expropiaciones del proyecto: programa de liquidación y ejecución de obras por concluir (fase1) de la Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo Guayas (Excorpecuador).</p> <p>La Dirección Distrital de Pichincha con memorando No. MTOP-DPP-2019-879-ME de fecha 02 de julio de 2019, informa que durante el mes de junio de 2019 no se ha efectuado pago alguno por concepto de expropiaciones por el valor programado en el PAI-2019</p>																																																		
<p>Mediante Acuerdo Ministerial N° 018 de 27 de marzo de 2015; en donde, se establece el procedimiento, requisitos y documentación, para la calificación a los aspirantes a ser acreditados como peritos de expropiación del MTOP, y reformado mediante Acuerdo Ministerial N° 007, de 02 de marzo de 2017; la misma que ha sido socializada oportunamente a través de la página WEB del MTOP, donde constan las solicitudes para la Calificación y Acreditación de Peritos de Expropiación del MTOP, en los procesos Indemnizatorios para la ejecución de obras de Infraestructura Vial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de profesionales arquitectos y/o ingenieros.</p> <p>Por lo que en el primer semestre del año 2019, se han acreditado y/o renovado, conforme al siguiente cuadro.</p> <table border="0" data-bbox="121 966 1068 1585"> <thead> <tr> <th data-bbox="121 966 779 997">NOMBRES</th> <th data-bbox="779 966 1068 997">No. ACREDITACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="121 997 779 1018">ACREDITACIÓNRENOVACIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1018 779 1039">MARCOS ANTONIO PAREDES SALTOS</td> <td data-bbox="779 1018 1068 1039">096-SIT-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1039 779 1060">GINCE-2019</td> <td data-bbox="779 1039 1068 1060">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1060 779 1081">DAVID ESTEBAN ALOMOTO QUISHPE</td> <td data-bbox="779 1060 1068 1081">098-SIT-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1081 779 1102">GINCE-2019</td> <td data-bbox="779 1081 1068 1102">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1102 779 1123">VILLAMARIN AGUIRRE EDUARDO SALOMON</td> <td data-bbox="779 1102 1068 1123">097-SIT-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1123 779 1144">GINCE-2019</td> <td data-bbox="779 1123 1068 1144">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1144 779 1165">GINA FERNANDA BURGOS VÉLEZ</td> <td data-bbox="779 1144 1068 1165">099-SIT-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1165 779 1186">GINCE-2019</td> <td data-bbox="779 1165 1068 1186">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1186 779 1207">FERNANDO ABRAHAN PALMA CHIQUITO</td> <td data-bbox="779 1186 1068 1207">100-SIT-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1207 779 1228">GINCE-2019</td> <td data-bbox="779 1207 1068 1228">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1228 779 1249">FERNANDO MARCOS LOAYZA CABRERA</td> <td data-bbox="779 1228 1068 1249">101-SIT-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1249 779 1270">GINCE-2019</td> <td data-bbox="779 1249 1068 1270">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1270 779 1291">SILVIA LORENA VILLACRESES MEDINA</td> <td data-bbox="779 1270 1068 1291">001-SIT-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1291 779 1312">UNC-2015</td> <td data-bbox="779 1291 1068 1312">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1312 779 1333">FABRICIO RAFAEL CEVALLOS VELEZ</td> <td data-bbox="779 1312 1068 1333">004-SIT-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1333 779 1354">UNC-2015</td> <td data-bbox="779 1333 1068 1354">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1354 779 1375">MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH</td> <td data-bbox="779 1354 1068 1375">031-SIT-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1375 779 1396">UNC-2017</td> <td data-bbox="779 1375 1068 1396">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1396 779 1417">PILAR ROCIO VILLACIS PROAÑO</td> <td data-bbox="779 1396 1068 1417">003-SIT-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1417 779 1438">UNC-2015</td> <td data-bbox="779 1417 1068 1438">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1438 779 1459">WILMER RAFAEL VILLARROEL OCAÑA</td> <td data-bbox="779 1438 1068 1459">102-SIT-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="121 1459 779 1480">GINCE-2019</td> <td data-bbox="779 1459 1068 1480">X</td> </tr> </tbody> </table> <p>Esta acreditación tiene una vigencia de dos años, pudiendo ser renovados si los profesionales, solicitan.</p> <p>Es necesario manifestar, que previo a la Acreditación, se efectúa la Capacitación a los profesionales, derogada la Ley de Caminos y su Reglamento; se procede con la nueva Normativa: Ley de Infraestructura del Sistema Nacional de Infraestructura del Transporte Vial, su Reglamento; Reforma a la Ley de Eficiencia de la Contratación Pública; y; Acuerdo de Metodología y Procedimiento de cálculo de la Plusvalía que genere la obra pública por Declaratoria de Utilidad Pública, para lo cual se les entrega el respectivo certificado de Capacitación.</p>	NOMBRES	No. ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓNRENOVACIÓN		MARCOS ANTONIO PAREDES SALTOS	096-SIT-	GINCE-2019	X	DAVID ESTEBAN ALOMOTO QUISHPE	098-SIT-	GINCE-2019	X	VILLAMARIN AGUIRRE EDUARDO SALOMON	097-SIT-	GINCE-2019	X	GINA FERNANDA BURGOS VÉLEZ	099-SIT-	GINCE-2019	X	FERNANDO ABRAHAN PALMA CHIQUITO	100-SIT-	GINCE-2019	X	FERNANDO MARCOS LOAYZA CABRERA	101-SIT-	GINCE-2019	X	SILVIA LORENA VILLACRESES MEDINA	001-SIT-	UNC-2015	X	FABRICIO RAFAEL CEVALLOS VELEZ	004-SIT-	UNC-2015	X	MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH	031-SIT-	UNC-2017	X	PILAR ROCIO VILLACIS PROAÑO	003-SIT-	UNC-2015	X	WILMER RAFAEL VILLARROEL OCAÑA	102-SIT-	GINCE-2019	X	<p>Lara Chavez, Fernando Fabian</p>	<p>28/06/2019 - 10:51 AM</p>
NOMBRES	No. ACREDITACIÓN																																																	
ACREDITACIÓNRENOVACIÓN																																																		
MARCOS ANTONIO PAREDES SALTOS	096-SIT-																																																	
GINCE-2019	X																																																	
DAVID ESTEBAN ALOMOTO QUISHPE	098-SIT-																																																	
GINCE-2019	X																																																	
VILLAMARIN AGUIRRE EDUARDO SALOMON	097-SIT-																																																	
GINCE-2019	X																																																	
GINA FERNANDA BURGOS VÉLEZ	099-SIT-																																																	
GINCE-2019	X																																																	
FERNANDO ABRAHAN PALMA CHIQUITO	100-SIT-																																																	
GINCE-2019	X																																																	
FERNANDO MARCOS LOAYZA CABRERA	101-SIT-																																																	
GINCE-2019	X																																																	
SILVIA LORENA VILLACRESES MEDINA	001-SIT-																																																	
UNC-2015	X																																																	
FABRICIO RAFAEL CEVALLOS VELEZ	004-SIT-																																																	
UNC-2015	X																																																	
MANZANO ZUMBA RUTH ELIZABETH	031-SIT-																																																	
UNC-2017	X																																																	
PILAR ROCIO VILLACIS PROAÑO	003-SIT-																																																	
UNC-2015	X																																																	
WILMER RAFAEL VILLARROEL OCAÑA	102-SIT-																																																	
GINCE-2019	X																																																	
<p>NACIONAL. Económico. Falta de ejecución de recursos por parte de las Direcciones Distritales conforme lo programado CAUSARÍA el retraso en los procesos indemnizatorios en el tiempo establecido.</p>	<p>Lara Chavez, Fernando Fabian</p>	<p>28/06/2019 - 10:24 AM</p>																																																

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>La Gestión Interna Nacional de Caminos y Expropiaciones a partir de enero de 2019, tiene a su cargo el Proyecto: K027 MTOP - Expropiaciones e Indemnizaciones varias carreteras (ESIGEF2015) GPR; donde existen monto que en su oportunidad fueron ingresado en el POA del 2019, para varios proyectos donde se ejecutará procesos de expropiación; por lo que con memorando No. MTOP-GINCE-2019-269-ME de fecha 24 de junio de 2019, se solicitó a las Direcciones Distritales, donde se ubican los proyectos, requiriendo se remita las razones por las cuales no se devengado los montos comprometidos; e, igualmente se indique las nuevas fechas programadas en las que se devengarán los montos programados.</p> <p>.Con memorando No. MTOP-DDI-2019-949-ME de fecha 25 de junio de 2019, la Dirección Distrital de Imbabura, indica que se está preparando la documentación de soporte para la solicitud de aval; una vez que se cuente con la autorización, se realizará el desembolso, para el proyecto Ampliación a seis carriles de la autovía Otavalo-Ibarra.</p> <p>.Memorando No. MTOP-DDE-2019-591-ME de fecha 27 de junio de 2019, la Dirección Distrital de Esmeraldas, manifiesta que: para el año 2019 se aprobó en el POA para el Proyecto EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS, CUP NRO. 175200000.860.7238, un presupuesto de \$ 367.124,16 en vista de que este presupuesto no cubría la deuda total en el proyecto, mediante reforma tipo AMP. Nro. 28, el 26 de febrero del 2019 el Ministerio de Finanzas aprobó la asignación de \$ 564,824.76 para pago de expropiaciones pendientes; adicionalmente indica que hasta el 31 de marzo del 2019, se efectuaron pago por concepto de expropiación</p> <p>.Memorando No. MTOP-DDB-2019-1043-ME de fecha 25 de junio de 2019, el Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolívar, solicita a la Analista de Contabilidad, Analista Administrativo Financiero, certifique si dentro del Item Expropiaciones e Indemnizaciones de Varias Carreteras, han asignado recursos económicos para los procesos de indemnizaciones esta para el proyecto: Construcción de la Carretera Chimbo-El Cristal y Rectificación y Mejoramiento de la Vía Chimbo-El Cristal</p>		
<p>MAYO 2019</p> <p>En atención a la de ejecución del presupuesto designado para las obras, que se encuentran establecidas dentro del Proyecto de Inversión: K027 MTOP-Expropiaciones e indemnizaciones varias carreteras, cúpleme manifestar:</p> <p>La Subsecretaría Distrital 1 con memorando No. MTOP-SUBZ1-2019-0811-ME de fecha 30 de mayo de 2019, solicita el Aval para pagos de expropiaciones de la construcción de obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Quinindé-Las Golondrinas de 33.8Km. de longitud, incluye paso lateral Las Golondrina de longitud 5 Km., presupuestado para el II cuatrimestre el valor de USD 197.670,42</p> <p>La Dirección Distrital de Pichincha con memorando No. MTOP-DPP-2019-722-ME de fecha 03 de junio de 2019, informa que durante el mes de mayo de 2019 no se ha efectuado pago alguno por concepto de expropiaciones por el valor programado en el PAI-2019</p> <p>Descripción de hitos</p> <p>Los hitos ingresados serán cumplidos de acuerdo con las fechas manifestadas en la herramienta de Gobiernos por Resultados. Cabe señalar que se ha cumplido con el ingreso de información para los hitos de fechas 15 y 31 de mayo de 2019.</p>	<p>Lara Chavez, Fernando Fabian</p>	<p>05/06/2019 - 02:45 PM</p>
<p>CUMPLIMIETO DE HITO ACREDITACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE PERITOS</p> <p>Mediante Acuerdo Ministerial N° 018 de 27 de marzo de 2015; en donde, se establece el procedimiento, requisitos y documentación, para la calificación a los aspirantes a ser acreditados como peritos de expropiación del MTOP, y reformado mediante Acuerdo Ministerial N° 007, de 02 de marzo de 2017; la misma que ha sido socializada oportunamente a través de la página WEB del MTOP, donde constan las solicitudes para la Calificación y Acreditación de Peritos de Expropiación del MTOP, en los procesos Indemnizatorios para la ejecución de obras de Infraestructura Vial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de profesionales arquitectos y/o ingenieros.</p> <p>Por lo que en el período comprendido de enero-mayo de 2019, se han acreditado y/o renovado 10 peritos.</p> <p>Esta acreditación tiene una vigencia de dos años, pudiendo ser renovados si los profesionales, solicitan.</p>	<p>Lara Chavez, Fernando Fabian</p>	<p>31/05/2019 - 03:06 PM</p>
<p>ABRIL 2019</p> <p>En atención a la de ejecución del presupuesto designado para las obras, que se encuentran establecidas dentro del Proyecto de Inversión: K027 MTOP-Expropiaciones e indemnizaciones varias carreteras, cúpleme manifestar:</p>	<p>Lara Chavez, Fernando Fabian</p>	<p>02/05/2019 - 12:16 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Actividades para cumplimiento de hitos</p> <p>La Dirección Distrital de Manabí con memorando No. MTOP-SUBZ4-2019-0502-ME de fecha 11 de abril de 2019, solicitó el Aval para pagos de expropiaciones para el proyecto de Ampliación, Rectificación y Mejoramiento de la carretera San Antonio-La Margarita-San Vicente; lo cual se encuentra en proceso para el pago respectivo a los afectados por esta obra de infraestructura vial, por el monto programado de USD 15.887,62.</p> <p>La Dirección Distrital de Esmeraldas, realizó el proceso respectivo para el pago a los afectados lo cual informa con memorando No. MTOP-FINAN_ESM-2019-80-ME de fecha 02 de abril de 2019, se espera que el Ministerio de Finanzas realice el trámite de acreditación para el pago a los afectados.</p> <p>La Dirección Distrital de Pichincha con memorando No. MTOP-DPP-2019-586-ME de fecha 02 de mayo informa que durante el mes de abril no se ha efectuado pago alguno por concepto de expropiaciones por el valor programado en el PAI-2019</p> <p>Descripción de hitos</p> <p>Los hitos ingresados serán cumplidos de acuerdo con las fechas manifestadas en la herramienta de Gobiernos por Resultados</p>		
<p>MARZO 2019</p> <p>Referente a la información de ejecución del presupuesto designado para las obras, que se encuentran establecidas dentro del Proyecto de Inversión: K027 MTOP-Expropiaciones e indemnizaciones varias carreteras, cúpleme manifestar:</p> <p>Conforme consta en el Presupuesto y Perfil económico se encuentra programado para el mes de abril de 2019; esta Gestión realiza las acciones necesarias para el cumplimiento de los valores presupuestados.</p> <p>Actividades para cumplimiento de hitos</p> <p>La Dirección Distrital de Esmeraldas con memorando No. MTOP-SUBZ1-2019-311-ME de fecha 28 de febrero de 2019, solicitó el Aval para pagos de expropiaciones; lo cual conforme a documento memorando No.MTOP-FINAN_ESM-2019-80-ME de fecha 2 de abril del 2019, se informa que con fechas 15 y 21 de marzo de 2019, se efectuó la solicitud para el pago a los afectados por concepto de expropiación, sumando un valor de USD 564.824,76.</p> <p>Igualmente la Dirección Distrital de Santa Elena, con memorando No. MTOP-SUBZ5-2019-319-ME de fecha 11 de marzo de 2019, efectúa las acciones necesarias para la consecución del aval, para proceder con los pagos a los afectados.</p> <p>La Dirección Distrital de Manabí con memorando No. MTOP-SUBZ4-2019-0371-ME de fecha 20 de marzo de 2019, se solicitó el aval para pagos por expropiación en el proyecto de Rehabilitación de la carretera Portoviejo-San Plácido-Pichincha, tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 Km.</p> <p>Descripción de hitos</p> <p>Los hitos ingresados serán cumplidos de acuerdo con las fechas manifestadas en la herramienta de Gobiernos por Resultados.</p>	<p>Lara Chavez, Fernando Fabian</p>	<p>05/04/2019 - 10:30 AM</p>
<p>FEBRERO 2019</p> <p>Respecto a la información de ejecución del presupuesto designado para las obras, que se encuentran establecidas dentro del Proyecto de Inversión: K027 MTOP-Expropiaciones e indemnizaciones varias carreteras, cúpleme manifestar:</p> <p>Conforme consta en el Presupuesto y Perfil económico se encuentra programado para el mes de abril de 2019; esta Gestión realiza las acciones necesarias para el cumplimiento de los valores presupuestados.</p> <p>Actividades para cumplimiento de hitos</p> <p>Se ha remitido correo electrónico para que los profesionales renueven sus Acreditaciones como Peritos para los procesos de expropiación.</p> <p>Se ha solicitado remitir los valores que tenga pendientes de pagos por procesos de expropiación.</p>	<p>Lara Chavez, Fernando Fabian</p>	<p>01/03/2019 - 08:33 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Descripción de hitos Los hitos ingresados serán cumplidos de acuerdo con las fechas manifestadas en la herramienta de Gobiernos por Resultados.</p>		
<p>Enero 2019 INFORME HERRAMIENTA DE GOBIERNO POR RESULTADOS a)ANTECEDENTES Con memorando No. MTOP-DCT-2019-61-ME de fecha 30 de enero de 2019, se cambió de Líder del Proyecto: K027 MTOP - Expropiaciones e Indemnizaciones varias carreteras (ESIGEF2015) GPR; designando al abogado Fernando Lara Chávez, Coordinador Gestión Interna Nacional de Caminos y Expropiaciones.</p> <p>b)ANÁLISIS Con el fin de actualizar los campos requeridos en la herramienta Gobiernos por Resultados, ésta Gestión a partir de la presente fecha estará a cargo del ingreso de la información de la ejecución del presupuesto designado para los proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Construcción de la Corrección Geométrica del Intercambiador y Aumento del Gálibo del puente Progreso, ubicado en la provincia del Guayas.</li> <li>.Construcción del Acceso al Puerto Pesquero Artesanal de Jaramijó, que es parte del proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento 24 meses, Mantenimiento por 48 meses, de la vía del Pacífico, Corredor Arterial E-15, tramo Santa Elena-Bahía de Caráquez de 255 Km.</li> <li>.Rehabilitación de la carretera Playas-Posorja, que incluye Construcción del Puente sobre el Estero Data, ubicada en la provincia del Guayas.</li> <li>.Construcción de la Carretera Colimes-Olmedo, ubicado en las provincias de Guayas y Manabí.</li> <li>.Rehabilitación y Mejoramiento (durante 24 meses) Mantenimiento (durante 48 meses) de la vía del Pacífico, Corredor Arterial E-15, tramo Santa Elena- Bahía de Caráquez de 255 Km.</li> <li>.Ampliación de la vía E20 Esmeraldas -Quinindé y la E15 tramo Esmeraldas-Río Verde.</li> <li>.Acceso Sur de Quito.</li> <li>.Ampliación a seis carriles de la Autovía Otaválo-Ibarra.</li> <li>.Construcción de la carretera Chillanes-Bucay de 55.40 Km. de longitud.</li> <li>.Rectificación y Mejoramiento de la vía Chimbo-El Cristal (Empate vía Guaranda-Babahoyo, de 40 Km. de longitud ubicados en la provincia de Bolívar.</li> </ul> <p>c)CONCLUSIONES Se ha solicita la información correspondiente a la ejecución de la Cédula Única Presupuestaria, designada para cada proyecto a las respectiva a las Direcciones Distritales; a continuación se detalla lo remitido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Con memorando No. MTOP-FINAN_ESM-2019-24-ME de fecha 04 de febrero de 2019, la Dirección Distrital de Esmeraldas; informa que del presupuesto asignado de USD 367.124,16, el Ministerio de Finanzas no ha realizado las asignaciones; motivo por el cual no se ha efectuado ningún pago hasta el 31 de enero de 2019.</li> <li>.Con memorando No. MTOP-DPP-2019-152-ME de fecha 04 de febrero de 2019, la Dirección Distrital de Pichincha, informa que en el mes de enero de 2019, no se ha realizado ningún pago; a la espera de la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas.</li> <li>.Mediante memorando No. MTOP-DDI-2019-197-ME de fecha 05 de febrero de 2019, la Dirección Distrital de Imbabura, manifiesta que el proyecto Ampliación a seis carriles de la Autovía Otavalo-Ibarra, es desarrollado y ejecutado por la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones; razón por la cual no es responsabilidad de dicha Dirección.</li> <li>.La Dirección Distrital de Guayas, mediante correo electrónico informa que no se ha devengado monto alguno por el tema de expropiaciones.</li> <li>.La Dirección Distrital de Bolívar con memorando No. MTOP-DDB-2019-147-ME de fecha 5 de febrero de 2019, informa que no se ha realizado ningún trámite de pago en los proyectos de ésta Dirección hasta el 31 de enero de 2019, las programaciones están para los meses de junio y julio 2019.</li> </ul> <p>d)RECOMENDACIONES Esta Gestión recomienda que las Direcciones Distritales, den cumplimiento a lo solicitado con los memorandos respectivos, referente a la programación anual de manera mensualizada conforme consta en el CUP 2019.</p> <p>En atención al CUP asignado para el proyecto Ampliación a seis carriles de la Autovía Otavalo-Ibarra, conforme lo manifiesta la Dirección Distrital de Imbabura, este proyecto se ejecuta con recursos de Contrato de Concesión por Inversión</p>	<p>Lara Chavez, Fernando Fabian</p>	<p>05/02/2019 - 01:13 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>OCTUBRE 2017</b> En el presente periodo, no se registra pago del rubro expropiaciones de los proyectos a cargo de las diferentes Direcciones Provinciales, con cargo al CUP registrado.</p>	Salgado Braserero, Jorge Fernando	01/11/2017 - 11:37 AM
<p><b>SEPTIEMBRE 2017</b> En el presente periodo se registran pagos correspondientes a las Provincias de Cotopaxi e Imbabura.</p>	Salgado Braserero, Jorge Fernando	05/10/2017 - 03:03 PM
<p><b>JULIO 2017</b> En el presente periodo no se registran pagos referente al rubro expropiaciones.</p>	Salgado Braserero, Jorge Fernando	04/08/2017 - 10:47 AM
<p><b>JUNIO 2017</b>  Mediante documentos: MTOP-DDI-2017-615-ME, MTOP-DDCH-2017-128-ME, MTOP-DDCH-2015-1668-ME; Se procedió a cancelar valores por concepto de rubro expropiaciones en las Provincias de Imbabura y Chimborazo respectivamente.</p>	Salgado Braserero, Jorge Fernando	07/07/2017 - 09:05 AM
<p>2014: Con los antecedentes expuestos se continúa con los procesos expropiatorios de la Carretera y Jambelí Latacunga Ambato; se hace todo el seguimiento del respectivo proceso, esto es socialización, notificaciones, planimetrías, verificación de documentación, además de la gestión por parte de la respectiva Dirección, con la firma de las siguientes Resoluciones: RESOLUCIÓN 001-2014-MTOP-JLA-P Y R303-2011-SDCT-JLA; RESOLUCIÓN R042-2011-SDCT Y RESOLUCIÓN 002-2014-MTOP-JLA-P; RESOLUCIÓN R023-2011-SDCT; RESOLUCIÓN R089-2011-SDCT; mismas que fueron canceladas a satisfacción el 27/08/2014. En la vía Otavalo-Ibarra; En julio de 2014 se presentó todos los requisitos y de esta manera se inició con la inspección del predio y demás trámites pertinentes según lo estipulado en la Ley de Caminos. Referente al tema de la aplicación de las plusvalías, ha sido aplicado el Acuerdo Ministerial Nro. 061 de 28 de julio de 2011, esto debido a que en la fecha en que los propietarios fueron notificados con la respectiva Resolución de Pago y la ficha técnica de valoración del predio, el Acuerdo Nro. 061 estaba en aplicación. Se citan los siguientes expedientes correspondientes; 001-2014-DPI, 002-2014-DPI, 003-2014-DPI, 004-2014-DPI, 005-2014-DPI, 006-2014-DPI, 007-2014-DPI. Estos expedientes no han sido cancelados y están en trámite. En Manabí del proyecto San Clemente con EXPEDIENTE 269-2013-DPM, se realiza todo el seguimiento y respectiva cancelación para el 27 de febrero del 2014. En la Provincia de Bolívar el proyecto Chillanes - Bucay se tiene procesos expropiatorios con los siguientes documentos de respaldo; 082-2013, 072-2012, 067-2012, los mismos que se encuentran cancelados en este año.</p> <p>2015: En la vía Riobamba Cebadas tenemos el proceso expropiatorio con el Número 001-2014-DPCH-RC el mismo que se encuentra cancelado su monto con la disposición de pago del 01/04/2015. En la Autovía Otavalo Ibarra el proceso expropiatorio 001-2015-OI tiene el pago pendiente. Mediante Memorando Nro. MTOP-DPI-2015-465-ME, de fecha 24 de marzo de 2015, la Srta. Ing. Gabriela Edith Espín Rosales, DIRECTORA PROVINCIAL DE IMBABURA se dirige al Sr. Ing. Mauricio Andrés Larrea Yépez, Subsecretario de Delegaciones y Concesiones del Transporte el mismo que textualmente dice: "Como es de su conocimiento el 28 de abril de 2008 se suscribió un contrato adicional de concesión para la ampliación a 6 carriles de la carretera Otavalo- Ibarra, con una longitud aproximada de 18,90 km.; al respecto y a pesar de que los estudios definitivos de ingeniería procuraron mantener el alineamiento horizontal de la carretera existente con el objeto de evitar en lo posible áreas importantes de expropiación a lo largo del proyecto; en el sector de Agualongo de Paredes se afectó parte del trazado de la línea férrea. En este contexto y al haber quedado pendiente la legalización de la expropiación de varios predios identificados por la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador según levantamiento realizado en marzo de 2010; me permito solicitar se sirva indicar el número de la partida presupuestaria con la que se reconocerían los valores que por indemnización corresponde a los propietarios de esos predios en las áreas afectadas, con el objeto de que esta Dirección Provincial concluya el proceso expropiatorio de todos los predios que resultaron afectados por la referida obra". 2017: Mediante Memorando Nro. MTOP-FINAN_IMB-2017-24-ME de 14 de febrero de 2017 el Mgs. Miguel Ángel Velasco Portilla SUPERVISOR FINANCIERO informa "" qué con fecha 09 de Enero del presente año se creó la Partida Presupuestaria para proceder con el pago de las indemnizaciones a los propietarios de los predios contiguos a la línea férrea y otros sectores, los cuales se vieron afectados por la Construcción y Ampliación de la Vía Otavalo - Ibarra y con fecha 23 del mismo mes se asignó los recursos correspondientes para dicho fin""</p>	Salgado Braserero, Jorge Fernando	05/06/2017 - 04:27 PM
<p>Antecedentes: El 28 de abril de 2008 se suscribió un contrato adicional de concesión para la ampliación a 6 carriles de la carretera Otavalo- Ibarra, con una longitud aproximada de 18,90 km. La construcción de la autovía se realizó entre los años 2010 y 2012, logrando inaugurar la obra en el mes de septiembre de 2012, el control y administración de la obra lo llevó a cabo el</p>	Salgado Braserero, Jorge Fernando	18/05/2017 - 09:39 AM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Departamento de Concesiones de Planta Central de Quito. A pesar de que los estudios definitivos de ingeniería procuraron mantener el alineamiento horizontal de la carretera existente con el objeto de evitar en lo posible áreas importantes de expropiación a lo largo del proyecto; en el sector de Agualongo de Paredes se afectó parte del trazado de la línea férrea. En el año 2016, se descentralizan las funciones, dando las atribuciones de pago a esta Dirección Distrital, durante este tiempo no existía partida presupuestaria, ni recursos, ni inclusión en el PAI; es en esta año 2016 cuando se programa la cancelación de los valores adeudados con la programación del PAI 2017, con la correspondiente partida presupuestaria y correspondientes recursos, mismos que se encuentran en trámite mediante la solicitud de los avales con su debida autorización para los pagos correspondientes.</p> <p>En el 2011 el proyecto Jambelí-Latacunga Ambato se encuentran procesos expropiatorios necesarios para la consecución de dicho proyecto</p>		

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas
2	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
3	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolivar
4	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
5	Zona 5 - Litoral > Guayas > Colimes
6	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Definición de cronograma anual, realizado	4-Inicio de Trabajo	05/01/2014		05/03/2014		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Asignación presupuestaria aprobada	9-Entregables Formales	01/02/2014		01/02/2014		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Aprobación del proyecto, realizado	1-Solicitud de Información	06/03/2014		05/06/2014		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Declaratoria de utilidad pública, realizado	9-Entregables Formales	06/06/2014		06/06/2014		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Peritos acreditados, realizado	9-Entregables Formales	06/09/2014		06/09/2014		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Declaratoria de utilidad pública, realizado	9-Entregables Formales	05/01/2015		05/01/2015		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Peritos acreditados	9-Entregables Formales	06/03/2015		06/03/2015		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Conservación del derecho de vía, realizado	9-Entregables Formales	06/06/2015		06/06/2015		Sí	2.0
9	EJECUCIÓN: Costos de construcción, para la valoración por parte del perito, realizado	5-Entregables Intermedios	06/09/2015		06/09/2015		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Declaratoria de utilidad pública, realizado	9-Entregables Formales	05/01/2016		05/01/2016		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN: Peritos acreditados	9-Entregables Formales	06/03/2016		06/03/2016		Sí	2.0

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	EJECUCIÓN: Conservación del derecho de vía, declaraso	9-Entregables Formales	06/06/2016		06/06/2016		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Costos de construcción, para la valoración por parte del perito, valorado	5-Entregables Intermedios	06/09/2016		06/09/2016		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Declaratoria de utilidad pública, declarado	9-Entregables Formales	05/01/2017		05/09/2017		Sí	3.0
15	EJECUCIÓN: Seguimiento y control de la gestión de pagos por parte de las Direcciones Distritales, realizado	5-Entregables Intermedios	15/05/2019		15/05/2019		Sí	9.0
16	EJECUCIÓN: Acreditación y renovación de peritos, certificados	9-Entregables Formales	31/05/2019		31/05/2019		Sí	5.0
17	EJECUCIÓN: Acreditación y renovación de peritos, certificados (I Trimestre)	9-Entregables Formales	28/06/2019	28/06/2019			No	5.0
18	EJECUCIÓN: Acreditación y renovación de peritos, certificados (III Trimestre)	9-Entregables Formales	30/09/2019		30/09/2019		Sí	6.0
19	EJECUCIÓN: Seguimiento y control de la gestión de pagos realizada por las Direcciones Distritales	5-Entregables Intermedios	29/11/2019	29/11/2019			No	10.0
20	EJECUCIÓN: Acreditación y renovación de peritos, certificados (IV Trimestre)	9-Entregables Formales	30/12/2019		30/12/2019		Sí	10.0
21	CIERRE: Informe de pagos pendientes, realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2019	31/12/2019			No	10.0

### SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CHILANES	Coronel Monar, Anibal Alejandro	{PR} - Provincia - BOLIVAR	27/09/2017

### INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cumplimiento de proyecto		108.14 %	0.86	0.93	01/01/2019	Jul-Dic


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,762,946.28 **
Costo Total:	6,760,135.56
Total Devengado:	4,354,114.05
% Costo Total Devengado:	64.41 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 64.41 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	4,322,321.00	4,285,255.35	0.00	8,607,576.35
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	600,000.00	3,146,441.51	0.00	3,746,441.51
Ppto. Codificado	3,686,002.11	2,966,584.41	0.00	6,652,586.52
Ppto. Comprometido	3,425,022.45	564,824.76	0.00	3,989,847.21
Planeado - Codificado (2019)		1,318,670.94		
Programado a Devengar	2,253,216.34	1,339,452.63	0.00	3,592,668.97
Ppto. Devengado	3,423,493.65	930,620.40	0.00	4,354,114.05
Pagado Real	3,379,886.87	0.00	0.00	3,379,886.87
Estimado a fin de año	* 3,423,493.65	0.00	0.00	3,423,493.65
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-1,170,277.31	1,339,452.63	0.00	169,175.32
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 151.94 %	69.48 %	0.00 %	121.19 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

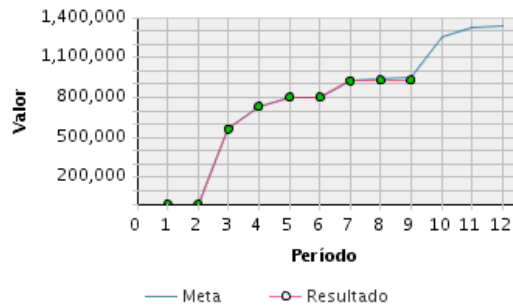

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	564,824.76	564,824.76	564,824.76	564,824.76	100.00 %		42.17 %
Abr	169,213.02	169,213.02	734,037.78	734,037.78	100.00 %		54.80 %
May	70,827.16	70,827.16	804,864.94	804,864.94	100.00 %		60.09 %
Jun	0.00	0.00	804,864.94	804,864.94	100.00 %		60.09 %
Jul	119,915.38	119,915.38	924,780.32	924,780.32	100.00 %		69.04 %
Ago	12,377.74	5,840.08	937,158.06	930,620.40	99.30 %		69.48 %
Sep	12,377.74	0.00	949,535.80	930,620.40	98.01 %		69.48 %
Oct	307,788.94		1,257,324.74				
Nov	69,750.14		1,327,074.88				
Dic	12,377.75		1,339,452.63				
<b>Total</b>	<b>1,339,452.63</b>	<b>930,620.40</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
10	Incrementar el seguimiento, control y evaluación de los proyectos de construcción y fiscalización de la infraestructura del transporte MEDIANTE la supervisión de la aplicación de normas técnicas, administrativas y lineamientos para la gestión de construcciones en los procesos desconcentrados.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	C5. Aval pago expropiaciones e indemnizaciones ruta Spondylus	Agosto-2019- _Aval_pago_Expropiac._Indemniz._Ruta_Espondylus.pdf	04/09/2019
2	A1. Registro_pago_expropiaciones_09_2017	EXPROPIACIONES_09-2017.rar	05/10/2017
3	A2. apacitaciones por parte de DCT	Capacitaciones_dirigidas.pdf	17/05/2017
4	A3. Disposiciones de Pago Chimborazo1	image2017-05-15-214207.pdf	17/05/2017
5	A4. Consolidado de procesos expropiatorios desde 2014 al 2017	Consolidado_Matriz_Expropiaciones_DCT.xlsx	14/06/2017
6	A5. Disposiciones de Pago Chimborazo2	image2017-05-15-214313.pdf	17/05/2017
7	A6. Disposiciones de Pago Chimborazo3	image2017-05-15-214553-1.pdf	17/05/2017
8	A7. Disposiciones de Pago Chimborazo4	image2017-05-15-214626.pdf	17/05/2017
9	A8. Informe Técnico Expropiaciones Imbabura	INFORME_TÉCNICO.pdf	17/05/2017
10	A9. FEBRERO 2019	JUSTIFICATIVOS_FEBRERO_2019.pdf	01/03/2019
11	B1. Justificativos	JUSTIFICATIVOS_ABRIL_2019.pdf	02/05/2019
12	B2. Justificativos enero 2019	JUSTIFICATIVOS_ENERO_2019.pdf	05/02/2019
13	B3. Memorandos	JUSTIFICATIVOS_MARZO_2019.pdf	05/04/2019
14	B4. Justificativos mayo 2019	MTOP-DPP-2019-722-ME.pdf	05/06/2019
15	B5. Justificativos mayo 2019	MTOP-SUBZ1-2019-0811-ME-2.pdf	05/06/2019
16	B6. Justificativos junio 2019	JUSTIFICATIVOS_JUNIO_2019.pdf	05/07/2019
17	B7. JUSTIFICATIVOS JULIO 2019	JUSTIFICATIVOS_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
18	B8. Justificativos Hito 15-05-2019	MTOP-SUBZ5-2019-351-ME-1.pdf	15/05/2019
19	B9. Acreditación y renovación de peritos primer semestre	JUSTIFICATIVOS_HITOS_PERITOS_ACREDITACIONES_RENOVACIONES_PRIMER_SEM	28/06/2019
20	C1. RENOVACIÓN PERITOS	RENOVACIÓN_PERITOS.pdf	31/05/2019
21	C2. ACREDITACIÓN PERITOS	ACREDITACIÓN_DE_PERITOS.pdf	31/05/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
22	C3. Acción 1 Riesgo 1	JUSTIFICATIVOS_RIESGOS_28-06-2019.pdf	28/06/2019
23	C4. SOLICITUD DE AVAL PARA EXPROPIACIÓN CARRETERA QUININDÉ LAS GOLONDRINAS	MTOP-SUBZ1-2019-0811-ME-2.pdf	05/06/2019
24	C6. Solicitud de cédulas presupuestarias devengadas desde 2019, nombre de funcionarios encargados GPR	MTOP-GINCE-2019-503-ME-1GPR.pdf	04/10/2019
25	C7. Se nombra a F. Lara Ch. líder proyecto K 027 MTOP, se solicita Dictamen Prioridad y Formato Senplades	MTOP-GINCE-2019-504-ME-1GPR.pdf	04/10/2019
26	C8. Solicitud de informe de estado de manejo herramienta GPR que estuvo a cargo de Dirección de Construcciones del Transporte	MTOP-GINCE-2019-505-ME-1GPR.pdf	04/10/2019
27	C9. Acreditación y Renovación de peritos	ACREDITACIÓN_Y_RENOVACIÓN_DE_PERITOS.pdf	04/10/2019
28	D1. CEDULA PRESUPUESTARIA PICHINCHA JULIO 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_PICHINCHA_JULIO_2019.pdf	04/10/2019
29	D2. CEDULA PRESUPUESTARIA PICHINCHA JUNIO 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_PICHINCHA_JUNIO_2019.pdf	04/10/2019
30	D4. INFORME PAGO EXPROPIACIONES PROVINCIA DE BOLIVAR	INFORME_QUIPUX_DE_GPR_OCTUBRE.pdf	05/11/2019
31	D5. SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS VALORES MENSUALES DEVENGADOS EN EL PROYECTO	SOLICITUD_DE_FINANCIERO_DR._MARCELO_MALDONADO_QUIPUX.pdf	05/11/2019
32	D6. REGISTRO DE VALORES MENSUALES DEVENGADOS EN EL PROYECTO K027	MTO-DF-2019-1043-ME.pdf	02/12/2019
33	D7. INFORMACIÓN EXPROPIACIONES ACCESO SUR	MTOP-DPP-2019-1548-ME.pdf	02/12/2019
34	D8. SOLICITUD DE AVAL DE EXPROPIACIONES PICHINCHA	MTOP-SUBZ2-2019-1527-M.pdf	02/12/2019
35	D9. SOLICITUD AVAL PARA CANCELACIÓN DE TERRENOS (EXPROPIACIÓN) CAÑAR	MTOP-SUBZ6-2019-1838-ME.pdf	02/12/2019
36	Devengados Ene - Sep 2019	Devengado_Ene-Sep_2019.PDF	03/01/2020
37	E1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS OCTUBRE NOVIEMBRE PROYECTO K027	MTOP-GINCE-2019-1266-TEMP.pdf	02/12/2019
38	E2. REPROGRAMACIÓN POA 2019	MTOP-GINCE-2019-1250-TEMP.pdf	02/12/2019
39	E3. SOLICITUD DE AVAL EXPROPIACIÓN , CONSTRUCCIÓN PUENTE QUIJOS 2 EN LA VÍA PAPALLACTA BAEZA	MTOP-SUBZ2-2019-1644-M.pdf	02/12/2019
40	E4. SOLICITUD DE AVAL CARRETERA SAGUANGAL LAS GOLONDRINAS	MTOP-SUBZ1-2019-1975-ME.pdf	02/12/2019
41	E5. SOLICITUD DE AVAL PARA CANCELACIÓN DE TERRENOS (EXPROPIACIÓN) CAÑAR	MTOP-SUBZ6-2019-1926-ME.pdf	02/12/2019
42	E6. SOLICITUD DE AVAL PARA CANCELACIÓN DE EXPEDIENTES DE INDEMINIZACIÓN EN LA RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BUENA VISTA-VEGA RIVERA-PACCHAZARUMA	MTOP-SUBZ7-2019-1710-ME.pdf	02/12/2019
43	Hito 18. Peritos III Trimestre	Peritos_III_Trimestre.pdf	03/01/2020
44	Hito 20. Peritos IV Trimestre	Peritos_IV_Trimestre.pdf	03/01/2020
45	Solicitud de Congelamiento del Proyecto (Ene - 2020)	Solicitud_de_Congelamiento_K027_Expropiaciones_e_Indeminizaciones.pdf	04/01/2020

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Director de Construcciones del Transporte	Subsecretario Zonal 7	faltamirano@mtop.gob.ec	
Guaman Vargas, César Manuel	Coordinador	Supervisión de la Región 4	cguaman@mtop.gob.ec	023974600

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Lara Chavez, Fernando Fabian	Líder de Proyecto	Coordinador Gestión Interna Nacional de Caminos y Expropiaciones	flara@mtop.gob.ec	
