

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 1**

**Dirección Provincial Sucumbíos**

**PROYECTO: K007 MTOP - Mantenimiento vial de la provincia de Sucumbíos**

|                                |   |                                 |  |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto:            | Arizaga Davila, Leoncio Abelardo (aarizaga@mtop.gob.ec) |                                 |  |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Cruz Chicaiza, Rene Alejandro                           | Programas Relacionados:         | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, Provincia - Sucumbíos, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, STPE - Inversión en 40km de frontera norte |
| Titular:                       | Arizaga Davila, Leoncio Abelardo                        | Prioridad:                      | 0  |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura   | Retorno Económico:              | 0.00   |
| CUP:                           | 175200000.506.3829                                      | TIR:                            | 100.00 %   |
| Objetivos Operativos:          | 4   | VAN:                            | 1,528,677.60   |
| Viabilidad Técnica:            | Alta  | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 33,685,970.66  |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                        |                                 |  |
| Tipo de Ppto. Externo:         |   | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 15/02/2011 - 31/12/2021  |
| Fecha de última actualización: | 08/07/2020  | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2013   |
| Modificado por:                | Farfán Quimi, Palmira Natalia                           | Fecha del siguiente Hito:       | 29/12/2017   |


**DATOS GENERALES**

|   |
|---|
| <b>Descripción</b>  |
| <p><b>DESCRIPCIÓN:</b><br/>         La contratación de las Microempresas obedece a la necesidad de realizar el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal de la provincia de Sucumbios, los trabajos principales que realizan las Asociaciones de Conservación Vial son: Roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de puentes, causes y quebradas; mantenimiento de la señalización vertical, entre otros.</p> <p><b>PRODUCTO / SERVICIO:</b><br/>         El producto esperado, es el mantenimiento de la Red Vial Estatales en óptimas condiciones.</p> <p><b>LÍNEA BASE:</b><br/>         La línea base para el Mantenimiento de la Red Vial Estatal a través de microempresas, se considera siempre a partir de cero, debido a que los contratos son anuales y los trabajos se desarrollan durante los 12 meses.</p> <p><b>OBJETIVO GENERAL:</b><br/>         Mantener la Red Vial Estatal Provincial en las condiciones adecuadas para el tránsito vehicular.</p> <p><b>OBJETIVO ESPECIFICO:</b><br/>         Disminuir el riesgo de accidentes de tránsito<br/>         Incrementar el nivel de servicio en las carreteras de la Red Vial estatal de la Provincia de Sucumbíos</p> <p><b>CONTRATISTA:</b><br/>         Asociaciones de Conservación Vial</p> <p><b>MONTO CONTRACTUAL</b><br/>         992,672.34</p> |
| <b>Beneficios Cualitativos</b>  |
| <p>Incrementar el nivel de servicio de las vías;<br/>         Mejorar la seguridad vial de personas, bienes y servicios<br/>         Disminuir los tiempos de viaje entre los diferentes destinos</p>   |
| <b>Tipo de Beneficiario</b>   |
| Ciudadanía en General   |
| <b>Restricciones</b>  |
| <p><b>Tiempo:</b> La ejecución de los contratos se debe cumplir según lo establecido en los contratos. Referente a las microempresas con la catalogación en el SERCOP el tiempo de ejecución es mensual.</p> <p><b>Costo:</b> Lo establecido en la orden de compra generada en el Catálogo Electrónico.</p> <p><b>Alcance:</b> Lo estipulado en el tramo correspondiente a cada microempresa.</p>   |

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 86.99 %  
 Fecha de Inicio: 15/02/2011 Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

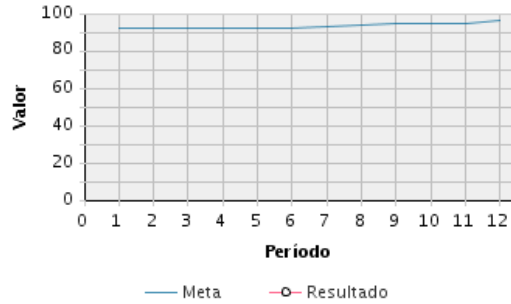

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
| 2020                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 92 %                        | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 93 % | 94 % | 95 % | 95 % | 95 % | 96 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>JUNIO 2020.</p> <p>Se trabaja en el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>Se continua realizando trabajos de rehabilitación en el tramo de la vía: Nueva Loja - Reventador y Jivino Verde - Shushufindi-Yamanunca, mediante (Oficio MTOP-DDS-20-87-OF, de fecha 04 de junio del 2020, Oficio MTOP-DDS-20-89-OF, de fecha 04 de junio del 2020 y Memorando Nro MTOP-DDS-2020-881-ME, de fecha 11 de junio del 2020, suscrito por el Ing. Abelardo Arizaga - Director Distrital) solicitud para el reinicio de trabajos con el COE Cantonal, Provincial y Nacional e informado de aprobacion.</p> <p>Se levanta la suspensión de obra y fiscalización mediante (Memorando Nro MTOP-SUBZ1-2020-0816-ME, de fecha 29 de junio del 2020, suscrito por el Ing. Marco Oyervide - Administrador del Contrato y Oficio MTOP-SUBZ1-2020-0045-OF, de fecha 29 de junio del 2020, suscrito por el Ing. Alejandro Cruz, Subsecretario Zonal 1- MTOP) .</p> | Arizaga Davila, Leoncio Abelardo | 03/07/2020 - 04:21 PM         |
| <p>MAYO 2020.</p> <p>Se trabaja en el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>Se continua realizando trabajos de rehabilitación con el personal mínimo en el tramo de la vía: Nueva Loja - Reventador.</p> <p>Continua la suspensión de obra y fiscalización mediante oficios (MTOP-SUB1-2020-010-OF, de fecha 19 de marzo del 2020 y MTOP-SUBZ1-2020-0029-OF, de fecha 23 de marzo del 2020, suscrito por el Ing. Alejandro Cruz, Subsecretario Zonal 1 - MTOP, de la rehabilitación en el tramo de la vía: Lumbaqui - La Bonita - Limite con Carchi, debido a la situación actual que se esta viviendo nuestro país por la emergencia sanitaria,</p>   | Arizaga Davila, Leoncio Abelardo | 04/06/2020 - 02:39 PM         |
| <p>Abril 2020.</p> <p>Se trabaja en el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>Se continua realizando trabajos de rehabilitación con el personal mínimo en el tramo de la vía: Nueva Loja - Reventador.</p>  | Arizaga Davila, Leoncio Abelardo | 04/05/2020 - 10:43 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Se ha realizado una suspensión de trabajos de la rehabilitación en el tramo de la vía: Lumbaqui - La Bonita - Limite con Carchi, debido a la situación actual que se esta viviendo nuestro pais por la emergencia sanitaria.  |                                  |                               |
| <p>Marzo 2020.</p> <p>Se trabaja en el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>Se continua realizando trabajos de rehabilitación con el personal mínimo en el tramo de la vía: Nueva Loja - Reventador.</p> <p>Se ha realizado una suspensión de trabajos de la rehabilitación en el tramo de la vía: Lumbaqui - La Bonita - Limite con Carchi, debido a la situación actual que se esta viviendo nuestro pais.</p>  | Arizaga Davila, Leoncio Abelardo | 01/04/2020 - 11:13 AM         |
| <p>Febrero 2020.</p> <p>Se está trabajando en el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja - El Reventador, Nueva Loja - Puerto EL Carmen, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUNCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO ITAYA.</p> <p>Se está realizando trabajos de rehabilitación mediante la declaratoria en situación de Emergencia en el tramo de la vía: Reventador- Nueva Loja y el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Lumbaqui - La Bonita - Limite con Carchi, Jivino-Shushufindi.</p>   | Arizaga Davila, Leoncio Abelardo | 05/03/2020 - 05:09 PM         |
| <p>Enero 2020.</p> <p>Se está trabajando en el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja - El Reventador, Nueva Loja - Puerto EL Carmen, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUNCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO ITAYA.</p> <p>Se está realizando trabajos de rehabilitación mediante la declaratoria en situación de Emergencia en el tramo de la vía: Reventador- Nueva Loja</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Lumbaqui - La Bonita - Limite con Carchi, Jivino-Shushufindi.</p>  | Arizaga Davila, Leoncio Abelardo | 04/02/2020 - 02:33 PM         |
| <p>Diciembre 2019.</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja - El Reventador, Nueva Loja - Puerto EL Carmen, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUNCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO ITAYA.</p> <p>Se está realizando trabajos de rehabilitación mediante la declaratoria en situación de Emergencia en el tramo de la vía: Lumbaqui - La Bonita - Limite con Carchi.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen y Nueva Loja - Puente Reventado</p>  | Arizaga Davila, Leoncio Abelardo | 03/01/2020 - 09:06 AM         |
| <p>Noviembre 2019.</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja - El Reventador, Nueva Loja - Puerto EL Carmen, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUNCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO ITAYA.</p> <p>Se está realizando trabajos de rehabilitación mediante la declaratoria en situación de Emergencia en el tramo de la vía: Lumbaqui - La Bonita - Limite con Carchi. Así mismo el mantenimiento de la capa asfáltica mediante bacheo en el tramo de la vía Jivino Vede - Shushufindi - Yamanunca.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen y Nueva Loja - Puente Reventador.</p> | Arizaga Davila, Leoncio Abelardo | 04/12/2019 - 08:23 AM         |
| <p>Octubre 2019.</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja - El Reventador, Nueva Loja - Puerto EL Carmen, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUNCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO ITAYA.</p>  | Orellana Sarmiento, Galo Oswaldo | 05/11/2019 - 09:27 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                             | Fecha de última actualización    |
|--|--|----------------------------------|
| <p>Se está realizando trabajos de rehabilitación mediante la declaratoria en situación de Emergencia en el tramo de la vía: Lumbaqui - La Bonita - Limite con Carchi. Así mismo el mantenimiento de la capa asfáltica mediante bacheo en el tramo de la vía Jivino Vede - Shushufindi - Yamanunca. Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen</p>  |  |                                  |
| <p>Septiembre 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja - El Reventador, Nueva Loja - Puerto EL Carmen, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUNCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO ITAYA.</p> <p>Se está realizando trabajos de rehabilitación mediante la declaratoria en situación de Emergencia en el tramo de la vía: Lumbaqui - La Bonita - Limite con Carchi. Así mismo el mantenimiento de la capa asfáltica mediante bacheo en el tramo de la vía Jivino Vede - Shushufindi - Yamanunca. Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen.</p> | <p>Solano Blacio,<br/>Wimper Vicente</p>   | <p>01/10/2019 -<br/>02:40 PM</p> |
| <p>Agosto 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUNCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO ITAYA.</p> <p>Se está realizando trabajos de rehabilitación mediante la declaratoria en situación de Emergencia en el tramo de la vía: Lumbaqui - La Bonita - Limite con Carchi. Así mismo el mantenimiento de la capa asfáltica mediante bacheo en el tramo de la vía Jivino Vede - Shushufindi - Yamanunca. Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen.</p>  | <p>López Mendoza,<br/>Cristhian Manuel</p> | <p>04/09/2019 -<br/>12:06 PM</p> |
| <p>Julio 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUNCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO ITAYA.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica</p>  | <p>López Mendoza,<br/>Cristhian Manuel</p> | <p>01/08/2019 -<br/>09:21 AM</p> |
| <p>Junio 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUNCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica</p>   | <p>López Mendoza,<br/>Cristhian Manuel</p> | <p>02/07/2019 -<br/>08:25 AM</p> |
| <p>Mayo 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUNCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la</p>  | <p>López Mendoza,<br/>Cristhian Manuel</p> | <p>05/06/2019 -<br/>02:44 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica.   |                                 |                               |
| <p>Abril 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica.</p>   | López Mendoza, Cristhian Manuel | 02/05/2019 - 08:58 AM         |
| <p>Marzo 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica.</p>   | López Mendoza, Cristhian Manuel | 03/04/2019 - 01:43 PM         |
| <p>Febrero 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica.</p>   | López Mendoza, Cristhian Manuel | 27/02/2019 - 07:52 AM         |
| <p>Enero 2019</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica.</p>   | López Mendoza, Cristhian Manuel | 04/02/2019 - 04:47 PM         |
| <p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA con las 23 Microempresas de conservación vial DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica.</p> | López Mendoza, Cristhian Manuel | 03/01/2019 - 03:29 PM         |
| <p>NOVIEMBRE 2018</p>  | López Mendoza, Cristhian Manuel | 06/12/2018 - 07:59 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, Nueva Loja - El Reventador, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA con las 23 Microempresas de conservación vial DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.</p> <p>Se están realizando el arreglo de varios sitios inestables en la carretera Nueva Loja - Puerto El Carmen, así mismo en la Carretera Nueva Loja - Simón Bolívar se está realizando la rehabilitación y cambio de alcantarilla de varios sitios críticos generados por el fuerte invierno que ha sufrido la región Amazónica.</p>   |                                 |                               |
| <p>Octubre 2018:</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA con las 23 Microempresas de conservación vial DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. Se realizó la publicación del proceso de contratación en el SOCE, del "SOBRE EL RIO PUENTE DURENO" ubicado en la vía Nueva Loja Puerto Carmen y la contratación de del punto crítico numero 6 bicado en la vía Nueva Loja Puerto Carmen También se encuentra en Proceso de contratación sobre señalización de la red vial Estatal..</p>   | López Mendoza, Cristhian Manuel | 05/11/2018 - 08:41 AM         |
| <p>Septiembre 2018:</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí - La Bonita, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA con las 23 Microempresas de conservación vial DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. Se realizó la publicación del proceso de contratación en el SOCE, del "PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FE" ubicado en la vía Jivino verde Shushufindl. También se encuentra en Proceso de contratación sobre señalización de la red vial Estatal. De igual manera se firmó el contrato para la contratación de las Fiscalizaciones de la construcción del puente sobre el rio Santa Fe.</p>            | López Mendoza, Cristhian Manuel | 03/10/2018 - 02:46 PM         |
| <p>Agosto:</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Lumbaquí, con maquinaria de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA con las 23 Microempresas de conservación vial DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. Se realizó la publicación del proceso de contratación en el SOCE, del "PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FE" ubicado en la vía Jivino verde Shushufindl. También se encuentra en Proceso de contratación sobre señalización de la red vial Estatal. De igual manera se elevó al SOCE los procesos para la contratación de las Fiscalizaciones de la construcción del puente sobre el rio Santa Fe.</p>                        | López Mendoza, Cristhian Manuel | 04/09/2018 - 02:24 PM         |
| <p>Julio 2018:</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Puerto el Carmen, con 4 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA con las 23 Microempresas de conservación vial DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. Se realizó la publicación del proceso de contratación en el SOCE, del "PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FE" ubicado en la vía Jivino verde Shushufindl. También se encuentra en Proceso de contratación sobre señalización de la red vial Estatal. De igual manera se elevó al SOCE los procesos para la contratación de las Fiscalizaciones de la construcción del puente sobre el rio Santa Fe.</p> | Vinces Navarrete, Julio Cesar   | 02/08/2018 - 02:44 PM         |
| <p>Junio 2018</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Puerto el Carmen, con 4 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento vial rutinario y emergente de los tramos de carretera; NUEVA LOJA - SIMÓN BOLÍVAR E-45, LUMBAQUÍ - EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO E-10, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO E-10, JIVINO VERDE- AGURICO 3, "Y" DE YAMANUCA -</p>  | López Mendoza, Cristhian Manuel | 06/07/2018 - 07:57 AM         |



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                          | Fecha de última actualización |
|--|---|-------------------------------|
| <p>PUERTO PROVIDENCIA - PUERTO HITAYA con las 23 Microempresas de conservación vial DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. Se realizó la publicación del proceso de contratación en el SOCE, del "PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FE" ubicado en la vía Jivino verde Shushufindi. También se encuentra en Proceso de contratación sobre señalización de la red vial Estatal. De igual manera se elevó al SOCE los procesos para la contratación de las Fiscalizaciones de la construcción del puente sobre el rio Santa Fe y sobre el rio Teteyé.</p>   |   |                               |
| <p>Mayo 2018</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Puerto el Carmen, con 4 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento rutinario de las vías NUEVA LOJA - REVENTADOR, PUENTE LUMBAQUI - LIMITE PROVINCIAL DEL CARCHI, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARME, JIVINO VERDE-AGURICO 3, YAMANUCA -PUERTO PROVIDENCIA - HITAYA con las 23 Microempresas DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, Se realizó la publicación del proceso de contratación del "PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FE" UBICADO EN LA VÍA JIVINO VERDE SHUSHUFINDI en el SOCE. también se encuentra en Proceso de contratación sobre señalización de la red vial Estatal. de igual manera se elevó al SOCE los procesos para la contratación de las Fiscalizaciones de la construcción del puente sobre el rio Santa Fe y sobre el rio Teteyé</p> | <p>Enríquez Ocampos, Robín Cristian</p> | <p>01/06/2018 - 03:11 PM</p>  |
| <p>Abril 2018</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja -Puerto el Carmen, con 4 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento rutinario de las vías NUEVA LOJA - REVENTADOR, PUENTE LUMBAQUI - LIMITE PROVINCIAL DEL CARCHI, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARME, JIVINO VERDE-AGURICO 3, YAMANUCA -PUERTO PROVIDENCIA - HITAYA con las 23 Microempresas DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, Se realizó la publicación del proceso de contratación del "PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FE" UBICADO EN LA VÍA JIVINO VERDE SHUSHUFINDI en el SOCE. tambien se encuentra en Proceso de contratacion sobre señalizacion de la red vial Estatal.</p>  | <p>Enríquez Ocampos, Robín Cristian</p> | <p>03/05/2018 - 11:03 AM</p>  |
| <p>Marzo 2018</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja - Reventador, con 4 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se continua con mantenimiento rutinario de las vías NUEVA LOJA - REVENTADOR, PUENTE LUMBAQUI - LIMITE PROVINCIAL DEL CARCHI, NUEVA LOJA- PUERTO EL CARME, JIVINO VERDE-AGURICO 3, YAMANUCA -PUERTO PROVIDENCIA - HITAYA con las 23 Microempresas DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, Se realizó la publicación del proceso de contratación del "PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FE" UBICADO EN LA VÍA JIVINO VERDE SHUSHUFINDI en el SOCE.</p>  | <p>Enríquez Ocampos, Robín Cristian</p> | <p>04/04/2018 - 08:49 AM</p>  |
| <p>Febrero 2018</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Nueva Loja - Reventador, con 6 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se emitió las Ordenes de Compra a 23 Microempresas, dentro del Catalogo Electrónico, quienes iniciaron su trabajo de Mantenimiento Vial Rutinario desde el 21 de Febrero hasta Diciembre de 2018 , adicional a esto, se finalizó la rehabilitación del punto crítico N°5 de la vía Nueva Loja - Puerto Carmen, y la construcción de 2 muros de hormigón en las abscisas 43+450 y 45+150 y dos muro de gaviones en las abscisas 39+550 y 44+450 en la vía Quito.</p>   | <p>Enríquez Ocampos, Robín Cristian</p> | <p>09/03/2018 - 11:49 AM</p>  |
| <p>Enero 2018</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Lumbaqui - La Bonita, con 3 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se han contratado 23 Microempresas a partir del marzo, para los periodos Marzo - Diciembre de 2018, adicional a esto se contrató la rehabilitación del punto crítico N°5 de la vía Nueva Loja - Puerto Carmen, también la contratación de 2 muros de hormigón en las abscisas 43+450 y 45+150 y dos muro de gaviones en las abscisas 39+550 y 44+450 en la vía Quito</p>   | <p>Enríquez Ocampos, Robín Cristian</p> | <p>05/02/2018 - 04:59 PM</p>  |
| <p>Diciembre 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Lumbaqui - La Bonita, con 6 máquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se han contratado Microempresas a partir del 14 de Octubre, para los periodos 14 de Octubre - 14 de Noviembre y 14 de Noviembre, 14 de Diciembre de 2017, adicional a esto se contrató la rehabilitación del punto crítico N°5 de la vía Nueva Loja - Puerto Carmen, también la contratación de 2 muros de hormigón en las abscisas 43+450 y 45+150 y dos muro de gaviones en las abscisas 39+550 y 44+450 en la vía Quito</p>   | <p>Enríquez Ocampos, Robín Cristian</p> | <p>05/01/2018 - 09:17 AM</p>  |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                          | Fecha de última actualización |
|--|---|-------------------------------|
| <p>Noviembre 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Lumbaqui - La Bonita, con 6 maquinas y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se han contratado Microempresas a partir del 14 de Octubre, para los períodos 14 de Octubre - 14 de Noviembre y 14 de Noviembre, 14 de Diciembre de 2017, adicional a esto se contrato la rehabilitacion del punto critico N°5 de la via nueva Loja - Puerto Carmen.</p>   | <p>Enríquez Ocampos, Robín Cristian</p> | <p>03/01/2018 - 04:00 PM</p>  |
| <p>Octubre 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Lumbaqui - La Bonita, con una sola máquina y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Los equipos pertenecientes a la Dirección Distrital de Sucumbíos se encuentran dañados y no hay recursos económicos para su reparación. Se han contratado Microempresas a partir del 14 de Octubre, para los períodos 14 de Octubre - 14 de Noviembre y 14 de Noviembre, 14 de Diciembre de 2017.</p>  | <p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p> | <p>01/11/2017 - 02:49 PM</p>  |
| <p>Septiembre 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Lumbaqui - La Bonita, con una sola máquina y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Los equipos pertenecientes a la Dirección Distrital de Sucumbíos se encuentran dañados y no hay recursos económicos para su reparación. La falta de recursos económicos, impiden la contratación de Microempresas.</p>  | <p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p> | <p>02/10/2017 - 09:01 AM</p>  |
| <p>Agosto 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de la carretera Lumbaqui - La Bonita, con una sola máquina y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se concluyó el bacheo asfáltico mayor de la red Vial estatal, en las carreteras Nueva Loja - Simón Bolívar; Nueva Loja - Chiritza ; Cuyabeno - Puerto El Carmen y Jivino Verde - Shushufindi. Los equipos pertenecientes a la Dirección Distrital de Sucumbíos se encuentran dañados y no hay recursos económicos para su reparación.</p>   | <p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p> | <p>05/09/2017 - 09:14 PM</p>  |
| <p>Julio 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puente Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se ha realizado el bacheo asfáltico mayor de la red Vial estatal, en las carreteras Nueva Loja - Simón Bolívar; Nueva Loja - Chiritza ; Cuyabeno - Puerto El Carmen y Jivino Verde - Shushufindi. Los contratos de las obras de asfalto se encuentran en archivos anexos del mes de Junio.</p>  | <p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p> | <p>02/08/2017 - 01:59 PM</p>  |
| <p>Junio 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puente Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>El 18 e Mayo concluyeron los trabajos de las Microempresas y no se ha vuelto a contratar Microempresas para el período Mayo - Junio 2017.</p> <p>Se ha relizado contratos para el Bacheo Asfáltico mayor en la Red Vial Estatal de la Provincia de Sucumbíos los trabajos deberán terminar el 15 de Julio de 2017.</p>   | <p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p> | <p>03/07/2017 - 07:43 PM</p>  |
| <p>Junio 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puente Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>El 18 e Mayo concluyeron los trabajos de las Microempresas y no se ha vuelto a contratar Microempresas para el período Mayo - Junio 2017.</p> <p>Se ha relizado contratos para el Bacheo Asfáltico mayor en la Red Vial Estatal de la Provincia de Sucumbíos los trabajos deberán terminar el 15 de Julio de 2017.</p>   | <p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p> | <p>22/06/2017 - 04:54 PM</p>  |
| <p>Mayo 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puente Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>A partir del 19 de Abril se contrataron 18 Microempresas para el Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal; los trabajos concluyeron el 18 de Mayo de 2017 y no se ha vuelto a contratar Microempresas para el período Mayo - Junio 2017.</p> <p>Se ha realizado contratos para mantenimiento Vial correspondiente a bacheo asfáltico mayor en la Red Vial Estatal Provincial y construcción de accesos del puente El Oso en la carretera Lumbaqui - Julio Andrade, Tramo La Bonita - Julio Andrade.</p> | <p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p> | <p>01/06/2017 - 10:39 AM</p>  |
| <p>Abril 2017</p> <p>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puente Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p> <p>A partir del 19 de Abril se contrataron 18 Microempresas para el Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal</p>  | <p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p> | <p>03/05/2017 - 12:17 PM</p>  |



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                                    | Fecha de última actualización    |
|---|---|----------------------------------|
| <p>Marzo 2017<br/>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puente Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos.</p>   | <p>Arizaga Davila,<br/>Leoncio<br/>Abelardo</p>   | <p>28/03/2017 -<br/>12:32 PM</p> |
| <p>Febrero 2017<br/>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puete Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se ha contratado maquinaria para realizar mantenimientos emergentes ya que los equipos del MTOP no se abastecen. No se ha contratado Microempresas debido a la falta de asignación de recursos económicos.</p>   | <p>Arizaga Davila,<br/>Leoncio<br/>Abelardo</p>   | <p>05/03/2017 -<br/>12:39 PM</p> |
| <p>Enero 2017<br/>Se está realizando el mantenimiento emergente de las carreteras Nueva Loja - Puete Reventador y Lumbaqui - La Bonita, con maquinaria y personal de la Dirección Provincial de Sucumbíos. Se ha contratado maquinaria para realizar mantenimientos emergentes ya que los equipos del MTOP no se abastecen. No se ha contratado Microempresas debido a la falta de asignación de recursos económicos.</p>   | <p>Arizaga Davila,<br/>Leoncio<br/>Abelardo</p>   | <p>05/03/2017 -<br/>12:39 PM</p> |
| <p>Diciembre 2016:<br/>Se han contratado dieciocho (18) Asociaciones de Conservación Vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal desde el 01 Diciembre de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016 en los tramos: Lumbaqui (entrada a la Bonita ) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; Río Palmar - La Bonita ; La Bonita - La Fama; La Fama - Santa Bárbara - Santa Barbara; Santa Barbara - Cocha Seca; Jivino Verde - Yamanunca; Yamanunca - Puerto Itaya; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza; Pte. Cuyabeno - Sansahuari; Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP. La Dirección Provincial se encuentra realizando el Mantenimiento Vial por Administración Directa en la Red Vial Estatal de la Provincia.</p>                            | <p>Benavides<br/>Morillo, Omar<br/>Alexander</p>  | <p>04/01/2017 -<br/>09:06 AM</p> |
| <p>Noviembre 2016:<br/>Se han contratado diecinueve (19) Asociaciones de Conservación Vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal desde el 01 Diciembre de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2016 en los tramos: Lumbaqui (entrada a la Bonita ) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; Río Palmar - La Bonita ; La Bonita - La Fama; La Fama - Santa Bárbara - Santa Barbara; Santa Barbara - Cocha Seca; Jivino Verde - Yamanunca; Yamanunca - Puerto Itaya; Shushufindi - Aguarico 3; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza; Pte. Cuyabeno - Sansahuari; Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP. La Dirección Provincial se encuentra realizando el Mantenimiento Vial por Administración Directa en la Red Vial Estatal de la Provincia.</p> | <p>Benavides<br/>Morillo, Omar<br/>Alexander</p>  | <p>04/01/2017 -<br/>09:06 AM</p> |
| <p>Octubre 2016:<br/>Se han contratado diecisiete (17) Asociaciones de Conservación Vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal desde el 24 Octubre de 2016 hasta el 23 de Noviembre de 2016 en los tramos: Lumbaqui (entrada a la Bonita ) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; Río Palmar - El Higuero - Santa Barbara; Santa Barbara - Cocha Seca; Jivino Verde - Yamanunca; Yamanunca - Puerto Itaya; Shushufindi - Aguarico 3; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza; Pte. Cuyabeno - Sansahuari; Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP.</p>  | <p>Arizaga Davila,<br/>Leoncio<br/>Abelardo</p>   | <p>31/10/2016 -<br/>11:25 AM</p> |
| <p>Septiembre 2016:<br/>Se han contratado doce Asociaciones de conservación vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal desde el 29 de agosto hasta el 28 de septiembre de 2016 en los tramos: Lumbaqui (entrada a la Bonita ) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; El Higuero - Santa Barbara; Santa Barbara - Cocha Seca; Jivino Verde - Yamanunca; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza; Pte. Cuyabeno - Sansahuari; Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP.</p>  | <p>Benavides<br/>Morillo, Omar<br/>Alexander</p>  | <p>06/10/2016 -<br/>04:14 PM</p> |
| <p>Julio 2016:<br/>Se han contratado nueve Asociaciones de conservación vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal desde el 05 de junio hasta 14 de julio de 2016 en los tramos: Lumbaqui (entrada a la Bonita ) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; El Higuero - Santa Barbara; Santa Barbara - Cocha Seca; Jivino Verde - Yamanunca; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza; Pte. Cuyabeno - Sansahuari; Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP.</p>   | <p>Benavides<br/>Paladines, Ángel<br/>Bolívar</p> | <p>29/07/2016 -<br/>10:13 AM</p> |
| <p>Junio 2016:<br/>Se han contratado nueve Asociaciones de conservación vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal para los tramos Lumbaqui (entrada a la Bonita ) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; El Higuero - Santa Barbara; Santa Barbara - Cocha Seca; Jivino Verde - Yamanunca; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza; Pte. Cuyabeno - Sansahuari; Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP.</p>   | <p>Benavides<br/>Paladines, Ángel<br/>Bolívar</p> | <p>27/06/2016 -<br/>02:20 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                     | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Mayo 2016:<br/>Se han contratado once Asociaciones de conservación vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal para los tramos Lumbaqui (entrada a la Bonita ) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; Río El Palmar - El Higueron; El Higueron - Santa Barbara; Santa Barbara - Cocha Seca; Puente Reventador - Simon Bolivar; Jivino Verde - Yamanunca; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza; Pte. Cuyabeno - Sansahuari; Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP.</p>   | Benavides Paladines, Ángel Bolívar | 03/06/2016 - 03:01 PM         |
| <p>Abril 2016:<br/>Se han contratado seis Asociaciones de conservación vial para el mantenimiento rutinario de la red vial estatal para los tramos Lumbaqui (entrada a la Bonita ) - Río Chingual; Río Chingual - Río Palmar; Río El Palmar - El Higueron; Puente Reventador - Simon Bolivar; Jivino Verde - Yamanunca; "Y" de Tarapaoa - Puente Chiritza. Asociaciones contratadas por medio de catálogo electrónico inclusivo dispuesto por el SERCOP.</p>   | Benavides Paladines, Ángel Bolívar | 04/05/2016 - 04:18 PM         |
| <p>Marzo 2016:<br/>En espera de la asignación de los recursos económicos para contratación de microempresas de mantenimiento vial, se está trabajando con la maquinaria del MTOP por administración directa y con el personal de la institución; Se han realizado las diligencias del caso para conseguir los recursos y precautelar la inversión realizada en el Puente sobre la quebrada "El Oso".</p>   | Benavides Paladines, Ángel Bolívar | 08/04/2016 - 04:19 PM         |
| <p>Febrero 2016:<br/>En espera de la asignación de los recursos económicos para contratación de microempresas de mantenimiento vial, se está trabajando con la maquinaria del MTOP por administración directa y con el personal de la institución; Se han realizado las diligencias del caso para conseguir los recursos y precautelar la inversión realizada en el Puente sobre la quebrada "El Oso".</p>   | Benavides Paladines, Ángel Bolívar | 08/03/2016 - 11:48 AM         |
| <p>Enero 2016:<br/>En el mes de Mayo del 2015, concluyeron los trabajos de las Microempresas; se realizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016; A la espera de la asignación de recursos para continuar el proceso respectivo. Se están realizando mediante contratación directa (ínfima cuantía) arreglos en la vía, en los tramos de Río El Palmar-Santa Bárbara, Mantenimiento del CEBAF San Miguel, rótulos de señalización para trabajos en la vía, adquisición de repuestos y filtros para maquinaria y vehículos. La maquinaria de la Dirección Provincial se encuentra trabajando en el Colegio Pacífico Cembranos, realizando rellenos y colocando alcantarillas.</p> | Arizaga Davila, Leoncio Abelardo   | 13/02/2016 - 01:35 PM         |
| <p>Diciembre 2015:<br/>En el mes de Mayo del 2015, concluyeron los trabajos de las Microempresas; se realizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016; A la espera de la asignación de recursos para continuar el proceso respectivo. Se están realizando mediante contratación directa (ínfima cuantía) arreglos en la vía, en los tramos de Río El Palmar-Santa Bárbara, Mantenimiento del CEBAF San Miguel, rótulos de señalización para trabajos en la vía, adquisición de repuestos y filtros para maquinaria y vehículos.</p>   | Arizaga Davila, Leoncio Abelardo   | 15/12/2015 - 12:03 PM         |
| <p>Noviembre 2015:<br/>En el mes de Mayo del 2015, concluyeron los trabajos de las Microempresas; se realizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016; A la espera de la asignación de recursos para continuar el proceso respectivo. Se están realizando mediante contratación directa (ínfima cuantía) arreglos en la vía, en los tramos de Río El Palmar-Santa Bárbara, Mantenimiento del CEBAF San Miguel, rótulos de señalización para trabajos en la vía, adquisición de repuestos y filtros para maquinaria y vehículos.</p>   | Arizaga Davila, Leoncio Abelardo   | 08/12/2015 - 08:52 AM         |
| <p>Octubre 2015:<br/>En el mes de Mayo del 2015, concluyeron los trabajos de las Microempresas; se realizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016; A la espera de la asignación de recursos para continuar el proceso respectivo. Se están realizando mediante contratación directa (ínfima cuantía) arreglos en la vía, en los tramos de Río El Palmar-Santa Bárbara, Mantenimiento del CEBAF San Miguel, rótulos de señalización para trabajos en la vía, adquisición de repuestos y filtros para maquinaria y vehículos.</p>   | Arizaga Davila, Leoncio Abelardo   | 30/10/2015 - 09:54 AM         |
| <p>Septiembre 2015:<br/>En el mes de Mayo del 2015, concluyeron los trabajos de las Microempresas; se realizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016; A la espera de la asignación de recursos para continuar el proceso respectivo. Se están realizando mediante contratación directa (ínfima cuantía) arreglos en la vía, en los tramos de Río El Palmar-Santa Bárbara, Mantenimiento del CEBAF San Miguel, rótulos de señalización para trabajos en la vía, adquisición de repuestos y filtros para maquinaria y vehículos.</p>  | Benavides Paladines, Ángel Bolívar | 06/10/2015 - 11:06 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| <p>Agosto 2015:<br/>Se finalizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016; A la espera de la asignación de recursos para continuar el proceso respectivo.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 07/09/2015 -<br>10:12 AM      |
| <p>JULIO 2015:<br/>Se finalizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 12/08/2015 -<br>10:52 AM      |
| <p>JUNIO 2015:<br/>Se finalizaron los Términos de Referencia y se enviaron a Administración Central para la asignación de recursos para los procesos de contratación 2015-2016.</p>   | Camacho<br>Sánchez,<br>Rodrigo Iván    | 03/07/2015 -<br>02:42 PM      |
| <p>MAYO 2015:<br/>Se concluye los trabajos de las Asociaciones de Conservación Vial San Francisco y Unión Amazonas, la Dirección provincial de Sucumbíos se encuentra elaborando los Términos de Referencia para los procesos de contratación 2015-2016.</p>  | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 05/06/2015 -<br>11:31 AM      |
| <p>ABRIL 2015.<br/>Las Asociaciones de Conservación Vial, han terminado su contrato, actualmente la Dirección provincial de Sucumbíos se encuentra elaborando los Terminos de Referencia para los procesos de contratación 2015-2016. Sólomente las Asociaciones de Conservación Vial San Francisco y Unión Amazonas realizaron trabajos de Mantenimiento Vial durante el mes de Abril, el MTOP está realizando Mantenimiento: Bacheo y limpieza con los equipos de la Dirección Provincial de Sucumbios.</p> | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 10/05/2015 -<br>09:19 PM      |
| <p>MARZO 2015.<br/>Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Bárbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 02/04/2015 -<br>10:51 AM      |
| <p>FEBRERO 2015.<br/>Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Bárbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 10/03/2015 -<br>04:31 PM      |
| <p>ENERO 2015.<br/>Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Bárbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa, se ha realizado el bacheo asfáltico en frío, en la carretera Cuyabeno - Puerto El Carmen.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 04/02/2015 -<br>11:47 AM      |
| <p>DICIEMBRE 2014.<br/>Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Bárbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa, se ha realizado el bacheo asfáltico en frío, en la carretera Cuyabeno - Puerto El Carmen.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 08/01/2015 -<br>08:37 AM      |
| <p>NOVIEMBRE 2014.<br/>Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Bárbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa, se ha realizado el bacheo asfáltico en frío, en la carretera Cuyabeno - Puerto El Carmen.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 10/12/2014 -<br>10:49 AM      |
| <p>ACTUBRE 2014:<br/>Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa, se ha realizado el bacheo asfáltico en frío, en la carretera Cuyabeno - Puerto El Carmen.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 10/11/2014 -<br>11:52 AM      |
| <p>SEPTIEMBRE 2014:<br/>Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa, se ha realizado el bacheo asfáltico en frío, en la carretera Cuyabeno - Puerto El Carmen.</p>  | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 16/10/2014 -<br>08:56 AM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p><b>AGOSTO 2014:</b><br/>Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen. Por Administración Directa, se ha realizado el bacheo asfáltico en frío, en la carretera Cuyabeno - Puerto El Carmen.</p> <p>Se ha solicitado la Certificación para realizar la limpieza de derrumbos en la carretera Lumbaqui - La Bonita, ya que la vía se encuentra prácticamente cerrada, sin que hasta la presente fecha se autorice este pedido.</p> <p>Se ha solicitado la Autorización para la contratación de la Señalización horizontal de la carretera Lumbaqui - Río Palmar, cuyo pedido fue aprobado los ultimos días del mes de Agosto del 2014.</p> | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 10/09/2014 -<br>08:34 AM      |
| <p><b>JULIO 2014:</b><br/>Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen</p>  | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 21/08/2014 -<br>03:47 AM      |
| <p><b>JUNIO 2014:</b><br/>Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 03/07/2014 -<br>08:59 AM      |
| <p><b>MAYO 2014:</b><br/>Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen.</p>  | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 12/06/2014 -<br>02:34 PM      |
| <p><b>ABRIL 2014:</b><br/>Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 07/05/2014 -<br>04:06 PM      |
| <p><b>MARZO 2014:</b><br/>Las Asociaciones de Conservación Vial, realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, tales como: Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y roza a mano, en las carreteras: Lumbaqui - La Bonita - Santa Barbara, Jivino Verde - Shushufindi, Nueva Loja - Puente Chiritza - Puerto el Carmen.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 07/05/2014 -<br>04:05 PM      |
| <p><b>MARzo 2014:</b><br/>Se firmó los contratos con las Asociaciones de Conservación Vial, las cuales iniciaron los trabajos.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 15/04/2014 -<br>11:13 AM      |
| <p><b>Febrero 2014:</b><br/>Se elaboró las Actas de Recepción correspondiente a los contratos del año 2013 (falta firma de contratistas) , adicionalmente, se realizó la publicación en el portal de Compras Públicas para la contratación 2014.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 14/03/2014 -<br>12:34 PM      |
| <p>Se elaboró las Actas de Recepción correspondiente a los contratos del año 2013 (falta firma de contratistas) , adicionalmente, se realizó la publicación en el portal de Compras Públicas para la contratación 2014.</p>  | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 07/03/2014 -<br>11:54 AM      |
| <p><b>Enero 2014</b><br/>Se está realizando el proceso preparatorio para contratación de Microempresas, tales como: Presupuestos TDR's y Pliegos.</p>  | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 12/02/2014 -<br>11:31 AM      |
| <p><b>DICIEMBRE 2013</b><br/>Las Microempresas siguen trabajando en el mantenimiento rutinario emergente de la Red Vial Estatal, su trabajo consiste en la Limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, poda, corte y retiro de árboles, limpieza de causes, ríos o quebradas, de los tramos contratados por cada una de las microempresas.</p>  | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 10/02/2014 -<br>08:23 AM      |
| <p><b>NOVIEMBRE 2013</b><br/>Las Microempresas siguen trabajando en el mantenimiento rutinario emergente de la Red Vial Estatal, su trabajo consiste en la Limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, poda, corte y retiro de árboles, limpieza de causes, ríos o quebradas, de los tramos contratados por cada una de las microempresas.</p>  | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 08/01/2014 -<br>08:46 AM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p><b>OCTUBRE 2013</b><br/>                     Las Microempresas siguen trabajando en el mantenimiento rutinario emergente de la Red Vial Estatal, su trabajo consiste en la Limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, poda, corte y retiro de árboles, limpieza de causes, ríos o quebradas, de los tramos contratados por cada una de las microempresas.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 09/12/2013 -<br>12:45 AM      |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2013</b><br/>                     Las Microempresas siguen trabajando en el mantenimiento rutinario emergente de la Red Vial Estatal, su trabajo consiste en la Limpieza de los tramos contratados por cada una de dichas microempresas.</p>  | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 05/11/2013 -<br>10:19 AM      |
| <p><b>AGOSTO 2013</b><br/>                     Las Microempresas siguen trabajando en el mantenimiento rutinario emergente de la Red Vial Estatal, su trabajo consiste en la Limpieza de los tramos contratados por cada una de dichas microempresas.</p>  | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 07/10/2013 -<br>09:54 AM      |
| <p><b>JULIO 2013</b><br/>                     Las Microempresas siguen trabajando en el mantenimiento rutinario emergente de la Red Vial Estatal, su trabajo consiste en la Limpieza cosntante de los tramos contratados por cada una de dichas microempresas;</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 06/09/2013 -<br>12:27 PM      |
| <p><b>JUNIO 2013</b><br/>                     Continúan los trabajos de las microempresas: Roza a mano, Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Poda, corte y retiro de árboles, Limpieza de puentes, Limpieza de cauces de ríos o queb. Conservación de señales verticales Sello de fisures o grietas Limpieza de derrumbes a mano, en las diferentes vías de la Red Estatal Provincial.<br/>                     Se adjunta Informe Ejecutivo mes de Junio de cada Microempresa.</p>             | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 08/08/2013 -<br>02:45 PM      |
| <p><b>MAYO 2013</b><br/>                     Continúan los trabajos de las microempresas: Roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, en las diferentes vías de la Red Estatal Provincial.<br/>                     Se puede revisar los tramos y nombres de de microempresas en el anexo que se encuentra dentro del indicador del proyecto.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 05/07/2013 -<br>09:49 AM      |
| <p><b>ABRIL 2013</b><br/>                     Continúan los trabajos de las microempresas: Roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, en las diferentes vías de la Red Estatal Provincial.<br/>                     Se puede revisar los tramos y nombres de de microempresas en el anexo que se encuentra dentro del indicador del proyecto.<br/>                     No se ha realizado pagos de planillas a las microempresas porque existenter errores en los contratos (Asunto)</p> | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 06/06/2013 -<br>06:33 PM      |
| <p><b>MARZO 2013</b><br/>                     Se inician los Trabajos de Mantenimiento Vial Rutinario, generado por Microempresas, en los diferentes tramos de la Red Vial Estatal Provincial.<br/>                     No ha sido posible pagar el anticipo a las Microempresas, debido a que aún no presentan las garantías, por lo tanto no existe registro de pago en el presupuesto</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 24/04/2013 -<br>03:57 PM      |
| <p><b>FEBRERO 2013</b><br/>                     Se solicita Certificación Presupuestaria para reliazar contratacion de Microempresas para que realicen los trabajos de Mantenimiento Vial Rutinario y se procede con el trámite precontractual y contractual.</p>  | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 31/03/2013 -<br>02:06 PM      |
| <p><b>ENERO 2013</b><br/>                     No se inician los trabajos de Mantenimiento Vial Rutinario con micro empresas, debido a que aún no realizan la asignación presupuestaria.</p>  | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 31/03/2013 -<br>02:04 PM      |
| <p><b>DICIEMBRE 2012</b><br/>                     Trabajo de Mantenimiento Vial Rutinario con micro empresas 100% de avance, bacheo asfáltico mayor en la carretera Cuyabeno - Puerto el Carmen de Putumayo 100% de avance. Con fecha 26 de Diciembre del 2012 se inician los trabajos de señalización en las carreteras: Lago Agrio - Simon Bolivar; Jivino Verde - Shushufindi; Shushufindi - Puerto Itaya y Shuhsufindi - La Primavera.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 31/03/2013 -<br>02:01 PM      |
| <p><b>NOVIEMBRE 2012</b><br/>                     Trabajo de Mantenimiento Vial Rutinario con micro empresas 97.32% de avance, bacheo asfáltico mayor en la carretera Cuyabeno - Puerto el Carmen de Putumayo 80% de avance.</p>   | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 08/01/2013 -<br>02:15 PM      |
| <p><b>Octubre 2012</b><br/>                     Se está trabajando normalmente en los proyectos que han sido contratados y se encuentran en vigencia, así como también microempresas.</p>  | Arizaga Davila,<br>Leoncio<br>Abelardo | 08/01/2013 -<br>02:11 PM      |



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                                  | Fecha de última actualización    |
|---|---|----------------------------------|
| <p>Se está elevando al portal, procesos para la implementación de señalización vertical, horizontal, porticos de señalización informativa y BTA's a nivel de la provincia de Sucumbios.</p>   |   |                                  |
| <p>SEPTIEMBRE 2012<br/>Se continúa con el Mantenimiento Vial Preventivo y Rutinario que realizan las microempresas en la Red Vial Estatal Provincial.</p> <p>AGOSTO 2012<br/>Se continúa con la señalización horizontal, vertical e informativa y el Mantenimiento Vial Preventivo y Rutinario que realizan las microempresas en la Red Vial Estatal Provincial.</p> <p>JULIO 2012<br/>Se continúa con la señalización horizontal, vertical e informativa y el Mantenimiento Vial Preventivo y Rutinario que realizan las microempresas en la Red Vial Estatal Provincial.</p> <p>JUNIO 2012<br/>Se continúa con la señalización horizontal, vertical e informativa y el Mantenimiento Vial Rutinario que realizan las microempresas en la Red Vial Estatal Provincial.</p> <p>MAYO 2012<br/>Se contrata señalización horizontal y vertical en el tramo Lumbaqui - La bonita y se continúa realizando el Mantenimiento Vial Rutinario con Microempresas en los diferentes tramos de la Red Vial Estatal Provincial.</p> <p>ABRIL 2012<br/>El devengado del mes de Abril corresponde a 163,545.66, superando el valor programado; debido a que se liquidó un proyecto de arrastre del año 2011 (ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DE SITIO INESTABLE Y ESTUDIOS HIDROLOGICOS - HIDRAULICOS PARA LAS OBRAS DE DEFENSA EN LA RIVERAS DEL RIO CHINGUAL); Además se canceló un Contrato Complementario, reajustes de precios tanto del CC como del CO y anticipo, del mismo proyecto por un valor de 43,881.17 que fue incluido dentro del Mantenimiento Vial.<br/>El Ing Marcos Eras se encuentra desde Marzo en el Área de Conservación Vial; desde el próximo mes ya tendrá todos los Reportes Ejecutivos en el SITOP de cada uno de los contratos. Mantenimiento Vial con Microempresas.</p> <p>MARZO 2012 :<br/>Mantenimiento Rutinario con Microempresas y por Administración directa en la carretera Lumbaqui - La Bonita</p> <p>FEBRERO 2012 :<br/>Mantenimiento Rutinario con Microempresas y por Administración directa en la carretera Lumbaqui - La Bonita</p> <p>ENERO 2012 :<br/>Gestion de Recurso Economicos (Mantenimiento Rutinario con Microempresas y por Administración directa en la carretera Lumbaqui - La Bonita)</p> <p>DICIEMBRE 2011 :<br/>Sellado de Fisuras superficiales, carretera Jivino Verde - Shushufindi</p> <p>NOVIEMBRE 2011 :<br/>Sellado de Fisuras superficiales, carretera Jivino Verde - Shushufindi</p> <p>OCTUBRE 2011 :<br/>Sellado de Fisuras superficiales, carretera Jivino Verde - Shushufindi</p> <p>SEPTIEMBRE 2011 :<br/>Bacheo Asfáltico mayor carretera Jivino Verde - Shushufindi</p> <p>AGOSTO 2011:<br/>Bacheo Asfáltico mayor carretera Nueva Loja - "Y" del Eno</p> <p>JULIO 2011:<br/>Sellado de Fisuras superficiales, carretera Nueva Loja - "Y" del Eno</p> <p>JUNIO 2011:<br/>Sellado de Fisuras superficiales, carretera Nueva Loja - "Y" del Eno</p> <p>MAYO 2011:<br/>Bacheo Asfáltico mayor carretera Nueva Loja - Puente San Miguel</p> <p>ABRIL 2011:<br/>Sellado de Fisuras superficiales, carretera Nueva Loja - Puente San Miguel</p> <p>MARZO 2011:<br/>Sellado de Fisuras superficiales, carretera Nueva Loja - Puente San Miguel</p> <p>FEBRERO 2011:<br/>El mantenimiento rutinario de la Red Vial estatal está dado a través de las Microempresas o mediante la Administración directa por contratos de construcción y/o conservación vial ; lo que mantiene un nivel de servicio óptimo en las carreteras de la Provincia.</p> | <p>Arizaga Davila,<br/>Leoncio<br/>Abelardo</p> | <p>07/11/2012 -<br/>11:52 AM</p> |

### PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema                     | Fecha de última actualización | Responsable                     | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| Falta de recursos economicos | 25/11/2019                    | Leoncio Abelardo Arizaga Davila | 10       | 10      | 1            | 0/1                         |

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 1

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo  | Fecha de última actualización | Responsable                     | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>3- REGIONAL. * General.</b><br>No reponer el equipo caminero dañado CAUSARÍA que no se atiende toda la demanda de conservación vial.     | 25/11/2019                    | Leoncio Abelardo Arizaga Davila | 10 %         | 10      | 1            | 0/1                         |
| <b>3- REGIONAL. * General.</b><br>La falta oportuna de asignación de recursos para el proyecto CAUSARÍA retraso en los plazos de ejecución. | 25/11/2019                    | Leoncio Abelardo Arizaga Davila | 10 %         | 10      | 1            | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 2

### LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |   |
|----------------------|---|
| 1                    | Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios |

### HITOS

|    | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | PLANEACIÓN: Inicio proyecto de mantenimiento,  | 1-Solicitud de Información | 16/02/2011         |                | 16/02/2011 |          | Sí            | 1.0           |
| 2  | EJECUCIÓN: Roza a mano en la carretera Lumbaqui - La Bonita, trabajo realizado.                        | 1-Solicitud de Información | 20/05/2011         |                | 20/05/2011 |          | Sí            | 1.0           |
| 3  | EJECUCIÓN: Mantenimiento Vial Rutinario en la carretera Simón Bolívar - Reventador, trabajo realizado. | 1-Solicitud de Información | 30/06/2011         |                | 30/06/2011 |          | Sí            | 1.0           |
| 4  | DEFINICIÓN: Dictamen Senplades, obtenido.  | 1-Solicitud de Información | 31/01/2012         |                | 31/01/2012 |          | Sí            | 1.0           |
| 5  | PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.  | 1-Solicitud de Información | 05/02/2012         |                | 05/02/2012 |          | Sí            | 1.0           |
| 6  | PLANEACIÓN: Publicación en el portal de Compras Publicas, realizado.                                   | 1-Solicitud de Información | 10/02/2012         |                | 10/02/2012 |          | Sí            | 1.0           |
| 7  | PLANEACIÓN: Resolución de Adjudicació, realizada.  | 1-Solicitud de Información | 15/02/2012         |                | 10/02/2012 |          | Sí            | 1.0           |
| 8  | EJECUCIÓN: Suscripción de Contratos, firmado.  | 1-Solicitud de Información | 28/02/2012         |                | 28/02/2012 |          | Sí            | 1.0           |
| 9  | CIERRE: Acta de Recepción, firmada.  | 9-Entregables Formales     | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |          | Sí            | 1.0           |
| 10 | DEFINICIÓN: Dictamen Senplades, obtenido.  | 1-Solicitud de Información | 15/01/2013         |                | 15/01/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 11 | PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.  | 1-Solicitud de Información | 15/02/2013         |                | 15/02/2013 |          | Sí            | 1.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 12 | PLANEACIÓN: Publicación en el portal de Compras Publicas, realizado.   | 2-Publicación de Pliegos   | 20/02/2013         |                | 20/02/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 13 | PLANEACIÓN: Resolución de Adjudicación, realizada.   | 3-Adjudicación             | 01/03/2013         |                | 01/03/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 14 | EJECUCIÓN: Suscripción de Contratos, Firmado.  | 3-Adjudicación             | 05/03/2013         |                | 05/03/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 15 | EJECUCIÓN: Limpieza desbroce y reposición de calzada, carretera Lumbaqui - La Bonita, terminado.                 | 5-Entregables Intermedios  | 30/03/2013         |                | 30/03/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 16 | EJECUCIÓN: Alquiler de maquinaria para emergencia vial, realizado.   | 1-Solicitud de Información | 30/05/2013         |                | 30/05/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 17 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbos en la carretera Lumbaqui La Bonita, realizado.                                  | 9-Entregables Formales     | 30/05/2013         |                | 30/05/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 18 | EJECUCIÓN: Bacheo asfáltico mayor en la carretera Lumbaqui - La Bonita, realizado. .                             | 1-Solicitud de Información | 01/06/2013         |                | 01/06/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 19 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Preventivo en la Carretera Jivino Verde Shushufindi, realizado.                         | 5-Entregables Intermedios  | 01/07/2013         |                | 01/07/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 20 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario y emergente de la carretera Nueva Loja - Chiritza, realizado                  | 5-Entregables Intermedios  | 30/08/2013         |                | 30/08/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 21 | PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.  | 1-Solicitud de Información | 28/01/2014         |                | 28/01/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 22 | EJECUCIÓN: Bacheo asfáltico en el sector Jivino Verde - Shushufindi - La Victoria - "Y" de Yamanunca, realizado. | 5-Entregables Intermedios  | 30/01/2014         |                | 30/10/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 23 | CIERRE: Liquidacion economica de contratos, realizado.   | 1-Solicitud de Información | 05/02/2014         |                | 05/02/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 24 | PLANEACIÓN: Publicación en el portal de Compras Publicas, realizado.   | 2-Publicación de Pliegos   | 14/02/2014         |                | 14/02/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 25 | CIERRE: Acta Entrega Recepción definitiva, firmado.  | 1-Solicitud de Información | 15/02/2014         |                | 15/02/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 26 | PLANEACIÓN: Resolución de Adjudicación, realizado.   | 3-Adjudicación             | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 27 | EJECUCIÓN: Suscripción de contratos, realizado.  | 4-Inicio de Trabajo        | 01/03/2014         |                | 01/03/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 28 | EJECUCIÓN: Limpieza y desbroce en la vía Lumbaqui - La Bonita, realizado.  | 5-Entregables Intermedios  | 30/03/2014         |                | 30/03/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 29 | EJECUCIÓN: Limpieza y Desbroce en la vía "Y" de Tipishca - Palma Roja, realizado.                                | 5-Entregables Intermedios  | 30/03/2014         |                | 30/03/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 30 | EJECUCIÓN: Limpieza y Desbroce en la vía Puente Chiritza - Cuyabeno.   | 5-Entregables Intermedios  | 15/04/2014         |                | 15/04/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 31 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbos en la carretera   | 5-Entregables Intermedios  | 30/05/2014         |                | 30/05/2014 |          | Sí            | 1.0           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|    | Lumbaqui - La Bonita, realizado.  |                            |                    |                |            |          |               |               |
| 32 | EJECUCIÓN: Mantenimiento Preventivo en la Carretera Jivino Verde Shuhsufindi, realizado.                                      | 5-Entregables Intermedios  | 30/06/2014         |                | 10/11/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 33 | EJECUCIÓN: Limpieza y desbroce en la vía "Y" del Coca Km 7-Puente Chiritza, realizado.  | 5-Entregables Intermedios  | 30/07/2014         |                | 30/07/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 34 | EJECUCIÓN: Bacheo asfáltico en el sector Cuyabeno - Palma Roja, Puerto El Carmen , realizado.                                 | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2014         |                | 30/09/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 35 | EJECUCIÓN: Rosa a mano en la Carretera Lumbaqui - La Bonita, realizado.   | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2014         |                | 30/09/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 36 | EJECUCIÓN: Señalización de la carretera Lumbaqui - el Palmar, realizado.  | 5-Entregables Intermedios  | 30/11/2014         |                | 30/11/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 37 | CIERRE: Liquidación Económica, realizado.   | 9-Entregables Formales     | 30/03/2015         |                | 30/03/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 38 | EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical de la carretera shushufindi - aguarico 3, realizado.                            | 5-Entregables Intermedios  | 30/07/2015         | 29/12/2017     |            |          | No            | 1.0           |
| 39 | CIERRE: Firma de Acta Entrega Recepción, realizado.   | 9-Entregables Formales     | 15/12/2015         |                | 15/12/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 40 | PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.   | 1-Solicitud de Información | 05/02/2016         |                | 31/03/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 41 | PLANEACIÓN: Publicación en el portal de Compras Publicas, realizado.  | 2-Publicación de Pliegos   | 08/02/2016         |                | 31/03/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 42 | PLANEACIÓN: Resolución de Adjudicación, realizada.  | 3-Adjudicación             | 22/02/2016         |                | 31/03/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 43 | EJECUCIÓN: Suscripción de Contratos, firmado.   | 4-Inicio de Trabajo        | 08/03/2016         |                | 01/04/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 44 | EJECUCIÓN: Construcción de muro de protección en el puente El Oso, realizado.   | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2016         |                | 29/12/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 45 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y desalojo en la carretera Lumbaquí -La Bonita, tramo: Río Palmar - Río Chingual, realizado. | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 46 | EJECUCIÓN: Adquisición de materiales para asfalto al frio, ejecutado.   | 5-Entregables Intermedios  | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 47 | EJECUCIÓN: Mantenimiento de la carretera Lumbaquí - Julio Andrade, realizado  | 5-Entregables Intermedios  | 31/10/2016         |                | 29/12/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 48 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario de limpieza CEBAF SAN MIGUEL, ejecutado.   | 5-Entregables Intermedios  | 29/12/2016         |                | 29/12/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 49 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: "Y" de Tarapoa - Puente Chiritza, realizado     | 9-Entregables Formales     | 29/12/2016         |                | 29/12/2016 |          | Sí            | 1.0           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 50 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: El Higerón - Puente Biprovincial, realizado       | 5-Entregables Intermedios              | 29/12/2016         |                | 29/12/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 51 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Jambelí - Puente Puchochoa, realizado             | 5-Entregables Intermedios              | 29/12/2016         |                | 29/12/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 52 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Jivino Verde - Shushufindi - Yamanunca, realizado | 5-Entregables Intermedios              | 29/12/2016         |                | 29/12/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 53 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Lumbaquí - Puente Chingual, realizado             | 5-Entregables Intermedios              | 29/12/2016         |                | 29/12/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 54 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Nueva Loja - Jambelí, realizado                   | 5-Entregables Intermedios              | 29/12/2016         |                | 29/12/2016 |          | Sí            | 2.0           |
| 55 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Puente El Palmar - El Higerón, realizado          | 5-Entregables Intermedios              | 29/12/2016         |                | 29/12/2016 |          | Sí            | 2.0           |
| 56 | EJECUCIÓN: Mantenimiento, Instalación y reparaciones del CEBAF SAN MIGUEL (Infraestructura), ejecutado.                         | 5-Entregables Intermedios              | 29/12/2016         |                | 29/12/2016 |          | Sí            | 2.0           |
| 57 | CIERRE: Acta de Recepción, firmada.   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/12/2016         |                | 30/12/2016 |          | Sí            | 1.0           |
| 58 | PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.   | 1-Solicitud de Información             | 02/05/2017         |                | 29/05/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 59 | PLANEACIÓN: Publicación en el portal de Compras Públicas, realizado.  | 2-Publicación de Pliegos               | 10/05/2017         |                | 29/05/2017 |          | Sí            | 2.0           |
| 60 | PLANEACIÓN: Resolución de Adjudicación, realizada.  | 3-Adjudicación                         | 15/05/2017         |                | 29/05/2017 |          | Sí            | 2.0           |
| 61 | EJECUCIÓN: Suscripción de Contratos, firmado  | 4-Inicio de Trabajo                    | 25/05/2017         |                | 29/05/2017 |          | Sí            | 2.0           |
| 62 | EJECUCIÓN: Bacheo Asfáltico Mayor, tramo: Simón Bolívar - Nueva Loja, realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 30/05/2017         |                | 29/07/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 63 | EJECUCIÓN: Bacheo Asfáltico Mayor, tramo: Lumbaquí - Cocha Seca, realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 30/05/2017         | 29/12/2017     |            |          | No            | 1.0           |
| 64 | EJECUCIÓN: Bacheo Asfáltico Mayor, tramo: Nueva Loja - Puerto El Carmen del Putumayo, realizado                                 | 5-Entregables Intermedios              | 30/05/2017         |                | 29/07/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 65 | EJECUCIÓN: Bacheo Asfáltico Mayor, tramo: Shushufindi - Aguarico 3, realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 30/05/2017         | 29/12/2017     |            |          | No            | 1.0           |
| 66 | EJECUCIÓN: Bacheo Asfáltico Mayor, tramo: Shushufindi - Puerto Itaya, realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 30/05/2017         | 29/12/2017     |            |          | No            | 1.0           |



HITOS

|    | Hito  | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 67 | EJECUCIÓN: Bacheo Asfáltico Mayor, tramo: Jivino Verde - Shushufindi, realizado   | 5-Entregables Intermedios  | 30/05/2017         |                | 29/07/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 68 | EJECUCIÓN: Construcción de muros de sostenimiento en la Red Vial Estatal de la Provincia, realizado                                       | 5-Entregables Intermedios  | 30/05/2017         |                | 29/12/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 69 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y desalojo en la carretera Lumbaqui -La Bonita, tramo: Lumbaqui - Río Palmar - Santa Bárbara, realizado. | 5-Entregables Intermedios  | 30/05/2017         |                | 29/05/2017 |          | Sí            | 2.0           |
| 70 | EJECUCIÓN: Mantenimiento de la carretera Lumbaqui - Julio Andrade, realizado  | 5-Entregables Intermedios  | 30/05/2017         |                | 29/05/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 71 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario de limpieza CEBAF SAN MIGUEL, ejecutado.   | 5-Entregables Intermedios  | 30/05/2017         |                | 29/05/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 72 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Lumbaqui - Cocha Seca, realizado                            | 5-Entregables Intermedios  | 30/05/2017         |                | 29/05/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 73 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Nueva Loja - Puerto El Carmen del Putumayo, realizado       | 5-Entregables Intermedios  | 30/05/2017         |                | 29/05/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 74 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Shushufindi - Aguarico 3, realizado                         | 5-Entregables Intermedios  | 30/05/2017         |                | 29/05/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 75 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Shushufindi - Puerto Itaya, realizado                       | 5-Entregables Intermedios  | 30/05/2017         |                | 29/05/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 76 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Simón Bolívar - Nueva Loja, realizado                       | 5-Entregables Intermedios  | 30/05/2017         |                | 29/05/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 77 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial rutinario y emergente con microempresas, tramo: Jivino Verde - Shushufindi, realizado                       | 5-Entregables Intermedios  | 30/05/2017         |                | 29/05/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 78 | EJECUCIÓN: Señalización Horizontal y vertical, Red Vial Estatal de la Provincia, realizado  | 5-Entregables Intermedios  | 30/06/2017         | 31/07/2018     |            |          | No            | 1.0           |
| 79 | PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.   | 1-Solicitud de Información | 01/02/2018         |                | 01/02/2018 |          | Sí            | 1.0           |
| 80 | EJECUCIÓN: Adquisición de material de construcción para trabajos de mantenimiento en la red vial estatal Provincial, realizado.           | 5-Entregables Intermedios  | 17/09/2018         | 17/09/2018     |            |          | No            | 1.0           |
| 81 | EJECUCIÓN: Limpieza y desbroce en la vía Lumbaqui - La Bonita, realizado.   | 5-Entregables Intermedios  | 31/10/2018         | 31/10/2018     |            |          | No            | 1.0           |

**HITOS**

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 82 | CIERRE: Acta Entrega Recepción definitiva, firmado.   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2018         | 31/12/2018     |            |          | No            | 1.0           |
| 83 | PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.2019   | 1-Solicitud de Información             | 15/01/2019         |                | 15/01/2019 |          | Sí            | 1.0           |
| 84 | EJECUCIÓN:Contratación de microempresas   | 5-Entregables Intermedios              | 01/05/2019         |                | 14/06/2019 |          | Sí            | 1.0           |
| 85 | CIERRE: Acta Entrega Recepción definitiva, firmado.   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 27/12/2019         |                | 15/11/2019 |          | Sí            | 1.0           |
| 86 | PLANEACIÓN: Certificación presupuestaria, obtenida 2020.  | 1-Solicitud de Información             | 31/07/2020         | 31/07/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 87 | EJECUCIÓN:Contratación de microempresas   | 5-Entregables Intermedios              | 31/08/2020         | 31/08/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 88 | EJECUCIÓN: Adquisición de herramientas menores y asfalto en caliente para trabajos de mantenimiento en la red vial estatal Provincial, realizado. | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2020         | 28/12/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 89 | EJECUCIÓN: Limpieza y desbroce en la Red Vial Estatal, realizado.   | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2020         | 31/12/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 90 | CIERRE: Acta Entrega Recepción definitiva, firmado.   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/01/2021         | 31/01/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 91 | PLANEACIÓN: Certificación presupuestaria, obtenida 2021.  | 1-Solicitud de Información             | 31/05/2021         | 31/05/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 92 | EJECUCIÓN:Contratación de microempresas   | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2021         | 30/06/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 93 | CIERRE: Acta Entrega Recepción definitiva, firmado.   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |


**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

|    | Supervisión   | Supervisor                 | Organización Supervisora     | Fecha de creación |
|----|---|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1  | EN EJECUCION  | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 16/09/2016        |
| 2  | EN EJECUCION  | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 24/07/2017        |
| 3  | EN EJECUCION  | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 16/06/2017        |
| 4  | EN EJECUCION  | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 22/05/2017        |
| 5  | EN EJECUCION  | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 21/04/2017        |
| 6  | EN EJECUCION  | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 21/03/2017        |
| 7  | EN EJECUCION  | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 20/02/2017        |
| 8  | EN EJECUCION  | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 27/12/2016        |
| 9  | Proyecto: K007MTOP MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 30/11/2016        |
| 10 | EN EJECUCION  | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 16/09/2016        |
| 11 | EN EJECUCION  | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 16/09/2016        |

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

|    | Supervisión   | Supervisor                 | Organización Supervisora     | Fecha de creación |
|----|---|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| 12 | EN EJECUCION  | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 11/05/2016        |
| 13 | EN EJECUCION  | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 13/04/2016        |
| 14 | GESTION DE RECURSOS   | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 17/11/2015        |
| 15 | PROYECTO: K007 MTOP - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS OCTUBRE DEL 2015. | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 20/10/2015        |
| 16 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN   | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 29/07/2015        |
| 17 | NO SE ESTA EJECUTANDO   | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 29/05/2015        |
| 18 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN   | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 30/04/2015        |
| 19 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION   | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 31/03/2015        |
| 20 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENE EJECUCION  | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 28/02/2015        |
| 21 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION   | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 28/01/2015        |
| 22 | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS   | Poma Herrera, Yofre Martín | {PR} - Provincia - SUCUMBÍOS | 11/12/2014        |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador  | Estado  | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Cumplimiento de activiades programadas en Mantenimiento Vial |  | 4.44 %            | 45   | 2                     | 01/01/2015      | Abr-Jun                    |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 33,685,970.66 ** |
| Costo Total:                  | 72,959,803.16    |
| Total Devengado:              | 26,383,777.04    |
| % Costo Total Devengado:      | 36.16 %          |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 36.16 %

Perfil Económico 2020

|   | Años Previos    | Año Actual (2020) | Años Futuros | Total         |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado  | 42,456,201.29   | 15,390,212.50     | 0.00         | 57,846,413.79 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 32,633,340.88   | 2,000,000.00      | 0.00         | 34,633,340.88 |
| Ppto. Codificado  | 48,659,466.48   | 7,462,982.98      | 0.00         | 56,122,449.46 |
| Ppto. Comprometido                                      | 41,419,089.49   | 4,104,874.17      | 0.00         | 45,523,963.66 |
| Planeado - Codificado (2020)                            |                 | 7,927,229.52      |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 47,156,312.33   | 7,462,982.98      | 0.00         | 54,619,295.31 |
| Ppto. Devengado   | 26,222,987.68   | 160,789.36        | 0.00         | 26,383,777.04 |
| Pagado Real   | 17,636,490.48   | 60,443.73         | 0.00         | 17,696,934.21 |
| Estimado a fin de año                                   | * 26,222,987.68 | 0.00              | 0.00         | 26,222,987.68 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 20,933,324.65   | 7,462,982.98      | 0.00         | 28,396,307.63 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 55.61 %       | 2.15 %            | 0.00 %       | 48.30 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 512,873.60      | 0.00              | 0.00         | 512,873.60    |
| Ppto. Devengado 998                                     | 512,873.60      | 0.00              | 0.00         | 512,873.60    |

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

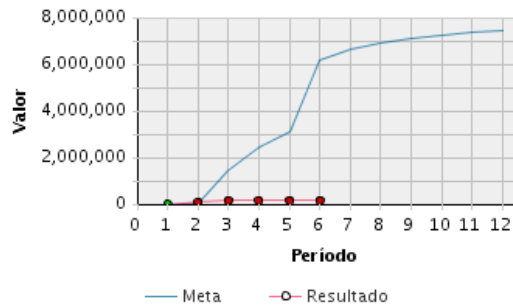

Presupuesto Mensual 2020

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2020 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 14,937.98                  | 70,442.09           | 14,937.98                    | 70,442.09             | 471.56 %         |        | 0.94 %       |
| Mar                      | 1,439,576.18               | 75,850.42           | 1,454,514.16                 | 146,292.51            | 10.06 %          |        | 1.96 %       |
| Abr                      | 979,434.79                 | 225.25              | 2,433,948.95                 | 146,517.76            | 6.02 %           |        | 1.96 %       |
| May                      | 674,207.81                 | 13,905.77           | 3,108,156.76                 | 160,423.53            | 5.16 %           |        | 2.15 %       |
| Jun                      | 3,052,558.57               | 365.83              | 6,160,715.33                 | 160,789.36            | 2.61 %           |        | 2.15 %       |
| Jul                      | 504,833.39                 |                     | 6,665,548.72                 |                       |                  |        |              |
| Ago                      | 252,817.08                 |                     | 6,918,365.80                 |                       |                  |        |              |
| Sep                      | 208,250.38                 |                     | 7,126,616.18                 |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 116,361.42                 |                     | 7,242,977.60                 |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 108,605.16                 |                     | 7,351,582.76                 |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 111,400.22                 |                     | 7,462,982.98                 |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>7,462,982.98</b>        | <b>160,789.36</b>   |                              |                       |                  |        |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |   |
|----------------------|---|
| 17                   | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 18                   | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.  |
| 19                   | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.                      |
| 20                   | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.                                    |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                   | Archivo                              | Fecha de Alta |
|----|--|--------------------------------------|---------------|
| 1  | A1 CONTRATOS MICROEMPRESAS Y MANTENIMIENTO VIAL SUCUMBOS | CONTRATOS_MANTE_VIAL_SUCU.xls        | 24/04/2012    |
| 2  | A2 FOTOGRAFIA DEL MANTENIMIENTO VIAL SUCUMBOS            | MANTENIMIENTO_VIAL_SUCUMBOS.pdf      | 24/04/2012    |
| 3  | A3 INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESA FLOR DEL VALE          | flor_del_valle.pdf                   | 10/05/2012    |
| 4  | A4 INFORME EJECUTIVO ABRIL MICROEMPRESA LA BONITA        | la_bnita.pdf                         | 10/05/2012    |
| 5  | A5 DEVENGADO MES DE MAYO                                 | DEVENGAD_MAYO_2.pdf                  | 08/06/2012    |
| 6  | A6 PLANILLA MICROEMPRESA SANTA BARBARA A MAYO 2012       | planilla_santa_barbara_0512.pdf      | 08/06/2012    |
| 7  | A7 Ejecución Junio 2012                                  | Ejecucion_Junio_2012.pdf             | 09/07/2012    |
| 8  | A8 PLANILLA JUNIO 2012                                   | señalizacion_junio_2012.pdf          | 09/07/2012    |
| 9  | A9 PLANILLA MICROEMPRESA SAN FRANCISCO A JUNIO 2012      | san_francisco_junio_2012.pdf         | 09/07/2012    |
| 10 | B1 PLANILLA LA BONITA A JUNIO 2012                       | planilla_la_bonita_a_junio.pdf       | 09/07/2012    |
| 11 | B2 PLANILLA DE AVANCES MICROEMPRESA JULIO                | PLANILLA_MICROEMPRESA_JULIO.pdf      | 13/08/2012    |
| 12 | B3 PLANILLA SANTA BARBARA A JULIO                        | PLANILLA_SANTA_BARBARA_JULIO.pdf     | 13/08/2012    |
| 13 | B4 DEVENGADO JULIO                                       | Julio_-_2012_DEVENGADO.xls           | 13/08/2012    |
| 14 | B5 DEVENGADO A AGOSTO 2012                               | Ejecucion_Agosto_2012.pdf            | 05/09/2012    |
| 15 | B6 Ejecución Presupuestaria Septiembre                   | Ejecucion_Septiembre_del_2012(1).pdf | 05/10/2012    |



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo  | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 16 | B7 INFORME MICROEMPRESAS NOV  | INFORMES_MICROEMPRESAS_SUCUMBIOS_-11-_2012.xls                                  | 08/01/2013    |
| 17 | B8 INFORME MICROEMPRESAS DIC  | INFORMES_MICROEMPRESAS_SUCUMBIOS_-12-_2012.xls                                  | 08/01/2013    |
| 18 | B9 MICROEMPRESAS CONTRATADAS  | INFORMES_MICROEMPRESAS_SUCUMBIOS_-03-_2013.xls                                  | 06/05/2013    |
| 19 | C1 DEVENGADO MES DE MAYO 2013   | REPORTE_MES_DE_MAYO_devengado.pdf   | 07/06/2013    |
| 20 | C2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2013  | Reporte_de_Ejecucion_mes_de_Junio_2013[1].pdf                                   | 05/07/2013    |
| 21 | C3 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2013 SANTA BARBARA                               | INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_JUNIO_2013_SANTA BARBARA.pdf                     | 05/07/2013    |
| 22 | C4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO 2013                                    | Reporte_Ejecucion_Agosto_2013[1].pdf  | 06/09/2013    |
| 23 | C5 FOTOGRAFIA DE PROYECTO AL 23 DE AGOSTO 2013                                    | Reporte_Ejecucion_Agosto_2013[1].pdf  | 06/09/2013    |
| 24 | C6 INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE AGOSTO 2013, MICROEMPRESA FLOR DEL VALLE        | informe_ejecutivo_mantenim_vial_mes_de_Agosto_2013.pdf                          | 06/09/2013    |
| 25 | C7 INFORME EJECUTIVO SITO JULIO 2013  | INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JULIO_2012.pdf  | 13/11/2013    |
| 26 | C8 Informe ejecutivo sitop oct 2013   | INFORME_EJECUTIVO_SITOP_oct_2012.pdf  | 14/11/2013    |
| 27 | C9 INFORME EJECUTIVO SITOP NOV 2013   | informe_ejecutivo_sitop_nov_mant_vial.pdf                                       | 09/12/2013    |
| 28 | D1 DEVENGADO MES DE NOVIEMBRE   | REPORTE_MES_DE_NOV_2013[1].pdf  | 10/12/2013    |
| 29 | D2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE 2014                                 | Reporte_Ejecucion_Dic2013.pdf   | 08/01/2014    |
| 30 | D3 INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE DICIEMBRE 2013                                  | informe_ejecutivo_sitop_microempresa_rio_chingual_dic_2013.pdf                  | 08/01/2014    |
| 31 | D4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE FEBERO 2014                                    | A1_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA_MES_DE_FEBRERO_2014.pdf                             | 12/03/2014    |
| 32 | D5 SOPORTE HITO 24 (FEBRERO 2014)   | A2_SOPORTE_HITO_24.pdf  | 14/03/2014    |
| 33 | D6 SOPORTE HITO 23 (FEBRERO DEL 2014)   | A3_SOPORTE_HITO_23.pdf  | 14/03/2014    |
| 34 | D7 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TRABAJOS 2013, ASOCIADO CON HOTO 23 (FEBRERO 2014)      | A4_ACTA_ENTREGA_RECEPCIÓN_TRABAJOS_2013_ASOCIADO CON HITO_23 (FEBRERO 2014).pdf | 04/03/2014    |
| 35 | D8 EJECUCION PRESUPUESTARIA MARZO   | A5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_MARZO.pdf   | 15/04/2014    |
| 36 | D9 CONTRATO MICROEMPRESA (SOPORTE DE HITO N°25)                                   | A6_CONTRATO_MICROEMPRESA_(SOPORTE_DE_HITO_N°25).pdf                             | 15/04/2014    |
| 37 | E1 INFORME TRABAJO JUNIO 2014   | A7_informe_trabajo.docx   | 03/07/2014    |
| 38 | E2 planilla 3   | A8_planilla_3.docx  | 03/07/2014    |
| 39 | E3 JUSTIFICACIÓN PROBLEMA CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA (ASOCIADO CON HITO N°30) | A9_JUSTIFICACION_PROBLEMA.pdf   | 03/07/2014    |
| 40 | E4 INFORMES_MICROEMPRESAS_SUCUMBIOS_-03-_2014                                     | B1_INFORMES_MICROEMPRESAS_SUCUMBIOS_-03-_2014.xls                               | 01/08/2014    |
| 41 | E5 INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE JULIO   | B2_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_JULIO.pdf                                     | 21/08/2014    |
| 42 | E6 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2014  | B3_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AGOSTO_2014.pdf                                      | 10/09/2014    |
| 43 | E7 EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2014   | B4_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2014.pdf                                     | 10/09/2014    |
| 44 | E8 INFORME EJECUTIVO SITOP OCT 2014   | B5_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_OCT_2014.pdf   | 10/11/2014    |
| 45 | E9 INFORME EJECUTIVO SITOP NOV2014  | B6_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_NOV2014.pdf  | 10/12/2014    |
| 46 | F1 INFORME EJECUTIVO SITOP MANT VIAL DIC  | B7_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MANT_VIAL_DIC.pdf                                    | 23/01/2015    |
| 47 | F2 INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO 2015   | B8_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ENERO_2015.pdf                                       | 10/02/2015    |
| 48 | F3 FOTOGRAFIA DE TRABAJOS REALIZADOS MES DE FEBRERO                               | Foto0173.jpg  | 11/03/2015    |
| 49 | F4 FOTOGRAFIA DE TRABAJOS REALIZADOS MES DE FEBRERO DEL 2015                      | B9_FOTOGRAFIA_DE_TRABAJOS_REALIZADOS_MES_DE_FEBRERO_DEL_2015.jpg                | 11/03/2015    |
| 50 | F5 INFORME EJECUTIVO MES DE FEBRERO 2015  | C1_INFORME_EJECUTIVO_MES.pdf  | 12/03/2015    |
| 51 | F6 INFORME EEJCUTIVO SITOP ABRIL 2015   | C2_INFORME_EEJCUTIVO_SITOP_ABRIL_2015.pdf                                       | 11/05/2015    |
| 52 | F7 Contrato microempresa Nuevo Horizonte  | Contrato_microempresa_Nuevo_Horizonte.pdf                                       | 30/09/2015    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 53 | F8 Contrato microempresa Nuevo Oriente   | Contrato_microempresa_Nuevo_Oriente.pdf  | 30/09/2015    |
| 54 | F9 Contrato microempresa Santa Barbara   | Contrato_microempresa_Santa_Barbara.pdf  | 30/09/2015    |
| 55 | G1 Es necesario realizar un bacheo integral en la Provincia  | baches_4.JPG   | 30/10/2015    |
| 56 | G2 El Puente sobre el río El Oso está por colapsar   | DSC04868.JPG   | 30/10/2015    |
| 57 | G3 ACTIVIDADES CONTRATADAS OCT-DIC 2015  | mantenimiento_vial_oct-dic.pdf   | 04/01/2016    |
| 58 | G4 INFOME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2016 - INICIO DE TRABAJOS DE MICROEMPRESAS 2016 CATALOGADAS EN EL SERCOP | ABRIL_2016_-_SERCOP.-_ORDEN_DE_COMPRA_CONTRATACIÓN_DE_MANTENIMIENTO_VIAL_RUTINARIO.pdf | 05/05/2016    |
| 59 | G5 INFOME EJECUTIVO SITOP MAYO 2016 - MICROEMPRESAS 2016 CATALOGADAS EN EL SERCOP                        | INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_MAYO_2016.pdf  | 06/06/2016    |
| 60 | G6 INFOME EJECUTIVO JUNIO 2016 - MICROEMPRESAS 2016 CATALOGADAS EN EL SERCOP                             | OC_Aso_Sin_Fronteras_Junio_2016.PDF  | 27/06/2016    |
| 61 | G7 DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA TRAMO VIA LUMBAQUI-LABONITA-JULIO ANDRADE                        | ACUERDO_MINISTERIAL_No__0025.pdf   | 29/07/2016    |
| 62 | G8 REPORTE MICROEMPRESAS DE CONSERVACION VIAL SEP-OCT 2016   | C8_REPORTE_MICROEMPRESAS_DE_CONSERVACION_VIAL1_SEPT_OCT_2016.pdf                       | 01/11/2016    |
| 63 | G9 LISTADO DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACION VIAL NOVIEMBRE 2016  | MICROEMPRESAS_-_Noviembre_2016.xls   | 07/12/2016    |
| 64 | H1 LISTADO DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACION VIAL DICIEMBRE 2016  | Asociaciones_de_conservacion_vial_contratadas.pdf                                      | 05/01/2017    |
| 65 | H2 MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DIRECTA MARZO 2017   | MANTENIMIENTO_PROVINCIA_DE_SUCUMBOS.pdf  | 28/03/2017    |
| 66 | H3 RESOLUCION PARA CONTRATACION DE MICROEMPRESAS ABRIL 2017  | RESOLUCION_MICROEMPRESAS_ABRIL_2017.pdf  | 09/05/2017    |
| 67 | H4 CONTRATO DE BACHEO ASFALTICO MAYOR NUEVA LOJA - CASCALES  | SERVIVALENTIN_NUEVA_LOJA_CASCALES_CONTRATO_270617.pdf                                  | 27/06/2017    |
| 68 | H5 CONTRATO BACHEO ASFALTICO MAYOR SIMON BOLIVAR - CASCALES  | ING._FIERRO_(SIMON_BOLIVAR_CASCALES)_contrao_2_2017.pdf                                | 27/06/2017    |
| 69 | H6 CONTRATO BACHEO ASFALTICO MAYOR - JIVINO VERDE - SHUSHUFINDI  | ING._FIERRO_(JIVINO)_CONTRATO_1.pdf  | 27/06/2017    |
| 70 | H7 CONTRATO BACHEO ASFALTICO MAYOR CUYABENO - PUERTO EL CARMEN   | CONTRATO_CONSTRUCRUZVAL.pdf  | 27/06/2017    |
| 71 | H8 CONTRATO DE BACHEO ASFALTICO MAYOR CARRETERA NUEVA LOJA - CASCALES.                                   | CONTRATO_2_CONSTRUCRUZVAL.pdf  | 27/06/2017    |
| 72 | H9 RESOLUCION PARA LA CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS  | resolución_de_inicio.htm   | 05/09/2017    |
| 73 | I1 CONTRATACIÓN DE MICROEMPESAS  | CONTRATACION_DE_MICROEMPRESAS.JPG  | 02/11/2017    |
| 74 | I2 INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2017  | INFORME_EJECUTIVO_SITOP_NOVIEMBRE_2017.pdf   | 06/12/2017    |
| 75 | I3 CONTRATACIÓN DE MICROEMPESAS  | micro_empresa_2017_Diciembre.pdf   | 05/01/2018    |
| 76 | I4 CONTRATACIÓN DE MICROEMPESAS  | k007.pdf   | 05/07/2019    |
| 77 | I5 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA   | Informe_de_necesidad_de_maquinaria.pdf   | 05/07/2019    |
| 78 | I6 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL   | Solicitud_de_contratación_de_personal.pdf  | 05/07/2019    |
| 79 | I7 ACTUALIZACION DE PROYECTOS  | Actualización_de_información_de_proyectos.pdf  | 05/07/2019    |
| 80 | I8 DEVENGADO MES DE FEBRERO  | DEVENGADO__2019-02.pdf   | 26/07/2019    |
| 81 | I9 DEVENGADO MES DE MARZO  | DEVENGADO__2019-03.pdf   | 26/07/2019    |
| 82 | J1 DEVENGADO MES DE ABRIL  | DEVENGADO_2019-04.pdf  | 26/07/2019    |
| 83 | J2 DEVENGADO MES DE MAYO   | DEVENGADO_2019-05.pdf  | 26/07/2019    |
| 84 | J3 DEVENGADO MES DE JUNIO  | DEVENGADO_2019-06.pdf  | 26/07/2019    |
| 85 | J4 DEVENGADO MES DE JULIO  | DEVENGADO_2019-07.pdf  | 01/08/2019    |
| 86 | J5 DEVENGADO MES DE AGOSTO   | DEVENGADO_2019-08.PDF  | 05/09/2019    |
| 87 | J6 DEVENGADO MES DE SEPTIEMBRE   | DEVENGADO_2019-09.PDF  | 01/10/2019    |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                  | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 88 | J7 DEVENGADO MES DE OCTUBRE                             | DEVENGADO_2019-10.PDF   | 18/11/2019    |
| 89 | J8 COSTO TOTAL DE PROYECTO                              | Ficha_Proyecto_K007.pdf                                       | 28/11/2019    |
| 90 | J9 DEVENGADO MES DE NOVIEMBRE                           | DEVENGADO_2019-11.PDF   | 18/12/2019    |
| 91 | K1 DEVENGADO MES ENERO-2020                             | CEDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO-2020.PDF                          | 05/03/2020    |
| 92 | K2 DEVENGADO MES FEBRERO-2020                           | CEDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO-2020.PDF                        | 05/03/2020    |
| 93 | K3 DEVENGADO MES DE MARZO                               | DEVENGADO_2020-03.PDF   | 03/04/2020    |
| 94 | K4 DEVENGADO MES DE ABRIL_2020                          | Devengado_Abril_2020.PDF                                      | 04/05/2020    |
| 95 | K5 CONTRATACIONES MICROEMPRESAS 2019_ ORDENES DE COMPRA | CONTRATACION_MICROEMPRESAS_2019_ORDENES_DE_COMPRA-Parte_1.pdf | 02/06/2020    |
| 96 | K6 CONTRATACIONES MICROEMPRESAS 2019_ ORDENES DE COMPRA | CONTRATACION_MICROEMPRESAS_2019_ORDENES_DE_COMPRA-Parte_2.pdf | 02/06/2020    |
| 97 | K7 ACTAS MICROEMPRESAS 2019                             | ACTAS_MICROEMPRESAS_2019.pdf                                  | 02/06/2020    |
| 98 | K8 DEVENGADO MES DE MAYO_2020                           | DEVENGADO_MAYO_2020.PDF                                       | 04/06/2020    |
| 99 | K9 DEVENGADO MES DE JUNIO_2020                          | DEVENGADO_JUNIO_2020.PDF                                      | 03/07/2020    |

### EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                           | Rol                             | Puesto  | Correo Electrónico   | Teléfono(s) |
|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|-------------|
| Arizaga Davila, Leoncio Abelardo | Lider del Proyecto              | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Sucumbios, Encargado | aarizaga@mtop.gob.ec | 023974600   |
| Cruz Chicaiza, Rene Alejandro    | Patrocinador Ejecutivo          | Subsecretario Zonal 1   | ccruz@mtop.gob.ec    | 023974600   |
| Noroña, Víctor                   | Supervisor Financiero           | Analista  | vnorona@mtop.gob.ec  | Ext. 13706  |
| Solano Blacio, Wimper Vicente    | Director Distrital de Sucumbíos |   | salio@mtop.gob.ec    |             |

### FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo    | Fecha de Alta |
|------------|---------------|
| 3941_1.jpg | 04/04/2020    |
