

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1

Dirección Provincial Esmeraldas

PROYECTO: K037 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de Esmeraldas

Líder del Proyecto:	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto (galdas@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cruz Chicaiza, Carlos René Alejandro	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, MTOP - RUTA DE SPONDYLUS, Provincia - Esmeraldas, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, STPE - Inversión en 40km de frontera norte
Titular:	Valencia Lara, Gustavo Stalin	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3743	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	50,996,518.53
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2011 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	05/11/2020	Fecha de Fin Base:	26/05/2014
Modificado por:	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2020

DATOS GENERALES

Descripción

La provincia de Esmeraldas tiene toda su red vial estatal contratadas, con proyectos que contemplan ampliaciones y que según su programación terminan de ejecutarse en el año 2012, es necesario la realización de este proyecto para el Mantenimiento de estos trabajos .

Montos:

Av. Colon: \$ 743981.30 USD. Contratista: SANCHEZ REAL ANGEL MARCELO

Av. Eloy Alfaro: \$ 736015.36 USD. Contratista: ALARCON SORNOZA BELFORT ANDRES

Esmeraldas - Súa: \$ 2072099.73 USD. Contratista: EDME S.A.

Mantenimiento rutinario y emergente por microempresas: \$ 501071.63 USD. Contratistas: Asociaciones de Mantenimiento Vial

OBJETIVO GENERAL:

Mantener la Red Vial Estatal en buen estado, mediante un plan de mantenimiento vial continua, cubriendo requerimientos de infraestructura adecuada de primer nivel.

Mejorar la movilidad de conectividad de la provincia de Esmeraldas mediante el mantenimiento de la Red Vial Estatal, garantizando la seguridad de los usuarios y el desarrollo económico, productivo y social de la provincia de Esmeraldas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

.Mejorar la infraestructura de la provincia de Esmeraldas, mediante convenio de cooperación interinstitucional con las municipalidades de los cantones de la provincia de Esmeraldas

.Realizar actividades de mantenimiento vial que permitan mantener las carreteras de la RVE provincial en buen estado

Línea Base: Estos proyectos se iniciaron con la venida del Señor Presidente de la República y al observar el estado deplorable de las calles se comprometió asfaltar las mismas, siendo un compromiso presidencial, por eso se intervino en las calles: Eloy Alfaro, Colón, 6 de Diciembre, Olmedo, Sucre, Av. Kennedy, Av. Libertad y en los Barrios Unidos Somos Más, 24 de Mayo y el 15 de Marzo que por motivos ajenos al Ministerio el Contratista no cumplió con el objeto del contrato, teniendo que terminar Unilateralmente.

Producto: Asfaltado, construcción de parterres, jardinería, instalaciones hidráulicas para agua potable y alcantarillado.

DATOS GENERALES

Descripción

- 1.- Mantenimiento y reparación de gabarra propiedad del MTOP que se encuentra en el cantón Eloy Alfaro
- 2.- Pavimentación de las Calles "Padre Lino Campesan" y "Armada Nacional" del Cantón San Lorenzo
- 3.- Asfaltado de la calle Olmedo en la ciudad de Esmeraldas
- 4.- Mantenimiento del camino vecinal Limón-Zabaletita del Medio, en el Cantón Quinindé
- 5.- Asfaltado de la calle Colón en la ciudad de Esmeraldas
- 6.- Asfaltado de la calle Eloy Alfaro en la ciudad de Esmeraldas
- 7.- Lastrado de carretera Las Piedras- Barrio 21 de noviembre -Parroquia Tachina-ciudad de Esmeraldas
- 8.- Trabajo de Asfaltado de las Calles desde el León hasta la "Y" de Tabiazo, Avenida Libertad y Kennedy, Avenida Sucre, Avenida 6 de Diciembre, en el Cantón Esmeraldas
- 9.- Asfaltado de las calles del barrio 24 de Mayo de la ciudad de Esmeraldas
- 10.- Asfaltado de las calles del barrio Unidos somos Más de la ciudad de Esmeraldas
- 11.- Señalización horizontal, vertical y seguridad vial de la vía San Lorenzo- Mataje
- 12.- Señalización horizontal, vertical y seguridad vial de la vía Y de Borbón- Borbón
- 13.- Señalización horizontal, vertical y seguridad vial de la vía Paso Lateral de Atacames
- 14.- Mantenimiento del puente metálico ubicado sobre el río Blanco en el cantón Quinindé
- 15.- Mantenimiento del puente metálico ubicado sobre el río Tululbí en el cantón San Lorenzo
- 16.- Mantenimiento del puente metálico ubicado sobre el río Viche en el cantón Quinindé
- 17.- Mantenimiento del puente metálico ubicado sobre el río Quinindé en el cantón Quinindé
- 18.- Mantenimiento del puente Calderón en el cantón Atacames

Localidades de intervención:

- 1) Cantón Esmeraldas
- 2) Cantón Atacames
- 3) Cantón Eloy Alfaro
- 4) Cantón Muisne
- 5) Cantón Quinindé
- 6) Cantón Rioverde
- 7) Cantón San Lorenzo

Beneficios Cualitativos

Mantener en buen estado las carreteras y puentes en los que intervengan el Ministerio de Transporte y Obra Públicas. con proyectos de arrastre

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Directos.

El siguiente perfil tiene como beneficiarios directos a los habitantes de toda la provincia de Esmeraldas.

MUJERES 262.780
HOMBRES 271.312

TOTAL 534.092

Beneficiarios Indirectos:

Son los turistas, comerciantes que llegan a la provincia de Esmeraldas.

Restricciones

COSTO: Los recursos presupuestarios para Mantenimiento Vial no cubren todo el año

TIEMPO: Por falta de asignación de recursos no se cumpliría con el cronograma elaborado

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 90.14 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

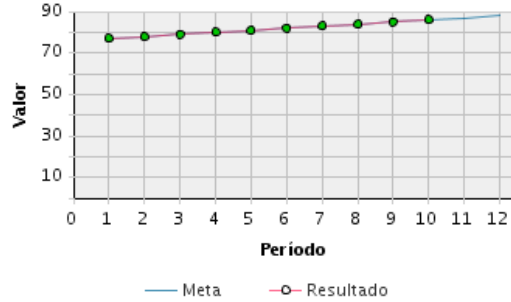

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	77 %	78 %	79 %	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	86 %	87 %	88 %
	Avance real acumulado											
	77 %	78 %	79 %	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	86 %		
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2020:</p> <p>Cumplen su último mes de contrato las 11 micro empresas cumpliendo el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que iniciaron de labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/11/2020 - 11:41 AM
<p>SEPTIEMBRE 2020:</p> <p>Al momento se encuentran contratadas las 11 micro empresas cumpliendo el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que iniciaron de labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/10/2020 - 11:01 AM
<p>AGOSTO 2020:</p> <p>Al momento se encuentran contratadas las 11 micro empresas cumpliendo el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que iniciaron de labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19, el Ministerio de Finanzas adeuda varias planillas a las asociaciones de conservación vial.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	04/09/2020 - 01:42 PM
<p>JULIO 2020:</p> <p>Al momento se encuentran contratadas las 11 micro empresas cumpliendo el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que iniciaron de labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19, sin presentarse novedades.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/08/2020 - 08:59 PM
<p>JUNIO 2020:</p> <p>Al momento se encuentran contratadas las 11 micro empresas cumpliendo el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que iniciaron de labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	03/07/2020 - 12:51 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2020:</p> <p>Mediante memorando MTOP-ADM_ESM-2020-126-ME, se dio a conocer que de las 11 micro empresas a ser contratadas para los 11 tramos del Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, se han generado nueve (9) Ordenes de Compra de Catálogo Electrónico, las mismas que iniciaron de labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas además se realiza mantenimiento por Administración Directa.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/06/2020 - 11:28 AM
<p>ABRIL 2020:</p> <p>Mediante memorando MTOP-ADM_ESM-2020-126-ME, se dio a conocer que de las 11 micro empresas a ser contratadas para los 11 tramos del Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, se han generado nueve (9) Ordenes de Compra de Catálogo Electrónico, cabe indicar que por la emergencia sanitaria su inicio de labores esta paralizado hasta segunda orden, pero se ha realizado mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas por Administración Directa.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/05/2020 - 08:46 AM
<p>MARZO 2020:</p> <p>A la fecha no se han contratado microempresas por modificaciones en trámites administrativos y renovar la solicitud de partida presupuestaria, pero se ha realizado mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/04/2020 - 10:24 AM
<p>FEBRERO 2020:</p> <p>A LA FECHA NO SE HAN CONTRATADO MICROEMPRESAS POR FATLA DE PARTIDA PRESUPUESTARIA, PERO SE HA REALIZADO MANENIMIENO RUINERIO A LA RED VIAL DE ESMERALDAS</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/03/2020 - 04:29 PM
<p>ENERO 2020:</p> <p>Se realizó mantenimiento por administración directa, con respecto a las 17 microempresas las mismas que se encuentran realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, se espera realizar la contratación a mediados de febrero de 2020. Se informa que se encuentran asigandos los recurso mediante memorando No. MTOP-FINAN_ESM-2020-19-ME, de fecha 31 de enero de 2020.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/02/2020 - 02:45 PM
<p>DICIEMBRE 2019:</p> <p>Se realizó mantenimiento por administración directa, con respecto a las 17 microempresas las mismas que se encontraban realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, terminaron su contrato septiembre 2019, se suscribio las respectivas Actas de Recepción Única.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	03/01/2020 - 10:47 AM
<p>NOVIEMBRE 2019:</p> <p>Se realizó mantenimiento por administración directa, con respecto a las 17 microempresas las mismas que se encontraban realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, terminaron su contrato septiembre 2019, se suscribio las respectivas Actas de Recepción Única, por el momento se encuentra etapa precontractual de atención a puntos críticos y bacheos para finalizar el año 2019.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/12/2019 - 11:37 AM
<p>OCTUBRE 2019:</p> <p>Se realizó mantenimiento por administración directa, con respecto a las 17 microempresas las mismas que se encontraban realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, terminaron su contrato septiembre 2019, en elaboración las Acta de Recepción Única, se esta solicitando presupuesto para meses faltantes del año, mediante un memorando MTOP-DDE-2019-875-ME, sin respuesta.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/11/2019 - 09:00 AM
<p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <p>Se realizó mantenimiento por administración directa, con respecto a las 17 microempresas las mismas que se encuentran realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, terminaron su contrato septiembre 2019, en elaboración las Acta de Recepción Única, se esta solicitando presupuesto para 3 meses más, mediante un memorando MTOP-DDE-2019-875-ME.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	04/10/2019 - 10:30 AM
<p>AGOSTO 2019:</p> <p>Se realizó mantenimiento por administración directa y bacheos viales, con respecto a las 17 microempresas se encuentran realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/09/2019 - 12:46 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, en vista que en septiembre termina sus contrato se esta solicitando presupuesto para 3 meses más.		
<p>JULIO 2019:</p> <p>Se realizó mantenimiento por administración directa y bacheos viales, con respecto a las 17 microempresas se encuentran realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, también continúan colaboración en los bacheos.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	02/08/2019 - 10:05 AM
<p>JUNIO 2019:</p> <p>Se realizó mantenimiento por administración directa y bacheos viales, con respecto a las 17 microempresas se encuentran realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, también se solicitó la colaboración en los bacheos.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	03/07/2019 - 11:27 AM
<p>MAYO 2019:</p> <p>Se realizó mantenimiento por administración directa, con respecto a las microempresas se suscribió 17 órdenes de compras, las cuales realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	04/06/2019 - 12:32 PM
<p>ABRIL 2019:</p> <p>Se realizó mantenimiento por administración directa, con respecto a las microempresas se suscribió 17 órdenes de compras, las cuales comenzaron sus trabajos a mediados del mes de abril 2019, con trabajos de mantenimiento rutinario en los tramos de la RVE de Esmeraldas.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	02/05/2019 - 08:37 AM
<p>MARZO 2019:</p> <p>Se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas terminaron su orden de compra, se espera contratarlas desde mayo 2019.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	03/04/2019 - 09:33 AM
<p>FEBRERO 2019:</p> <p>Se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas terminaron su orden de compra, se espera contrarlas desde abril 2019.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	01/03/2019 - 04:04 PM
<p>ENERO 2019:</p> <p>Se cumplió con el último mes de las labores y actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, se le ha realizado charlas a las asociaciones para que realicen de mejor manera su labor, se realizó la presentación y cambio de Fiscalizador, también se realiza mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía, la orden de compra vigente finalizó por lo que se debe realizar una nueva contratación para este año.</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	05/02/2019 - 03:22 PM
<p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>Se cumple mes a mes con las labores y actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, se le ha realizado charlas a las asociaciones para que realicen de mejor manera su labor, se realizó la presentación y cambio de Fiscalizador, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía, existen retrasos con la acreditación de los pagos de las planillas por parte del Ministerio de Finanzas.</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	04/01/2019 - 11:57 AM
<p>NOVIEMBRE 2018:</p> <p>Se cumple mes a mes con las labores y actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, se le ha realizado charlas a las asociaciones para que realicen de mejor manera su labor, se realizó la presentación y cambio de Fiscalizador, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía, existen retrasos con la acreditación de los pagos de las planillas por parte del Ministerio de Finanzas.</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	03/12/2018 - 12:27 PM
<p>OCTUBRE 2018:</p> <p>Se cumple mes a mes con las labores y actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	05/11/2018 - 08:58 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2018:</p> <p>Se cumple mes a mes con las labores y actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, se le ha realizado charlas a las asociaciones para que realicen de mejor manera su labor, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía.</p>	Estupiñan Echeverría, Victor Hugo	01/08/2018 - 11:11 AM
<p>JUNIO 2018:</p> <p>Se ha cumplido con el primer mes de labores con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía.</p>	Estupiñan Echeverría, Victor Hugo	05/07/2018 - 08:43 AM
<p>MAYO 2018:</p> <p>Se ha cumplido con el primer mes de labores con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/06/2018 - 02:59 PM
<p>ABRIL 2018:</p> <p>Se ha cumplido con el primer mes de labores con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, también se realizó mantenimiento por administración directa.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	04/05/2018 - 05:44 PM
<p>MARZO 2018:</p> <p>Se ha cumplido con el primer mes de labores con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/04/2018 - 04:42 PM
<p>FEBRERO 2018:</p> <p>A inicios de febrero una vez contratadas las 17 microempresas de conservación vial las cuales cubren en su totalidad la red vial estatal en la Provincia de Esmeraldas, cada una cuenta con 10 personas y realizan trabajos de mantenimiento en un tramo de aproximadamente 30 km, la contratación de esta ha sido por 12 meses, estas iniciaron su trabajo con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	19/03/2018 - 08:49 AM
<p>ENERO 2018:</p> <p>No existió contratación por espera de asignación presupuestaria a partir de febrero se realizó las contrataciones de 17 microempresas para toda la red vial estatal.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	21/02/2018 - 02:33 PM
<p>DICIEMBRE 2017:</p> <p>El 27 de diciembre de 2017 se terminarán los contratos de 17 microempresas de conservación, en espera de recursos para contratar en el 2018</p> <p>Además en el sector de Tacusa hasta Río verde se continúan con las labores de limpieza de alcantarillas por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/01/2018 - 03:53 PM
<p>NOVIEMBRE 2017:</p> <p>Las 17 microempresas de conservación realizarán actividades de mantenimiento rutinario de roza mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, en todas las Red Vial Estatal de Esmeraldas a cargo de la Dirección Distrital de Esmeraldas.</p> <p>Además en el sector de Pegue se continúan con las labores de limpieza de alcantarillas por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital. Se esta por legalizar los contratos de mantenimiento vial (Señalización horizontal)</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/12/2017 - 03:09 PM
<p>OCTUBRE 2017:</p> <p>Las 17 microempresas de conservación realizarán actividades de mantenimiento rutinario de roza mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, en todas las Red Vial Estatal de Esmeraldas a cargo de la Dirección Distrital de Esmeraldas.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	01/11/2017 - 09:00 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Además en el sector de Pegue se continúan con las labores de limpieza de alcantarillas por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.		
<p>SEPTIEMBRE 2017: Se realizó la orden de compra para los servicios de mantenimiento rutinario a 17 microempresas de conservación, las cuales realizarán actividades de roza mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas.</p> <p>Se dan mantenimiento por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/10/2017 - 03:36 PM
<p>AGOSTO 2017: Culminados los contratos vigentes de los mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación. Se espera presupuesto para recontractar las microempresas.</p> <p>Se dan mantenimiento por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/09/2017 - 03:39 PM
<p>JULIO 2017: Culminados los contratos vigentes de los mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizaron trabajos de roza mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10.</p> <p>Se dan mantenimiento por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.</p>	Serrano Cedeño, Alex Ricardo	03/08/2017 - 04:57 PM
<p>JUNIO 2017: Se realizan el mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizan trabajos de roza mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10. En el sector de Pegue se realiza la limpieza de la alcantarilla con maquinaria del MTOP y de igual manera se hace limpieza de calzada en el sector de Camarones.</p> <p>Se dan mantenimiento a las vías afectadas a causa del terremoto de abril 2016.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/07/2017 - 08:58 AM
<p>MAYO 2017: Se realizan el mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizan trabajos de roza mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10.</p> <p>Se dan mantenimiento a las vías afectadas a causa del terremoto de abril 2016.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	06/06/2017 - 04:00 PM
<p>ABRIL 2017: Se realizan el mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizan trabajos de roza mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10. Se dan mantenimiento a las vías afectadas a causa del terremoto de abril 2016</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/05/2017 - 03:16 PM
<p>MARZO 2017: -Microempresas: En la actualidad realizan el mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizan trabajos de roza mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, según especificaciones técnicas del MTOP, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/04/2017 - 05:02 PM
<p>FEBRERO 2017: -Microempresas: Se inicio la contratación de microempresas de conservación vial (13) por lapso de 4 meses.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	03/03/2017 - 05:15 PM
<p>ENERO 2017: -Microempresas: Se espera asignación presupuestaria para la contratación anual de microempresas de conservación vial en este año 2017.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	03/02/2017 - 04:14 PM
<p>DICIEMBRE 2016:</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/01/2017 - 09:45 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 1 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales para el año 2017.		
NOVIEMBRE 2016: -Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 6 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, también existen 4 micro empresas de albergados , a las 9 anteriores ya se les esta realizando acta de recepción definitiva.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/12/2016 - 04:00 PM
OCTUBRE 2016: -Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 9 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, también existen 4 micro empresas de albergados , a las 6 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	01/11/2016 - 05:01 PM
SEPTIEMBRE 2016: -Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 4 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, a las 4 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/10/2016 - 05:17 PM
AGOSTO 2016: -Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 4 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, a las 6 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/09/2016 - 03:47 PM
JULIO 2016: -Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 6 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, a las 6 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	08/08/2016 - 10:28 AM
JUNIO 2016: -Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 6 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, a las 4 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	04/07/2016 - 03:16 PM
MAYO 2016: -Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 4 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	08/06/2016 - 12:57 PM
ABRIL 2016: -Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, Se suscribió el Acta recepción definitiva el 25 de abril de 2016. -Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 4 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/05/2016 - 12:09 PM
MARZO 2016: -Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de marzo 2016. -Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, en el mes de Abril se retomará la contratación ya fueron asignados los recursos para la contratación.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/04/2016 - 04:49 PM
FEBRERO 2016: -Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de marzo 2016.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	07/03/2016 - 12:26 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas		
ENERO 2016: -Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de marzo 2016. -Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/02/2016 - 02:59 PM
DICIEMBRE 2015: -Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de enero. -Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/01/2016 - 01:59 PM
NOVIEMBRE 2015: -Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de diciembre. -Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra está terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribió el Acta de Recepción Definitiva el 25 de noviembre de 2015. -Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	27/11/2015 - 10:34 AM
OCTUBRE 2015: -Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de noviembre. -Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra está terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva prevista para fines de noviembre de 2015. -Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/11/2015 - 03:29 PM
SEPTIEMBRE 2015: -Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de octubre. -Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra está terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva prevista para fines de octubre de 2015. -Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/10/2015 - 09:21 AM
AGOSTO 2015: -Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para los primeros días de octubre.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	04/09/2015 - 11:58 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra está terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva con fecha 14 de septiembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.</p>		
<p>JULIO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para los primeros días de octubre.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, se están elaborando las Actas de recepción únicas.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	31/07/2015 - 12:05 PM
<p>JUNIO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de julio de 2015.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva con fecha 14 de septiembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, se estan elaborabdo las Actas de recepción unicas.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	02/07/2015 - 09:14 AM
<p>MAYO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de junio de 2015.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva con fecha 14 de septiembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	01/06/2015 - 11:57 AM
<p>ABRIL 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de mayo de 2015.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Se suscribio el Acta de Recepción Definitiva con fecha 17 de abril de 2015.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribio el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva con fecha 14 de septiembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría.</p>	Flores Zambrano, Boris Marcelo	07/05/2015 - 01:12 PM
<p>MARZO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de abril de 2015.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido, prevista para fines de abril de 2015</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/04/2015 - 10:13 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de abril de 2015.		
<p>FEBRERO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de marzo de 2015.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido, prevista para fines de marzo de 2015</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de marzo de 2015.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	09/03/2015 - 01:40 PM
<p>ENERO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de febrero del 2015.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido, prevista para el 04 de marzo de 2015</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La contratista esta en la construcción de las obras que se incrementaron y fueron aprobadas en la orden de Cambio N° 1 y también la ejecución del rubro nuevo de señalización (chevrone). La obra esta en etapa de terminación y tiene como plazo hasta el 17 de febrero de cumplir con el objeto del contrato.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	09/02/2015 - 01:47 PM
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el mediados de enero del 2015.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido, prevista para el 04 de marzo de 2015.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/01/2015 - 08:58 AM
<p>NOVIEMBRE 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, en trámite Recepción Provisional, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/12/2014 - 01:24 PM
<p>OCTUBRE 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, en trámite Recepción Provisional, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, en trámite Recepción Provisional. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	10/11/2014 - 08:45 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: La obra no se entregó en el plazo establecido en el contrato de fecha 17 de noviembre de 2013, el contratista procedió a entregar la obra concluida el 22 de agosto del 2014, por lo que se procederá al cobro de la multa respectiva al presentar la planilla de liquidación.</p> <p>Está prevista suscribir el Acta recepción provisional hasta el 15 de octubre del 2014. El trámite del Acta recepción de definitiva se la realizara luego de los 6 meses según lo establece la Ley de Contratación Pública.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/10/2014 - 11:03 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Asfaltado Av. Colón: El proyecto no se ha entregado en la fecha establecida en el contrato, se procederá al cobro de multa en la planilla de liquidación. La obra se terminó el 11 de enero del 2014, la contratista solicitó el trámite del Acta de recepción provisional, que se elaborará hasta fines del mes de septiembre 2014.</p> <p>La suscripción del Acta recepción de definitiva se la realizará luego de los 6 meses según lo establece la Ley de Contratación Pública.</p>		
<p>AGOSTO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Los trabajos no se entregaron a la fecha establecida en el contrato, por lo que se procederá al cobro de la multa respectiva al presentar la planilla de liquidación.</p> <p>La obra fue concluida el 14 de agosto del 2014, está prevista el Acta Recepción Provisional hasta el 15 de septiembre del 2014. La suscripción del Acta Recepción de Definitiva se la realizará luego de los 6 meses según lo establece la Ley de Contratación Pública.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: El proyecto no fue entregado en la fecha establecida en el contrato, se procederá al cobro de multas en la planilla de liquidación. La obra se terminó en enero del 2014, la contratista aun no ha solicitado Recepción Provisional, mediante conversación telefónica la contratista se comprometió a solicitar y presentar la documentación pertinente para elaborar el Acta de Recepción Provisional hasta mediados del mes de septiembre 2014.</p> <p>La suscripción del Acta Recepción de Definitiva se la realizará luego de los 6 meses según lo establece la Ley de Contratación Pública.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>09/09/2014 - 08:14 AM</p>
<p>JULIO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: En la actualidad el contratista a conseguido los adoquines de parterre que faltaban y los está colocando.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La obra está terminada, se ha conversado con el contratista vía telefónica para que solicite la recepción provisional la misma que se espera realizarla para el 8 de agosto.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>30/07/2014 - 02:14 PM</p>
<p>JUNIO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: El contratista ha transportado el adoquín que tiene que colocar en el proyecto.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La obra está terminada, se ha conversado con el contratista vía telefónica para que solicite la recepción provisional.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>05/07/2014 - 11:48 AM</p>
<p>MAYO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: El contratista ha limpiado la obra para poner los adoquines que le faltan y sembrar las plantas que faltan, teniendo que presentar la planilla cuando termine la obra para poder cuantificar la multa correspondiente.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La obra está terminada, se ha hablado con el contratista para que solicite la recepción provisional.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>06/06/2014 - 01:18 PM</p>
<p>ABRIL 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: El contratista está adquiriendo el resto de plantas faltantes en la Av. Eloy Alfaro para terminar con este ornato de la ciudad y los ladrillos peatonales en los parterres serán colocados antes del 15 de mayo.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La calle Colón está terminada, teniendo que nombrarse la comisión para la recepción provisional cuando el contratista la solicite, caso contrario, le recomendaremos al contratista que la solicite.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>08/05/2014 - 01:23 PM</p>
<p>MARZO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Falta el 1% para la culminación, el problema se presentó por la falta de ladrillos que cumplan las especificaciones técnicas y el ornato de la ciudad.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La calle Colón está terminada, teniendo que nombrarse la comisión para la recepción provisional.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>07/04/2014 - 01:56 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2014: -Asfaltado Av. Eloy Alfaro: La Fiscalización y la Contratista estan evaluando el avance de la obra para la liquidación económica. -Asfaltado Av. Colón: La Fiscalización y la Contratista estan evaluando el avance de la obra para la liquidación económica.</p>	<p>Dávila Cadena, Christian Roberto</p>	<p>07/03/2014 - 04:49 PM</p>
<p>Julio 2013: - Se terminarán los trabajos de asfaltado del barrio Unidos Somos Más. -Asfaltado Av. Eloy Alfaro : Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos. -Asfaltado Av. Colón: Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos. - Asfaltado Barrio 24 de Mayo: Esta terminada con acta provisional: Se adjunta acta.</p>	<p>Martínez Martínez, Jorge Aníbal</p>	<p>02/08/2013 - 12:14 PM</p>
<p>Junio 2013: - Se continúa trabajando en el asfaltado del barrio Unidos Somos Más, colocación de carpeta asfáltica -Asfaltado Av. Eloy Alfaro : Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos. -Asfaltado Av. Colón: Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos. - Asfaltado Barrio 24 de Mayo: Esta terminada con acta provisional: Se adjunta acta.</p>	<p>Martínez Martínez, Jorge Aníbal</p>	<p>05/07/2013 - 10:33 AM</p>
<p>Mayo 2013: - Se continúa trabajando en el asfaltado del barrio Unidos Somos Más, colocación de carpeta asfáltica -Asfaltado Av. Eloy Alfaro : construcción de Parterre y colocación de carpeta asfáltica -Asfaltado Av. Colón: Construcción de aceras y bordillos, parterres y colocación de carpeta asfáltica.</p> <p>Abril 2013: -Asfaltado del Barrio Unidos Somos Más se encuentra colocando la carpeta asfáltica -Asfaltado de la Av. Eloy Alfaro : se construye los bordillos y aceras así como los bordillos para los parterres -Asfaltado Av. Colón : Se construye los bordillos y aceras , así como los bordillos para los parterres</p> <p>Marzo 2012: Se continua trabajando en los proyectos de asfaltado tales como :</p> <p>-Asfaltado de la Y de León -Tabiazo-Avs. Kennedy-Libertad-6 de Diciembre- Sucre, esta obra se encuentra terminada -Asfaltado del Barrio 24 de Mayo: Se continua colocando carpeta asfáltica -Asfaltado del Barrio Unidos Somos Más se encuentra colocando la carpeta asfáltica -Asfaltado de la Av. Eloy Alfaro : se construye los bordillos y aceras así como los bordillos para los parterres .Asfaltado Av. Colón : Se construye los bordillos y aceras , así como los bordillos para los parterres</p>	<p>Martínez Martínez, Jorge Aníbal</p>	<p>05/07/2013 - 10:29 AM</p>
<p>Enero 2013: Se continua con la construcción de aceras , bordillos, colocación de subbase, sumideros en el barrio 24 de Mayo, avance físico de 52,13 % - El Barrio Unidos Somos Más, se está colocando subbase, construyendo aceras y bordillos, colocación de tirantes para sumideros, avance físico 40 % - El asfaltado de la avenida Eloy Alfaro, se está construyendo los bordillos y aceras , bordillos para parterre, avance físico del 15% -Asfaltado de las calles desde el León hasta la Y de Tabiazo, Av. Libertad y Kennedy, Av. Sucre, Av. 6 de Diciembre, colocación de la carpeta asfáltica, vance físico del 98 % -asfaltado del barrio 15 de Marzo, se encuentra con Terminación Unilateral -Mantenimiento puente Tulumbí, terminada la obra 100 % -Reconstrucción muro gavión puente Teaone 3, colocación de carpeta asfáltica al ingreso del puente, avance físico 100% -Mantenimiento puente Calderón, colocación de gaviones, avance físico 20 % - Mantenimiento puente Viche, trabajos de pintura para la estructura metálica, 95 % -Mantenimiento puente Quinindé, construcción de muro de gaviones, Samblasting, y pintura, avance físico 30 % -Mantenimiento CV Limón-Zabaletita, Quinindé, Trámite de Terminación Unilateral</p>	<p>Martínez Martínez, Jorge Aníbal</p>	<p>26/02/2013 - 06:13 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfaltado de calles del barrio Unidos Somos Más: se encuentra en ejecución , aceras, bordillos, excavación ,colocación de material de mejoramiento, subbase, domiciliarias, subidas de pozos. cajas, un avance físico del 30 % - Asfaltado de calles del barrio 24 de mayo : En etapa de ejecución , aceras, bordillos, colocación de material de mejoramiento,subbase, base, domiciliarias, subidas de pozos , cajas, avance físico 42 % -Mantenimiento camino vecinal Roto- Vinzade : Los trabajos se encuentran concluidos. 100 % -Mantenimiento de estructura metálica del puente sobre el rio Blanco : terminado 100 % - Mantenimiento de estructura metálica del puente sobre el rio Tululbí : etapa de construcción, samblassting y pintura, procura metálica, instalación de acometidas eléctricas, instalación de transformador , colocación de iluminarias., avance físico 65 % - Mantenimiento de estructura metálica del puente sobre el rio Viche : etapa de construcción, limpieza de maleza, samblassting y pintura, procura metálica, instalación de acometidas eléctricas,, avance físico 45 % 	Martínez Martínez, Jorge Aníbal	10/01/2013 - 07:52 AM

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
3- REGIONAL. Ambiental. Las fuertes lluvias CAUSARÍAN el retraso de la ejecución de la obra	04/09/2020	Gustavo Ernesto Aldas Palacios	50 %	90	45	1/2

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Aprobación de mantenimiento vial provincial realizada	4-Inicio de Trabajo	01/01/2011		01/01/2011		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Firma de contrato asfaltado de las calles del barrio 15 de Marzo firmado	1-Solicitud de Información	30/05/2011		30/05/2011		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Señalización de la vía El Salto- Muisne del Cantón Muisne ejecutados	5-Entregables Intermedios	23/08/2011		23/08/2011		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Rehabilitación y Mantenimiento del camino vecinal J3-Vinsade en el cantón Quinindé ejecutados	5-Entregables Intermedios	04/09/2011		04/09/2011		Sí	1.5
5	EJECUCIÓN: Asfaltado de la avenida principal de la Parroquia Sua realizada	5-Entregables Intermedios	30/09/2011		30/09/2011		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	EJECUCIÓN: Elaboración y Colocación de 106 señales regulatorias para ser ubicadas antes y después de cada puente o viaducto en la Provincia de Esmeraldas. colocadas	5-Entregables Intermedios	05/11/2011		05/11/2011		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Construcción del puente sobre el río La Unión del paso Lateral de Atacames ejecutado	1-Solicitud de Información	20/11/2011		20/11/2011		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Señalización de la vía Esmeraldas- Atacames-Súa- Provincia de Esmeraldas realizado	5-Entregables Intermedios	22/11/2011		22/11/2011		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Trabajos de acceso a la Parroquia La Unión del cantón Atacames ejecutado	1-Solicitud de Información	30/03/2012		30/03/2012		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Mantenimiento y reparación de gabarra propiedad del MTOP que se encuentra en el cantón Eloy Alfaro realizado	1-Solicitud de Información	30/06/2012		30/06/2012		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Pavimentación de las Calles "Padre Lino Campesan" y "Armada Nacional" del Cantón San Lorenzo realizado	5-Entregables Intermedios	30/07/2012		30/07/2012		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Asfaltado de la calle Olmedo en la ciudad de Esmeraldas ejecutado	1-Solicitud de Información	30/08/2012		30/08/2012		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Lastrado de carretera LasPiedras- Barrio 21 de noviembre -Parroquia Tachina-ciudad de Esmeraldas terminado	5-Entregables Intermedios	25/09/2012		25/09/2012		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Señalización horizontal, vertical y seguridad vial de la vía San Lorenzo - Mataje, Cantón San Lorenzo realizada	5-Entregables Intermedios	30/10/2012		30/10/2012		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Señalización horizontal, vertical y seguridad vial de la vía Y Borbón - Borbón, Cantón Eloy Alfaro realizada	5-Entregables Intermedios	30/10/2012		30/10/2012		Sí	3.0
16	EJECUCIÓN: Señalización horizontal, vertical y seguridad vial del Paso Lateral de Atacames realizada	5-Entregables Intermedios	30/10/2012		30/10/2012		Sí	3.0
17	EJECUCIÓN: Mantenimiento de puente metálico y obras civiles ubicado sobre el río Blanco , en el Cantón Quinindé realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	4.0
18	EJECUCIÓN: Mantenimiento del camino vecinal Limón-Zabaletita del Medio, en el Cantón Quinindé ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Trabajo de Asfaltado de las Calles desde el León hasta la "Y"	5-Entregables Intermedios	30/03/2013		30/03/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Tabiazo, Avenida Libertad y Kennedy, Avenida Sucre, Avenida 6 de Diciembre, en el Cantón Esmeraldas ejecutado							
20	EJECUCIÓN: Asfaltado de las calles del barrio 24 de Mayo de la ciudad de Esmeraldas realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Asfaltado de las calles del barrio Unidos somos Más de la ciudad de Esmeraldas ejecutado	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Asfaltado de la calle Colón en la ciudad de Esmeraldas realizado	5-Entregables Intermedios	15/04/2014		15/02/2014		Sí	1.0
23	CIERRE Liquidación Económica Av. Colón	5-Entregables Intermedios	05/09/2014		05/09/2014		Sí	0.5
24	EJECUCIÓN: Asfaltado de la calle Eloy Alfaro en la ciudad de Esmeraldas realizado	5-Entregables Intermedios	15/09/2014		15/10/2014		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario y emegente por microempresas	4-Inicio de Trabajo	17/09/2014		17/03/2015		Sí	1.0
26	CIERRE Liquidación Económica Av. Eloy Alfaro	5-Entregables Intermedios	26/12/2014		30/04/2015		Sí	0.5
27	CIERRE: Acta de entrega de Recepción firmada Av. Colón	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	17/02/2015		17/04/2015		Sí	0.5
28	EJECUCIÓN: Mantenimiento de la carretera Esmeraldas - Súa	5-Entregables Intermedios	17/02/2015		17/02/2015		Sí	1.0
29	CIERRE: Acta de entrega de Recepción firmadas Mantenimientos rutinarios y emergentes por microempresas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	12/05/2015		06/04/2015		Sí	0.5
30	CIERRE: Acta de entrega de Recepción firmada Av. Eloy Alfaro	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2015		25/02/2016		Sí	0.5
31	CIERRE: Acta de entrega de Recepción firmada carretera Esmeraldas - Súa	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	14/09/2015		25/11/2015		Sí	0.5
32	EJECUCIÓN: Aprobación de asignación presupuestaria para el Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Enero 2018, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Febrero 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Marzo 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2018		30/03/2018		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Abril 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	1.0
36	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Esmeraldas - Mayo 2018, realizado							
37	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Junio 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	29/06/2018		29/06/2018		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Julio 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Agosto 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Septiembre 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	28/09/2018		28/09/2018		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Octubre 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	1.0
42	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Noviembre 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Diciembre 2018, realizado	5-Entregables Intermedios	28/12/2018		28/12/2018		Sí	1.0
44	CIERRE: Acta entrega recepción, firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018		08/02/2019		Sí	0.5
45	CIERRE: Liquidación económica, realizada	9-Entregables Formales	31/12/2018		09/04/2019		Sí	0.5
46	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Enero 2019, realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.5
47	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Marzo 2019, realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.5
48	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Abril 2019, realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.5
49	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Mayo 2019, realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.5
50	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Junio 2019, realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.5
51	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Julio 2019, realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.5
52	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Esmeraldas - Agosto 2019, realizado							
53	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Septiembre 2019, realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.0
54	CIERRE: Liquidación económica 2019, realizada	9-Entregables Formales	30/12/2019		15/10/2019		Sí	0.5
55	CIERRE: Acta entrega recepción 2019, firmadas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2019		20/09/2019		Sí	0.5
56	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - ENERO 2020, realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	1.0
57	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - FEBRERO 2020, realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	1.0
58	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - MARZO 2020, realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	1.0
59	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - ABRIL 2020, realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	1.0
60	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - MAYO 2020, realizado	5-Entregables Intermedios	29/05/2020		29/05/2020		Sí	1.0
61	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - JUNIO 2020, realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	1.0
62	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - JULIO 2020, realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	1.0
63	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - AGOSTO 2020, realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2020		31/08/2020		Sí	1.0
64	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - SEPTIEMBRE 2020, realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	1.0
65	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - OCTUBRE 2020, realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2020		30/10/2020		Sí	1.0
66	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - NOVIEMBRE 2020, realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	1.0
67	CIERRE: Acta entrega recepción 2020, firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2020	31/12/2020			No	1.0
68	EJECUCIÓN mantenimiento de la provincia de Esmeraldas 2021	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	8.0


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
69	CIERRE: Acta entrega recepción 2021, firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5
70	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5
71	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5
72	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	1.5
73	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5
74	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5
75	COMPLETADO: Informe de Cierre de Proyectos (SENPLADES) aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	0.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	OBRA CON TRABAJOS TERMINADOS	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	31/05/2016
2	OBRA CON TRABAJOS TERMINADOS	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	17/03/2016
3	OBRA TERMINADA	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	27/01/2016
4	OBRA TERMINADA	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	25/11/2015
5	OBRA TERMINADA	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	22/09/2015
6	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	26/08/2015
7	OBRA CON TRABAJOS TERMINADOS	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	31/07/2015
8	OBRA TERMINADA	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	11/06/2015
9	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	30/04/2015
10	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	17/03/2015
11	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	15/12/2014
12	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	27/11/2014
13	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	20/10/2014
14	GOBERNACIÓN DE ESMERALDAS	Lemos Ramirez, Pablo Rafael	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	27/07/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de mantenimiento de la red Vial Estatal		928.20 %	0.1	0.9282	01/01/2017	Octubre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	7,763,423.05
Estimado Al Fin Del Proyecto:	50,996,518.53 **
Costo Total:	65,165,986.67
Total Devengado:	47,486,824.74
% Costo Total Devengado:	72.87 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 72.87 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	64,964,590.82	18,629,550.46	0.00	83,594,141.28
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	38,455,400.13	2,000,000.00	0.00	40,455,400.13
Ppto. Codificado	62,882,355.35	4,633,026.01	0.00	67,515,381.36
Ppto. Comprometido	26,843,464.92	3,853,812.90	0.00	30,697,277.82
Planeado - Codificado (2020)		13,996,524.45		
Programado a Devengar	49,058,797.82	4,633,026.01	0.00	53,691,823.83
Ppto. Devengado	46,363,492.52	1,123,332.22	0.00	47,486,824.74
Pagado Real	19,408,015.39	247,892.67	0.00	19,655,908.06
Estimado a fin de año	* 46,363,492.52	0.00	0.00	46,363,492.52
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	2,695,305.30	4,633,026.01	0.00	7,328,331.31
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 94.51 %	24.25 %	0.00 %	88.44 %
Ppto. Codificado 998	1,683,769.93	0.00	0.00	1,683,769.93
Ppto. Devengado 998	1,681,963.25	0.00	0.00	1,681,963.25

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

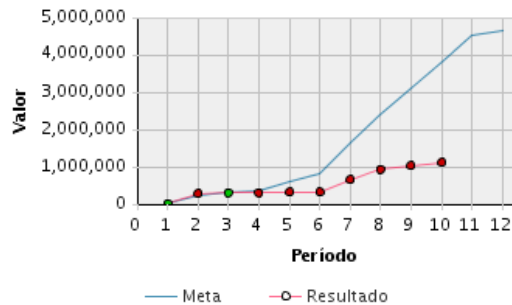

Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	2,318.01	2,318.01	2,318.01	2,318.01	100.00 %	●	0.05 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	247,298.74	287,135.13	249,616.75	289,453.14	115.96 %		6.25 %
Mar	66,247.65	4,366.07	315,864.40	293,819.21	93.02 %		6.34 %
Abr	48,837.24	108.04	364,701.64	293,927.25	80.59 %		6.34 %
May	237,360.44	31,173.91	602,062.08	325,101.16	54.00 %		7.02 %
Jun	203,959.40	2,426.05	806,021.48	327,527.21	40.64 %		7.07 %
Jul	856,140.00	321,154.40	1,662,161.48	648,681.61	39.03 %		14.00 %
Ago	746,860.89	275,934.10	2,409,022.37	924,615.71	38.38 %		19.96 %
Sep	697,621.01	99,380.15	3,106,643.38	1,023,995.86	32.96 %		22.10 %
Oct	697,621.02	99,336.36	3,804,264.40	1,123,332.22	29.53 %		24.25 %
Nov	697,621.02		4,501,885.42				
Dic	131,140.59		4,633,026.01				
Total	4,633,026.01	1,123,332.22					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
17	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
18	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		IMG01998-20120707-1319.jpg	09/07/2012
2	01 -Acta Provisional del asfaltado barrio 24 de Mayo	Acta_de_recepcion_Prov._24_de_Mayo.pdf	05/07/2013
3	A1. INFORME DE SITOP MARZO 2014 AV. COLON	A1-INFORME_AV._COLON_SITOP_MARZO_2014.PDF	17/04/2014
4	A2. INFORME DE SITOP MARZO 2014 AV. ELOY ALFARO	A2-INFORME_AV._ELOY_ALFARO_SITOP_MARZO_2014.PDF	17/04/2014
5	A3. INFORME DE SITOP ABRIL 2014 AV. ELOY ALFARO	A3.INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AV._ELOY_ALFARO_ABRIL_2014.PDF	06/06/2014
6	A4. INFORME DE SITOP ABRIL 2014 AV. COLON	A4.INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AV._COLON_ABRIL_2014.PDF	06/06/2014
7	A5. INFORME DE SITOP MAYO 2014 AV. COLON	A5._INFORME_SITOP_MAYO_2014_AV._COLON_-_K037.PDF	06/06/2014
8	A6. INFORME DE SITOP MAYO 2014 AV. ELOY ALFARO	A6._INFORME_SITOP_MAYO_2014_AV._ELOY_ALFARO_-_K037.PDF	06/06/2014
9	A7. INFORME SITOP AV. COLON 2014	A7._5791_INFORME_SITOP_AV._COLON_JUNIO_2014.pdf	16/07/2014
10	A8. INFORME SITOP AV. ELOY ALFARO JUNIO 2014	A8._5687_INFORME_SITOP_AV._ELOY_ALFARO_JUNIO_2014.pdf	16/07/2014
11	A9. INFORME EJECUTIVO SITOP AV. COLON JULIO 2014	A9._5791_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AV._COLON_JULIO_2014.pdf	30/07/2014
12	aceras Av. Eloy Alfaro	SAM_1230.JPG	12/04/2013
13	aceras en av. Colón	SAM_0199.JPG	12/04/2013
14	aceras y bordillos barrio 24 de mayo	DSC01657.JPG	10/01/2013
15	archivo Informe ejecutivo desde nov 2011 hasta nov del 2012	INFORME_EJECUTIVO__NOV_2011_-_NOV_2012.docx	10/01/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	asesorios para tuberías de agua potable barrio 24 de mayo	DSC01741.JPG	10/01/2013
17	ASOCIACION HITO 30 - ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA AV. ELOY ALFARO	5687-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2016.pdf	06/05/2016
18	B1.INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2014	A11._5687_INFORME_EJECUTIVO_ELOY_ALFARO_AGOSTO2014.pdf	08/09/2014
19	B2. INFORME EJECUTIVO SITOP AV. ELOY ALFARO JULIO 2014	A10._5687_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AV._ELOY_ALFARO_2014.pdf	08/07/2014
20	B3. INFORME EJECUTIVO AV. COLON AGOSTO 2014	A12._INFORME_SITOP_COLON_AGOSTO_2014.pdf	08/09/2014
21	B4. INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2014 AV. ELOY ALFARO	A13.5687_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPTIEMBRE_2014_AV._ELOY_ALFARO.pdf	06/11/2014
22	B5. INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2014 AV. COLON	A14._5791_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPTIEMBRE_2014_AV._COLON.pdf	06/11/2014
23	B6. 5687-INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2014 AV. ELOY ALFARO	B6._5687-INFORME_EJECUTIVO_SITOP_OCTUBRE_2014_AV._ELOY_ALFARO.pdf	10/11/2014
24	B7. 5791-INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2014 AV. COLON	B7._5791-INFORME_EJECUTIVO_SITOP_OCTUBRE_2014_AV._COLON.pdf	10/11/2014
25	B8.5687-INFORME EJECUTIVO NOV 2014 AV. ELOY ALFARO	B8.5687-INFORME_EJECUTIVO_NOV_2014_AV._ELOY_ALFARO.pdf	05/12/2014
26	B9.5791 INFORME EJECUTIVO NOV 2014 AV. COLON	B9.5791_INFORME_EJECUTIVO_NOV_2014_AV._COLON.pdf	05/12/2014
27	C1. 5687 INFORME EJECUTIVO SITOP DIC 2014 AV. ELOY ALFARO	C1._5687_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_DIC_2014.pdf	06/01/2015
28	C2. 5791 INFORME EJECUTIVO SITOP DIC 2014 AV. COLON	C2._5791_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_DIC_2014.pdf	06/01/2015
29	C3. 8695 INFORME EJECUTIVO SITOP DIC 2014 - EDME	C3._8695_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_DIC_2014.pdf	06/01/2015
30	C4. 5791 INFORME EJECUTIVO DE SITOP ENE 2015 AV. COLON	C4._5791_INFORME_EJECUTIVO_DE_SITOP_ENE_2015_AV._COLON.pdf	09/02/2015
31	C5. 5687 INFORME EJECUTIVO SITOP ENE 2015 AV. ELOY ALFARO	C5._5687_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ENE_2015_AV._ELOY_ALFARO.pdf	09/02/2015
32	C6. 8695-ORDEN DE CAMBIO N° 1-2015	C6._8695-ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_1-2015.pdf	09/02/2015
33	C7. 8695 INFORME EJECUTIVO ENE 2015	C7._8695_INFORME_EJECUTIVO_ENE_2015.pdf	09/02/2015
34	C8. 5687 INFORME EJECUTIVO FEB 2015 AV. ELOY ALFARO	C8._5687_INFORME_EJECUTIVO_FEB_2015.pdf	09/03/2015
35	C9. 5791 INFORME EJECUTIVO FEB 2015 AV. COLON	C9._5791_INFORME_EJECUTIVO_FEB_2015_AV._COLON.pdf	09/03/2015
36	CONTRATO COMPLEMENTARIO AV. COLON	COMPLEMENTARIO_COLON.pdf	02/12/2013
37	CONTRATO COMPLEMENTARIO AV. ELOY ALFARO	COMPLEMENTARIO_ELOY_ALFARO.pdf	02/12/2013
38	CONTRATO ORIGINAL AV COLON	CONTRATO_ORIGINAL_AV_COLON.pdf	03/07/2019
39	CONTRATO ORIGINAL AV ELOY ALFARO	CONTRATO_ORIGINAL_AV_ELOY_ALFARO.pdf	03/07/2019
40	D1. INFORME SITOP MARZO 2015 - AV. COLON	D1._INFORME_SITOP_MARZO_2015_-_AV._COLON.pdf	07/04/2015
41	D2. INFORME EJECUTIVO SITOP MAR 2015 - AV. ELOY ALFARO	D2._INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAR_2015_-_AV._ELOY_ALFARO.pdf	07/04/2015
42	D3. INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2015 - EDME	D3._INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MARZO_2015_-_EDME.pdf	07/04/2015
43	D4. 5791-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2015- AV. COLON	D4._5791-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf	27/04/2015
44	D5._8849-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf	D5._8849-ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_2015.pdf	08/07/2015
45	D6. 8867-ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 2015	D6._8867-ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_2015.pdf	08/07/2015
46	D7. 8848-ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 2015	D7._8848-ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_2015.pdf	08/07/2015
47	D7. ORDEN DE COMPRA POR CATA LOGO ID 14232 AÑO - 2016	ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATA_LOGO_ID_14232_AÑO_2016.pdf	03/02/2017
48	D8. 8868-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2015	D8._8868-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf	08/07/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
49	D9. 9314-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2015	D9_9314-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf	08/07/2015
50	E1-5687-ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL-2015 AV. ELOY ALFARO	E1-5687-ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL-2015.pdf	31/07/2015
51	E2. 5687 INFORME EJECUTIVO JUL 2015 AV. ELOY ALFARO	E2_5687_INFORME_EJECUTIVO_JUL_2015_AV._ELOY_ALFARO.pdf	07/08/2015
52	E3. 5687 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2015 AV. ELOY ALFARO	E3_5687_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2015_AV._ELOY_ALFARO.pdf	07/09/2015
53	E4. 5687 INFORME EJECUTIVO OCT 2015 AV. ELOY ALFARO.pdf	E4_5687_INFORME_EJECUTIVO_OCT_2015_AV._ELOY_ALFARO.pdf	10/11/2015
54	E5. 8695-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2015	E5_8695-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf	26/11/2015
55	E6. ORDEN DE COMPRA POR CATA LOGO ID 14423 - AÑO 2016	ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATA_LOGO_ID_14423_-_AÑO_2016.pdf	03/02/2017
56	E7. ORDEN DE COMPRA POR CATA LOGO ID 14231 - AÑO 2016	ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATA_LOGO_ID_14231_-_AÑO_2016.pdf	03/02/2017
57	E8. ORDEN DE COMPRA POR CATA LOGO ID 14232 AÑO - 2016	ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATA_LOGO_ID_14233_-_AÑO_2016.pdf	03/02/2017
58	E9. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17639	E9_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17639.pdf	03/08/2017
59	EJECUCION DE GASTOS ENERO - JUNIO 2013	EJECUCION_DE_GASTOS_ENERO_-_JUNIO_2013.pdf	05/07/2013
60	excavación barrio Unidos Somos Más	2012-10-29_10.18.31.jpg	05/12/2012
61	F1. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17640	F1_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17640.pdf	03/08/2017
62	F2. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17641	F2_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17641.pdf	03/08/2017
63	F3. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17642	F3_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17642.pdf	03/08/2017
64	F4. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17644	F4_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17644.pdf	03/08/2017
65	F5. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17645	F5_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17645.pdf	03/08/2017
66	F6. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17646	F6_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17646.pdf	03/08/2017
67	F7 ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17647	F7_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17647.pdf	03/08/2017
68	F8. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17648	F8_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17648.pdf	03/08/2017
69	F9. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17649	F9_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17649.pdf	03/08/2017
70	FOTO ASFALTADO DE CALLE COLON	IMG00016-20130605-1803.jpg	05/06/2013
71	foto señalización paso lateral de atacames	DSCN1014.JPG	09/10/2012
72	fotos puente tululbi ejecución trabajos	DSC00149.JPG	10/01/2013
73	fotos asfaltado av. Olmedo	IMG01999-20120707-1319.jpg	09/07/2012
74	G1. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17650	G1_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17650.pdf	03/08/2017
75	G2. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17651	G2_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17651.pdf	03/08/2017
76	G3. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17652	G3_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17652.pdf	03/08/2017
77	G4. 19447_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	G4_19447_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
78	G5.19717_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	G5.19717_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
79	G6.19718_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	G6.19718_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
80	G7.19720_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	G7.19720_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
81	G8.19721_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	G8.19721_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
82	G9.19723_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	G9.19723_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
83	H1.19724_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	H1.19724_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
84	H2.19727_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	H2.19727_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
85	H3.19729_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	H3.19729_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
86	H4.19732_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	H4.19732_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
87	H5.19734_ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA	H5.19734_ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
88	H6.19736_ACTA ENTREGA RECEPCION	H6.19736_ACTA_ENTREGA_RECEPCION.pdf	05/01/2018
89	H7.19737_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	H7.19737_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
90	H8.19738_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	H8.19738_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
91	H9.19740_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	H9.19740_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
92	I1.19739_ACTA RECEPCION UNICA	I1.19739_ACTA_RECEPCION_UNICA.pdf	05/01/2018
93	I2.19745_ACTA RECEPCION DEFINITIVA	I2.19745_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	05/01/2018
94	I3. DEVENGADO ESIGEF ENERO 2018	I3._DEVENGADO_ESIGEF_ENERO_2018.pdf	28/09/2018
95	I4. DEVENGADO ESIGEF FEBRERO 2018	I4._DEVENGADO_ESIGEF_FEBRERO_2018.pdf	28/09/2018
96	I5. DEVENGADO ESIGEF MARZO 2018	I5._DEVENGADO_ESIGEF_MARZO_2018.pdf	28/09/2018
97	I6. DEVENGADO ESIGEF ABRIL 2018	I6._DEVENGADO_ESIGEF_ABRIL_2018.pdf	28/09/2018
98	I7. DEVENGADO ESIGEF MAYO 2018	I7._DEVENGADO_ESIGEF_MAYO_2018.pdf	28/09/2018
99	I8. DEVENGADO ESIGEF JUNIO 2018	I8._DEVENGADO_ESIGEF_JUNIO_2018.pdf	28/09/2018
100	I9. DEVENGADO ESIGEF JULIO 2018	I9._DEVENGADO_ESIGEF_JULIO_2018.pdf	28/09/2018
101	INFORME ARCHIVO EJECUTIVO DEL NOV 2011 AL NOV 2012	RESUMEN_EJECUTIVO_____nov_2011_a_nov_2012.docx	08/01/2013
102	informe de gasto enero - diciembre 2013	informe_de_gasto_enero-diciembre.pdf	08/01/2014
103	informe de gasto enero - noviembre 2013	informe_de_gasto_enero_-_noviembre_2013.pdf	09/12/2013
104	informe de gasto enero - septiembre 2013	informe_de_gasto_enero_-_septiembre_2013.pdf	07/10/2013
105	informe sitop octubre 2013 av. Eloy Alfaro	GestionReporteFN_elay_alfaro.pdf	05/11/2013
106	INFORME TECNICO DEL ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO 15 DE MARZO	INFORME_TECNICO_15_DE_MARZO_MTOP-CON_ESM-2013-177-ME.pdf	30/08/2013
107	informe tecnico sitop octubre 2013 av. Colón	GestionReporteF_Colon.pdf	05/11/2013
108	informe tecnico sitop septiembre 2013 av. Eloy Alfaro	informe_sitop_septiembre_2013_av._Eloy_Alfaro.pdf	07/10/2013
109	informe tecnico sitop septiembre 2013 av. Colón	informe_sitop_septiembre_2013_av._colón.pdf	07/10/2013
110	J1. DEVENGADO ESIGEF AGOSTO 2018	J1._DEVENGADO_ESIGEF_AGOSTO_2018.pdf	28/09/2018
111	J2. DEVENGADO ESIGEF SEPTIEMBRE 2018	J2._DEVENGADO_ESIGEF_SEPTIEMBRE_2018.pdf	02/10/2018
112	J3. DEVENGADO ESIGEF OCTUBRE 2018	J3._DEVENGADO_ESIGEF_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
113	J4-ALINEADA HITO 44-20810-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2019.pdf	J4-ALINEADA_HITO_44-20810-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2019.pdf	01/03/2019
114	J5-ALINEADA HITO 44-20820-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2019	J5-ALINEADA_HITO_44-20820-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2019.pdf	01/03/2019
115	J6-Reporte pago esigef febrero 2019	J6-Reporte_pago_esigef_febrero_2019.pdf	01/03/2019
116	J7-Alineado al Hito 47 - Reporte pago esigef marzo 2019	J7-Alineado_al_Hito_47_-_Reporte_pago_esigef_marzo_2019.pdf	03/04/2019
117	J8-Alineado al Hito 48 - Reporte pago esigef abril 2019	J8-Alineado_al_Hito_48_-_Reporte_pago_esigef_abril_2019.pdf	02/05/2019
118	J8. Asociado a Hito 47 -Informe de Acciones Riesgos proyectos en ejecucion - Abril 2019	J8._Asociado_a_Hito_47_-_Informe_de_Acciones_Riesgos_proyectos_en_ejecucion_-_Abril_2019.pdf	03/04/2019
119	J9. ANEXOS FORMATO SENPLADES 1	J9._2015-06-22_02-30-47_MANTENIMIENTODEINFRAESTRUC	26/07/2019
120	K1. ANEXO FORMATO SENPLADES 2	K1._2015-06-23_03-59-05_INFORMEDE SITUACION.PDF	26/06/2019
121	K2. ANEXOS FORMATO SENPLADES 3	K2._2015-11-23_12-43-31_MANTENIMIENTODEESMERALDAS	26/06/2019
122	K3. ANEXOS FORMATO SENPLADES 4	K3._2017-09-02_01-43-43_MARCOLGICOMANTENIMIENTO	26/07/2019
123	K4. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20825	K4._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20825.pdf	03/07/2019
124	K5. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20813	K5._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20813.pdf	03/07/2019
125	K6. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20819	K6._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20819.pdf	03/07/2019
126	K7. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20816	K7._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20816.pdf	03/07/2019
127	K8. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20817	K8._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20817.pdf	03/07/2019
128	K9. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20829	K9._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20829.pdf	03/07/2019
129	L1. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20824	L1._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20824.pdf	03/07/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
130	L2. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20812	L2._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20812.pdf	03/07/2019
131	L3. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20814	L3._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20814.pdf	03/07/2019
132	L4. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20815	L4._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20815.pdf	03/07/2019
133	L5. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20827	L5._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20827.pdf	03/07/2019
134	L6. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20820	L6._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20820.pdf	03/07/2019
135	L7. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20826	L7._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20826.pdf	03/07/2019
136	L8. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20828	L8._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20828.pdf	03/07/2019
137	L9. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20810	L9._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20810.pdf	03/07/2019
138	M1-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23634	M1-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23634.pdf	04/07/2019
139	M2-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23635	M2-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23635.pdf	04/07/2019
140	M3-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23644	M3-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23644.pdf	04/07/2019
141	M4-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23645	M4-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23645.pdf	04/07/2019
142	M5-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23646	M5-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23646.pdf	04/07/2019
143	M6-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23647	M6-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23647.pdf	04/07/2019
144	M7-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23651	M7-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23651.pdf	04/07/2019
145	M8-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23652	M8-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23652.pdf	04/07/2019
146	M9-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23653	M9-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23653.pdf	04/07/2019
147	MANTENIMIENTO MES DE JUNIO 2013	MANTENIMIENTO_VIAL_MES_DE_JUNIO.pdf	05/07/2013
148	Material de mejoramiento barrio 24 de mayo	DSC01859.JPG	05/12/2012
149	Material de mejoramiento barrio 24 de mayo	DSC01865.JPG	05/12/2012
150	muro gaviones protección puente sobre el rio blanco	DSC02615.JPG	10/01/2013
151	N1. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20818	N1._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20818.pdf	03/07/2019
152	N2. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20811	N2._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20811.pdf	03/07/2019
153	N3-Alineado al Hito 50 - Reporte pago esigef junio 2019	N3-Alineado_al_Hito_50_-_Reporte_pago_esigef_junio_2019.pdf	03/07/2019
154	N4-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23628	N4-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23628.pdf	04/07/2019
155	N5-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23629	N5-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23629.pdf	04/07/2019
156	N6-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23630	N6-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23630.pdf	04/07/2019
157	N7-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23631	N7-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23631.pdf	04/07/2019
158	N8-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23632	N8-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23632.pdf	04/07/2019
159	N9-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23633	N9-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23633.pdf	04/07/2019
160	O1-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23654	O1-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23654.pdf	04/07/2019
161	O2-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23655	O2-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23655.pdf	04/07/2019
162	O3-Alineado al Hito 51 - Reporte pago esigef julio 2019	O3-Alineado_al_Hito_51_-_Reporte_pago_esigef_julio_2019.pdf	02/08/2019
163	O4. PLAN DE ACCION ESMERALDAS - JULIO 2019	O4._PLAN_DE_ACCION_ESMERALDAS_-_JULIO_2019.pdf	07/08/2019
164	O5-Alineado al Hito 52 - Reporte pago esigef agosto 2019	O5-Alineado_al_Hito_52_-_Reporte_pago_esigef_agosto_2019.pdf	05/09/2019
165	O6. Memorando MTOP-DDE-2019-875-ME	O6._Memorando_MTOP-DDE-2019-875-ME.pdf	04/10/2019
166	O7. Alineado a Hito 53 - Devengado eSIGEF - Septiembre 2019	O7._Alineado_a_Hito_53_-_Devengado_eSIGEF_-_Septiembre_2019.pdf	04/10/2019
167	O8. Devengado eSIGEF - Octubre 2019	O8._Devengado_eSIGEF_-_Octubre_2019.pdf	05/11/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
168	O9. COSTO TOTAL PROYECTO 2019 - SENPLADES - SIPeIP - Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública	O9._COSTO_TOTAL_PROYECTO_2019_-_SENPLADES_-_SIPeIP_-_Sistema_Integrado_de_Planificación_e_Inversión_Pública.pdf	26/11/2019
169	P1. Ficha_Proyecto- Mantenimiento vial	P1._Ficha_Proyecto-_Mantenimiento_vial.pdf	26/11/2019
170	P2. Alineado al Hito 55 -ACTAS RECEPCION DEFINITIVA MANTENIMIENTO VIAL 2019	P2._Alineado_al_Hirto_55_-_ACTAS_RECEPCION_DEFINITIVA_MANTENIMIENTO_VIAL_2019.pdf	27/11/2019
171	P3. Alineado al Hito 54 - Liquidación y constancia de Pago	P3._Alineado_al_Hito_54_-_Liquidación_y_constancia_de_Pago.pdf	27/11/2019
172	P4. Alineado al Riesgo -2- NACIONAL. Económico. La falta de recursos CAUSARÍA la terminación de los proyectos	P4._Alineado_al_Riesgo_-2-_NACIONAL._Económico._La_falta_de_recursos_CAUSARÍA_la_terminación_de_los_proyec	27/11/2019
173	P5. DEVENGADO MANTENIMIENTO - NOVIEMBRE 2019	P5._DEVENGADO_MANTENIMIENTO_-_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
174	P6. cedula_presupuestaria_diciembre_2019	P6._cedula_presupuestaria_diciembre_2019.pdf	05/02/2020
175	P7. Cédula presupuestaria enero 2020	P7._Cédula_presupuestaria_enero_2020.pdf	05/02/2020
176	P8. Asiganción Presupuestaria Memorando MTOP-FINAN_ESM-2020-19-ME	P8._Asiganción_Presupuestaria_Memorando_MTOP-FINAN_ESM-2020-19-ME.pdf	05/02/2020
177	P9. Cedula_marzo 2020	P9._Cedula_marzo_2020.pdf	05/04/2020
178	pintura estructura metálica del puente sobre el rio balnco	DSC02839.JPG	10/01/2013
179	Q1. Alineado a Hito 52 - Memo de Contratación MTOP-ADM_ESM-2020-126-ME	Q1._Alineado_a_Hito_52_-_Memo_de_Contratación_MTOP-ADM_ESM-2020-126-ME.pdf	05/05/2020
180	Q2. CEDULA_ABRIL 2020	Q2._CEDULA_ABRIL_2020.pdf	05/05/2020
181	Q3. CEDULA_PRESUPUESTARIA MAYO 2020	Q3._CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2020.pdf	05/06/2020
182	Q4. Alineado a Riesgo - Gestionar Mantenimiento de equipo caminero conforme el cronograma establecido	Q4._Alineado_a_Riesgo_-_Gestionar_Mantenimiento_de_equipo_caminero_conforme_el_cronograma_establecido.pdf	16/06/2020
183	Q5. Cedula presupuestaria junio 2020	Q5._Cedula_presupuestaria_junio_2020.pdf	03/07/2020
184	Q6. Cedula presupuestaria julio 2020	Q6._Cedula_presupuestaria_julio_2020.pdf	05/08/2020
185	Q7. CEDULA AGOSTO 2020	Q7._CEDULA_AGOSTO.pdf	05/09/2020
186	Q8. Reporte-Cedula Presupuestaria de Octubre 2020	Q8._Reporte-Cedula_Presupuestaria_de_Octubre_2020.pdf	05/11/2020
187	REINICIO DE LOS TRABAJOS DE LA AV. COLON	REINICIO_COLON.pdf	02/12/2013
188	REINICIO DE LOS TRABAJOS EN LA AV. ELOY ALFARO	REINICIO_DE_ELOY_ALFARO.pdf	02/12/2013
189	Samblasting estructura metálica	DSC03998.JPG	10/01/2013
190	Samblasting estructura metálica puente	DSC03658.JPG	10/01/2013
191	Samblasting estructura metálica puente	DSC03998.JPG	10/01/2013
192	Samblasting estructura metálica puente viche	DSC00178.JPG	10/01/2013
193	señalización 24 mayo	IMG-20130605-00125.jpg	05/06/2013
194	tendido y compactación barrio 24 de mayo	DSC01798.JPG	10/01/2013
195	tirantes para sumidero	IMG-20130216-00459.jpg	12/04/2013
196	trabajos av. colon	SAM_0148.JPG	12/04/2013
197	trabajos Av. Colon	SAM_0008.JPG	12/04/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	Líder de Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	galdas@mtop.gob.ec	023974600 / 0958988062 / 11615
Rezabala Zamora, Maritza Del Carmen	Supervisora Financiera (E)	Supervisora Financiera de Esmeraldas	mrezabala@mtop.gob.ec	0988270005 / 11606

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Valencia Lara, Gustavo Stalin	Administrador del Proyecto	Director Distrital de Esmeraldas	gvalencia@mtop.gob.ec	0983585159

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
18111_1.jpg	05/02/2020
