

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Pichincha

PROYECTO: K012 MTOP - Términos de Referencia para contratar los Estudios de Factibilidad, Impactos Ambientales e Ingeniería Definitivos de la Carretera Mitad del Mundo - Calacalí - La Independencia

Líder del Proyecto:	Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio (jrodriguez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Programas Relacionados:	TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS
Titular:	Gonzales Maza, Walter Dionicio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.373923	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,480,536.18
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	14/03/2013 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	05/11/2020	Fecha de Fin Base:	31/10/2016
Modificado por:	Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	Fecha del siguiente Hito:	01/12/2020

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

Contratista: Consorcio Mitad del Mundo.
 Supervisor: Ing. Richard Navas Coque.
 Monto: USD. 4.391.538,00
 Longitud: 362 Km.

LINEA BASE:

PRODUCTO:

La red vial del Ecuador es un pilar básico para el fomento de la productividad basada en los principios de equidad, equivalencia, excelencia, sostenibilidad ambiental y competitividad, que hace posible el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los principios del Buen Vivir. Por tal motivo, al realizar los estudios correspondientes se evalúan aspectos ambientales, técnicos, sociales que serán el principio para el desarrollo de una construcción vial responsable y óptima.

OBJETIVO GENERAL:

Objeto del Contrato: Estudios de Factibilidad, Impactos Ambientales e Ingeniería; Pre-preliminares, preliminares y Definitivos para la Rectificación, Mejoramiento y Ampliación de la carretera Mitad del Mundo-Calacalí-La Independencia de la provincia de Pichincha.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Beneficios Cualitativos

- *Mejoramiento de la sección típica y calzada de la vía.
- *Disminución en el tiempo de viaje.
- *Elevar el nivel de servicio, confort y seguridad vial que presta la vía actualmente.
- *Enlazar y mejorar las vías de los cantones y zonas rurales (Nanegalito, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, etc).
- *Seguridad vial: señalización, atención de incidentes.
- *Convertirlo en el principal acceso vial que una la zona Centro-Norte con las provincias de la Costa.

Tipo de Beneficiario

1.-GRUPOS ÉTNICOS:

*Cantón Quito: La raza predominante en el Cantón, es la mestiza, con un 82.8%, seguida por la raza blanca con un 6.7 %, luego están los afro ecuatorianos o afro descendientes, con el 4.7%; está la raza indígena, con el 4.1 % montubio, 1.4%; y otras razas, 0.4%. La población total del Cantón, es de 2'239'191 habitantes de los cuales el 48.63% son hombres y el restante 51.37% son mujeres.

Tipo de Beneficiario

*Cantón San Miguel de los bancos: La raza predominante en el Cantón, es la mestiza, con un 84.8 %, afro ecuatorianos o afro descendientes, con el 6.3 %, luego está la raza blanca, con el 5.7%, montubio, 2.3 % seguida por la raza indígena, con un 0.6% ; y otras razas, 0.3%.

La población total del Cantón, es de 17573 habitantes de los cuales el 53.57% son hombres y el restante 46.43% son mujeres.

*Cantón Pedro Vicente Maldonado: La raza predominante en el Cantón, es la mestiza, con un 78.6 %, afro ecuatorianos o afro descendientes, con el 9.7 %, luego está la raza blanca, con el 6.2%, montubio, 2.8 % seguida por la raza indígena, con un 2.6% ; y otras razas, 0.2%.

La población total del Cantón, es de 12924 habitantes de los cuales el 52.25 % son hombres y el restante 47.75 % son mujeres.

*Cantón Puerto Quito: La raza predominante en el Cantón, es la mestiza, con un 83.2 %, afro ecuatorianos o afro descendientes, con el 8.6 %, luego está la raza blanca, con el 5.1%, montubio, 2.4 % seguida por la raza indígena, con un 0.5 % ; y otras razas, 0.2%.

La población total del Cantón, es de 20445 habitantes de los cuales el 52.70 % son hombres y el restante 47.30 % son mujeres.

2.-BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Se considera beneficiarios directos a todos los habitantes del cantón Quito, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Cantón Puerto Quito, de acuerdo al siguiente detalle:

CANTONES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Quito	1088811	1150380	2239191
San Miguel de los Bancos	9413	8160	17573
Pedro Vicente Maldonado	6735	6189	12924
Puerto Quito	10774	9671	20445
Total	1115733	1174400	2290133
%	48.72	51.28	100
%Acumulado	48.72	100	100

3.-GRUPOS PRODUCTIVOS:

- *Sectores agrícolas
- *Sectores ganaderos
- *Sector turístico

Restricciones

RECURSOS: Humanos: suficiente personal técnico especializado para revisión y aprobación de informes de los estudios.

Recursos Fiscales existentes para financiación del proyecto de estudio.

Equipos: poseer equipos especializados para la correcta ejecución de los estudios técnicos y evitar fallas en la etapa de construcción.

COSTO: el valor monetario es de USD. 4'391.538,00 SIN IVA para la ejecución del estudio.

TIEMPO: el proyecto tendrá una duración de 21 meses.


ALCANCE: Generación de documentación técnica, viabilidad, presupuesto, planos y especificaciones técnicas regidas al MOP-001-F2002 para la posterior construcción del objeto del estudio.

CALIDAD: generar los estudios técnicos y financieros lo más adecuados a la realidad para evitar sobre o subestimaciones que generen problemas en la ejecución en la fase de construcción.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.91 %
 Fecha de Inicio: 14/03/2013 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	85 %	90 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	100 %
	Avance real acumulado											
	85 %	90 %	92 %									
	Estado											
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 12). -La Ficha y Plan de Manejo Ambiental cuenta con aprobación por parte del MAE. -En proceso de liquidación económica y trámites administrativos previo a la suscripción del Acta Recepción. -En trámite de pago la planilla de liquidación. -Se ha realizado las reproducciones (Hito 13). -Se ha aprobado el estudio con informes de supervisión (Hito 14). -Mediante memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2020-0536-M de fecha 28 de abril de 2020, se ha solicitado la autorización de modificación presupuestaria para financiar la planilla de liquidación. Aún no se asignan los recursos económicos. -Mediante memorando MTOP-DPP-2020-726-ME de fecha 25 de mayo de 2020 el Director Distrital de Pichincha solicita nuevamente la asignación de recursos. No hay asignación al respecto. -Con oficio No. 308-2020-CMM-CLR, de 07 de octubre de 2020, el ingeniero Carlos León Romero, Director de Proyecto del Consultor, solicita a la Dirección Provincial de Pichincha "el pago total de la planilla 21 y reajuste". -Con memorando MTOP-DNEIT-2020-551-ME de fecha 23 de octubre de 2020 el Director Nacional de Estudios, Encargado emite lo siguiente "se recomienda que a la brevedad posible se realice el pago de la Planilla 21 de Liquidación del Contrato y su reajuste; a la vez que, en el caso de ser procedente, se considere la petición del Consultor de realizar abonos parciales al total de la deuda. 	Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	05/11/2020 - 02:17 PM
<p>SEPTIEMBRE 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 12). -La Ficha y Plan de Manejo Ambiental cuenta con aprobación por parte del MAE. -En proceso de liquidación económica y trámites administrativos previo a la suscripción del Acta Recepción. -En trámite de pago la planilla de liquidación. -Se ha realizado las reproducciones (Hito 13). -Se ha aprobado el estudio con informes de supervisión (Hito 14). -Mediante memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2020-0536-M de fecha 28 de abril de 2020, se ha solicitado la autorización de modificación presupuestaria para financiar la planilla de liquidación. Aún no se asignan los recursos económicos. 	Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	04/10/2020 - 08:22 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 12). -La Ficha y Plan de Manejo Ambiental cuenta con aprobación por parte del MAE. -En proceso de liquidación económica y trámites administrativos previo a la suscripción del Acta Recepción. -En trámite de pago la planilla de liquidación. -Se ha realizado las reproducciones (Hito 13). -Se ha aprobado el estudio con informes de supervisión (Hito 14). -Mediante memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2020-0536-M de fecha 28 de abril de 2020, se ha solicitado la autorización de modificación presupuestaria para financiar la planilla de liquidación. Aún no se asignan los recursos económicos. 	<p>Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio</p>	<p>04/09/2020 - 10:10 AM</p>
<p>JULIO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 12). -La Ficha y Plan de Manejo Ambiental cuenta con aprobación por parte del MAE. -En proceso de liquidación económica y trámites administrativos previo a la suscripción del Acta Recepción. -En trámite de pago la planilla de liquidación. -Se ha realizado las reproducciones (Hito 13). -Se ha aprobado el estudio con informes de supervisión (Hito 14). -Mediante memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2020-0536-M de fecha 28 de abril de 2020, se ha solicitado la autorización de modificación presupuestaria para financiar la planilla de liquidación. Aún no se asignan los recursos económicos. 	<p>Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio</p>	<p>04/08/2020 - 01:39 PM</p>
<p>JUNIO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 12). -La Ficha y Plan de Manejo Ambiental cuenta con aprobación por parte del MAE. -En proceso de liquidación económica y trámites administrativos previo a la suscripción del Acta Recepción. -En trámite de pago la planilla de liquidación. -Se ha realizado las reproducciones (Hito 13). -Se ha aprobado el estudio con informes de supervisión (Hito 14). -Mediante memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2020-0536-M de fecha 28 de abril de 2020, se ha solicitado la autorización de modificación presupuestaria para financiar la planilla de liquidación. Aún no se asignan los recursos económicos. 	<p>Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio</p>	<p>03/07/2020 - 09:21 AM</p>
<p>MAYO 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 12). -La Ficha y Plan de Manejo Ambiental cuenta con aprobación por parte del MAE. -En proceso de liquidación económica y trámites administrativos previo a la suscripción del Acta Recepción. -En trámite de pago la planilla de liquidación. -Se ha realizado las reproducciones (Hito 13). 	<p>Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio</p>	<p>04/06/2020 - 05:11 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Se ha aprobado el estudio con informes de supervisión (Hito 14).</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2020-0536-M de fecha 28 de abril de 2020, se ha solicitado la autorización de modificación presupuestaria para financiar la planilla de liquidación.</p>		
<p>ABRIL 2020:</p> <p>-Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 12).</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-En proceso de liquidación económica y trámites administrativos previo a la suscripción del Acta Recepción.</p> <p>-En trámite de pago la planilla de liquidación.</p> <p>-Se ha realizado las reproducciones (Hito 13).</p> <p>-Se ha aprobado el estudio con informes de supervisión (Hito 14).</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2020-0536-M de fecha 28 de abril de 2020, se ha solicitado la autorización de modificación presupuestaria para financiar la planilla de liquidación.</p>	<p>Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio</p>	<p>05/05/2020 - 10:24 AM</p>
<p>MARZO 2020:</p> <p>-Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 12).</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-En proceso de liquidación económica y trámites administrativos previo a la suscripción del Acta Recepción.</p> <p>-En trámite de pago la planilla de liquidación.</p> <p>-Se ha realizado las reproducciones (Hito 13).</p> <p>-Se ha aprobado el estudio con informes de supervisión (Hito 14).</p>	<p>Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio</p>	<p>03/04/2020 - 05:52 PM</p>
<p>FEBRERO 2020:</p> <p>-Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 10).</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-En proceso de liquidación económica y trámites administrativos previo a la suscripción del Acta Recepción.</p> <p>-En trámite de pago la planilla de liquidación.</p>	<p>Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio</p>	<p>04/03/2020 - 08:45 AM</p>
<p>ENERO 2020:</p> <p>-Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 10).</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-En proceso de liquidación económica y trámites administrativos para suscripción de Acta Recepción.</p>	<p>Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio</p>	<p>05/02/2020 - 09:35 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2019:</p> <p>-Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 10).</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-En proceso de liquidación económica y trámites administrativos para suscripción de Acta Recepción.</p>	<p>Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio</p>	<p>03/01/2020 - 08:34 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2019:</p> <p>-Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 10).</p>	<p>Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio</p>	<p>05/12/2019 - 08:33 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-En proceso de liquidación económica y trámites administrativos para suscripción de Acta Recepción.</p>		
<p>OCTUBRE 2019:</p> <p>-Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 10).</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-En proceso de liquidación económica y trámites administrativos para suscripción de Acta Recepción.</p>	Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	05/11/2019 - 09:56 AM
<p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <p>-Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 10).</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-En proceso de liquidación económica y trámites administrativos para suscripción de Acta Recepción.</p>	Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	04/10/2019 - 11:53 AM
<p>AGOSTO 2019:</p> <p>-Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 10).</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-En proceso de liquidación económica y trámites administrativos para suscripción de Acta Recepción.</p>	Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	05/09/2019 - 08:33 AM
<p>JULIO 2019:</p> <p>-Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 10).</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-En proceso de liquidación económica y trámites administrativos para suscripción de Acta Recepción.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	01/08/2019 - 12:27 PM
<p>JUNIO 2019:</p> <p>-Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 10).</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-En proceso de liquidación económica y trámites administrativos para suscripción de Acta Recepción.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	01/07/2019 - 12:31 PM
<p>MAYO 2019:</p> <p>-Se encuentran aprobados en su totalidad los estudios (Hito 10).</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-En proceso de liquidación económica y trámites administrativos para suscripción de Acta Recepción.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	05/06/2019 - 10:26 AM
<p>ABRIL 2019:</p> <p>Están aprobados los estudios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hidráulicos - Hidrológicos <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-Actualización proyecto SENPLADES solicitado con memorando N° MTOP-DPP-2016-1155-ME, de fecha 11 de julio de 2016.</p> <p>-Mediante oficio nro. MTOP-DEV-17-194-OF el Administrador remite Observaciones al consultor del componente geológico y área sísmica.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	02/05/2019 - 05:57 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-En fase final de aprobación del informe final de ingeniería		
<p>ABRIL 2019: Están aprobados los estudios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hidráulicos - Hidrológicos <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-Actualización proyecto SENPLADES solicitado con memorando N° MTOP-DPP-2016-1155-ME, de fecha 11 de julio de 2016. -Mediante oficio nro. MTOP-DEV-17-194-OF el Administrador remite Observaciones al consultor del componente geológico y área sísmica. -En fase final de aprobación del informe final de ingeniería</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	02/05/2019 - 09:06 AM
<p>MARZO 2019: Están aprobados los estudios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hidráulicos - Hidrológicos <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-Actualización proyecto SENPLADES solicitado con memorando N° MTOP-DPP-2016-1155-ME, de fecha 11 de julio de 2016. -Mediante oficio nro. MTOP-DEV-17-194-OF el Administrador remite Observaciones al consultor del componente geológico y área sísmica. -En fase final de aprobación del informe final de ingeniería</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	02/05/2019 - 09:06 AM
<p>FEBRERO 2019: - Estan aprobados los estudios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hidráulicos - Hidrológicos <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-Actualización proyecto SENPLADES solicitado con memorando N° MTOP-DPP-2016-1155-ME, de fecha 11 de julio de 2016. -Mediante oficio nro. MTOP-DEV-17-194-OF el Administrador remite Observaciones al consultor del componente geológico y área sísmica.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	03/04/2019 - 05:03 PM
<p>ENERO 2019: - Estan aprobados los estudios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hidráulicos - Hidrológicos <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-Actualización proyecto SEMPLADES solicitado con memorando N° MTOP-DPP-2016-1155-ME, de fecha 11 de julio de 2016. -Mediante oficio nro. MTOP-DEV-17-194-OF el Administrador remite Observaciones al consultor del componente geológico y área sísmica.</p>	Vargas Acuña, Carlos Andres	27/02/2019 - 01:25 PM
<p>ENERO 2017: - Estan aprobados los estudios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hidráulicos - Hidrológicos <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-Actualización proyecto SEMPLADES solicitado con memorando N° MTOP-DPP-2016-1155-ME, de fecha 11 de julio de 2016. -Mediante oficio nro. MTOP-DEV-17-194-OF el Administrador remite Observaciones al consultor del componente geológico y área sísmica.</p>	Vargas Acuña, Carlos Andres	05/02/2019 - 11:10 AM
<p>DICIEMBRE 2017: -La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE. -La planilla N° 20 fue pagada con fecha 02 de junio de 2017.</p>	Vargas Acuña, Carlos Andres	05/01/2018 - 11:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Actualización proyecto SEMPLADES solicitado con memorando N° MTOP-DPP-2016-1155-ME, de fecha 11 de julio de 2016.</p> <p>-Mediante oficio nro. MTOP-DEV-17-194-OF el Administrador remite Observaciones al consultor del componente geológico y área sísmica.</p> <p>-Se aprobaron los estudios hidrológicos, hidráulicos para obras de arte mayor.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2017:</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-La planilla N° 20 fue pagada con fecha 02 de junio de 2017.</p> <p>-Actualización proyecto SEMPLADES solicitado con memorando N° MTOP-DPP-2016-1155-ME, de fecha 11 de julio de 2016.</p> <p>-Mediante oficio nro. MTOP-DEV-17-194-OF el Administrador remite Observaciones al consultor del componente geológico y área sísmica.</p> <p>-Se aprobaron los estudios hidrológicos, hidráulicos para obras de arte mayor.</p>	Vargas Acuña, Carlos Andres	05/12/2017 - 02:29 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-La planilla N° 20 fue pagada con fecha 02 de junio de 2017.</p> <p>-Actualización proyecto SEMPLADES solicitado con memorando N° MTOP-DPP-2016-1155-ME, de fecha 11 de julio de 2016.</p> <p>-Observaciones remitidas al consultor en el area de geotecnia y estructuras.</p> <p>-Se aprobaron los estudios hidrológicos, hidráulicos para obras de arte mayor.</p>	Vargas Acuña, Carlos Andres	01/11/2017 - 03:30 PM
<p>AGOSTO 2017:</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-La planilla N° 20 fue pagada con fecha 02 de junio de 2017.</p> <p>-Actualización proyecto SEMPLADES solicitado con memorando N° MTOP-DPP-2016-1155-ME, de fecha 11 de julio de 2016.</p> <p>-Observaciones remitidas al consultor en el area de geotecnia y estructuras.</p> <p>-Se aprobaron los estudios hidrológicos, hidráulicos para obras de arte mayor.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	04/09/2017 - 03:27 PM
<p>JULIO 2017:</p> <p>-La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>-La planilla N° 20 fue pagada con fecha 02 de junio de 2017.</p> <p>-Actualización proyecto SEMPLADES solicitado con memorando N° MTOP-DPP-2016-1155-ME, de fecha 11 de julio de 2016.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	04/09/2017 - 03:09 PM
<p>JUNIO 2017:</p> <p>La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>Con memorando Nro. MTOP-DEV-2017-267-ME de fecha 20 de Abril de 2017 la Dirección de Estudios aprueba las cantidades de la planilla No 20.</p> <p>Con memorando Nro. CON_PIC-2017-144-ME de fecha 20 de Abril de 2017 El Supervisor aprueba la Planilla No 20, actualmente a cargo del Administrador(Dirección de Estudios) la planilla No. 20 para su revisión y aprobación.</p> <p>La planilla No 20 fue pagada con fecha 02 de junio de 2017.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	05/07/2017 - 11:36 AM
<p>MAYO 2017:</p> <p>La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>Con memorando Nro. MTOP-DEV-2017-267-ME de fecha 20 de Abril de 2017 la Dirección de Estudios aprueba las cantidades de la planilla No 20.</p> <p>Con memorando Nro. CON_PIC-2017-144-ME de fecha 20 de Abril de 2017 El Supervisor aprueba la Planilla No 20, actualmente a cargo del Administrador(Dirección de Estudios) la planilla No. 20 para su revisión y aprobación.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	06/06/2017 - 11:07 AM
<p>ABRIL 2017:</p> <p>La Ficha y Plan de Manejo Ambiental se cuenta con aprobación por parte del MAE.</p> <p>Con memorando Nro. MTOP-DEV-2017-267-ME de fecha 20 de Abril de 2017 la Dirección de Estudios aprueba las cantidades de la planilla No 20.</p> <p>Con memorando Nro. CON_PIC-2017-144-ME de fecha 20 de Abril de 2017 El Supervisor aprueba la Planilla No 20 y se remite al Administrador(Dirección de Estudios) la planilla No. 20 para su revisión y aprobación.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	09/05/2017 - 11:32 AM
<p>MARZO 2017:</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	03/04/2017 - 12:25 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* Con Oficios No. MTOP-DEV-15-261-OF y MTOP-DEV-15-278-OF, de fecha 10 de Julio de 2015 y 17 de Julio de 2015 respectivamente la Directora de Estudios del Transporte comunica al contratista sobre las observaciones realizadas a la Ficha y Plan de Manejo Ambiental a los anteproyectos estructurales de los siguientes puentes: Puente sobre el río Blanco y Caoní del proyecto de la referencia, mismas que deberán ser absueltas por el consultor dentro del menor tiempo posible.</p> <p>* El contratista ingresó la planilla No. 20 a la Dirección Distrital de Pichincha, al momento se encuentra en la Unidad Financiera con la finalidad de continuar con el trámite de pago respectivo.</p>		
<p>FEBRERO 2017:</p> <p>* Con Oficios No. MTOP-DEV-15-261-OF y MTOP-DEV-15-278-OF, de fecha 10 de Julio de 2015 y 17 de Julio de 2015 respectivamente la Directora de Estudios del Transporte comunica al contratista sobre las observaciones realizadas a la Ficha y Plan de Manejo Ambiental a los anteproyectos estructurales de los siguientes puentes: Puente sobre el río Blanco y Caoní del proyecto de la referencia, mismas que deberán ser absueltas por el consultor dentro del menor tiempo posible.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	06/03/2017 - 12:08 PM
<p>ENERO 2017:</p> <p>* Con Oficios No. MTOP-DEV-15-261-OF y MTOP-DEV-15-278-OF, de fecha 10 de Julio de 2015 y 17 de Julio de 2015 respectivamente la Directora de Estudios del Transporte comunica al contratista sobre las observaciones realizadas a la Ficha y Plan de Manejo Ambiental a los anteproyectos estructurales de los siguientes puentes: Puente sobre el río Blanco y Caoní del proyecto de la referencia, mismas que deberán ser absueltas por el consultor dentro del menor tiempo posible.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	07/02/2017 - 11:49 AM
<p>DICIEMBRE 2016: Con Oficios Nro. MTOP-DEV-15-261-OF y MTOP-DEV-15-278-OF, de fecha 10 de julio de 2015 y 17 de julio de 2015 respectivamente la Directora de Estudios del Transporte comunica al contratista sobre las observaciones realizadas a la Ficha y Plan de Manejo Ambiental a los anteproyectos estructurales de los siguientes puentes: Puente sobre el río Blanco y Caoní del proyecto de la referencia, mismas que deberán ser absueltas por el Consultor.</p>	Navas Coque, Richard Wladimir	05/01/2017 - 07:50 PM
<p>NOVIEMBRE 2016: Mediante Oficio Nro. MTOP-DEV-16-258-OF de fecha 05 de octubre de 2016 se aprueba el estudio de Señalización, mediante Oficio Nro. MTOP-DEV-16-264-OF de fecha 06 de octubre de 2016 se aprueba el Diseño Geométrico Definitivo. Se remiten observaciones al estudio de factibilidad y estabilidad de taludes y zonas inestables.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	07/12/2016 - 02:48 PM
<p>OCTUBRE 2016: Mediante Oficio Nro. MTOP-DEV-16-258-OF de fecha 05 de octubre de 2016 se aprueba el estudio de Señalización, mediante Oficio Nro. MTOP-DEV-16-264-OF de fecha 06 de octubre de 2016 se aprueba el Diseño Geométrico Definitivo. Se remiten observaciones al estudio de factibilidad y estabilidad de taludes y zonas inestables.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	07/12/2016 - 02:45 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016: Con Oficio No. MTOP-DEV-15-261-OF y MTOP-DEV-15-278-OF, de fecha 10 de Julio 2015 y 17 de Julio de 2015 respectivamente la Directora de Estudios del Transporte comunica al contratista sobre las observaciones realizadas a la Ficha y Plan de Manejo Ambiental a los anteproyectos estructurales de los puentes: Puente sobre el río Blanco y Caoní del proyecto de la referencia, mismas que deberán ser absueltas por el consultor.</p> <p>Al momento se realiza un cruce de información con el contratista con la finalidad de subsanar más rapido las observaciones antes refereridas.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	07/10/2016 - 11:21 AM
<p>AGOSTO 2016: Con Oficio No. MTOP-DEV-15-261-OF y MTOP-DEV-15-278-OF, de fecha 10 de Julio 2015 y 17 de Julio de 2015 respectivamente la Directora de Estudios del Transporte comunica al contratista sobre las observaciones realizadas a la Ficha y Plan de Manejo Ambiental a los anteproyectos estructurales de los puentes: Puente sobre el río Blanco y Caoní del proyecto de la referencia, mismas que deberán ser absueltas por el consultor.</p> <p>Al momento se realiza un cruce de información con el contratista con la finalidad de subsanar más rapido las observaciones antes refereridas.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	01/09/2016 - 11:15 AM
<p>JULIO 2016: Con Oficio No. MTOP-DEV-15-261-OF y MTOP-DEV-15-278-OF, de fecha 10 de Julio 2015 y 17 de Julio de 2015 respectivamente la Directora de Estudios del Transporte comunica al contratista sobre las observaciones realizadas a la Ficha y Plan de Manejo Ambiental a los anteproyectos estructurales de los puentes: Puente sobre el río Blanco y Caoní del proyecto de la referencia, mismas que deberán ser absueltas por el consultor.</p> <p>Al momento se realiza un cruce de información con el contratista con la finalidad de subsanar más rapido las observaciones antes refereridas.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	09/08/2016 - 09:52 AM
<p>JUNIO 2016: Con Oficio No. MTOP-DEV-15-261-OF y MTOP-DEV-15-278-OF, de fecha 10 de Julio 2015 y 17 de Julio de 2015 respectivamente la Directora de Estudios del Transporte comunica al contratista sobre las observaciones realizadas a la Ficha y Plan de Manejo Ambiental a los anteproyectos estructurales de los puentes: Puente sobre el río Blanco y Caoní del proyecto de la referencia, mismas que deberán ser absueltas por el consultor.</p>	Aldas Aldas, Michael Dario	11/07/2016 - 11:58 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2016: Con Oficio No. MTOP-DEV-15-261-OF y MTOP-DEV-15-278-OF, de fecha 10 de Julio 2015 y 17 de Julio de 2015 respectivamente la Directora de Estudios del Transporte comunica al contratista sobre las observaciones realizadas a la Ficha y Plan de Manejo Ambiental a los anteproyectos estructurales de los puentes: Puente sobre el río Blanco y Caoní del proyecto de la referencia, mismas que deberán ser absueltas por el consultor.	Aldas Aldas, Michael Dario	08/06/2016 - 04:47 PM
ABRIL 2016: Mediante MTOP-DEV-2016-196-ME se aprueban las planillas referidas anteriormente y se solicita proceder con el trámite de pago correspondiente por parte del Director Provincial.	Aldas Aldas, Michael Dario	05/05/2016 - 02:33 PM
MARZO 2016: Se aprueban las 16 y 17 por parte del Supervisor, se remiten al Administrador del Contrato, Ing. Mariela Macías para su respectiva revisión y aprobación.	Aldas Aldas, Michael Dario	05/05/2016 - 02:07 PM
FEBRERO 2016: Se presentan por parte del Consultor las planillas 16 y 17, al momento el Supervisor se encuentra revisando las mismas.	Aldas Aldas, Michael Dario	05/05/2016 - 02:02 PM
ENERO 2016: Con oficios No. MTOP-DEV-15-261-OF y MTOP-DEV-15-278-OF de fecha 10 de Julio de 2015 y 17 de Julio de 2015 respectivamente, la Directora de Estudios del Transporte comunica al contratista sobre las observaciones realizadas a la Ficha y Plan de Manejo Ambiental a los anteproyectos estructurales de los puentes: Puente sobre el Río Blanco y Caoní del proyecto de la referencia; las mismas que seran absueltas por el Consultor.	Aldas Aldas, Michael Dario	05/05/2016 - 02:01 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Acta Entrega - Recepción Definitiva de los Estudios	05/11/2020	Jorge Antonio Rodríguez Cepeda	10	10	1	2/3

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pedro Vicente Maldonado
2	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pto. Quito
3	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Sn. Miguel de los Bancos
4	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento del proyecto en Formato SENPLADES. Elaborado	1-Solicitud de Información	14/03/2013		14/03/2013		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPEIP. Postulado.	1-Solicitud de Información	14/03/2013		14/03/2013		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Entrega de Anticipo. Realizado	3-Adjudicación	14/03/2013		16/03/2013		Sí	5.0
4	PLANEACIÓN: Firma del Contrato. Realizado.	3-Adjudicación	14/03/2013		14/03/2013		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Estudio de Evaluación y Mitigación de Impactos Ambientales. Realizado.	5-Entregables Intermedios	18/03/2013		08/05/2013		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	EJECUCIÓN: Estudio de Factibilidad. Realizado.	4-Inicio de Trabajo	18/03/2013		05/07/2013		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Estudio Pre-Preliminar. Realizado.	5-Entregables Intermedios	18/03/2013		08/05/2013		Sí	7.5
8	EJECUCIÓN: Estudio Preliminar. Realizado.	5-Entregables Intermedios	05/07/2013		08/05/2014		Sí	7.5
9	EJECUCIÓN: Estudio de Ingeniería Definitivos. Realizado.	5-Entregables Intermedios	08/05/2014		20/02/2016		Sí	10.0
10	EJECUCIÓN: Obras Complementarias. Realizado.	5-Entregables Intermedios	08/05/2014		20/02/2016		Sí	10.0
11	EJECUCIÓN: Presentación del Informe Final. Realizado.	9-Entregables Formales	14/05/2015		20/02/2016		Sí	10.0
12	EJECUCIÓN: Aprobación del Informe Final. Realizado.	9-Entregables Formales	20/02/2016		17/04/2019		Sí	10.0
13	EJECUCIÓN: Reproducciones. Realizado.	5-Entregables Intermedios	18/02/2020		18/02/2020		Sí	5.0
14	CIERRE: Informes de supervisión aprobados	5-Entregables Intermedios	16/03/2020		16/03/2020		Sí	2.0
15	CIERRE: Liquidación económica aprobada	9-Entregables Formales	01/12/2020	01/12/2020			No	1.0
16	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva. Realizado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	08/12/2020	08/12/2020			No	1.0
17	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	5-Entregables Intermedios	15/12/2020	15/12/2020			No	1.0
18	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	5-Entregables Intermedios	22/12/2020	22/12/2020			No	2.0
19	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	23/12/2020	23/12/2020			No	1.0
20	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	5-Entregables Intermedios	28/12/2020	28/12/2020			No	1.5
21	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	5-Entregables Intermedios	29/12/2020	29/12/2020			No	0.5
22	COMPLETADO: Informe de cierre de proyecto (Planifica Ecuador) Aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	1,317,461.40
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,480,536.18 **
Costo Total:	4,327,401.09
Total Devengado:	3,069,547.41
% Costo Total Devengado:	70.93 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 70.93 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	7,497,789.93	1,257,853.66	0.00	8,755,643.59
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	2,330,886.37	621,171.79	0.00	2,952,058.16
Ppto. Codificado	4,598,680.53	410,988.77	0.00	5,009,669.30
Ppto. Comprometido	3,760,078.62	0.00	0.00	3,760,078.62
Planeado - Codificado (2020)		846,864.89		
Programado a Devengar	3,040,936.86	410,988.77	0.00	3,451,925.63
Ppto. Devengado	3,069,547.41	0.00	0.00	3,069,547.41
Pagado Real	3,069,547.41	0.00	0.00	3,069,547.41
Estimado a fin de año	* 3,069,547.41	0.00	0.00	3,069,547.41
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-28,610.55	410,988.77	0.00	382,378.22
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.94 %	0.00 %	0.00 %	88.92 %
Ppto. Codificado 998	1,346,742.35	0.00	0.00	1,346,742.35
Ppto. Devengado 998	928,001.73	0.00	0.00	928,001.73

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

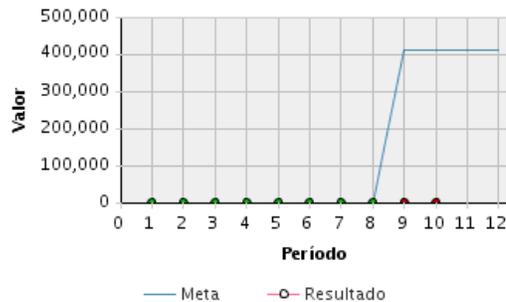

Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	410,988.77	0.00	410,988.77	0.00	0.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	410,988.77	0.00	0.00 %		0.00 %
Nov	0.00		410,988.77				
Dic	0.00		410,988.77				
Total	410,988.77	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
14	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal PROVINCIAL MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
17	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Contrato Original.	ContratoOriginal5787.pdf	12/02/2016
2	A2. Contrato Complementario No. 01.	ContratoComple1.pdf	12/02/2016
3	A3. Contrato Complementario No. 02.	ContratoComplementario2.pdf	12/02/2016
4	A4. Contrato Complementario No. 03.	ContratoComple3.pdf	12/02/2016
5	A5. Contrato Complementario No. 04.	ContratoComplementarioNo.04.pdf	12/02/2016
6	A6. Informe Ejecutivo SITOP-Enero 2016.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Enero_2016..pdf	05/05/2016
7	A7. Informe Ejecutivo SITOP-Febrero 2016.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Febrero_2016..pdf	05/05/2016
8	A8. Informe Ejecutivo SITOP-Marzo 2016.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Marzo_2016..pdf	05/05/2016
9	A9. Autorización de ampliación de "Fecha de Fin", proyecto consta en PAI 2020	2020.01.23_MTOP-CGP-2020-78-ME_y_anexos_K009_K012_K014_K018_y_a_fase_Congelado_K006_K007_K015_K	23/01/2020
10	B1. Informe Ejecutivo SITOP-Abril 2016.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Abril_2016..pdf	05/05/2016
11	B2. Informe Ejecutivo SITOP-Mayo 2016.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Mayo_2016.1.pdf	08/06/2016
12	B3. Informe Ejecutivo SITOP-Junio 2016.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Junio_2016..pdf	11/07/2016
13	B4. Informe Ejecutivo SITOP-Julio 2016.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Julio_2016..pdf	09/08/2016
14	B5. Informe Ejecutivo SITOP-Agosto 2016.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Agosto_2016..pdf	01/09/2016
15	B6. Informe Ejecutivo SITOP-Septiembre 2016.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Septiembre_2016..pdf	07/10/2016
16	B7. Informe Ejecutivo SITOP-Octubre 2016.	Informe_Ejecutivo-Octubre_2016..pdf	07/12/2016
17	B8. Informe Ejecutivo SITOP-Noviembre 2016.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Noviembre_2016..pdf	07/12/2016
18	C1. Informe Ejecutivo SITOP-Diciembre 2016.	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_DICIEMBRE_2016.pdf	05/01/2017
19	C2. Informe Ejecutivo SITOP-Enero 2017.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Enero_2017..pdf	07/02/2017
20	C3. Informe Ejecutivo SITOP-Febrero 2017.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Febrero_2017..pdf	06/03/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
21	C4. Informe Ejecutivo SIITOP-Marzo 2017.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Marzo_2017..pdf	03/04/2017
22	C5. Informe Ejecutivo Sitop_Abril 2017	Informe_Ejecutivo_Sitop_Abril_2017.pdf	08/05/2017
23	C6. ANEXO SÁBANA PLANILLA 1	SÁBANA_PLANILLA_1.pdf	08/05/2017
24	C7. ANEXO SÁBANA PLANILLA 2	SÁBANA_PLANILLA_2.pdf	08/05/2017
25	C8. ANEXO SÁBANA PLANILLA 3	SÁBANA_PLANILLA_3.pdf	08/05/2017
26	D1. ANEXO SÁBANA PLANILLA 4	SÁBANA_PLANILLA_4.pdf	08/05/2017
27	D2. Informe Ejecutivo Sitop_Mayo 2017.	Informe_Ejecutivo_Sitop_Mayo_2017_ID_5787.pdf	06/06/2017
28	D3. Informe Ejecutivo Sitop_Junio 2017.	Informe_Ejecutivo_Sitop_Junio_2017_ID_5787..pdf	05/07/2017
29	D4. Informe Ejecutivo Sitop_Julio 2017.	Informe_Ejecutivo_Sitop_julio_2017_ID_5787.pdf	02/08/2017
30	D5. Informe Ejecutivo Sitop_Agosto 2017	Informe_Ejecutivo_Sitop_agosto_2017_ID_5787.pdf	04/09/2017
31	D6. Informe Ejecutivo Sitop_Septiembre 2017.	Informe_Ejecutivo_Sitop_septiembre_2017_ID_5787.pdf	05/10/2017
32	D7. Informe Ejecutivo Sitop_octubre 2017.	Informe_Ejecutivo_Sitop_octubre_2017_ID_5787.pdf	01/11/2017
33	D8 INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2017 ID 5787	INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2017_ID_5787.pdf	04/12/2017
34	E1. Informe Ejecutivo Sitop_diciembre 2017.	Informe_Ejecutivo_Sitop_diciembre_2017.pdf	05/01/2018
35	E2. Designación Ing. Richard Navas_Supervisor Estudios_08-05-2018	MTOP-DPP-2018-726-ME_DESIGNACIÓN_SUPERVISOR_5787.pdf	28/06/2018
36	E3_INFORME EJECUTIVO ENERO 2019_5787	INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2019_ID_5787.pdf	01/03/2019
37	E4_INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019_5787	INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2019_ID_5787-.pdf	01/03/2019
38	E5_INFORME EJECUTIVO MARZO 2019_5787	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2019_ID_5787.pdf	02/07/2019
39	E6_INFORME EJECUTIVO ABRIL 2019_5787	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2019_ID_5787.pdf	02/07/2019
40	E7_INFORME EJECUTIVO MAYO 2019_5787	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2019_ID_5787.pdf	02/07/2019
41	E8_INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019_5787	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2019_ID_5787.pdf	02/07/2019
42	F1.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ENERO 2013	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ENERO_2013.pdf	02/04/2020
43	F2.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_FEBRERO 2013	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_FEBRERO_2013.pdf	20/11/2019
44	F3.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_MARZO 2013	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_MARZO_2013.pdf	20/11/2019
45	F4.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ABRIL 2013	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ABRIL_2013.pdf	20/11/2019
46	F5.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_MAYO 2013	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_MAYO_2013.pdf	20/11/2019
47	F6.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_JUNIO 2013	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_JUNIO_2013.pdf	20/11/2019
48	F7.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_JULIO 2013	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_JULIO_2013.pdf	20/11/2019
49	F8.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_AGOSTO 2013	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_AGOSTO_2013.pdf	20/11/2019
50	F9.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_SEPTIEMBRE 2013	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_SEPTIEMBRE_2013.pdf	20/11/2019
51	G1.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_OCTUBRE 2013	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_OCTUBRE_2013.pdf	20/11/2019
52	G2.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_NOVIEMBRE 2013	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_NOVIEMBRE_2013.pdf	20/11/2019
53	G3.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_DICIEMBRE 2013	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_DICIEMBRE_2013.pdf	20/11/2019
54	G4.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ENERO 2014	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ENERO_2014.pdf	20/11/2019
55	G5.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_FEBRERO 2014	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_FEBRERO_2014.pdf	20/11/2019
56	G6.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_MARZO 2014	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_MARZO_2014.pdf	20/11/2019
57	G7.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ABRIL 2014	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ABRIL_2014.pdf	20/11/2019
58	G8.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_MAYO 2014	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_MAYO_2014.pdf	20/11/2019
59	G9.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_JUNIO 2014	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_JUNIO_2014.pdf	20/11/2019
60	H1.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_JULIO 2014	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_JULIO_2014.pdf	20/11/2019
61	H2.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_AGOSTO 2014	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_AGOSTO_2014.pdf	20/11/2019
62	H3.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_SEPTIEMBRE 2014	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_SEPTIEMBRE_2014.pdf	20/11/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
63	H4.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_OCTUBRE 2014	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_OCTUBRE_2014.pdf	20/11/2019
64	H5.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_NOVIEMBRE 2014	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_NOVIEMBRE_2014.pdf	20/11/2019
65	H6.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_DICIEMBRE 2014	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_DICIEMBRE_2014.pdf	20/11/2019
66	H7.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ENERO 2015	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ENERO_2015.pdf	21/11/2019
67	H8.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_FEBRERO 2015	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_FEBRERO_2015.pdf	21/11/2019
68	H9.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_MARZO 2015	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_MARZO_2015.pdf	21/11/2019
69	I1.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ABRIL 2015	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ABRIL_2015.pdf	21/11/2019
70	I2.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_MAYO 2015	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_MAYO_2015.pdf	21/11/2019
71	I3.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_JUNIO 2015	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_JUNIO_2015.pdf	21/11/2019
72	I4.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_JULIO 2015	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_JULIO_2015.pdf	21/11/2019
73	I5.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_AGOSTO 2015	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_AGOSTO_2015.pdf	21/11/2019
74	I6.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_SEPTIEMBRE 2015	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_SEPTIEMBRE_2015.pdf	21/11/2019
75	I7.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_OCTUBRE 2015	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_OCTUBRE_2015.pdf	21/11/2019
76	I8.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_NOVIEMBRE 2015	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_NOVIEMBRE_2015.pdf	21/11/2019
77	I9.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_DICIEMBRE 2015	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_DICIEMBRE_2015.pdf	21/11/2019
78	J1.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ENERO 2016	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ENERO_2016.pdf	21/11/2019
79	J2.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_FEBRERO 2016	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_FEBRERO_2016.pdf	21/11/2019
80	J3.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_MARZO 2016	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_MARZO_2016.pdf	21/11/2019
81	J4.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ABRIL 2016	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ABRIL_2016.pdf	21/11/2019
82	J5.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_MAYO 2016	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_MAYO_2016.pdf	21/11/2019
83	J6.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_JUNIO 2016	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_JUNIO_2016.pdf	21/11/2019
84	J7.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_JULIO 2016	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_JULIO_2016.pdf	21/11/2019
85	J8.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_AGOSTO 2016	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_AGOSTO_2016.pdf	21/11/2019
86	J9.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_SEPTIEMBRE 2016	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_SEPTIEMBRE_2016.pdf	21/11/2019
87	K1.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_OCTUBRE 2016	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_OCTUBRE_2016.pdf	21/11/2019
88	K2.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_NOVIEMBRE 2016	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_NOVIEMBRE_2016.pdf	21/11/2019
89	K3.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_DICIEMBRE 2016	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_DICIEMBRE_2016.pdf	21/11/2019
90	K4.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ENERO 2017	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ENERO_2017.pdf	21/11/2019
91	K5.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_FEBRERO 2017	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_FEBRERO_2017.pdf	21/11/2019
92	K6.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_MARZO 2017	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_MARZO_2017.pdf	21/11/2019
93	K7.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ABRIL 2017	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ABRIL_2017.pdf	21/11/2019
94	K8.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_MAYO 2017	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_MAYO_2017.pdf	21/11/2019
95	K9.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_JUNIO 2017	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_JUNIO_2017.pdf	21/11/2019
96	L1.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_JULIO 2017	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_JULIO_2017.pdf	21/11/2019
97	L2.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_AGOSTO 2017	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_AGOSTO_2017.pdf	21/11/2019
98	L3.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_SEPTIEMBRE 2017	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_SEPTIEMBRE_2017.pdf	21/11/2019
99	L4.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_OCTUBRE 2017	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_OCTUBRE_2017.pdf	21/11/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
100	L5.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_NOVIEMBRE 2017	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_NOVIEMBRE_2017.pdf	21/11/2019
101	L6.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_DICIEMBRE 2017	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_DICIEMBRE_2017.pdf	21/11/2019
102	L7.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ENERO-DICIEMBRE 2018	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ENERO-DICIEMBRE_2018.pdf	21/11/2019
103	L8.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ENERO 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ENERO_2019.pdf	21/11/2019
104	L9.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_FEBRERO 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_FEBRERO_2019.pdf	21/11/2019
105	M1.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_MARZO 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_MARZO_2019.pdf	21/11/2019
106	M2.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ABRIL 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ABRIL_2019.pdf	21/11/2019
107	M3.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_MAYO 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_MAYO_2019.pdf	21/11/2019
108	M4.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_JUNIO 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_JUNIO_2019.pdf	03/07/2019
109	M5.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_JULIO 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_JULIO_2019.pdf	02/08/2019
110	M6.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_AGOSTO 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
111	M7.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_SEPTIEMBRE 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_SEPTIEMBRE_2019.pdf	04/10/2019
112	M8.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_OCTUBRE 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
113	M9.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_NOVIEMBRE 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_NOVIEMBRE_2019.pdf	03/01/2020
114	N1.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_DICIEMBRE 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_DICIEMBRE_2019.pdf	05/02/2020
115	N2.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ENERO 2020	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ENERO_2020.pdf	05/02/2020
116	N3.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_FEBRERO 2020	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_FEBRERO_2020.pdf	04/06/2020
117	N4.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_MARZO 2020	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_MARZO_2020.pdf	04/06/2020
118	N5.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_ABRIL 2020	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_ABRIL_2020.pdf	04/06/2020
119	N6.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_MAYO 2020	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_MAYO_2020.pdf	04/06/2020
120	N7.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_JUNIO 2020	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_JUNIO_2020.pdf	03/07/2020
121	N8.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_JULIO 2020	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_JULIO_2020.pdf	05/08/2020
122	N9.CEDULA PRESUPUESTARIA_K012_AGOSTO 2020	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K012_AGOSTO_2020.pdf	04/09/2020
123	Z.1_MATRIZ DE MARCO LOGICO_K012_JUNIO 2019	Estudio_Mitad_del_Mundo_M_L_175200000.0000.373923.pdf	03/07/2019
124	Z.2.COSTO TOTAL-SIPEIP	K012-SIPEIP-COSTO_TOTAL.JPG	20/11/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Jarrin Amán, Hipatia Soledad	Financiero Dirección Distrital de Pichincha	Analista Administrativo Financiero Provincial	hjarrin@mtop.gob.ec	23305
Navas Coque, Richard Wladimir	Supervisor del Estudio.	Subdirector Técnico de Estudios	rnavas@mtop.gob.ec	023974600
Navas Coque, Richard Wladimir	Administrador del Contrato.	Subdirector Técnico de Estudios	rnavas@mtop.gob.ec	023974600
Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	Soporte Técnico.	Analista de Infraestructura Provincial 2- MTOP	jrodriguez@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
97346_1.jpg	05/05/2016
