

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 6**  
**Dirección Provincial Morona Santiago**

**PROYECTO: K048** MTOP - Estudios definitivos para el puente sobre el Río Palora, ubicado en el Cantón Pablo Sexto, provincia de Morona Santiago

Líder del Proyecto:	Flores Tubón, José Luis (jlflores@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:		Programas Relacionados:	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RÍO PALORA UBICADO EN EL CANTÓN PAULO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANT, Provincia - Morona Santiago
Titular:	Mendoza Cozar, Ivan Geovanny	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.860.6942	TIR:	20.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	532,467.73
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	196,679.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2011 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	05/02/2020	Fecha de Fin Base:	10/11/2013
Modificado por:	Flores Tubón, José Luis	Fecha del siguiente Hito:	31/08/2018


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
<p>Estudio integral Puente sobre Río Palora paso a Pabló Sexto L=350 m.</p> <p>Contratista: Consulsismica  Fiscalizador: Ing. Bolívar Polo T.  Supervisor: Ing. Bolivar Polo T.  Objetivo: Unir anillo vial Palora - Pablo Sexto - Huamboya</p> <p>Monto de construcción: \$ 296.480,00  Monto total: \$ 296.480,00</p> <p>Linea base. no existe puente definitivo se utiliza gabarra para el paso vehicular y de los usuarios</p>
<b>Beneficios Cualitativos</b>
Mejoramiento de las condiciones de vida del ciudadano, integración comercial entre Palora y Pablo Sexto
<b>Tipo de Beneficiario</b>
Ciudadanía de Palora, Pablo Sexto, Huamboya, el Puyo y Macas
<b>Restricciones</b>
Tiempo: La fecha limite para culminar la obra es el 20 de Junio de 2014

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/03/2011 Fecha de Fin: 31/12/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

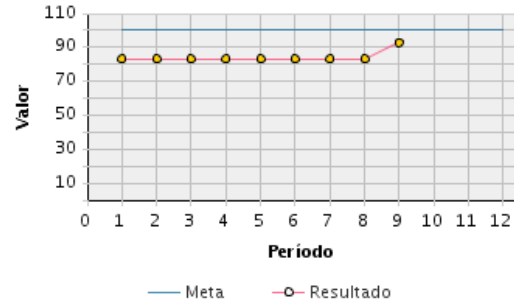

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	93 %			
Estado												
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2020.- En tramite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte -Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual esta realizando las actualizaciones solicitadas, se tramito a la subsecretaria el informe con las correcciones realizadas por la dirección de estudios.	Flores Tubón, José Luis	05/02/2020 - 07:40 AM
DICIEMBRE 2018.- En tramite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte -Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual esta realizando las actualizaciones solicitadas, se tramito a la subsecretaria el informe con las correcciones realizadas por la dirección de estudios.	Flores Tubón, José Luis	04/01/2019 - 10:24 AM
NOVIEMBRE 2018.- En tramite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte -Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual esta realizando las actualizaciones solicitadas, se tramito a la subsecretaria el informe con las correcciones realizadas por la dirección de estudios.	Flores Tubón, José Luis	05/12/2018 - 10:59 AM
OCTUBRE 2018.- En tramite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte -Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual esta realizando las actualizaciones solicitadas, se tramito a la subsecretaria el informe con las correcciones realizadas por la dirección de estudios.	Flores Tubón, José Luis	05/11/2018 - 03:52 PM
SEPTIEMBRE 2018.- En tramite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte -Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual esta realizando las actualizaciones solicitadas, se tramito a la subsecretaria el informe con las correcciones realizadas por la dirección de estudios.	Flores Tubón, José Luis	05/10/2018 - 09:33 AM
AGOSTO 2018.- En tramite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte -Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual esta realizando las actualizaciones solicitadas, se tramito a la subsecretaria el informe con las correcciones realizadas por la dirección de estudios.	Flores Tubón, José Luis	04/09/2018 - 11:34 AM
JULIO 2018.- En trámite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte -Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual está realizando las actualizaciones solicitadas, se tramito a la subsecretaria el informe con las correcciones realizadas por la dirección de estudios.	Flores Tubón, José Luis	02/08/2018 - 02:05 PM
JUNIO 2018.- En trámite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte -Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual está realizando las actualizaciones solicitadas, se tramito a la subsecretaria el informe con las correcciones realizadas por la dirección de estudios.	Idrovo Aguirre, Romeo Alexander	06/07/2018 - 07:30 PM
MAYO 2018.- En trámite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte -Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor	Flores Tubón, José Luis	05/06/2018 - 09:49 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
el cual está realizando las actualizaciones solicitadas, se tramito a la subsecretaria el informe con las correcciones realizadas por la dirección de estudios.		
ABRIL 2018.- En trámite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte -Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual está realizando las actualizaciones solicitadas, se tramito a la subsecretaria el informe con las correcciones realizadas por la dirección de estudios.	Flores Tubón, José Luis	04/05/2018 - 03:25 PM
(HITO ASOCIADO 11) MARZO 2018.- En tramite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte -Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual esta realizando las actualizaciones solicitadas, se tramito a la subsecretaria el informe con las correcciones realizadas por la dirección de estudios.	Flores Tubón, José Luis	04/04/2018 - 03:59 PM
(HITO ASOCIADO 11) FEBRERO 2018.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2018; aprobado la inclusión se asignaran los recursos para el pago de la planilla pendiente por lo cual el Dpto. financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto.	Flores Tubón, José Luis	20/03/2018 - 04:11 PM
(HITO ASOCIADO 11) ENERO 2018.- Se realizo los informes correspondientes para inclusión al PAI 2018; aprobado la inclusión se asignaran los recursos para el pago de la planilla pendiente por lo cual el Dpto. financiero de Morona podrá hacer los trámites respectivos para el cierre del proyecto.	Flores Tubón, José Luis	20/03/2018 - 04:10 PM
(HITO ASOCIADO 11) DICIEMBRE 2017.- En trámite la aprobación del informe del presupuesto definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte - Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual está realizando las actualizaciones solicitadas.	Reinoso Jara, Darwin Rolando	04/01/2018 - 04:36 PM
(HITO ASOCIADO 11) NOVIEMBRE 2017.- En trámite la aprobación del informe del presupuesto definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte - Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual está realizando las actualizaciones solicitadas.	Reinoso Jara, Darwin Rolando	05/12/2017 - 11:57 AM
(HITO ASOCIADO 11) OCTUBRE 2017.- En trámite la aprobación del informe del presupuesto definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte - Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual está realizando las actualizaciones solicitadas.	Reinoso Jara, Darwin Rolando	01/11/2017 - 03:35 PM
SEPTIEMBRE 2017.- En trámite la aprobación del informe del presupuesto definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte - Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual está realizando las actualizaciones solicitadas.	Reinoso Jara, Darwin Rolando	05/10/2017 - 03:29 PM
AGOSTO 2017.- En trámite la aprobación del informe del presupuesto definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte - Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual está realizando las actualizaciones solicitadas.	Reinoso Jara, Darwin Rolando	11/09/2017 - 04:15 PM
JULIO 2017.- En trámite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte - Quito, se solicito nueva información del proyecto de estudios al consultor el cual está realizando las actualizaciones solicitadas.	Saavedra Correa, Jose Luis	04/08/2017 - 12:47 PM
JULIO 2017.- NO SE PRESENTADO LA LIQUIDACIÓN DE VALORES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR PARTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA.	Saavedra Correa, Jose Luis	04/08/2017 - 12:41 PM
JUNIO 2017.- En trámite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte - Quito.	Saavedra Correa, Jose Luis	04/07/2017 - 03:27 PM
MAYO 2017.- En trámite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte - Quito.	Saavedra Correa, Jose Luis	05/06/2017 - 05:00 PM
ABRIL 2017.- En trámite la aprobación el Informe del Presupuesto Definitivo en la Dirección de Estudios del Transporte - Quito.	Saavedra Correa, Jose Luis	04/05/2017 - 01:55 PM
MARZO 2017.- En trámite la aprobación el informe del Presupuesto Definitivo.	Saavedra Correa, Jose Luis	04/05/2017 - 01:55 PM
FEBRERO 2017.- El Consultor remite nuevamente para el tramite del informe realizando las correcciones indicadas en Memorando N° MTOP-DEV-16-175-OF	Saavedra Correa, Jose Luis	07/03/2017 - 12:54 PM
ENERO 2017.- El Consultor remite nuevamente para el tramite del informe realizando las correcciones indicadas en Memorando N° MTOP-DEV-16-175-OF	Saavedra Correa, Jose Luis	07/02/2017 - 09:44 AM
DICIEMBRE 2016. Direccion de Estudios del Transporte tramita aprobacion de informe presentado por Consultor	Saavedra Correa, Jose Luis	05/01/2017 - 05:38 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2016. Direccion de Estudios del Transporte tramita aprobacion de informe presentado por Consultor	Arias Castro, Franklin	05/12/2016 - 10:32 AM
OCTUBRE 2016.- Consultor informa mediante correo electrónico la entrega del informe definitivo realizando las correcciones realizadas.	Arias Castro, Franklin	01/11/2016 - 10:32 AM
SEPTIEMBRE 2016.- El Consultor remite a los especialistas de la región 6 especificaciones especiales del proyecto corregidas para su aprobación: estructural y geotécnica.	Arias Castro, Franklin	03/10/2016 - 03:09 PM
AGOSTO 2016.- Supervisor del proyecto insiste, mediante memorando N° MTOP-CONS_MOR-2016-91-ME, convoque reunión con Consultor y funcionario de Dirección de Estudios, fin revisión de informe	Arias Castro, Franklin	06/09/2016 - 11:00 AM
JULIO 2016.- Ing. Angel López funcionario de Direccion de Estudios del transporte, solicita que se apruebe especificaciones especiales del proyecto, Coordinador de la constructora remite esta informacion a especialista estructural de la Subsecretaria regional 6, en cumplimiento a esta petición.	Arias Castro, Franklin	02/08/2016 - 10:43 AM
JUNIO 2016.- El Consultor remite nuevamente para el trámite del informe realizando las correcciones indicadas en Memorando N° MTOP-DEV-16-175-OF	Arias Castro, Franklin	05/07/2016 - 03:43 PM
MAYO 2016.- Se encuentran en trámite aprobación de informe de presupuesto con precios de MTOP referenciales el mismo que tiene que ser aprobado por el departamento de estudios de planta central	Arias Castro, Franklin	03/06/2016 - 12:22 PM
ABRIL 2016.- Se encuentran en trámite aprobación de informe de presupuesto con precios de MTOP referenciales el mismo que tiene que ser aprobado por el departamento de estudios de planta central.	Arias Castro, Franklin	04/05/2016 - 12:57 PM
MARZO 2016.- Se encuentran en trámite aprobación de informe de presupuesto con precios de MTOP referenciales el mismo que tiene que ser aprobad por el departamento de estudios de planta central.	Arias Castro, Franklin	04/04/2016 - 02:52 PM
FEBRERO 2016.- Se solicita a la Dirección de Estudios del Transporte la revisión, aprobación, de la entrega del informe del consultor realizadas las correcciones solicitadas.	Arias Castro, Franklin	01/03/2016 - 10:45 AM
ENERO 2016.- La Consultora encargada del estudio expone telefónicamente que se está realizando correcciones al presupuesto y estima que presentará definitivamente este en la presente semana.	Arias Castro, Franklin	03/02/2016 - 10:16 AM
DICIEMBRE 2015.- Se encuentran en trámite aprobación de informe de presupuesto con precios de MTOP referenciales el mismo que tiene que ser aprobado por el Departamento de estudios de planta central	Arias Castro, Franklin	05/01/2016 - 08:20 AM
NOVIEMBRE 2015.- Se encuentran en trámite aprobación de informe de presupuesto con precios de MTOP referenciales el mismo que tiene que ser aprobado por el Departamento de estudios de planta central.	Arias Castro, Franklin	01/12/2015 - 11:44 AM
OCTUBRE 2015.- Se encuentran en trámite aprobación de informes de presupuesto con precios de MTOP referenciales el mismo que tiene que sea aprobado por el departamento de estudios de planta central	Arias Castro, Franklin	04/11/2015 - 04:02 PM
SEPTIEMBRE 2015.- Se coordina para determinar fecha para revision de informe de presupuesto definitivo dele studio con el consultor y funcionario de la Direccion de estudio del transporte, tentativa se detrina para el 30 de septiembre de 2015.	Arias Castro, Franklin	05/10/2015 - 11:30 AM
AGOSTO 2015.- Se encuentran en tramite aprobación de informe de presupuesto con precios de MTOP referenciales el mismo que tiene que ser aprobado por el departamento de estudios de planta central.	Arias Castro, Franklin	01/09/2015 - 08:41 AM
JULIO 2015.- Se encuentran en tramite aprobación de informe se estudio aprobación de presupuesto con precios de MTOP referenciales.	Arias Castro, Franklin	06/08/2015 - 08:07 AM
JUNIO 2015.- Se encuentran en trámite aprobación de informe de estudio aprobación de presupuesto con precios de MTOP referenciales.	Arias Castro, Franklin	06/07/2015 - 10:33 AM
Mayo 2015.- Se encuentran en trámite aprobación de informe se estudio aprobación de presupuesto con precios de MTOP Referenciales	Arias Castro, Franklin	05/06/2015 - 09:26 AM
Abril 2015.-La Dirección de Estudios del Transporte emite criterio sobre el presupuesto y devuelve a fin que consultor absuelva observaciones al presupuesto, la Supervisión pone en conocimiento del consultor fin de atención	Arias Castro, Franklin	05/05/2015 - 11:17 AM
Marzo 2015.- Direccion de Estudio del Transporte, no emite informe sobre presupuesto total del proyecto hasta la fecha	Arias Castro, Franklin	06/04/2015 - 03:57 PM
FEBRERO 2015.- Director Provincial solicita mediante escrito a la Dirección de estudios del transporte se pronuncie sobre el Presupuesto total del proyecto presentado por el consultor fin proceder a liquidación y recepción de estudios	Arias Castro, Franklin	05/03/2015 - 01:39 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero 2015.- LA SUPERVISION INSISTE QUE EL CONTRATISTA TRAMITE ANTE DIRECCION DE ESTUDIOS MTOP-QUITO LA APROBACION DE PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO PARA PROCEDER A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO. PARTIVULAR QUE SE PONE EN CONOCIMIENTO DE SUBSECRETARIO REGIONAL 6.	Arias Castro, Franklin	04/02/2015 - 09:10 AM
Diciembre 2014.- En Dirección estudios no se pronuncia sobre la aprobación de presupuesto del proyecto total, Supervisor solicita al consultor gestionar la aprobación del presupuesto total del proyecto.	Arias Castro, Franklin	07/01/2015 - 01:35 PM
Noviembre 2014.- En Dirección estudios se tramita aprobación de presupuesto del proyecto total.	Arias Castro, Franklin	02/12/2014 - 12:27 PM
OCTUBRE 2014.- Se aprueba estudio sistema eléctrico y se presenta para aprobación presupuesto definitivo del proyecto.	Arias Castro, Franklin	07/11/2014 - 02:41 PM
SEPTIEMBRE 2014.- Se encuentra en trámite de aprobación de informe de estudio ambiental, eléctrico y aprobación de presupuesto con precios de MTOP referenciales.	Arias Castro, Franklin	03/10/2014 - 04:25 PM
AGOSTO 2014.- Contratista deberá coordinar el trámite aprobación de informe de estudio ambiental, eléctrico y aprobación de presupuesto con precios de MTOP referenciales, esta disposición es importante acatar en función de que se cumpla con el objeto del contrato y se realice recepción única del proyecto, se deberá tener todas las aprobaciones de los productos finales para realizar la liquidación tecnico economica y recepción única del proyecto.	Arias Castro, Franklin	02/09/2014 - 04:11 PM
JULIO 2014.- Contratista deberá coordinar el trámite aprobación de informe de estudio ambiental, eléctrico y aprobación de presupuesto con precios de MTOP referenciales, esta disposición es importante acatar en función de que se cumpla con el objeto del contrato y se realice recepción única del proyecto.	Arias Castro, Franklin	05/08/2014 - 11:46 AM
JUNIO 2014.- Se encuentran en trámite aprobación de informe se estudio ambiental, eléctrico y aprobación de presupuesto con precios de MTOP referenciales.	Arias Castro, Franklin	08/07/2014 - 12:19 PM
MAYO 2014.- No se aprueban informes de sistema eléctrico, señalización vial y presupuesto total del proyecto. Se ha insistido al Coordinador Ing. José Lindao de la Empresa atender de manera urgente a las observaciones realizadas.	Arias Castro, Franklin	06/06/2014 - 11:42 AM
ABRIL 2014.- Se encuentra en tramite de aprobación informe ambiental, electrico y aprobación presupuesto con precios del MTOP referenciales	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:11 PM
MARZO 2014.- Contratista deberá coordinar revisión y aprobación de los estudios (productos finales) con los especialistas de la Región 6 del MTOP.	Arias Castro, Franklin	07/04/2014 - 01:57 PM
FEBRERO 2014.- Contratista deberá coordinar revisión y aprobación de los estudios (productos finales) con los especialistas de la Región 6 del MTOP.	Arias Castro, Franklin	06/03/2014 - 11:08 AM
ENERO 2014.- Contratista deberá entregar corrección de los productos finales del estudio para su revisión y trámite de aprobación.	Arias Castro, Franklin	18/02/2014 - 01:39 PM
DICIEMBRE 2013: La compañía ha realizado correcciones indicadas, los mismos que son Revisados Nuevamente Previa a su Aprobación y Aceptación de Diseños Correspondientes.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	06/01/2014 - 09:42 AM
NOVIEMBRE 2013: La compañía ha realizado correcciones indicadas, los mismos que son Revisados Nuevamente Previa a su Aprobación y Aceptación de Diseños Correspondientes.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	04/12/2013 - 06:55 AM
OCTUBRE 2013: La compañía ha realizado correcciones indicadas, los mismos que son Revisados Nuevamente Previa a su Aprobación y Aceptación de Diseños Correspondientes.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/11/2013 - 10:03 AM
AGOSTO 2013: La compañía ha realizado correcciones indicadas, los mismos que son Revisados Nuevamente Previa a su Aprobación y Aceptación de Diseños Correspondientes.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	02/10/2013 - 07:44 AM
JULIO 2013: La compañía ha realizado correcciones indicadas, los mismos que son Revisados Nuevamente Previa a su Aprobación y Aceptación de Diseños Correspondientes.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/09/2013 - 08:37 AM
JUNIO 2013: La compañía ha realizado correcciones indicadas, los mismos que son Revisados Nuevamente Previa a su Aprobación y Aceptación de Diseños Correspondientes.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	03/08/2013 - 08:01 AM
MAYO 2013: La compañía ha realizado correcciones indicadas por los Especialistas de la Regional 6, los mismos que son Revisados Nuevamente Previa a su Aprobación y Aceptación de Diseños Correspondientes.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	04/07/2013 - 09:56 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2013: La compañía ha presentado todos los informes estipulados en el contrato, los mismos que son Revisados por los Especialistas de la Regional 6, Previa a su Aprobación y Aceptación de Diseños Correspondientes.</p>	<p>Vásconez Vásquez, Hugo Francisco</p>	<p>03/06/2013 - 10:42 AM</p>
<p>MARZO 2013: La compañía ha presentado todos los informes estipulados en el contrato, los mismos que son Revisados por los Especialistas de la Regional 6, Previa a su Aprobación y Aceptación de Diseños Correspondientes.</p>	<p>Vásconez Vásquez, Hugo Francisco</p>	<p>04/05/2013 - 08:53 AM</p>
<p>FEBRERO 2013: La compañía presento informes preliminares de Geofísica, Geotécnica y Diseño Vial, los que fueron puestos a consideración de los Especialistas de la Zona 6, para su revisión y Aprobación, de los que Geofísica a ha sido Aprobado, quedando el Diseño Vial para su Aprobación.</p>	<p>Vásconez Vásquez, Hugo Francisco</p>	<p>04/05/2013 - 08:50 AM</p>
<p>FEBRERO 2013: La compañía presento informes preliminares de Geofísica, Geotécnica y Diseño Vial, los que fueron puestos a consideración de los Especialistas de la Zona 6, para su revisión y Aprobación, de los que Geofísica aha sido Aprobado, quedando el Diseño Vial para su Aprobación.</p>	<p>Vásconez Vásquez, Hugo Francisco</p>	<p>05/04/2013 - 01:23 PM</p>
<p>ENERO 2013: La compañía presento informes preliminares de Geofísica, Geotécnica y Diseño Vial, los que fueron puestos a consideración de los Especialistas de la Zona 6, para su revisión y Aprobación, de los que Geofísica aha sido Aprobado, quedando el Diseño Vial para su Aprobación.</p>	<p>Vásconez Vásquez, Hugo Francisco</p>	<p>08/03/2013 - 03:11 PM</p>
<p>DICIEMNRE 2012: La Cía., presenta la Planificación de ensayos de Sísmica de Refracción y Ser. Las mismas que han dado cumplimiento. Se ha presentado para la Aprobación al personal de Especialistas de la Zona 6, el Emplazamiento del puente y los Accesos, Además la consultora a propuesto incrementos de cantidades de Obra y Creación Rubros en la parte Topográfica y Geotécnica.</p>	<p>Vásconez Vásquez, Hugo Francisco</p>	<p>02/02/2013 - 12:10 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2012: La Cía. presenta planificación de ensayos de sísmica de refracción y Sev. Las mismas que se han dado cumplimiento. Se ha presentado para la Aprobación a los Especialistas de la Regional 6 el Emplazamiento y los accesos los que han sido Aprobados, Además presentan propuesta de incrementos de obra en la parte Topográfica y Geotécnica</p>	<p>Vásconez Vásquez, Hugo Francisco</p>	<p>12/01/2013 - 08:37 AM</p>
<p>OCTUBRE 2012: La Consultora realiza los trabajos de Topografía y presenta informe de avances de Estudio Geológico, Hidráulico y propuestas de Ensayos de Campo de Sísmica de Refracción y Sev. La Consultora no ha presentado Planillas para la Aprobación y su posterior cancelación SEPTIEMBRE 2012 Se encuentra en ejecución los trabajos de obtención de datos en el campo AGOSTO 2012: Con fecha 28 de Agosto se entrega anticipo y se inicia los trabajos JULIO 2012: Se suscribe el Contrato con la Consultora Consulsísmica JUNIO 2012: Se encuentra en ejecución Estudios MAYO 2012: Se encuentra en ejecución Estudios ABRIL 2012: Se realizo la contratación de la obra y se inicio con los estudios MARZO 2012: Se sube al Portal de Compras Publicas FEBRERO 2012: Se continúa realizando los cambios en los Términos de Referencia para Subir al Portal de Compras Publicas ENERO 2012: Se está realizando los cambios en los Términos de Referencia para Subir al Portal de Compras Publicas DICIEMBRE 2011: Se realizó el concurso de ofertas para realizar los Estudios, se presento únicamente una carpeta y no cumplía con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia. Se declaro Desierto el proceso y se Elevara al Portal de Compras Públicas en Enero del 2012 SEPTIEMBRE-2011. LA DIRECCION PROVINCIAL NO HA ELABORADO TERMINOS DE REFERECNIA PARA REALIZAR ESTUDIO PARA AL CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE RIO PALORA FEBRERO 2011 Se está realizando los TDRs. (Términos de Referencia)</p>	<p>Vásconez Vásquez, Hugo Francisco</p>	<p>02/12/2012 - 10:11 AM</p>



**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
No se firme los anexos de aprobación de los trabajos realizados	05/02/2020	José Luis Flores Tubón	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 10, Abiertos: 1

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>2- NACIONAL. * General.</b> Presentar la planilla de liquidación de trabajos CAUSARIA que no se pueda terminar presupuestariamente el proyecto	05/02/2020	José Luis Flores Tubón	10 %	10	1	0/0

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Pablo Sexto


**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Gestión del proyecto y TDR ejecutado	1-Solicitud de Información	02/03/2011		02/03/2011		Sí	2.0
2	PLANEACIÓN: Actualización de TDRs y Pliegos ejecutado	1-Solicitud de Información	15/01/2012		15/01/2012		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Publicación en el Portal ejecutado	2-Publicación de Pliegos	01/02/2012		01/02/2012		Sí	2.0
4	PLANEACIÓN: Adjudicación del Contrato ejecutado	3-Adjudicación	01/04/2012		01/04/2012		Sí	2.0
5	PLANEACIÓN: Firma del Contrato ejecutado	4-Inicio de Trabajo	10/07/2012		10/07/2012		Sí	2.0
6	PLANEACIÓN: Entrega de Anticipo ejecutado	5-Entregables Intermedios	15/08/2012		15/08/2012		Sí	3.0
7	EJECUCIÓN: Inicio de los Estudios ejecutado	5-Entregables Intermedios	16/08/2012		16/08/2012		Sí	15.0
8	EJECUCIÓN: a del 33% del Estudio ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	15.0
9	EJECUCIÓN: Entrega del 66% del Estudio ejecutado	5-Entregables Intermedios	05/04/2014		05/04/2014		Sí	20.0
10	EJECUCIÓN: (Avance del 100% del Estudio) ejecutado	5-Entregables Intermedios	20/05/2014		20/05/2014		Sí	20.0
11	EJECUCIÓN: Aprobación de los Estudios ejecutado	5-Entregables Intermedios	15/04/2015		30/09/2018		Sí	10.0
12	CIERRE: Liquidación económica reajuste de precios definitivos pagado	9-Entregables Formales	28/04/2015	31/08/2018			No	5.0
13	COMPLETADO: Recepción Única del Proyecto (Ojo 5 años de garantía) legalizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/04/2015	31/08/2018			No	2.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Juan Jose Rubio	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	07/11/2013
2	Revision y constatacion de Avance de Proyecto	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	23/12/2013
3	Avance del Puento sobre el Rio Pastaza	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	25/02/2014
4	Historico - Se procederá en este mes de mayo ha elevar los términos de referencia, para la contratación del estudio.	Arcos Tuitza, Juan Rafael	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	02/05/2012
5	Historico - Se ha subido al portal los términos de referencia para su contratación, en la cual se presento una sola oferta, la cual fue negada por tener errores en el análisis de precios unitarios	Arcos Tuitza, Juan Rafael	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	20/03/2012
6	Historico - Pliegos enviados a la Subsecretaria del MTOP para la contratación la cual sera en próximos días.	Arcos Tuitza, Juan Rafael	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	24/10/2011

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de informes técnicos de control de obra.		100.00 %	12	12	01/01/2018	Jul-Dic




AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	114,865.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	196,679.00 **
Costo Total:	296,480.00
Total Devengado:	196,679.00
% Costo Total Devengado:	66.34 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 66.34 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	650,208.85	0.00	0.00	650,208.85
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	532,602.73	0.00	0.00	532,602.73
Ppto. Codificado	560,680.73	0.00	0.00	560,680.73
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	532,602.73	0.00	0.00	532,602.73
Ppto. Devengado	196,679.00	0.00	0.00	196,679.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 196,679.00	0.00	0.00	196,679.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	335,923.73	0.00	0.00	335,923.73
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 36.93 %	0.00 %	0.00 %	36.93 %
Ppto. Codificado 998	28,213.00	0.00	0.00	28,213.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	100.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
18	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
19	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
20	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo
21	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	4943_INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	4943_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
2	4943_INFORME EJECUTIVO ENERO 2020	4943_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2020.pdf	05/02/2020
3	CONTRATO COMPLEMENTARIO 1	C.5.pdf	03/09/2014
4	CONTRATO COMPLEMENTARIO 2	C.6.pdf	03/09/2014
5	CONTRATO ORIGINAL	C.4.pdf	03/09/2014
6	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013	A.2.pdf	15/03/2014
7	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	B.8.pdf	06/05/2014
8	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2015	D.6.pdf	05/05/2015
9	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2016	G.2.pdf	04/05/2016
10	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	H.5.pdf	04/05/2017
11	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	INFORME_EJECUTIVO_4943.pdf	04/05/2018
12	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	A.1.pdf	15/03/2014
13	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	C.7.pdf	03/09/2014
14	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2015	F.1.pdf	05/10/2015
15	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2016	G.6.pdf	06/09/2016
16	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	4943.pdf	04/09/2018
17	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	A.7.pdf	15/03/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	B.3.pdf	15/03/2014
19	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	D.2.pdf	06/01/2015
20	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2015	F.2.pdf	05/01/2016
21	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2016	H.1..pdf	05/01/2017
22	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	4943.pdf	04/01/2019
23	INFORME EJECUTIVO ENERO 2013	B.4.pdf	15/03/2014
24	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	D.3.pdf	04/02/2015
25	INFORME EJECUTIVO ENERO 2016	F.3.pdf	03/02/2016
26	INFORME EJECUTIVO ENERO 2017	H.2..pdf	07/02/2017
27	INFORME EJECUTIVO ENERO 2018	4943.pdf	05/04/2018
28	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013	A.3.pdf	15/03/2014
29	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	B.6.pdf	15/03/2014
30	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	D.4.pdf	05/03/2015
31	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2016	F.4.pdf	01/03/2016
32	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2018	4943.pdf	05/04/2018
33	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	C.3.pdf	05/08/2014
34	INFORME EJECUTIVO JULIO 2015	E.8.pdf	06/08/2015
35	INFORME EJECUTIVO JULIO 2016	G.5.pdf	02/08/2016
36	INFORME EJECUTIVO JULIO 2017	H.8.pdf	04/08/2017
37	INFORME EJECUTIVO JULIO 2017	H.8.pdf	04/08/2017
38	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	4943.pdf	03/08/2018
39	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	4943.pdf	06/08/2018
40	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013	A.4.pdf	15/03/2014
41	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	C.2.pdf	08/07/2014
42	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2015	E.7.pdf	06/07/2015
43	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2016	G.4.pdf	05/07/2016
44	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2017	H.7.pdf	05/07/2017
45	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018_estudio_puente_palor	06/07/2018
46	INFORME EJECUTIVO MARZO 2013	A.5.pdf	15/03/2014
47	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	B.7.pdf	03/04/2014
48	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	D.5.pdf	06/04/2015
49	INFORME EJECUTIVO MARZO 2016	G.1.pdf	05/04/2016
50	INFORME EJECUTIVO MARZO 2017	H.4.pdf	05/04/2017
51	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	INFORME_EJECUTIVO_4943.pdf	05/04/2018
52	INFORME EJECUTIVO MAYO 2013	A.6.pdf	15/03/2014
53	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	B.9.pdf	06/06/2014
54	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	C.1.pdf	06/06/2014
55	INFORME EJECUTIVO MAYO 2015	E.6.pdf	05/06/2015
56	INFORME EJECUTIVO MAYO 2016	G.3.pdf	03/06/2016
57	INFORME EJECUTIVO MAYO 2017	H.6.pdf	06/06/2017
58	INFORME EJECUTIVO MAYO 2018	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
59	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2012	B.2.pdf	15/03/2014
60	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	A.8.pdf	15/03/2014
61	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	C.9.pdf	02/12/2014
62	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2015	G.1.pdf	01/12/2015
63	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2016	G.9.pdf	05/12/2016
64	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_4943_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
65	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	4943.pdf	05/12/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
66	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2012	B.1.pdf	15/03/2014
67	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013	A.9.pdf	15/03/2014
68	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	C.8.pdf	05/11/2014
69	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2015	F.9.pdf	04/11/2015
70	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2016	G.8.pdf	01/11/2016
71	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_4943.pdf	01/11/2017
72	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	B.5.pdf	15/03/2014
73	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	C.8.pdf	06/10/2014
74	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2015	F.2.pdf	05/10/2015
75	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2016	G.7.pdf	03/10/2016
76	Informe Problemas	Informe_Problemas.pdf	04/01/2020
77	Informe Riesgos	Informe_Riesgos.pdf	04/01/2020
78	MEMORANDO N° MTOP-CON_MOR-2015-37-ME	D.7.PDF	06/03/2015
79	MTOP-CON-MOR_2015-90-ME	E.9.pdf	13/08/2015
80	MTOP-CONS_MOR-15-21-OF	D.8.pdf	07/05/2015
81	MTOP-CONS_MOR-15-23-OF	F.3.pdf	05/10/2015
82	mtop-cons_mor-2014-220-me	D.9.pdf	07/05/2015
83	MTOP-CONS_MOR-2015-102-ME	F.4.pdf	05/10/2015
84	MTOP-CONS_MOR-2016-12-ME	F.6.pdf	02/03/2016
85	mtop-cons_mor-2016-81-me	G.7.pdf	06/09/2016
86	mtop-cons_mor-2016-91-me	G.8.pdf	06/09/2016
87	MTOP-DCIT-2015-270-ME	E.1.pdf	07/05/2015
88	MTOP-DDMS-2016-181-ME	F.5.pdf	02/03/2016
89	MTOP-DDMS-2016-526-ME	G.4.pdf	05/07/2016
90	MTOP-DDMS-2016-662-ME	G.9.pdf	06/09/2016
91	MTOP-DDMS-2018-157-ME	MTOP-DDMS-2018-157-ME.pdf	04/06/2018
92	MTOP-DDMS-2018-252-ME	MTOP-DDMS-2018-252-ME.pdf	04/06/2018
93	mtop-dev-2014-1234-me	E.2.pdf	07/05/2015
94	MTOP-DEV-2015-172-ME	E.3.pdf	07/05/2015
95	MTOP-DEV-2015-817-ME	F.5.pdf	05/10/2015
96	mtop-dpms-2015-143-me	E.4.pdf	07/05/2015
97	MTOP-DPMS-2015-645-ME	F.6.pdf	05/10/2015
98	MTOP-DPMS-2015-724-ME	F.7.pdf	05/10/2015
99	MTOP-DPMS-2015-764-ME	F.8.pdf	05/10/2015
100	MTOP-EITZ6-2016-403-ME	H.1.pdf	06/09/2016
101	No-objeción recursos adicionales Puente Namangoza	D.5.pdf	06/03/2015
102	Nro. MTOP-DEV-2015-333-ME	E.5.pdf	07/05/2015
103	OFICIO FICALIZADOR MTOP - AMPLIACION DE PLAZO	D.6.pdf	06/03/2015
104	OFICIO GOBERNADOR	ofcio_al_gobernador.rar	26/09/2012
105	OFICIO TRAMITE PUENTE SOBRE EL RIO PALORA	G.5.pdf	05/07/2016
106	SENPLADES-SPA-2011-IP-022	D.1.pdf	17/12/2014

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	FINANCIERO MTOP			
	CONTRATISTA			

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Flores Tubón, José Luis	FISCALIZADOR VIAL MTOPE ETAPA DE ESTUDIOS	Experto de Infraestructura Distrital	jlflores@mtop.gob.ec	64206
Quezada Jara, Mónica Fabiola	PATROCINADOR EJECUTIVO MTOPE	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600
Tipan Guañuna, Jairo Fernando	ADMINISTRADOR DEL PROYECTO MTOPE	Coordinador Técnico de Infraestructura Distrital/ Lider de Proyecto	jtipan@mtop.gob.ec	64213

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
5126_1.jpg	05/04/2017
