

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 5
Dirección Provincial Guayas

PROYECTO: K063 MTOP - Construcción de la carretera Colimes - Olmedo

Líder del Proyecto:	Mendoza Cedeno, José Eugenio (jemendoza@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLIMES-OLMEDO, Provincia - Guayas, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Delgado León, Andrés Glen	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.1074.4728	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	5	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	34,297,365.57
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	10/06/2013 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	01/04/2019	Fecha de Fin Base:	10/07/2019
Modificado por:	Mendoza Cedeno, José Eugenio	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La carretera Olmedo-Sequel del Limón-Colimes, se está convirtiendo en un nuevo eje de desarrollo provincial y regional, que enlaza dos provincias importantes como lo son: por una parte Manabí, gran centro de producción agropecuario, gastronómico y puerta de entrada a paradisíacos paisajes; y por otro lado Guayas, que tiene una vocación netamente agrícola, ligada siempre con los avances tecnológicos en todos sus cultivos desarrollados, lo que ha generado una enorme demanda principalmente de las poblaciones aledañas a la zona. Razón por la cual el MTOP ha contratado la rehabilitación y mantenimiento por 4 años de esta vía.

PRODUCTO / SERVICIO:

Mejorar la calidad de servicio y seguridad de la vía existente.

LINEA BASE:

En la carretera Colimes - Olmedo, existía una vía de tercer orden, en mal estado, a nivel de mejoramiento la que no garantizaba la transitabilidad en la etapa invernal.

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Como objetivo general del proyecto será complementar el desarrollo vial y bienestar para los usuarios de la vía con la construcción del proyecto.

Objetivos específicos:

- Que mejore la infraestructura de transporte de la zona.
- Que mejore la transportación de los productos agrícola y ganadero de esta región a los centros de consumo.
- Que se haga la adecuada señalización de las vías de acceso para así mejorar la circulación.
- Que se haga la adecuada señalización de la vía.

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de la vía Colimes - Olmedo de 35.4 km de longitud, ubicada en las provincias del Guayas y Manabí.

Contratista: COMPAÑIA VERDU S.A.
 Fiscalizador: ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL ACOLIT CIA. LTDA.
 Supervisor: MENDOZA CEDEÑO JOSE EUGENIO
 ID Contrato: 6336

Fecha inicio obra:12/06/2013
 Fecha de terminación vigente de la obra:15/08/2015
 Plazo de ejecución 26 meses

Fecha inicio de mantenimiento:16/08/2015
 Fecha de terminación del mantenimiento:16/08/2019

DATOS GENERALES

Descripción

Plazo de ejecución 48 meses

Costo total presupuestado 23 MM
 Costo invertido hasta la fecha 14 MM

TPDA: 360
 Tipo de pavimento: Carpeta Asfáltica
 Número de carriles: Carriles: 2 carriles, 1 por sentido de circulación con un ancho de 3.35 m. en la parte baja plana y espaldones de 2.00 m,
 En la parte alta montañosa se tiene un ancho de 3.35 m. por carril y espaldones de 1.00 m.

Ancho total:10.70 m en la parte baja y 8.70 en la parte alta.
 Longitud:35.44 km
 Provincia: Guayas y Manabí
 Cantón: Colimes y Olmedo
 Eje: E-48
 Tipo de Red Vial: Vía Colectora de la RVE
 Etapa de Contrato: Construcción

Plazas de trabajo directas:150 personas para operadores de equipo, choferes, operadores de plantas (asfalto, hormigón, trituración y explotación de materias) y equipos de topografía generadas por el proyecto.
 Plazas de trabajo indirectas (adicionales):25 empleados para personal de cocina para alimentación del personal de campo.

Beneficiarios directos(Cantones):33.267 Habitantes.
 Beneficiarios indirectos(Resto de Provincia):4.981.996 Habitantes.

Monto inicial construcción: USD\$ 23.624.026,89
 Contratos Complementarios:
 1 fecha 10/03/2014: \$ 0,00 0.0 MESES
 2 fecha 02/03/2015 \$ 1.493.358,16
 Ordenes de cambio:
 1 fecha 10/12/2014 \$ 0,00 180.0 DÍAS
 2 fecha 02/03/2015 \$ 3.355.637,90 0.0 MESES
 Costo + Porcentaje
 COSTO MAS 1 31/07/2014 \$ 15.267,84 0.0 MESES
 Monto contractual USD\$ 28.488.290,79
 Reajuste construcción USD\$ 522.495,14
 IVA construcción USD\$ 2.656.634,00

Monto inicial fiscalización USD\$ 1.309.564,58
 COMPLEMENTARIO 1 fecha 03/02/2014: \$ 147.606,45 y ampliación 3.0 MESES
 Monto contractual: USD\$ 1.457.171,03
 Reajuste fiscalización: USD\$ 10.391,67
 IVA fiscalización: USD\$ 56.583,07

Costo Total: USD\$ 33.191.565,70

Beneficios Cualitativos

Recuperar y mantener el nivel de servicio en buenas condiciones, reducir los tiempos de viaje y costo operativo del vehículo, brindar mayor seguridad en la vía.
 TIR: 17%
 VAN: 5'244.837.23

Tipo de Beneficiario

Sector agrícola - Industrial
 Sector ganadero
 Poblaciones aledañas


Restricciones

TIEMPO: Terminar el proyecto dentro del tiempo establecido en el contrato.
 COSTO: No excederse del monto presupuestado para el proyecto.
 ALCANCE: Utilizar las canteras o minas según se especifica en los estudios.
 RECURSOS: Utilizar los materiales según las especificaciones técnicas del contrato.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 88.56 %
Fecha de Inicio: 10/06/2013 **Fecha de Fin:** 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

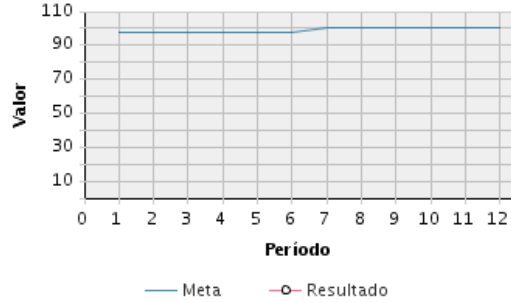

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2019: La contratista continúa con las tareas de mantenimiento realizando las reparaciones que la fiscalización reporto oportunamente; existen planillas pendiente de pago, desde el mes de diciembre del 2017. a enero de 2019.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	01/04/2019 - 01:50 PM
MARZO 2019: La contratista continúa con las tareas de mantenimiento realizando las reparaciones que la fiscalización reporto oportunamente; existen planillas pendiente de pago, desde el mes de diciembre del 2017. a enero de 2019.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	06/03/2019 - 11:17 AM
FEBRERO 2019: La contratista continúa con las tareas de mantenimiento realizando las reparaciones que la fiscalización reporto oportunamente; existen planillas pendiente de pago, desde el mes de diciembre del 2017. a enero de 2019.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	07/02/2019 - 09:40 AM
ENERO 2019: La contratista continúa con las tareas de mantenimiento realizando las reparaciones que la fiscalización reporto oportunamente; existen planillas pendiente de pago, desde el mes de diciembre del 2017. a diciembre de 2018. DICIEMBRE 2018: La contratista continúa con las tareas de mantenimiento realizando las reparaciones que la fiscalización reporto oportunamente; existen planillas pendiente de pago, desde el mes de diciembre del 2017. a noviembre de 2018.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	05/02/2019 - 08:48 AM
NOVIEMBRE 2018: La contratista continúa con las tareas de mantenimiento cumpliendo las reparaciones que la fiscalización reporto oportunamente; a la fecha se le deben al contratista planillas desde el mes de diciembre del 2017.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	04/12/2018 - 09:24 AM
OCTUBRE 2018: La contratista continúa con las tareas de mantenimiento cumpliendo al 99 % las reparaciones que la fiscalización reporto oportunamente; a la fecha se le deben al contratista planillas desde el mes de diciembre del 2017.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	06/11/2018 - 07:45 AM
SEPTIEMBRE 2018: La contratista continúa con las tareas de mantenimiento cumpliendo al 98 % las reparaciones que se encontraban pendientes; a la fecha se le deben al contratista planillas desde el mes de diciembre del 2017.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	01/10/2018 - 11:12 AM
AGOSTO 2018: La contratista continúa con las tareas de mantenimiento cumpliendo al 100 % las reparaciones que se encontraban pendientes; fisico es del 100 %; a la fecha se le deben al contratista planillas desde el mes de diciembre del 2017.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	04/09/2018 - 02:44 PM
JULNIO 2018: La contratista continúa con las tareas de mantenimiento cumpliendo al 100 % las reparaciones que se encontraban pendientes; fisico es del 100 %; a la fecha se le deben al contratista planillas desde el mes de diciembre del 2017.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	03/08/2018 - 04:42 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2018: La contratista continúa con las tareas de mantenimiento cumpliendo con la reparación de estándares, los avances que registra el proyecto a la fecha es ; avance economico es de 94.90 % y el avance fisico es del 100 %; a la fecha se le deben al contratista planillas desde el mes de diciembre del 2017.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>05/07/2018 - 11:01 AM</p>
<p>MAYO 2018: La contratista continúa con las tareas de mantenimiento cumpliendo con la reparación de estándares, los avances que registra el proyecto a la fecha es ; avance economico es de 94.90 % y el avance fisico es del 100 %; a la fecha se le deben al contratista planillas desde el mes de diciembre del 2017.</p> <p>ABRIL 2018: La contratista continúa con las tareas de mantenimiento por niveles des servicio, los avances que registra el proyecto a la fecha es ; avance economico es de 94.90 % y el avance fisico es del 100 %; a la fecha se le deben al contratista planillas desde el mes de diciembre del 2017.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>04/06/2018 - 10:47 AM</p>
<p>MARZO 2018.- La Cia Contratista continua con sus tareas de mantenimiento por niveles de servicio, las observaciones son levantadas por la fiscalizacion, el contratista debe cumplir en los plazos previstos.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>10/04/2018 - 10:57 AM</p>
<p>FEBRERO 2018.- La Cia Contratista continua con sus tareas de mantenimiento por niveles de servicio, en base a las observaciones levantadas por la fiscalizacion, las mismas deben ser atendidas dentro de los plazos previstos.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>07/03/2018 - 01:13 PM</p>
<p>ENERO 2018.- La Cia Contratista continua con sus tareas de mantenimiento por niveles de servicio, en base a las observaciones levantadas por la fiscalizacion, las mismas deben ser atendidas dentro de los plazos previstos.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>31/01/2018 - 11:09 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2017.- La Cia Contratista continua con sus tareas de mantenimiento por niveles de servicio, que responden a las observaciones levantadas por la fiscalizacion, y las mismas deben ser atendidas dentro de los plazos previstos.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>21/12/2017 - 09:17 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2017.- La Cia Contratista continua con sus tareas de mantenimiento, que responden a las observaciones levantadas por la fiscalizacion, y las mismas deben ser atendidas dentro de los plazos previstos.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>01/12/2017 - 02:21 PM</p>
<p>OCTUBRE 2017.- La Cia Contratista continua con sus tareas de mantenimiento, que responden a las observaciones levantadas por la fiscalizacion, y las mismas deben ser atendidas dentro de los plazos previstos.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>31/10/2017 - 03:33 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2017.- La Cia Contratista cumpliendo con sus obligaciones contractuales, continua con las tareas de mantenimiento, que consisten en reparar y atender dentro de los plazos establecidos las observaciones levantadas por fiscalizacion, a fin de brindar un servicio de calidad para los usuarios.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>04/10/2017 - 07:33 AM</p>
<p>AGOSTO 2017.- Una vez completados los trabajos de reparacion de las areas afectadas como consecuencia de la temporada invernal, la Cia contratista a continuado con sus tareas de mantenimiento que se cumplen a lo largo de toda la via; que involucra trabajos como rosa de vegetacion , limpieza de cunetas y encauzamientos, reposicion de pintura en las zonas donde se habian efectauado trabajos de reparacion a nivel de capa de rodadura.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>06/09/2017 - 11:44 AM</p>
<p>JULIO 2017.- Durante este mes se continuaron con los trabajos de reparación de las partes afectadas, como consecuencia de la temporada invernal; los trabajos ejecutados fueron: frezado, retirada de material contaminado, reposición de material granular, base y la colocación de la capa de rodadura, esto trabajos fue necesario ejecutar en el tramo desde el Cantón Olmedo km. 0+000 hasta el km. 12+000, que fue el que presento mayor afectación; existe un area dentro de este tramo que presenta deformaciones; motivo por el cual la fiscalización esta realizando una evaluación y determinación de las causas a fin de instruir a la Cia contratista ejecutar los trabajos que correspondan, para mejorar la transitabilidad.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>02/08/2017 - 03:49 PM</p>
<p>JUNIO 2017: El presente informe del mes de JUNIO , al encontrarse el proyecto en etapa de mantenimiento por niveles de servicio, las actividades mensuales son repetidas, ya que la fiscalizacion de la obra realiza el levantamiento de estándares establecidos en el contrato y de acuerdo al grado de cumplimiento se sanciona u/o se premia a la contratista segun sea el caso, estos estándares son: de calzada, derecho de via, espaldones, seguridad vial y obras de drenaje, a fin de mantener los niveles de servicio que exige el contrato.</p> <p>Durante el presente mes la Cia contratista, inicio las tareas de reparacion de las areas que presentaban afectacion de mayor grado, como consecuencia de la temporada invernal, estos trabajos corresponden, al retiro de la capa de rodadura afectada, reposicion de material filtrante, base granular, imprimacion, para posteriormente colocar la capa de rodadura de 3 ", y señalizacion. estos trabajos se realizaran a lo largo del tramo donde se presenten estos problemas, con lo cual se recupera el nivel de servicio y se cumplira con los estándares.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>04/07/2017 - 11:52 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2017: El presente informe del mes de MAYO , al encontrarse el proyecto en etapa de mantenimiento por niveles de servicio, las actividades mensuales son repetidas, ya que la fiscalización de la obra realiza el levantamiento de estandares establecidos en el contrato y de acuerdo al grado de cumplimiento se sanciona u/o se premia a la contratista segun sea el caso, estos estandares son: de calzada, derecho de via, espaldones, seguridad vial y obras de drenaje, a fin de mantener los niveles de servicio que exige el contrato.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	02/06/2017 - 04:58 PM
ABRIL 2017: El presente informe del mes de abril , al encontrarse el proyecto en etapa de mantenimiento por niveles de servicio, las actividades mensuales son repetidas, ya que la fiscalización de la obra realiza el levantamiento de estandares establecidos en el contrato y de acuerdo al grado de cumplimiento se sanciona u/o se premia a la contratista segun sea el caso, estos estandares son: de calzada, derecho de via, espaldones, seguridad vial y obras de drenaje, a fin de mantener los niveles de servicio que exige el contrato.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	04/05/2017 - 07:46 AM
MARZO 2017: El presente informe del mes de marzo , al encontrarse el proyecto en etapa de mantenimiento por niveles de servicio, las actividades mensuales son repetidas, ya que la fiscalización de la obra realiza el levantamiento de estandares establecidos en el contrato y de acuerdo al grado de cumplimiento se sanciona u/o se premia a la contratista segun sea el caso, estos estandares son: de calzada, derecho de via, espaldones, seguridad vial y obras de drenaje, a fin de mantener los niveles de servicio que exige el contrato.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	04/04/2017 - 11:24 AM
FEBRERO 2017: El presente informe del mes de febrero, al encontrarse el proyecto en etapa de mantenimiento por niveles de servicio, las actividades mensuales son repetidas, ya que la fiscalización de la obra realiza el levantamiento de estandares establecidos en el contrato y de acuerdo al grado de cumplimiento se sanciona u/o se premia a la contratista segun sea el caso, estos estandares son: de calzada, derecho de via, espaldones, seguridad vial y obras de drenaje, a fin de mantener los niveles de servicio que exige el contrato.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	06/03/2017 - 07:21 AM
ENERO 2017: El presente informe del mes de enero, al encontrarse el proyecto en etapa de mantenimiento por niveles de servicio, las actividades mensuales son repetidas, ya que la fiscalización de la obra realiza el levantamiento de estandares establecidos en el contrato y de acuerdo al grado de cumplimiento se sanciona u/o se premia a la contratista segun sea el caso, estos estandares son: de calzada, derecho de via, espaldones, seguridad vial y obras de drenaje, a fin de mantener los niveles de servicio que exige el contrato.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	07/02/2017 - 01:58 PM
DICIEMBRE 2016: aL encontrarse la obra en etapa de mantenimiento; y siendo este mantenimiento por niveles de servicio, las actividades mensuales son repetidas, ya que la fiscalización de la obra realiza el levantamiento de estandares establecidos en el contrato y de acuerdo al grado de cumplimiento se sanciona u/o se premia a la contratista segun sea el caso, estos estandares son: de calzada, derecho de via, espaldones, seguridad vial y obras de drenaje, a fin de mantener los niveles de servicio que exige el contrato.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	05/01/2017 - 05:04 PM
NOVIEMBRE 2016: La contratista continua con las tareas de mantenimiento, que corresponden a los estandares de calzada, derecho de via, espaldones, seguridad vial y obras de drenaje, a fin de mantener los niveles de servicio que exige el contrato.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	05/12/2016 - 08:48 AM
OCTUBRE 2016: Continuan los trabajos de mantenimiento por niveles de servicio que incluyen rubros tales como: bacheo, roza de vegetación, sello de fisuras superficiales y repintado de la señalización horizontal a fin de cumplir con estándares.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	01/11/2016 - 03:33 PM
SEPTIEMBRE 2016: Continuan los trabajos de mantenimiento por niveles de servicio que incluyen rubros tales como: bacheo, roza de vegetación, sello de fisuras superficiales y repintado de la señalización horizontal a fin de cumplir con estándares.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	01/11/2016 - 03:32 PM
AGOSTO 2016: Continuan los trabajos de mantenimiento por niveles de servicio que incluyen rubros tales como: bacheo, roza de vegetación, sello de fisuras superficiales y repintado de la señalización horizontal a fin de cumplir con estándares.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	09/09/2016 - 01:28 PM
JULIO 2016: Continuan los trabajos de mantenimiento por niveles de servicio que incluyen rubros tales como: bacheo, roza de vegetación, sello de fisuras superficiales y repintado de la señalización horizontal a fin de cumplir con estándares.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	05/08/2016 - 08:05 AM
JUNIO 2016: Continuan los trabajos de mantenimiento por niveles de servicio que incluyen rubros tales como: bacheo, roza de vegetación, sello de fisuras superficiales y repintado de la señalización horizontal a fin de cumplir con estándares.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	06/07/2016 - 09:27 AM
MAYO 2016: Continuan los trabajos de mantenimiento por niveles de servicio que incluyen rubros tales como: bacheo, roza de vegetación, sello de fisuras superficiales y de ser el caso repintado de la señalización horizontal a fin de cumplir con estándares.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	06/07/2016 - 09:26 AM
ABRIL 2016: Continuan los trabajos de mantenimiento por niveles de servicio que incluyen rubros tales como: bacheo, roza de vegetación, sello de fisuras superficiales y de ser el caso repintado de la señalización horizontal a fin de cumplir con estándares. Por efectos de las lluvias se presentó un derrumbe que interrumpió parcialmente la calzada, misma que fue despejada por la Cía. VERDU, encargada del mantenimiento	Calderón Cañar, Edgar Miguel	06/05/2016 - 01:49 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2016: Continúan los trabajos de mantenimiento por niveles de servicio que incluyen rubros tales como: bacheo, roza de vegetación, sello de fisuras superficiales y de ser el caso repintado de la señalización horizontal a fin de cumplir con estándares.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	06/05/2016 - 01:48 PM
FEBRERO 2016: Continúan los trabajos de mantenimiento por niveles de servicio que incluyen rubros tales como: bacheo, roza de vegetación, sello de fisuras superficiales y de ser el caso repintado de la señalización horizontal a fin de cumplir con estándares.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	08/03/2016 - 04:15 PM
ENERO 2016: Continúan los trabajos de mantenimiento por niveles de servicio que incluyen rubros tales como: bacheo, roza de vegetación, sello de fisuras superficiales y de ser el caso repintado de la señalización horizontal a fin de cumplir con estándares.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	08/03/2016 - 04:14 PM
DICIEMBRE 2015: Continúan los trabajos de mantenimiento por niveles de servicio que incluyen rubros tales como: bacheo, roza de vegetación, sello de fisuras superficiales y de ser el caso repintado de la señalización horizontal a fin de cumplir con estándares.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	08/03/2016 - 04:11 PM
NOVIEMBRE 2015: Este proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento por niveles de servicio, por lo que las condiciones físicas de la carpeta de rodadura se encuentra en buen estado.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	08/12/2015 - 12:56 PM
OCTUBRE 2015: La obra se encuentra terminada y abierta al tránsito. Se realizan trabajos de mantenimiento periódico.	Palacios Pesantes, Daniel	05/11/2015 - 02:32 PM
SEPTIEMBRE 2015: La obra se encuentra terminada y abierta al tránsito. Se realizan trabajos de mantenimiento periódico.	Palacios Pesantes, Daniel	05/11/2015 - 02:31 PM
AGOSTO 2015: La obra se encuentra terminada y abierta al tránsito. Se realizan trabajos de mantenimiento periódico.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	07/09/2015 - 02:14 PM
JULIO 2015.- Se concluyó los trabajos de ejecución de obra el 30 de junio del 2015. Iniciaron trabajos de mantenimiento de la carretera.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	12/08/2015 - 04:49 PM
JUNIO 2015.- Se concluyó los trabajos en el acceso a Recinto El Limón, mejoras en las calles de Colimes y sistema de drenaje en la ciudad de Olmedo. De acuerdo a Acta 451 se consideró concederle al contratista sólo una ampliación de plazo a por 15 días para concluir la obra, es decir 30 de junio del 2015.	Palacios Pesantes, Daniel	03/07/2015 - 02:11 PM
MAYO 2015.- Se realizan labores para concluir acceso a Recinto El Limón, mejoras en las calles de Colimes y sistema de drenaje en la ciudad de Olmedo. Debido a la presencia de fuertes lluvias la obra ha disminuido considerablemente los rendimientos de avance por lo cual se consideró concederle una ampliación de plazo al contratista por 60 días para concluir la obra.	Palacios Pesantes, Daniel	03/07/2015 - 02:11 PM
ABRIL 2015.- Continúan labores para concluir acceso a Recinto El Limón, mejoras en las calles de Colimes y sistema de drenaje en la ciudad de Olmedo. Debido a la presencia de fuertes lluvias la obra ha disminuido considerablemente los rendimientos de avance por lo cual se consideró concederle una ampliación de plazo al contratista por 60 días para concluir la obra.	Palacios Pesantes, Daniel	03/06/2015 - 04:22 PM
MARZO 2015: Construcción de muros rompe velocidades, continúan los trabajos de excavación y fundición de bordillos	Palacios Pesantes, Daniel	06/04/2015 - 03:01 PM
FEBRERO 2015: Excavación para cunetas, fundición de cunetas, Reforestación en la vía.	Palacios Pesantes, Daniel	06/04/2015 - 03:00 PM
ENERO 2015: Continúan los trabajos de imprimación y colocación de capa de rodadura.	Palacios Pesantes, Daniel	10/02/2015 - 03:42 PM
DICIEMBRE 2014: Continúan con el movimiento de tierra, transporte y colocación de mejoramiento y base, imprimación y colocación de capa de rodadura.	Palacios Pesantes, Daniel	08/01/2015 - 03:52 PM
NOVIEMBRE 2014: Continúan con el movimiento de tierra, transporte y colocación de mejoramiento y base, imprimación y colocación de capa de rodadura, se construyen las cunetas y losa superior de alcantarilla de cajón.	Palacios Pesantes, Daniel	08/01/2015 - 03:52 PM
Octubre 2014 - Los trabajos que se han ejecutado: Parte vial desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 35+400 se realizó excavaciones y revestimientos de las cunetas con hormigón estructural de cemento portland clase B, ubicadas en varios sectores y en ambos lados de la vía. Construcción de protecciones de entrada y salida de varias alcantarillas tubulares, con la utilización de hormigón estructural de cemento portland clase B para cabezales y acero de refuerzo en barras. Excavación en suelo, rellenos con material de préstamo importado y acabado de la obra básica para la conformación de la plataforma de la vía, en varios tramos. Construcción de la estructura del pavimento de la vía, conformada por las capas de material de mejoramiento de la subrasante y base Clase 1 (Tipo A). Imprimación asfáltica y construcción de la capa de rodadura con hormigón asfáltico mezclado en planta. Construcción del sistema de drenaje de la vía con tubos de hormigón armado.	Palacios Pesantes, Daniel	07/11/2014 - 09:25 AM
Construcción de los puentes Sequel: se construye varios pilotes de H. A.		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Construcción de Accesos: Se realizaron trabajos para la construcción del acceso al Sitio El Limón, excavación en el suelo, relleno con material de préstamo importado, acabado de la obra básico en toda la Longitud del acceso. Mejoramiento de la subrasante.</p> <p>Acceso colimes: Imprimación asfáltica y a capa de rodadura de 0.075 m en toda la longitud del acceso y en los empalmes con las calles que interceptan con la vía de acceso</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2014: En el tramo del Km. 5 al 8 se han realizado trabajos de conformación de la plataforma, excavación de suelo, material de préstamo importado incluido transporte; además se han ejecutado trabajos de colocación de mejoramiento de la subrasante base clase -1. A nivel de asfalto se han ejecutado de imprimación y colocación de capa de rodadura. En el área de drenaje se ha trabajado en la construcción de los ducto cajón. A nivel de pilotes prebarrenados diámetro 0.60 m se trabaja en el Puente El Limón. En la parte ambiental se realiza el control de polvo.</p>	Palacios Pesantes, Daniel	14/10/2014 - 10:20 AM
<p>AGOSTO 2014: En la abscisas 7+000 al 12+400 se han realizado los trabajos de excavación sin clasificar, relleno con material de préstamo, material de mejoramiento. También colocación de capa de rodadura desde la 12+400 hasta la 15+400. Construcción de alcantarillas de hormigón armado así como instalación de alcantarillas tubulares; construcción de bordillos y cunetas. Barrenado de pilotes.</p>	Palacios Pesantes, Daniel	14/10/2014 - 09:56 AM
<p>Junio 2014: Movimiento de tierra, colocación de material de mejoramiento y basa, construcción de alcantarillas de cajon, construcción de bordillos y cunetas.</p>	Palacios Pesantes, Daniel	21/07/2014 - 03:36 PM
<p>MAYO 2014: Se continúa con la conformación de la rasante existente previo a la colocación de mejoramiento. HITO 8 y 10.</p>	Palacios Pesantes, Daniel	07/06/2014 - 03:16 PM
<p>Abril 2014: Se continúa con el trabajo de bordillos y cunetas con hormigón de 210 kg/cm2, conformación de la rasante existente previo a la colocación de mejoramiento. HITO 8 y 10.</p>	Palacios Pesantes, Daniel	21/04/2014 - 03:44 PM
<p>Marzo 2014: Construcción de bordillos y cunetas con hormigón de 210 kg/cm2 y actividades de mantenimiento. HITO 8 y 10.</p>	Palacios Pesantes, Daniel	21/04/2014 - 03:43 PM
<p>Junio 2013 - Febrero 2013: Excavación suelos, tendido y compactación de material de préstamo importado, sub-base y Base. Colocación de carpeta asfáltica. Hormigón estructural para alcantarillas. 6 KM de Señalización horizontal y vertical. HITO 1, 2 y 3.</p>	Palacios Pesantes, Daniel	21/04/2014 - 03:42 PM

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>2- NACIONAL. Económico. FALTA DE PAGO DE PLANILLAS CAUSARÍA PARALIZACIÓN DE LA OBRA</p>	20/03/2019	José Eugenio Mendoza Cedeno	50 %	50	25	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Guayas > Colimes

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 EJECUCIÓN: Adjudicación realizada.	3-Adjudicación	10/06/2013		10/06/2013		Sí	2.0
2 EJECUCIÓN: Inicio de Obra, realizada.	4-Inicio de Trabajo	18/07/2013		18/07/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	EJECUCIÓN: Pilotaje del puente Seguelillo, realizado.	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		15/06/2014		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Cimentación del puente Seguelillo, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/06/2014		Sí	3.0
5	EJECUCIÓN: Pilotaje del puente El Limón, realizadas.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		16/10/2014		Sí	4.0
6	EJECUCIÓN: Superestructura del puente Seguelillo, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		30/07/2014		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Acceso del puente Seguelillo, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		30/07/2014		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Puente Seguelillo realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/08/2014		Sí	4.0
9	EJECUCIÓN: Cimentación de infraestructura del puente El Limón.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		15/11/2014		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Drenaje y alcantarillado del Tramo 2: Km. 12.6 al Km.0.0, realizado.	5-Entregables Intermedios	05/07/2014		30/09/2014		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Construcción Sub-base del Tramo 2: Km. 12.6 al Km.0.0, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/10/2014		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Drenaje y alcantarillado del Tramo 1: Km. 35,4 al Km. 12.6, realizado.	5-Entregables Intermedios	10/08/2014		30/09/2014		Sí	3.0
13	EJECUCIÓN: Construcción de la base del Tramo 2: Km. 12.6 al Km.0.0, realizado.	5-Entregables Intermedios	25/08/2014		30/11/2014		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Construcción de sub-base del Tramo 1: Km. 35,4 al Km. 12.6, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		10/10/2014		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Mitigación Ambiental 50% general ejecutada.	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2013		Sí	6.0
16	EJECUCIÓN: Construcción capa de rodadura del Tramo 2: Km. 12.6 al Km.0.0, realizado.	5-Entregables Intermedios	15/09/2014		16/06/2015		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Construcción de Base del Tramo 1: Km. 35,4 al Km. 12.6, realizado.	5-Entregables Intermedios	15/10/2014		30/11/2014		Sí	4.0
18	EJECUCIÓN: Superestructura del puente El Limón, realizado.	5-Entregables Intermedios	15/10/2014		15/11/2014		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Acceso del puente El Limón, realizado.	5-Entregables Intermedios	20/11/2014		20/11/2014		Sí	3.0
20	EJECUCIÓN: Acceso: Colimes, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	3.0
21	EJECUCIÓN: Construcción capa de rodadura del Tramo 1: Km. 35,4 al Km. 12,6, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		10/12/2014		Sí	9.0
22	EJECUCIÓN: Mitigación ambiental del Tramo 1: Km. 35,4 al Km. 12.6, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		15/06/2015		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Mitigación Ambiental del Tramo 2: Km. 12.6 al Km.0.0, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		15/06/2015		Sí	5.0
24	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 1, 25% realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		30/07/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	EJECUCIÓN: Acceso: El Limón, realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	5.0
26	EJECUCIÓN: Acceso: Olmedo, realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	3.0
27	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 1, 50% realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/07/2015		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Puente Seguel El Limón. Realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	5.0
29	EJECUCIÓN: Señalización Horizontal del Tramo 1: Km. 35,4 al Km. 12.6, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Señalización Horizontal del Tramo 2: Km. 12.6 al Km.0.0, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Señalización Vertical del Tramo 1: Km. 35,4 al Km. 12.6, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: Señalización Vertical del Tramo 2: Km. 12.6 al Km.0.0, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
33	CIERRE: Acta de Recepción Provisional, recibida.	5-Entregables Intermedios	30/07/2015		15/03/2016		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 1, 75% realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN: Expropiaciones, realizadas.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		14/08/2015		Sí	4.0
36	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 1, 100% realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 2, 25% realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 2, 50% realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 2, 75% realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 2, 100% realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 3, 25% realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	1.0
42	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 3, 50% realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 3, 75% realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 3, 100% realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		21/12/2017		Sí	0.3
45	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 4, 25% realizado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2018		30/03/2018		Sí	0.3
46	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 4, 50% realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.4
47	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 4, 75% realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.0
48	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 5, 00% realizado.	5-Entregables Intermedios	27/12/2018		27/12/2018		Sí	0.0
49	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 5, 25% realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2019	31/03/2019			No	0.0
50	CIERRE: Liquidación económica del proyecto, realizada.	9-Entregables Formales	10/07/2019	10/07/2019			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
51	COMPLETADO: Acta de Recepción Definitiva, recibida.	5-Entregables Intermedios	10/07/2019	10/07/2019			No	1.0
52	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 5, 50% realizado.	5-Entregables Intermedios	10/07/2019	10/07/2019			No	0.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Se realiza recorrido de la carretera Colimes Olmedo y se observa que no presenta daños	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	17/12/2015
2	La obra se encuentra terminada y en excelentes condiciones	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	29/07/2015
3	La obra presenta retrasos de acuerdo a la programación de hitos, pero se evidencio que ha tenido un avance significativo en base a la visita anterior.	Panchana Farra, Rolando José	{PR} - Provincia - GUAYAS	20/02/2015
4	La obra avanza de acuerdo a su nueva programación, esto se debe a la celebración del contrato complementario y la orden de trabajo	Panchana Farra, Rolando José	{PR} - Provincia - GUAYAS	14/04/2015
5	La obra presenta retrasos debido a la fuerte etapa invernal, la contratista ha solicitado una prórroga de 60 días	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	17/06/2015
6	La obra presenta retrasos de acuerdo a la programación de hitos, pero se evidencio que ha tenido un avance significativo en base a la visita anterior.	Panchana Farra, Rolando José	{PR} - Provincia - GUAYAS	15/12/2014
7	La obra presenta retrasos de acuerdo a la programación de la ficha de GPR,	Panchana Farra, Rolando José	{PR} - Provincia - GUAYAS	23/10/2014
8	La obra presenta retrasos de acuerdo a la programación de la ficha de GPR, ya que en el punto visualizamos que estos hitos aun siguen sin cumplirse	Panchana Farra, Rolando José	{PR} - Provincia - GUAYAS	13/08/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje económico de cumplimiento	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2016	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	7,087,208.07
Estimado Al Fin Del Proyecto:	34,297,365.57 **
Costo Total:	35,199,542.78
Total Devengado:	33,365,512.14
% Costo Total Devengado:	94.79 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 94.79 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	33,964,441.71	1,910,212.32	0.00	35,874,654.03
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	6,176,611.18	931,853.43	0.00	7,108,464.61
Ppto. Codificado	37,174,343.13	931,853.43	0.00	38,106,196.56
Ppto. Comprometido	36,096,445.07	0.00	0.00	36,096,445.07
Planeado - Codificado (2019)		978,358.89		
Programado a Devengar	36,535,813.49	931,853.43	0.00	37,467,666.92
Ppto. Devengado	33,365,512.14	0.00	0.00	33,365,512.14
Pagado Real	24,123,744.04	0.00	0.00	24,123,744.04
Estimado a fin de año	* 33,365,512.14	65,216.51	0.00	33,430,728.65
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	3,170,301.35	866,636.92	0.00	4,036,938.27
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 91.32 %	0.00 %	0.00 %	89.05 %
Ppto. Codificado 998	6,298,701.29	0.00	0.00	6,298,701.29
Ppto. Devengado 998	6,136,826.44	0.00	0.00	6,136,826.44

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

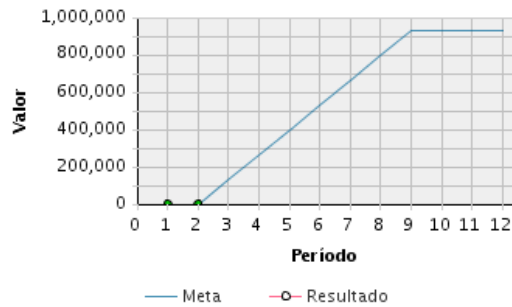

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	133,121.93		133,121.93				
Abr	133,121.93		266,243.86				
May	133,121.93		399,365.79				
Jun	133,121.91		532,487.70				
Jul	133,121.91		665,609.61				
Ago	133,121.91		798,731.52				
Sep	133,121.91		931,853.43				
Oct	0.00		931,853.43				
Nov	0.00		931,853.43				
Dic	0.00		931,853.43				
Total	931,853.43	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
14	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
15	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
16	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo
17	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.
18	Reducir el índice de incumplimiento de las normativas de transporte pesado, MEDIANTE la implementación del sistema de control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		PLANILLA_40_MANT._COLIMES.pdf	17/12/2018
2	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA	ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL_COLIMES_OLMEDO.pdf	09/07/2016
3	C+% 1 Carretera Colimes- Olmedo	C+%_1_Carretera_Colimes-_Olmedo.pdf	05/06/2015
4	C.C-1 Carretera Colimes- Olmedo	C.C-1_Carretera_Colimes-_Olmedo.pdf	05/06/2015
5	C.C-2 Carretera Colimes- Olmedo	C.C-2_Carretera_Colimes-_Olmedo.pdf	05/06/2015
6	C.O Carretera Colimes- Olmedo	Contrato_Original_Carretera_Colimes-_Olmedo.pdf	05/06/2015
7	COSTO+%	PlanillaCostomasPorcentajeNo1ProyectoColimesOlmedo.pdf	16/01/2017
8	Dictamen	27_06_2014_093106_DICTAMEN.pdf	16/06/2015
9	Informe de viabilidad	2014-08-15_03-05-35_INFORMEDEVIABILIDAD_OLMEDO-COLIMES.pdf	16/06/2015
10	Informe Ejecutivo SITOP, abril 2014.	B.12.pdf	22/04/2014
11	Informe Ejecutivo SITOP, Diciembre 2013.	B.08.pdf	22/04/2014
12	Informe Ejecutivo SITOP, Abril 2015.	B.24.pdf	05/05/2015
13	Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2013.	B.04.pdf	22/04/2014
14	Informe Ejecutivo SITOP, Agosto 2014.	B.16.pdf	01/09/2014
15	Informe Ejecutivo SITOP, Agosto 2015.	B.28.pdf	01/09/2015
16	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2014.	B.20.pdf	08/01/2015
17	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2014.	B.09.pdf	22/04/2014
18	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2015.	B.21.pdf	03/02/2015
19	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2014.	B.10.pdf	22/04/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
20	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2015.	B.22.pdf	04/03/2015
21	Informe Ejecutivo SITOP, Julio 2014.	B.15.pdf	04/08/2014
22	Informe Ejecutivo SITOP, Julio 2015.	B.27.pdf	05/08/2015
23	Informe Ejecutivo SITOP, julio2013.	B.03.pdf	22/04/2014
24	Informe Ejecutivo SITOP, Junio 2014.	B.14.pdf	04/08/2014
25	Informe Ejecutivo SITOP, Junio 2015.	B.26.pdf	01/07/2015
26	Informe Ejecutivo SITOP, junio2013.	B.02.pdf	22/04/2014
27	Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2014.	B.11.pdf	22/04/2014
28	Informe Ejecutivo SITOP, Marzo 2015.	B.23.pdf	10/04/2015
29	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2013.	B.01.pdf	22/04/2014
30	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2014.	B.13.pdf	09/06/2014
31	Informe Ejecutivo SITOP, Mayo2015.	B.25.pdf	02/06/2015
32	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2013.	B.07.pdf	22/04/2014
33	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2014.	B.19.pdf	03/12/2014
34	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2013.	B.06.pdf	22/04/2014
35	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2014.	B.18.pdf	06/11/2014
36	Informe Ejecutivo SITOP, OCTUBRE 2015.	6336_IE_OCTUBRE2015.pdf	05/11/2015
37	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2013.	B.05.pdf	22/04/2014
38	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2014.	B.17.pdf	06/10/2014
39	Informe Ejecutivo SITOP, Septiembre 2015.	B.29.pdf	12/10/2015
40	Informe Ejecutivo SITOP, SEPTIEMBRE 2015.	6336_IE_SEPTIEMBRE2015.pdf	05/11/2015
41	O.C-1 Carretera Colimes- Olmedo	O.C-1_Carretera_Colimes-_Olmedo.pdf	05/06/2015
42	O.C-2 Carretera Colimes- Olmedo	O.C-2_Carretera_Colimes-_Olmedo.pdf	05/06/2015
43	PLANILLA 10 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_10_DE_MANT._COLIMES-VERDU.pdf	17/12/2018
44	PLANILLA 11 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_11_DE_MANT._COLIEMS-VERDU.pdf	17/12/2018
45	PLANILLA 12 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_12_DE_MANT._COLIEMS-VERDU..pdf	17/12/2018
46	PLANILLA 13 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_13_DE_MANT._COLIEMS-VERDU..pdf	17/12/2018
47	PLANILLA 14	PLANILLA_No._14_Colimes_-_Olmedo.pdf	16/01/2017
48	PLANILLA 14 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_14_DE_MANT._COLIEMS-VERDU..pdf	17/12/2018
49	PLANILLA 16	Planilla_No._16_-_Colimes_-_Olmedo_-_Septiembre_2014.pdf	16/01/2017
50	PLANILLA 3 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_3_DE_MANT._COLIMES-VERDU..pdf	17/12/2018
51	PLANILLA 35 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_35_DE_MANT._COLIMES-VERDU.pdf	17/12/2018
52	PLANILLA 36 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_36_DE_MANT._COLIMES-VERDU.pdf	17/12/2018
53	PLANILLA 37 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_37_DE_MANT._COLIMES-VERDU.pdf	17/12/2018
54	PLANILLA 38 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_38__DE_MANT._COLIMES-VERDU.pdf	17/12/2018
55	PLANILLA 39 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_39_DE_MANT._COLIMES-VERDU.pdf	17/12/2018
56	PLANILLA 4 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_4_DE_MANT._COLIMES-VERDU..pdf	17/12/2018
57	PLANILLA 5 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_5_DE_MANT._COLIMES-VERDU..pdf	17/12/2018
58	PLANILLA 6 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_6__DE_MANT._COLIMES-VERDU..pdf	17/12/2018
59	PLANILLA 7 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_7__DE_MANT._COLIMES-VERDU..pdf	17/12/2018
60	PLANILLA 8 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_8__DE_MANT._COLIMES-VERDU..pdf	17/12/2018
61	PLANILLA 9 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_9__DE_MANT._COLIMES-VERDU..pdf	17/12/2018
62	PLANILLA 1	PlanillaNo1ContratoComplementarioColimesMarzo2015.pdf	17/01/2017
63	PLANILLA 13	PLANILLA_No._13_Colimes_-_Olmedo.pdf	16/01/2017
64	PLANILLA 15	PLANILLA_No._15_Agosto_2014_-_Colimes_Olmedo.pdf	16/01/2017
65	PLANILLA 2 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_2_DE_MANT._COLIMES-VERDU.pdf	17/12/2018
66	PLANILLA 1 DE MANT. COLIMES-VERDU	PLANILLA_1_DE_MANT._COLIMES-VERDU.pdf	17/12/2018
67	PLANILLA 1 DEL C.C. No 2 DE OBRA.	PLANILLA_1_DEL_C.C._No_2_OBRA_COLIMES_OLMEDO.pdf	17/12/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
68	PLANILLA 1 FISC. OBRA	PLANILLA_DE_FISCALIZACION_#01_MANT.pdf	27/01/2017
69	PLANILLA 10	Planilla_No_10_Colimes-Olmedo.pdf	16/01/2017
70	PLANILLA 11	PLANILLA_No_11.pdf	16/01/2017
71	PLANILLA 12	PLANILLA_No_12_Colimes_-_Olmedo_-_Mayo_2014.pdf	16/01/2017
72	PLANILLA 14 DE OBRA	PLANILLA_14_OBRA_COLIMES_OLMEDO.pdf	21/12/2017
73	PLANILLA 15 DE MANTENIMIENTO VERDU	PLANILLA_15_COLIMES_MANT..pdf	21/12/2017
74	PLANILLA 15 OBRA VERDU	PLANILLA_15_OBRA_COLIMES_OLMEDO.pdf	21/12/2017
75	PLANILLA 16 MANTENIMIENTO VERDU	PLANILLA_16_COLIMES_MANT..pdf	21/12/2017
76	PLANILLA 16 OBRA VERDU	PLANILLA_16_OBRA_COLIMES_OLMEDO.pdf	21/12/2017
77	PLANILLA 17 DE MANTENIMIENTO DE LA OBRA	PLANILLA__17_COLIMES_MANT..pdf	21/12/2017
78	PLANILLA 18 MANTENIMIENTO VERDU	PLANILLA_18_COLIMES_MANT..pdf	21/12/2017
79	PLANILLA 19 MANTENIMIENTO VERDU	PLANILLA_19_COLIMES_MANT..pdf	21/12/2017
80	PLANILLA 2	PlanillaNo2ContratoComplementarioNo2ColimesAbril2015.pdf	17/01/2017
81	PLANILLA 2 FISCALIZACION OBRA	PLANILLA_DE_FISCALIZACION_#02_MANT.pdf	27/01/2017
82	PLANILLA 20 MANTENIMIENTO VERDU	PLANILLA_20_COLIMES_MANT..pdf	21/12/2017
83	PLANILLA 21 MANTENIMIENTO VERDU	PLANILLA_21_COLIMES_MANT..pdf	21/12/2017
84	PLANILLA 21 OBRA VERDU	PLANILLA_21_OBRA_COLIMES_OLMEDO.pdf	21/12/2017
85	PLANILLA 22	PlanillaNo22ColimesOlmedoMarzo2015.pdf	17/01/2017
86	PLANILLA 22 MANTENIMIENTO VERDU	PLANILLA_22_COLIMES_MANT..pdf	21/12/2017
87	PLANILLA 22 OBRA VERDU	PLANILLA_22_OBRA_COLIMES_OLMEDO.pdf	21/12/2017
88	PLANILLA 23	PlanillaNo23ColimesOlmedoAbril2015.pdf	17/01/2017
89	PLANILLA 23 MANTENIMIENTO VERDU	PLANILLA_23_COLIMES_MANT..pdf	21/12/2017
90	PLANILLA 23 OBRA VERDU	PLANILLA_23_OBRA_COLIMES_OLMEDO.pdf	21/12/2017
91	PLANILLA 24	PlanillaNo24ColimesOlmedoMayo2015.pdf	17/01/2017
92	PLANILLA 24 MANTENIMIENTO VERDU	PLANILLA_24_COLIMES_MANT..pdf	21/12/2017
93	PLANILLA 24 OBRA VERDU	PLANILLA_24_OBRA_COLIMES.pdf	21/12/2017
94	PLANILLA 25	PlanillaNo25ProyectoColimesOlmedoPeriodoJunio2015.pdf	16/01/2017
95	PLANILLA 25 OBRA VERDU	PLANILLA_25_OBRA_COLIMES-OLMEDO.pdf	21/12/2017
96	PLANILLA 26	PlanillaDeLiquidacion26ColimesOlmedoParte1.pdf	16/01/2017
97	PLANILLA 26 LIQUIDACION DE OBRA VERDU	PLANILLA_No_26_DE_LIQUIDACION_OBRA_COLIMES_OLMEDO.pdf	16/01/2017
98	PLANILLA 26 MANTENIMIENTO VERDU	PLANILLA_26_COLIMES_MANT..pdf	21/12/2017
99	PLANILLA 26-A	PlanillaDeLiquidacion26ColimesOlmedoParte2.pdf	16/01/2017
100	PLANILLA 27 DE MANTENIMIENTO	PLANILLA_27_MANT._ACOLIT_COLIMES.pdf	16/04/2018
101	PLANILLA 28 DE MANTENIMIENTO	PLANILLA_28_DE_MANTENIMIENTO_DE_OBRA.pdf	16/04/2018
102	PLANILLA 29 DE MANTENIMIENTO	PLANILLA_29_DE_MANTENIMIENTO_DE_OBRA.pdf	16/04/2018
103	PLANILLA 3	PlanillaNo3ContratoComplementarioNo3Colimes.pdf	17/01/2017
104	PLANILLA 3 DE OBRA DEL C.C. 2	PLANILLA_3_OBRA_DE_C.C._No_2_COLIMES_OLMEDO.pdf	21/12/2017
105	PLANILLA 3 FISCAL. ACOLIT MANT	PLANILLA_DE_FISCALIZACION_#03_MANT.pdf	27/01/2017
106	PLANILLA 30 DE MANTENIMIENTO	PLANILLA_30_MANT._COLIMES-OLMEDO.pdf	16/04/2018
107	PLANILLA 31 DE MANTENIMIENTO	PLANILLA_31_COLIMES_OLMEDO_MANTE..pdf	16/04/2018
108	PLANILLA 32 DE MANTENIMIENTO	PLANILLA_32_VERDU_COLIMES_OLMEDO_MANTE..pdf	16/04/2018
109	PLANILLA 34 MANTENIMIENTO COLIMES	PLANILLA_34_DE_MANT._COLIMES-VERDU.pdf	17/12/2018
110	PLANILLA 40 MANTENIMIENTO COLIMES-OLMEDO	PLANILLA_40_MANT._COLIMES.pdf	17/12/2018
111	PLANILLA 5 FISCALIZACION MANT.	PLANILLA_DE_FISCALIZACION_#05_MANT.pdf	27/01/2017
112	PLANILLA 5 OBRA	Planilla_No_5_de_Liquidación_Contrato_Complementario_No_2012017etc_Colimes_Olmedo	16/01/2017
113	PLANILLA 6 FISC. MANTENIMIENTO.	PLANILLA_DE_FISCALIZACION_#_06_MANT.pdf	30/01/2017
114	PLANILLA 7 DE FISC. MANTE.	PLANILLA_DE_FISCALIZACION_#07.pdf	30/01/2017
115	PLANILLA 7 OBRA	Planila_No_07_Colimes-Olmedo.pdf	16/01/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
116	PLANILLA 8	Planilla_No._08_Colimes-Olmedo.pdf	16/01/2017
117	PLANILLA 8 DE OBRA	PLANILLA_8_OBRA_COLIMES_OLMEDO.pdf	21/12/2017
118	PLANILLA 8 FISC. MANT .	PLANILLA_DE_FISCALIZACION_#_08.pdf	30/01/2017
119	PLANILLA 9	Planilla_9_Colimes-Olmedo.pdf	16/01/2017
120	PLANILLA 9 DE OBRA	PLANILLA_9_OBRA_COLIMES_OLMEDO.pdf	21/12/2017
121	PLANILLA DE FISCALIZACION No 10	Planilla_10_mayo_2016.pdf	17/01/2017
122	PLANILLA DE FISCALIZACION No 13	PLANILLA_13_-_AGOSTO_2016.pdf	17/01/2017
123	PLANILLA DE FISCALIZACION No 14	PLANILLA_14_-_SEPTIEMBRE_2016.pdf	17/01/2017
124	PLANILLA DE FISCALIZACION No 15	PLANILLA_15_-_OCTUBRE_2016.pdf	17/01/2017
125	PLANILLA DE FISCALIZACION No 3 MANT.	PLANILLA_DE_FISCALIZACION_#03_MANT.pdf	27/01/2017
126	PLANILLA DE FISCALIZACION No 9	Planilla_9-abril_2016.pdf	17/01/2017
127	PLANILLA DE FISCALIZACION No. 11	Planilla_11_junio_2016.pdf	17/01/2017
128	PLANILLA DE FISCALIZACION No. 12	PLANILLA_12_JULIO_2016.pdf	17/01/2017
129	PLANILLA DE MANTENIMIENTO No 11	Planilla_Mantenimiento_Colimes-Olmedo_Planilla_11.pdf	16/01/2017
130	PLANILLA DE MANTENIMIENTO No 1	Planilla_No_1_Mantenimiento_Colimes_Olmedo.pdf	16/01/2017
131	PLANILLA DE MANTENIMIENTO No 12	Planilla_Mantenimiento_Colimes-Olmedo_Planilla_12.pdf	16/01/2017
132	PLANILLA DE MANTENIMIENTO No 13	Planilla_Mantenimiento_Colimes-Olmedo_Planilla_13.pdf	16/01/2017
133	PLANILLA DE MANTENIMIENTO No 14	Planilla_Mantenimiento_Colimes-Olmedo_Planilla_14.pdf	16/01/2017
134	PLANILLA DE MANTENIMIENTO No 2	Planilla_de_Mantenimiento_No_2_Colimes_-_Olmedo.pdf	16/01/2017
135	PLANILLA DE MANTENIMIENTO No 3	Planilla_No._3_Mantenimiento_Colimes_Olmedo_-_Octubre_2015.pdf	16/01/2017
136	PLANILLA No 4 DE OBRA	Planilla_No._4_Contrato_Complementario_No._2_Proyecto_Colimes_Olmedo.pdf	16/01/2017
137	PLANILLLA 13 DE OBRA	PLANILLA_13_OBRA_COLIMES_OLMEDO.pdf	21/12/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Delgado León, Andrés Glen	Director Distrital de Guayas	Director Distrital del Guayas	adelgado@mtop.gob.ec	
Suárez Mendieta, Manuel Orlando	Líder de Proyecto	Coordinador Técnico de Infraestructura Provincial	msuarez@mtop.gob.ec	023974600
Valle Zuñiga, Hugo Arturo	Subsecretario Regional 5	Subsecretario Regional 5	hvalle@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
74747_1.jpg	08/12/2015
