

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 1**

**Dirección Provincial Esmeraldas**

**PROYECTO: K037 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de Esmeraldas**

|                                |  |                                 |  |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto:            | Vivero Cedeño, Cesar Heraclito (cvivero@mtop.gob.ec) |                                 |  |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Valencia Lara, Gustavo Stalin                        | Programas Relacionados:         | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, MTOP - RUTA DE SPONDYLUS, Provincia - Esmeraldas, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, STPE - Inversión en 40km de frontera norte |
| Titular:                       | Quiroz Franco, Mariela Mercedes                      | Prioridad:                      | 0  |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura                                      | Retorno Económico:              | 0.00   |
| CUP:                           | 175200000.506.3743                                   | TIR:                            | 0.00 %   |
| Objetivos Operativos:          | 3  | VAN:                            | 0.00   |
| Viabilidad Técnica:            | Alta   | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 51,586,553.20  |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                     |                                 |  |
| Tipo de Ppto. Externo:         | Organismo multilateral                               | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2011 - 31/12/2021  |
| Fecha de última actualización: | 06/04/2021   | Fecha de Fin Base:              | 26/05/2014   |
| Modificado por:                | Quiroz Franco, Mariela Mercedes                      | Fecha del siguiente Hito:       | 30/04/2021   |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

La provincia de Esmeraldas tiene toda su red vial estatal contratadas, con proyectos que contemplan ampliaciones y que según su programación terminan de ejecutarse en el año 2012, es necesario la realización de este proyecto para el Mantenimiento de estos trabajos .

**Montos:**

Av. Colon: \$ 743981.30 USD. Contratista: SANCHEZ REAL ANGEL MARCELO

Av. Eloy Alfaro: \$ 736015.36 USD. Contratista: ALARCON SORNOZA BELFORT ANDRES

Esmeraldas - Súa: \$ 2072099.73 USD. Contratista: EDME S.A.

Mantenimiento rutinario y emergente por microempresas: \$ 501071.63 USD. Contratistas: Asociaciones de Mantenimiento Vial

**OBJETIVO GENERAL:**

Mantener la Red Vial Estatal en buen estado, mediante un plan de mantenimiento vial continua, cubriendo requerimientos de infraestructura adecuada de primer nivel.

Mejorar la movilidad de conectividad de la provincia de Esmeraldas mediante el mantenimiento de la Red Vial Estatal, garantizando la seguridad de los usuarios y el desarrollo económico, productivo y social de la provincia de Esmeraldas

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

.Mejorar la infraestructura de la provincia de Esmeraldas, mediante convenio de cooperación interinstitucional con las municipalidades de los cantones de la provincia de Esmeraldas

.Realizar actividades de mantenimiento vial que permitan mantener las carreteras de la RVE provincial en buen estado

Línea Base: Estos proyectos se iniciaron con la venida del Señor Presidente de la República y al observar el estado deplorable de las calles se comprometió asfaltar las mismas, siendo un compromiso presidencial, por eso se intervino en las calles: Eloy Alfaro, Colón, 6 de Diciembre, Olmedo, Sucre, Av. Kennedy, Av. Libertad y en los Barrios Unidos Somos Más, 24 de Mayo y el 15 de Marzo que por motivos ajenos al Ministerio el Contratista no cumplió con el objeto del contrato, teniendo que terminar Unilateralmente.

Producto: Asfaltado, construcción de parterres, jardinería, instalaciones hidráulicas para agua potable y alcantarillado.

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

- 1.-Mantenimiento y reparación de gabarra propiedad del MTOP que se encuentra en el cantón Eloy Alfaro
- 2.- Pavimentación de las Calles "Padre Lino Campesan" y "Armada Nacional" del Cantón San Lorenzo
- 3.- Asfaltado de la calle Olmedo en la ciudad de Esmeraldas
- 4.- Mantenimiento del camino vecinal Limón-Zabaletita del Medio, en el Cantón Quinindé
- 5.-Asfaltado de la calle Colón en la ciudad de Esmeraldas
  
- 6.- Asfaltado de la calle Eloy Alfaro en la ciudad de Esmeraldas
- 7.- Lastrado de carretera LasPiedras- Barrio 21 de noviembre -Parroquia Tachina-ciudad de Esmeraldas
- 8.- Trabajo de Asfaltado de las Calles desde el León hasta la "Y" de Tabiazo, Avenida Libertad y Kennedy, Avenida Sucre, Avenida 6 de Diciembre, en el Cantón Esmeraldas
- 9.- Asfaltado de las calles del barrio 24 de Mayo de la ciudad de Esmeraldas
- 10.- Asfaltado de las calles del barrio Unidos somos Más de la ciudad de Esmeraldas
- 11.- Señalización horizontal, vertical y seguridad vial de la vía San Lorenzo- Mataje
- 12.- Señalización horizontal, vertical y seguridad vial de la vía Y de Borbón- Borbón
- 13.- Señalización horizontal, vertical y seguridad vial de la vía Paso Lateral de Atacames
- 14.- Mantenimiento del puente metálico ubicado sobre el río Blanco en el cantón Quininde
- 15.- Mantenimiento del puente metálico ubicado sobre el río Tululbí en el cantón San Lorenzo
- 16.-Mantenimiento del puente metálico ubicado sobre el río Viche enel cantón Quinindé
- 17.-Mantenimiento del puente metálico ubicado sobre el río Quinindé en el cantón Quinindé
- 18.- Mantenimiento del puente Calderón en el cantón Atacames

Localidades de intervención:

- 1) Cantón Esmeraldas
- 2) Cantón Atacames
- 3) Cantón Eloy Alfaro
- 4) Cantón Muisne
- 5) Cantón Quinindé
- 6) Cantón Rioverde
- 7) Cantón San Lorenzo

**Beneficios Cualitativos**

Mantener en buen estado las carreteras y puentes en los que intervengan el Ministerio de Transporte y Obra Públicas. con proyectos de arrastre

**Tipo de Beneficiario**

Beneficiarios Directos.

El siguiente perfil tiene como beneficiarios directos a los habitantes de toda la provincia de Esmeraldas.

MUJERES 262.780  
HOMBRES271.312

TOTAL534.092

Beneficiarios Indirectos:

Son los turistas, comerciantes que llegan a la provincia de Esmeraldas.

**Restricciones**


COSTO: Los recursos presupuestarios para Mantenimiento Vial no cubren todo el año

TIEMPO: Por falta de asignación de recursos no se cumpliría con el cronograma elaborado

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 93.95 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

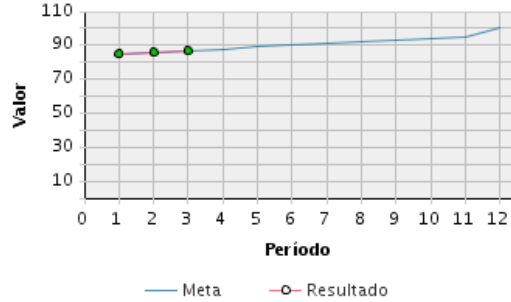

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2021                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 85 %                        | 86 % | 87 % | 88 % | 89 % | 90 % | 91 % | 92 % | 93 % | 94 % | 95 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 85 %                        | 86 % | 87 % |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | ●                           | ●    | ●    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>MARZO 2021:</b></p> <p>Se espera el financiamiento para la contratación de las 11 micro empresas que cumplen el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que realizaran las labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas, además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19, solo queda el mantenimiento contratado por 5 años en la RVE E-20.</p>   | Quiroz Franco, Mariela Mercedes | 05/04/2021 - 04:27 PM         |
| <p><b>FEBRERO 2021:</b></p> <p>Se espera el financiamiento para la contratación de las 11 micro empresas que cumplen el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que realizaran las labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas, además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19, solo queda el mantenimiento contratado por 5 años en la RVE E-20.</p>   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/03/2021 - 12:52 PM         |
| <p><b>ENERO 2021:</b></p> <p>Se espera el financiamiento para la contratación de las 11 micro empresas que cumplen el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que realizaran las labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas, además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19, solo queda el mantenimiento contratado por 5 años en la RVE E-20.</p>   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/02/2021 - 10:38 AM         |
| <p><b>DICIEMBRE 2020:</b></p> <p>Se culminó el contrato las 11 micro empresas cumpliendo el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que realizaban las labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19, solo queda el mantenimiento contratado por 5 años.</p>   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/01/2021 - 11:22 AM         |
| <p><b>NOVIEMBRE 2020:</b></p> <p>Se culminó el contrato las 11 micro empresas cumpliendo el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que realizaban las labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19, solo queda el mantenimiento contratado por 5 años, para finalizar las actas el fiscalizador solicitó rectificar ciertos trabajos a las 11 microempresas.</p> | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 04/12/2020 - 12:28 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>OCTUBRE 2020:</b></p> <p>Cumplen su último mes de contrato las 11 micro empresas cumpliendo el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que iniciaron de labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19.</p>   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/11/2020 - 11:41 AM         |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2020:</b></p> <p>Al momento se encuentran contratadas las 11 micro empresas cumpliendo el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que iniciaron de labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19.</p>   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/10/2020 - 11:01 AM         |
| <p><b>AGOSTO 2020:</b></p> <p>Al momento se encuentran contratadas las 11 micro empresas cumpliendo el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que iniciaron de labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19, el Ministerio de Finanzas adeuda varias planillas a las asociaciones de conservación vial.</p>  | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 04/09/2020 - 01:42 PM         |
| <p><b>JULIO 2020:</b></p> <p>Al momento se encuentran contratadas las 11 micro empresas cumpliendo el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que iniciaron de labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19, sin presentarse novedades.</p>   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/08/2020 - 08:59 PM         |
| <p><b>JUNIO 2020:</b></p> <p>Al momento se encuentran contratadas las 11 micro empresas cumpliendo el Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, las mismas que iniciaron de labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas además se realiza mantenimiento por Administración Directa, todos cumpliendo los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria del COVID-19.</p>  | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 03/07/2020 - 12:51 PM         |
| <p><b>MAYO 2020:</b></p> <p>Mediante memorando MTOP-ADM_ESM-2020-126-ME, se dio a conocer que de las 11 micro empresas a ser contratadas para los 11 tramos del Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, se han generado nueve (9) Ordenes de Compra de Catálogo Electrónico, las mismas que iniciaron de labores de mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas además se realiza mantenimiento por Administración Directa.</p>   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/06/2020 - 11:28 AM         |
| <p><b>ABRIL 2020:</b></p> <p>Mediante memorando MTOP-ADM_ESM-2020-126-ME, se dio a conocer que de las 11 micro empresas a ser contratadas para los 11 tramos del Servicio de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal, se han generado nueve (9) Ordenes de Compra de Catálogo Electrónico, cabe indicar que por la emergencia sanitaria su inicio de labores esta paralizado hasta segunda orden, pero se ha realizado mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas por Administración Directa.</p> | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/05/2020 - 08:46 AM         |
| <p><b>MARZO 2020:</b></p> <p>A la fecha no se han contratado microempresas por modificaciones en trámites administrativos y renovar la solicitud de partida presupuestaria, pero se ha realizado mantenimiento rutinario a la red vial de Esmeraldas.</p>   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/04/2020 - 10:24 AM         |
| <p><b>FEBRERO 2020:</b></p> <p>A LA FECHA NO SE HAN CONTRATADO MICROEMPRESAS POR FATLA DE PARTIDA PRESUPUESTARIA, PERO SE HA REALIZADO MANENIMIENO RUINERIO A LA RED VIAL DE ESMERALDAS</p>   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/03/2020 - 04:29 PM         |
| <p><b>ENERO 2020:</b></p>   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/02/2020 - 02:45 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Se realizó mantenimiento por administración directa, con respecto a las 17 microempresas las mismas que se encontraban realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, se espera realizar la contratación a mediados de febrero de 2020. Se informa que se encuentran asigandos los recurso mediante memorando No. MTOP-FINAN_ESM-2020-19-ME, de fecha 31 de enero de 2020.  |                                 |                               |
| <b>DICIEMBRE 2019:</b><br><br>Se realizó mantenimiento por administración directa, con respecto a las 17 microempresas las mismas que se encontraban realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, terminaron su contrato septiembre 2019, se suscribio las respectivas Actas de Recepción Única.  | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 03/01/2020 - 10:47 AM         |
| <b>NOVIEMBRE 2019:</b><br><br>Se realizó mantenimiento por administración directa, con respecto a las 17 microempresas las mismas que se encontraban realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, terminaron su contrato septiembre 2019, se suscribio las respectivas Actas de Recepción Única, por el momento se encuentra etapa precontractual de atención a puntos críticos y bacheos para finalizar el año 2019. | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/12/2019 - 11:37 AM         |
| <b>OCTUBRE 2019:</b><br><br>Se realizó mantenimiento por administración directa, con respecto a las 17 microempresas las mismas que se encontraban realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, terminaron su contrato septiembre 2019, en elaboración las Acta de Recepción Única, se esta solicitando presupuesto para meses faltantes del año, mediante un memorando MTOP-DDE-2019-875-ME, sin respuesta.          | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/11/2019 - 09:00 AM         |
| <b>SEPTIEMBRE 2019:</b><br><br>Se realizó mantenimiento por administración directa, con respecto a las 17 microempresas las mismas que se encuentran realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, terminaron su contrato septiembre 2019, en elaboración las Acta de Recepción Única, se esta solicitando presupuesto para 3 meses más, mediante un memorando MTOP-DDE-2019-875-ME.                                   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 04/10/2019 - 10:30 AM         |
| <b>AGOSTO 2019:</b><br><br>Se realizó mantenimiento por administración directa y bacheos viales, con respecto a las 17 microempresas se encuentran realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, en vista que en septiembre termina sus contrato se esta solicitando presupuesto para 3 meses más.   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/09/2019 - 12:46 PM         |
| <b>JULIO 2019:</b><br><br>Se realizó mantenimiento por administración directa y bacheos viales, con respecto a las 17 microempresas se encuentran realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, también continúan colaboración en los bacheos.   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 02/08/2019 - 10:05 AM         |
| <b>JUNIO 2019:</b><br><br>Se realizó mantenimiento por administración directa y bacheos viales, con respecto a las 17 microempresas se encuentran realizando trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas, también se solicitó la colaboración en los bacheos.  | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 03/07/2019 - 11:27 AM         |
| <b>MAYO 2019:</b><br><br>Se realizó mantenimiento por administración directa, con respecto a las microempresas se suscribió 17 órdenes de compras, las cuales realizan los trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes en los tramos de la RVE de Esmeraldas.  | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 04/06/2019 - 12:32 PM         |
| <b>ABRIL 2019:</b><br><br>Se realizó mantenimiento por administración directa, con respecto a las microempresas se suscribió 17 órdenes de compras, las cuales comenzaron sus trabajos a mediados del mes de abril 2019, con trabajos de mantenimiento rutinario en los tramos de la RVE de Esmeraldas.  | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 02/05/2019 - 08:37 AM         |
| <b>MARZO 2019:</b>   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 03/04/2019 - 09:33 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas terminaron su orden de compra, se espera contratarlas desde mayo 2019.   |                                 |                               |
| <p>FEBRERO 2019:</p> <p>Se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas terminaron su orden de compra, se espera contratarlas desde abril 2019.</p>  | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 01/03/2019 - 04:04 PM         |
| <p>ENERO 2019:</p> <p>Se cumplió con el último mes de las labores y actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, se le ha realizado charlas a las asociaciones para que realicen de mejor manera su labor, se realizó la presentación y cambio de Fiscalizador, también se realiza mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía, la orden de compra vigente finalizó por lo que se debe realizar una nueva contratación para este año.</p> | Ortiz Campos, Lenin Herminio    | 05/02/2019 - 03:22 PM         |
| <p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>Se cumple mes a mes con las labores y actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, se le ha realizado charlas a las asociaciones para que realicen de mejor manera su labor, se realizó la presentación y cambio de Fiscalizador, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía, existen retrasos con la acreditación de los pagos de las planillas por parte del Ministerio de Finanzas.</p>  | Ortiz Campos, Lenin Herminio    | 04/01/2019 - 11:57 AM         |
| <p>NOVIEMBRE 2018:</p> <p>Se cumple mes a mes con las labores y actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, se le ha realizado charlas a las asociaciones para que realicen de mejor manera su labor, se realizó la presentación y cambio de Fiscalizador, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía, existen retrasos con la acreditación de los pagos de las planillas por parte del Ministerio de Finanzas.</p>  | Ortiz Campos, Lenin Herminio    | 03/12/2018 - 12:27 PM         |
| <p>OCTUBRE 2018:</p> <p>Se cumple mes a mes con las labores y actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, se le ha realizado charlas a las asociaciones para que realicen de mejor manera su labor, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía, existen retrasos con la acreditación de los pagos de las planillas por parte del Ministerio de Finanzas.</p>   | Ortiz Campos, Lenin Herminio    | 05/11/2018 - 08:58 AM         |
| <p>SEPTIEMBRE 2018:</p> <p>Se cumple mes a mes con las labores y actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, se le ha realizado charlas a las asociaciones para que realicen de mejor manera su labor, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía.</p>   | Ortiz Campos, Lenin Herminio    | 02/10/2018 - 02:41 PM         |
| <p>Enero 2014 :</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Se encuentra culminada y en revisión planilla de liquidación para recepción provisional.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Se encuentra culminada y en revisión planilla de liquidación para recepción provisional.</p>   | Ortiz Campos, Lenin Herminio    | 28/09/2018 - 09:18 AM         |
| <p>Diciembre 2013:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: colocación de adoquines decorativos en parterres.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: colocación de adoquines decorativos y colocación de plantas ornamentales en parterres.</p>   | Ortiz Campos, Lenin Herminio    | 28/09/2018 - 09:18 AM         |
| <p>Noviembre 2013:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Colocación de carpeta asfáltica; colocación de adoquines decorativos en parterres; hormigonado de aceras y bordillos.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Colocación de carpeta asfáltica; colocación de adoquines decorativos y colocación de plantas ornamentales en parterres; hormigonado de aceras y bordillos.</p> <p>-Se anexa contratos complementarios de la Av. colon y la Av. Eloy Alfaro, de igual manera los oficios de reinicio de obra por parte del fiscalizador</p>   | Ortiz Campos, Lenin Herminio    | 28/09/2018 - 09:18 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                                   | Fecha de última actualización    |
|---|--|----------------------------------|
| <p>Octubre 2013:<br/>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Colocación de carpeta asfáltica; colocación de adoquines decorativos en parterres; hormigonado de aceras y bordillos.<br/>-Asfaltado Av. Colón: Colocación de carpeta asfáltica; colocación de adoquines decorativos y colocación de plantas ornamentales en parterres; hormigonado de aceras y bordillos.</p> <p>Septiembre 2013:<br/>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro : Se reanuda los trabajos, una vez que se entrego el anticipo del contrato complementario por rubros nuevos.<br/>-Asfaltado Av. Colón: Se reanuda los trabajos, una vez que se entrego el anticipo del contrato complementario por rubros nuevos.<br/>Por lo que la terminación del asfaltado de estas obras o hitos será el 26 de noviembre; mas los 6 meses para su recepción definitiva.</p> <p>Agosto 2013:<br/>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro : Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos.<br/>-Asfaltado Av. Colón: Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos.</p> | <p>Ortiz Campos,<br/>Lenin Herminio</p>          | <p>28/09/2018 -<br/>09:18 AM</p> |
| <p>AGOSTO 2018:</p> <p>Se cumple mes a mes con las labores y actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, se le ha realizado charlas a las asociaciones para que realicen de mejor manera su labor, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía.</p>   | <p>Estupiñan<br/>Echeverria,<br/>Victor Hugo</p> | <p>04/09/2018 -<br/>09:22 AM</p> |
| <p>JULIO 2018:</p> <p>Se cumple mes a mes con las labores y actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, se le ha realizado charlas a las asociaciones para que realicen de mejor manera su labor, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía.</p>  | <p>Estupiñan<br/>Echeverria,<br/>Victor Hugo</p> | <p>01/08/2018 -<br/>11:11 AM</p> |
| <p>JUNIO 2018:</p> <p>Se ha cumplido con el primer mes de labores con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía.</p>  | <p>Estupiñan<br/>Echeverria,<br/>Victor Hugo</p> | <p>05/07/2018 -<br/>08:43 AM</p> |
| <p>MAYO 2018:</p> <p>Se ha cumplido con el primer mes de labores con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, también se realizó mantenimiento por administración directa, las microempresas también colaboran en las acciones de derrumbes en la vía.</p>   | <p>Rodas Mejía,<br/>Vicente<br/>Fernando</p>     | <p>05/06/2018 -<br/>02:59 PM</p> |
| <p>ABRIL 2018:</p> <p>Se ha cumplido con el primer mes de labores con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contratiempos, también se realizó mantenimiento por administración directa.</p>  | <p>Rodas Mejía,<br/>Vicente<br/>Fernando</p>     | <p>04/05/2018 -<br/>05:44 PM</p> |
| <p>MARZO 2018:</p>  | <p>Rodas Mejía,<br/>Vicente<br/>Fernando</p>     | <p>05/04/2018 -<br/>04:42 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                      | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Se ha cumplido con el primer mes de labores con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras, sin contrataciones.  |                                     |                               |
| <p><b>FEBRERO 2018:</b></p> <p>A inicios de febrero una vez contratadas las 17 microempresas de conservación vial las cuales cubren en su totalidad la red vial estatal en la Provincia de Esmeraldas, cada una cuenta con 10 personas y realizan trabajos de mantenimiento en un tramo de aproximadamente 30 km, la contratación de esta ha sido por 12 meses, estas iniciaron su trabajo con actividades de rosa mano, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, limpieza de alcantarilla, poda y retiro de árboles, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, entre otras.</p> | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 19/03/2018 -<br>08:49 AM      |
| <p><b>ENERO 2018:</b></p> <p>No existió contratación por espera de asignación presupuestaria a partir de febrero se realizó las contrataciones de 17 microempresas para toda la red vial estatal.</p>   | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 21/02/2018 -<br>02:33 PM      |
| <p><b>DICIEMBRE 2017:</b></p> <p>El 27 de diciembre de 2017 se terminarán los contratos de 17 microempresas de conservación, en espera de recursos para contratar en el 2018</p> <p>Además en el sector de Tacusa hasta Río verde se continúan con las labores de limpieza de alcantarillas por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.</p>  | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 05/01/2018 -<br>03:53 PM      |
| <p><b>NOVIEMBRE 2017:</b></p> <p>Las 17 microempresas de conservación realizarán actividades de mantenimiento rutinario de roza mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, en todas las Red Vial Estatal de Esmeraldas a cargo de la Dirección Distrital de Esmeraldas.</p> <p>Además en el sector de Pegue se continúan con las labores de limpieza de alcantarillas por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital. Se esta por legalizar los contratos de mantenimiento vial (Señalización horizontal)</p>   | Aldas Palacios,<br>Gustavo Ernesto  | 05/12/2017 -<br>03:09 PM      |
| <p><b>OCTUBRE 2017:</b></p> <p>Las 17 microempresas de conservación realizarán actividades de mantenimiento rutinario de roza mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, en todas las Red Vial Estatal de Esmeraldas a cargo de la Dirección Distrital de Esmeraldas.</p> <p>Además en el sector de Pegue se continúan con las labores de limpieza de alcantarillas por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.</p>   | Aldas Palacios,<br>Gustavo Ernesto  | 01/11/2017 -<br>09:00 AM      |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2017:</b></p> <p>Se realizó la orden de compra para los servicios de mantenimiento rutinario a 17 microempresas de conservación, las cuales realizarán actividades de roza mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas.</p> <p>Se dan mantenimiento por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.</p>  | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 05/10/2017 -<br>03:36 PM      |
| <p><b>AGOSTO 2017:</b></p> <p>Culminados los contratos vigentes de los mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación. Se espera presupuesto para recontractar las microempresas.</p> <p>Se dan mantenimiento por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.</p>  | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 05/09/2017 -<br>03:39 PM      |
| <p><b>JULIO 2017:</b></p> <p>Culminados los contratos vigentes de los mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizaron trabajos de rosa mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10.</p> <p>Se dan mantenimiento por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital.</p>   | Serrano Cedeño,<br>Alex Ricardo     | 03/08/2017 -<br>04:57 PM      |
| <p><b>JUNIO 2017:</b></p> <p>Se realizan el mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizan trabajos de rosa mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10. En el sector de Pegue se realiza la limpieza de la alcantarilla con maquinaria del MTOP y de igual manera se hace limpieza de calzada en el sector de Camarones.</p>             | Aldas Palacios,<br>Gustavo Ernesto  | 05/07/2017 -<br>08:58 AM      |



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Se dan mantenimiento a las vías afectadas a causa del terremoto de abril 2016.   |                                 |                               |
| <p>MAYO 2017:</p> <p>Se realizan el mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizan trabajos de rosa mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10.</p> <p>Se dan mantenimiento a las vías afectadas a causa del terremoto de abril 2016.</p> | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 06/06/2017 - 04:00 PM         |
| <p>ABRIL 2017:</p> <p>Se realizan el mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizan trabajos de rosa mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10.</p> <p>Se dan mantenimiento a las vías afectadas a causa del terremoto de abril 2016</p> | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/05/2017 - 03:16 PM         |
| <p>MARZO 2017:</p> <p>-Microempresas: En la actualidad realizan el mantenimiento rutinario 13 microempresas de conservación vial conformada cada una por 10 personas, las cuales realizan trabajos de rosa mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, limpieza de calzada, poda y tala de árboles, según especificaciones técnicas del MTOP, en lo que respecta a las redes viales estatales a cargo de nuestra jurisdicción, cubriendo la E-15, E-20, E-381 y E-10.</p>              | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 05/04/2017 - 05:02 PM         |
| <p>FEBRERO 2017:</p> <p>-Microempresas: Se inicio la contratación de microempresas de conservación vial (13) por lapso de 4 meses.</p>   | Rodas Mejía, Vicente Fernando   | 03/03/2017 - 05:15 PM         |
| <p>ENERO 2017:</p> <p>-Microempresas: Se espera asignación presupuestaría para la contratación anual de microempresas de conservación vial en este año 2017.</p>   | Aldas Palacios, Gustavo Ernesto | 03/02/2017 - 04:14 PM         |
| <p>DICIEMBRE 2016:</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 1 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales para el año 2017.</p>  | Rodas Mejía, Vicente Fernando   | 05/01/2017 - 09:45 AM         |
| <p>NOVIEMBRE 2016:</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 6 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, también existen 4 micro empresas de albergados , a las 9 anteriores ya se les esta realizando acta de recepción definitiva.</p>   | Rodas Mejía, Vicente Fernando   | 05/12/2016 - 04:00 PM         |
| <p>OCTUBRE 2016:</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 9 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, también existen 4 micro empresas de albergados , a las 6 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.</p>   | Rodas Mejía, Vicente Fernando   | 01/11/2016 - 05:01 PM         |
| <p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 4 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, a las 4 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.</p>   | Rodas Mejía, Vicente Fernando   | 05/10/2016 - 05:17 PM         |
| <p>AGOSTO 2016:</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 4 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, a las 6 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.</p>   | Rodas Mejía, Vicente Fernando   | 05/09/2016 - 03:47 PM         |
| <p>JULIO 2016:</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 6 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, a las 6 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.</p>  | Rodas Mejía, Vicente Fernando   | 08/08/2016 - 10:28 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                      | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>JUNIO 2016:</b></p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 6 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales, a las 4 anteriores ya se les suscribió acta de recepción definitiva.</p>  | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 04/07/2016 -<br>03:16 PM      |
| <p><b>MAYO 2016:</b></p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 4 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales.</p>  | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 08/06/2016 -<br>12:57 PM      |
| <p><b>ABRIL 2016:</b></p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, Se suscribió el Acta recepción definitiva el 25 de abril de 2016.</p> <p>-Microempresas: Se han suscritos ordenes de compras con 4 Asociaciones de conservación vial, las cuales serán contratadas mensualmente dependiendo de los recursos fiscales.</p>  | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 06/05/2016 -<br>12:09 PM      |
| <p><b>MARZO 2016:</b></p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de marzo 2016.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, en el mes de Abril se retomará la contratación ya fueron asignados los recursos para la contratación.</p>  | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 06/04/2016 -<br>04:49 PM      |
| <p><b>FEBRERO 2016:</b></p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de marzo 2016.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas</p>   | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 07/03/2016 -<br>12:26 PM      |
| <p><b>ENERO 2016:</b></p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de marzo 2016.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas</p>   | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 05/02/2016 -<br>02:59 PM      |
| <p><b>DICIEMBRE 2015:</b></p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de enero.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.</p>   | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 05/01/2016 -<br>01:59 PM      |
| <p><b>NOVIEMBRE 2015:</b></p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de diciembre.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra está terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribió el Acta de Recepción Definitiva el 25 de noviembre de 2015.</p> | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 27/11/2015 -<br>10:34 AM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                      | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| -Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.  |                                     |                               |
| <p>OCTUBRE 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de noviembre.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra está terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva prevista para fines de noviembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.</p>    | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 06/11/2015 -<br>03:29 PM      |
| <p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para fines de octubre.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra está terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva prevista para fines de octubre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.</p>     | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 05/10/2015 -<br>09:21 AM      |
| <p>AGOSTO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para los primeros días de octubre.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra está terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva con fecha 14 de septiembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, Actas de recepción únicas firmadas.</p> | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 04/09/2015 -<br>11:58 AM      |
| <p>JULIO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. Se suscribió el Acta recepción provisional el 30 de abril de 2015, se prevé el acta de recepción definitiva para los primeros días de octubre.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, se están elaborando las Actas de recepción únicas.</p>  | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 31/07/2015 -<br>12:05 PM      |
| <p>JUNIO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de julio de 2015.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva con fecha 14 de septiembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría, se estan elaborabdo las Actas de recepción unicas.</p>   | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 02/07/2015 -<br>09:14 AM      |
| <p>MAYO 2015:</p>  | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 01/06/2015 -<br>11:57 AM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                        | Fecha de última actualización |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de junio de 2015.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribió el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva con fecha 14 de septiembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría.</p>  |                                       |                               |
| <p>ABRIL 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de mayo de 2015.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Se suscribio el Acta de Recepción Definitiva con fecha 17 de abril de 2015.</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada con fecha 17 de febrero 2015, y se suscribio el Acta de Recepción Provisional con fecha 14 de marzo de 2015, se espera suscribir el Acta de Recepción Definitiva con fecha 14 de septiembre de 2015.</p> <p>-Microempresas: No se puede iniciar la suscripción de los nuevos contratos por falta de partida presupuestaría.</p>   | <p>Flores Zambrano, Boris Marcelo</p> | <p>07/05/2015 - 01:12 PM</p>  |
| <p>MARZO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de abril de 2015.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido, prevista para fines de abril de 2015</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de abril de 2015.</p>   | <p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>  | <p>06/04/2015 - 10:13 AM</p>  |
| <p>FEBRERO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de marzo de 2015.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido, prevista para fines de marzo de 2015</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La obra esta terminada. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de marzo de 2015.</p>   | <p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>  | <p>09/03/2015 - 01:40 PM</p>  |
| <p>ENERO 2015:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el fines de febrero del 2015.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido, prevista para el 04 de marzo de 2015</p> <p>-Mantenimiento De La Carretera: Esmeraldas-Súa: La contratista esta en la construcción de las obras que se incrementaron y fueron aprobadas en la orden de Cambio N° 1 y también la ejecución del rubro nuevo de señalización (chevrone). La obra esta en etapa de terminación y tiene como plazo hasta el 17 de febrero de cumplir con el objeto del contrato.</p> | <p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>  | <p>09/02/2015 - 01:47 PM</p>  |
| <p>DICIEMBRE 2014:</p>  | <p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>  | <p>06/01/2015 - 08:58 AM</p>  |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                      | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido. En trámite del Acta recepción provisional prevista para el mediados de enero del 2015.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido, prevista para el 04 de marzo de 2015.</p>  |                                     |                               |
| <p>NOVIEMBRE 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, en trámite Recepción Provisional, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, se firmó la Recepción Provisional el 5 de septiembre del 2014. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido.</p>  | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 05/12/2014 -<br>01:24 PM      |
| <p>OCTUBRE 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Proyecto terminado, en trámite Recepción Provisional, se aplicaran las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Proyecto terminado, en trámite Recepción Provisional. Se aplicarán las multas correspondientes en la liquidación económica, por no entregar la obra en el plazo establecido.</p>   | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 10/11/2014 -<br>08:45 AM      |
| <p>SEPTIEMBRE 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: La obra no se entregó en el plazo establecido en el contrato de fecha 17 de noviembre de 2013, el contratista procedió a entregar la obra concluida el 22 de agosto del 2014, por lo que se procederá al cobro de la multa respectiva al presentar la planilla de liquidación.</p> <p>Está prevista suscribir el Acta recepción provisional hasta el 15 de octubre del 2014. El trámite del Acta recepción de definitiva se la realizara luego de los 6 meses según lo establece la Ley de Contratación Pública.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: El proyecto no se ha entregado en la fecha establecida en el contrato, se procederá al cobro de multa en la planilla de liquidación. La obra se terminó el 11 de enero del 2014, la contratista solicito el trámite del Acta de recepción provisional, que se elaborara hasta fines del mes de septiembre 2014.</p> <p>La suscripción del Acta recepción de definitiva se la realizará luego de los 6 meses según lo establece la Ley de Contratación Pública.</p>  | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 06/10/2014 -<br>11:03 AM      |
| <p>AGOSTO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Los trabajos no se entregaron a la fecha establecida en el contrato, por lo que se procederá al cobro de la multa respectiva al presentar la planilla de liquidación.</p> <p>La obra fue concluida 14 de agosto del 2014, está prevista el Acta Recepción Provisional hasta el 15 de septiembre del 2014. La suscripción del Acta Recepción de Definitiva se la realizara luego de los 6 meses según lo establece la Ley de Contratación Pública.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: El proyecto no fue entregado en la fecha establecida en el contrato, se procederá al cobro de multas en la planilla de liquidación. La obra se termino en enero del 2014, la contratista aun no ha solicitado Recepción Provisional, mediante conversación telefónica la contratista se comprometió a solicitar y presentar la documentación pertinente para elaborar el Acta de Recepción Provisional hasta mediados del mes de septiembre 2014.</p> <p>La suscripción del Acta Recepción de Definitiva se la realizará luego de los 6 meses según lo establece la Ley de Contratación Pública.</p> | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 09/09/2014 -<br>08:14 AM      |
| <p>JULIO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: En la actualidad el contratista a conseguido los adoquines de parterre que faltaban y los está colocando.</p>  | Rodas Mejía,<br>Vicente<br>Fernando | 30/07/2014 -<br>02:14 PM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| -Asfaltado Av. Colón: La obra está terminada, se ha conversado con el contratista vía telefónica para que solicite la recepción provisional la misma que se espera realizarla para el 8 de agosto.   |                                  |                               |
| <p>JUNIO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: El contratista ha trasportado el adoquín que tiene que colocar en el proyecto.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La obra está terminada, se ha conversado con el contratista vía telefónica para que solicite la recepción provisional.</p>   | Rodas Mejía, Vicente Fernando    | 05/07/2014 - 11:48 AM         |
| <p>MAYO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: El contratista ha limpiado la obra para poner los adoquines que le faltan y sembrar las plantas que faltan, teniendo que presentar la planilla cuando termine la obra para poder cuantificar la multa correspondiente.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La obra está terminada, se ha hablado con el contratista para que solicite la recepción provisional.</p>  | Rodas Mejía, Vicente Fernando    | 06/06/2014 - 01:18 PM         |
| <p>ABRIL 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: El contratista está adquiriendo el resto de plantas faltantes en la Av. Eloy Alfaro para terminar con este ornato de la ciudad y los ladrillos peatonales en los parterres serán colocados antes del 15 de mayo.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La calle colón está terminada, teniendo que nombrarse la comisión para la recepción provisional cuando el contratista la solicite, caso contrario, le recomendaremos al contratista que la solicite.</p> | Rodas Mejía, Vicente Fernando    | 08/05/2014 - 01:23 PM         |
| <p>MARZO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: Falta el 1% para la culminación, el problema se presento por la falta de ladrillos que cumplan las especificaciones técnicas y el ornato de la ciudad.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La calle colón está terminada, teniendo que nombrarse la comisión para la recepción provisional.</p>   | Rodas Mejía, Vicente Fernando    | 07/04/2014 - 01:56 PM         |
| <p>FEBRERO 2014:</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro: La Fiscalización y la Contratista estan evaluando el avance de la obra para la liquidación económica.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: La Fiscalización y la Contratista estan evaluando el avance de la obra para la liquidación económica.</p>   | Dávila Cadena, Christian Roberto | 07/03/2014 - 04:49 PM         |
| <p>Julio 2013:</p> <p>- Se terminaron los trabajos de asfaltado del barrio Unidos Somos Más.</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro : Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos.</p> <p>- Asfaltado Barrio 24 de Mayo: Esta terminada con acta provisional: Se adjunta acta.</p>  | Martínez Martínez, Jorge Aníbal  | 02/08/2013 - 12:14 PM         |
| <p>Junio 2013:</p> <p>- Se continúa trabajando en el asfaltado del barrio Unidos Somos Más, colocación de carpeta asfáltica</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro : Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos.</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Se encuentra suspendida la obra hasta la firma del contrato complementario por rubros nuevos.</p> <p>- Asfaltado Barrio 24 de Mayo: Esta terminada con acta provisional: Se adjunta acta.</p>                 | Martínez Martínez, Jorge Aníbal  | 05/07/2013 - 10:33 AM         |
| <p>Mayo 2013:</p> <p>- Se continúa trabajando en el asfaltado del barrio Unidos Somos Más, colocación de carpeta asfáltica</p> <p>-Asfaltado Av. Eloy Alfaro : construcción de Parterre y colocación de carpeta asfáltica</p> <p>-Asfaltado Av. Colón: Construcción de aceras y bordillos, parterres y colocación de carpeta asfáltica.</p>  | Martínez Martínez, Jorge Aníbal  | 05/07/2013 - 10:29 AM         |
| <p>Abril 2013:</p> <p>-Asfaltado del Barrio Unidos Somos Más se encuentra colocando la carpeta asfáltica</p> <p>-Asfaltado de la Av. Eloy Alfaro : se construye los bordillos y aceras así como los bordillos para los parterres</p>   |                                  |                               |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                        | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| <p>.-Asfaltado Av. Colón : Se construye los bordillos y aceras , así como los bordillos para los parterres</p> <p>Marzo 2012:</p> <p>Se continua trabajando en los proyectos de asfaltado tales como :</p> <p>-Asfaltado de la Y de León -Tabiazo-Avs. Kennedy-Libertad-6 de Diciembre- Sucre, esta obra se encuentra terminada</p> <p>-Asfaltado del Barrio 24 de Mayo: Se continua colocando carpeta asfáltica</p> <p>-Asfaltado del Barrio Unidos Somos Más se encuentra colocando la carpeta asfáltica</p> <p>-Asfaltado de la Av. Eloy Alfaro : se construye los bordillos y aceras así como los bordillos para los parterres</p> <p>.Asfaltado Av. Colón : Se construye los bordillos y aceras , así como los bordillos para los parterres</p>   |                                       |                               |
| <p>Enero 2013: Se continua con la construcción de aceras , bordillos, colocación de subbase, sumideros en el barrio 24 de Mayo, avance físico de 52,13 %</p> <p>- El Barrio Unidos Somos Más, se está colocando subbase, construyendo aceras y bordillos, colocación de tirantes para sumideros, avance físico 40 %</p> <p>- El asfaltado de la avenida Eloy Alfaro, se está construyendo los bordillos y aceras , bordillos para parterre, avance físico del 15%</p> <p>-Asfaltado de las calles desde el León hasta la Y de Tabiazo, Av. Libertad y Kennedy, Av. Sucre, Av. 6 de Diciembre, colocación de la carpeta asfáltica, vance físico del 98 %</p> <p>-asfaltado del barrio 15 de Marzo, se encuentra con Terminación Unilateral</p> <p>-Mantenimiento puente Tulumbí, terminada la obra 100 %</p> <p>-Reconstrucción muro gavión puente Teaone 3, colocación de carpeta asfáltica al ingreso del puente, avance físico 100%</p> <p>-Mantenimiento puente Calderón, colocación de gaviones, avance físico 20 %</p> <p>- Mantenimiento puente Viche, trabajos de pintura para la estructura metálica, 95 %</p> <p>-Mantenimiento puente Quinindé, construcción de muro de gaviones, Samblassting, y pintura, avance físico 30 %</p> <p>-Mantenimiento CV Limón-Zabaletita,Quinindé,Trámite de Terminación Unilateral</p> | Martínez<br>Martínez, Jorge<br>Aníbal | 26/02/2013 -<br>06:13 PM      |
| <p>DICIEMBRE:</p> <p>- Asfaltado de calles del barrio Unidos Somos Más: se encuentra en ejecución , aceras, bordillos, excavación ,colocación de material de mejoramiento, subbase, domiciliarias, subidas de pozos. cajas, un avance físico del 30 %</p> <p>- Asfaltado de calles del barrio 24 de mayo : En etapa de ejecución , aceras, bordillos, colocación de material de mejoramiento,subbase, base, domiciliarias, subidas de pozos , cajas, avance físico 42 % -Mantenimiento camino vecinal Roto- Vinzade : Los trabajos se encuentran concluidos. 100 %</p> <p>-Mantenimiento de estructura metálica del puente sobre el rio Blanco : terminado 100 %</p> <p>- Mantenimiento de estructura metálica del puente sobre el rio Tululbí : etapa de construcción, samblassting y pintura, procura metálica, instalación de acometidas eléctricas, instalación de transformador , colocación de iluminarias., avance físico 65 %</p> <p>- Mantenimiento de estructura metálica del puente sobre el rio Viche : etapa de construcción, limpieza de maleza, samblassting y pintura, procura metálica, instalación de acometidas eléctricas.,, avance físico 45 %</p>  | Martínez<br>Martínez, Jorge<br>Aníbal | 10/01/2013 -<br>07:52 AM      |

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

| Riesgo  | Fecha de última actualización | Responsable                   | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <p><b>3- REGIONAL. Ambiental.</b><br/>Las fuertes lluvias CAUSARÍAN el retraso de la ejecución de la obra</p> | 05/04/2021                    | Cesar Heraclito Vivero Cedeño | 50 %         | 90      | 45           | 0/2                         |

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

| Localidad de Impacto |   |
|----------------------|---|
| 1                    | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas |

**HITOS**

|    | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | DEFINICIÓN: Aprobación de mantenimiento vial provincial realizada  | 4-Inicio de Trabajo        | 01/01/2011         |                | 01/01/2011 |          | Sí            | 10.0          |
| 2  | PLANEACIÓN: Firma de contrato asfaltado de las calles del barrio 15 de Marzo firmado   | 1-Solicitud de Información | 30/05/2011         |                | 30/05/2011 |          | Sí            | 10.0          |
| 3  | EJECUCIÓN: Señalización de la vía El Salto- Muisne del Cantón Muisne ejecutados  | 5-Entregables Intermedios  | 23/08/2011         |                | 23/08/2011 |          | Sí            | 1.0           |
| 4  | EJECUCIÓN: Rehabilitación y Mantenimiento del camino vecinal J3-Vinsade en el cantón Quinindé ejecutados   | 5-Entregables Intermedios  | 04/09/2011         |                | 04/09/2011 |          | Sí            | 1.5           |
| 5  | EJECUCIÓN: Asfaltado de la venida principal de la Parroquia Sua realizada  | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2011         |                | 30/09/2011 |          | Sí            | 1.0           |
| 6  | EJECUCIÓN: Elaboración y Colocación de 106 señales regulatorias para ser ubicadas antes y después de cada puente o viaducto en la Provincia de Esmeraldas. colocadas | 5-Entregables Intermedios  | 05/11/2011         |                | 05/11/2011 |          | Sí            | 1.0           |
| 7  | EJECUCIÓN: Construcción del puente sobre el río La Unión del paso Lateral de Atacames ejecutado  | 1-Solicitud de Información | 20/11/2011         |                | 20/11/2011 |          | Sí            | 1.0           |
| 8  | EJECUCIÓN: Señalización de la vía Esmeraldas- Atacames-Súa- Provincia de Esmeraldas realizado  | 5-Entregables Intermedios  | 22/11/2011         |                | 22/11/2011 |          | Sí            | 1.0           |
| 9  | EJECUCIÓN: Trabajos de acceso a la Parroquia La Unión del cantón Atacames ejecutado  | 1-Solicitud de Información | 30/03/2012         |                | 30/03/2012 |          | Sí            | 1.0           |
| 10 | EJECUCIÓN: Mantenimiento y reparación de gabarra propiedad del MTOP que se encuentra en el cantón Eloy Alfaro realizado  | 1-Solicitud de Información | 30/06/2012         |                | 30/06/2012 |          | Sí            | 1.0           |
| 11 | EJECUCIÓN: Pavimentación de las Calles "Padre Lino Campesan" y "Armada Nacional" del Cantón San Lorenzo realizado  | 5-Entregables Intermedios  | 30/07/2012         |                | 30/07/2012 |          | Sí            | 1.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Asfaltado de la calle Olmedo en la ciudad de Esmeraldas ejecutado   | 1-Solicitud de Información | 30/08/2012         |                | 30/08/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 13 | EJECUCIÓN: Lastrado de carretera LasPiedras- Barrio 21 de noviembre -Parroquia Tachina-ciudad de Esmeraldas terminado  | 5-Entregables Intermedios  | 25/09/2012         |                | 25/09/2012 |          | Sí            | 2.0           |



HITOS

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 14 | EJECUCIÓN: Señalización horizontal, vertical y seguridad vial del la vía San Lorenzo - Mataje, Cantón San Lorenzo realizada   | 5-Entregables Intermedios              | 30/10/2012         |                | 30/10/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 15 | EJECUCIÓN: Señalización horizontal, vertical y seguridad vial del la vía Y Borbón - Borbón, Cantón Eloy Alfaro realizada  | 5-Entregables Intermedios              | 30/10/2012         |                | 30/10/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 16 | EJECUCIÓN: Señalización horizontal, vertical y seguridad vial del Paso Lateral de Atacames realizada  | 5-Entregables Intermedios              | 30/10/2012         |                | 30/10/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 17 | EJECUCIÓN: Mantenimiento de puente metálico y obras civiles ubicado sobre el rio Blanco , en el Cantón Quinindé realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2012         |                | 30/11/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 18 | EJECUCIÓN: Mantenimiento del camino vecinal Limón-Zabaletita del Medio, en el Cantón Quinindé ejecutado   | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2012         |                | 30/11/2012 |          | Sí            | 1.0           |
| 19 | EJECUCIÓN: Trabajo de Asfaltado de las Calles desde el León hasta la "Y" de Tabiazo, Avenida Libertad y Kennedy, Avenida Sucre, Avenida 6 de Diciembre, en el Cantón Esmeraldas ejecutado | 5-Entregables Intermedios              | 30/03/2013         |                | 30/03/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 20 | EJECUCIÓN: Asfaltado de las calles del barrio 24 de Mayo de la ciudad de Esmeraldas realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 30/04/2013         |                | 30/04/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 21 | EJECUCIÓN: Asfaltado de las calles del barrio Unidos somos Más de la ciudad de Esmeraldas ejecutado   | 5-Entregables Intermedios              | 31/07/2013         |                | 31/07/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 22 | EJECUCIÓN: Asfaltado de la calle Colón en la ciudad de Esmeraldas realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 15/04/2014         |                | 15/02/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 23 | CIERRE Liquidación Económica Av. Colón  | 5-Entregables Intermedios              | 05/09/2014         |                | 05/09/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 24 | EJECUCIÓN: Asfaltado de la calle Eloy Alfaro en la ciudad de Esmeraldas realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 15/09/2014         |                | 15/10/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 25 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario y emegente por microempresas   | 4-Inicio de Trabajo                    | 17/09/2014         |                | 17/03/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 26 | CIERRE Liquidación Económica Av. Eloy Alfaro  | 5-Entregables Intermedios              | 26/12/2014         |                | 30/04/2015 |          | Sí            | 0.5           |
| 27 | CIERRE: Acta de entrega de Recepción firmada Av. Colón  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 17/02/2015         |                | 17/04/2015 |          | Sí            | 0.5           |
| 28 | EJECUCIÓN: Mantenimiento de la carretera Esmeraldas - Súa   | 5-Entregables Intermedios              | 17/02/2015         |                | 17/02/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 29 | CIERRE: Acta de entrega de Recepción firmadas Mantenimientos rutinarios   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 12/05/2015         |                | 06/04/2015 |          | Sí            | 0.5           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | y emergentes por microempresas   |  |                    |                |            |   |               |               |
| 30 | CIERRE: Acta de entrega de Recepción firmada Av. Eloy Alfaro   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/06/2015         |                | 25/02/2016 |    | Sí            | 0.5           |
| 31 | CIERRE: Acta de entrega de Recepción firmada carretera Esmeraldas - Súa  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 14/09/2015         |                | 25/11/2015 |    | Sí            | 0.5           |
| 32 | EJECUCIÓN: Aprobación de asignación presupuestaria para el Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Enero 2018, aprobado | 5-Entregables Intermedios              | 31/01/2018         |                | 31/01/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 33 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Febrero 2018, realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 28/02/2018         |                | 28/02/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 34 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Marzo 2018, realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 30/03/2018         |                | 30/03/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 35 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Abril 2018, realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 30/04/2018         |                | 30/04/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 36 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Mayo 2018, realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 31/05/2018         |                | 31/05/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 37 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Junio 2018, realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 29/06/2018         |                | 29/06/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 38 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Julio 2018, realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 31/07/2018         |                | 31/07/2018 |   | Sí            | 1.0           |
| 39 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Agosto 2018, realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 31/08/2018         |                | 31/08/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 40 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Septiembre 2018, realizado   | 5-Entregables Intermedios              | 28/09/2018         |                | 28/09/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 41 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Octubre 2018, realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 31/10/2018         |                | 31/10/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 42 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Noviembre 2018, realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2018         |                | 30/11/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 43 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Diciembre 2018, realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 28/12/2018         |                | 28/12/2018 |  | Sí            | 1.0           |
| 44 | CIERRE: Acta entrega recepción, firmada  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2018         |                | 08/02/2019 |  | Sí            | 0.5           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 45 | CIERRE: Liquidación económica, realizada   | 9-Entregables Formales                 | 31/12/2018         |                | 09/04/2019 |          | Sí            | 0.5           |
| 46 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Enero 2019, realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 31/01/2019         |                | 31/01/2019 |          | Sí            | 0.5           |
| 47 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Marzo 2019, realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 31/03/2019         |                | 31/03/2019 |          | Sí            | 0.5           |
| 48 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Abril 2019, realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 30/04/2019         |                | 30/04/2019 |          | Sí            | 0.5           |
| 49 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Mayo 2019, realizado       | 5-Entregables Intermedios              | 31/05/2019         |                | 31/05/2019 |          | Sí            | 0.5           |
| 50 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Junio 2019, realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2019         |                | 30/06/2019 |          | Sí            | 0.5           |
| 51 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Julio 2019, realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 31/07/2019         |                | 31/07/2019 |          | Sí            | 0.5           |
| 52 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Agosto 2019, realizado     | 5-Entregables Intermedios              | 31/08/2019         |                | 31/08/2019 |          | Sí            | 1.5           |
| 53 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - Septiembre 2019, realizado | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2019         |                | 30/09/2019 |          | Sí            | 1.0           |
| 54 | CIERRE: Liquidación económica 2019, realizada  | 9-Entregables Formales                 | 30/12/2019         |                | 15/10/2019 |          | Sí            | 0.5           |
| 55 | CIERRE: Acta entrega recepción 2019, firmadas  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2019         |                | 20/09/2019 |          | Sí            | 0.5           |
| 56 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - ENERO 2020, realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 31/01/2020         |                | 31/01/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 57 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - FEBRERO 2020, realizado    | 5-Entregables Intermedios              | 28/02/2020         |                | 28/02/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 58 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - MARZO 2020, realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 31/03/2020         |                | 31/03/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 59 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - ABRIL 2020, realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 30/04/2020         |                | 30/04/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 60 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - MAYO 2020, realizado       | 5-Entregables Intermedios              | 29/05/2020         |                | 29/05/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 61 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de   | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2020         |                | 30/06/2020 |          | Sí            | 1.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|    | Esmeraldas - JUNIO 2020, realizado   |  |                    |                |            |          |               |               |
| 62 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - JULIO 2020, realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 31/07/2020         |                | 31/07/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 63 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - AGOSTO 2020, realizado     | 5-Entregables Intermedios              | 31/08/2020         |                | 31/08/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 64 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - SEPTIEMBRE 2020, realizado | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2020         |                | 30/09/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 65 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - OCTUBRE 2020, realizado    | 5-Entregables Intermedios              | 30/10/2020         |                | 30/10/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 66 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - NOVIEMBRE 2020, realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2020         |                | 30/11/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 67 | CIERRE: Acta entrega recepción 2020, firmada   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2020         |                | 31/12/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 68 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - ENERO 2021, realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 31/01/2021         |                | 31/01/2021 |          | Sí            | 1.0           |
| 69 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - FEBRERO 2021, realizado    | 5-Entregables Intermedios              | 28/02/2021         |                | 28/02/2021 |          | Sí            | 1.0           |
| 70 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - MARZO 2021, realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 31/03/2021         |                | 31/03/2021 |          | Sí            | 1.0           |
| 71 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - ABRIL 2021, realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 30/04/2021         | 30/04/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 72 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - MAYO 2020, realizado       | 5-Entregables Intermedios              | 31/05/2021         | 31/05/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 73 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - JUNIO 2021, realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2021         | 30/06/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 74 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - JULIO 2021, realizado      | 5-Entregables Intermedios              | 31/07/2021         | 31/07/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 75 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - AGOSTO 2021, realizado     | 5-Entregables Intermedios              | 31/08/2021         | 31/08/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 76 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - SEPTIEMBRE 2021, realizado | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2021         | 30/09/2021     |            |          | No            | 1.0           |

**HITOS**

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 77 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - OCTUBRE 2021, realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 31/10/2021         | 31/10/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 78 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - NOVIEMBRE 2021, realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2021         | 30/11/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 79 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia de Esmeraldas - DICIEMBRE 2021, realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 30/12/2021         | 30/12/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 80 | CIERRE: Acta entrega recepción 2021, firmada   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 0.5           |
| 81 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones | V - Verificación ejecutiva             | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 0.5           |
| 82 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita                                  | V - Verificación ejecutiva             | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 0.5           |
| 83 | CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF                           | V - Verificación ejecutiva             | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 1.5           |
| 84 | CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado  | V - Verificación ejecutiva             | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 0.5           |
| 85 | CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado  | V - Verificación ejecutiva             | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 0.5           |
| 86 | COMPLETADO: Informe de Cierre de Proyectos (SENPLADES) aprobado  | V - Verificación ejecutiva             | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 0.0           |


**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

|   | Supervisión                  | Supervisor                     | Organización Supervisora      | Fecha de creación |
|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | OBRA CON TRABAJOS TERMINADOS | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 31/05/2016        |
| 2 | OBRA CON TRABAJOS TERMINADOS | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 17/03/2016        |
| 3 | OBRA TERMINADA               | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 27/01/2016        |
| 4 | OBRA TERMINADA               | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 25/11/2015        |
| 5 | OBRA TERMINADA               | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 22/09/2015        |
| 6 | OBRA EN EJECUCIÓN            | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 26/08/2015        |
| 7 | OBRA CON TRABAJOS TERMINADOS | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 31/07/2015        |
| 8 | OBRA TERMINADA               | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 11/06/2015        |

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

|    | Supervisión               | Supervisor                     | Organización Supervisora      | Fecha de creación |
|----|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 9  | OBRA EN EJECUCIÓN         | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 30/04/2015        |
| 10 | OBRA EN EJECUCIÓN         | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 17/03/2015        |
| 11 | OBRA EN EJECUCIÓN         | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 15/12/2014        |
| 12 | OBRA EN EJECUCIÓN         | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 27/11/2014        |
| 13 | OBRA EN EJECUCIÓN         | Cabezas Castillo, Janeth Paola | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 20/10/2014        |
| 14 | GOBERNACIÓN DE ESMERALDAS | Lemos Ramirez, Pablo Rafael    | {PR} - Provincia - ESMERALDAS | 27/07/2013        |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador  | Estado  | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de mantenimiento de la red Vial Estatal |  | 103.20 %          | 0.35 | 0.3612                | 01/01/2017      | Marzo                      |


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 7,763,423.05     |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 51,586,553.20 ** |
| Costo Total:                  | 65,165,986.67    |
| Total Devengado:              | 48,126,309.30    |
| % Costo Total Devengado:      | 73.85 %          |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 73.85 %

**Perfil Económico 2021**

|  | Años Previos    | Año Actual (2021) | Años Futuros | Total                |
|--|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <b>Ppto. Planeado</b>  | 83,594,141.28   | 3,460,243.90      | 0.00         | <b>87,054,385.18</b> |
| <b>Ppto. Externo Planeado</b>                                  | 0.00            | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>          |
| <b>Ppto. Aprobado Inicial</b>                                  | 40,455,400.13   | 2,041,503.67      | 0.00         | <b>42,496,903.80</b> |
| <b>Ppto. Codificado</b>  | 64,923,859.02   | 3,460,243.90      | 0.00         | <b>68,384,102.92</b> |
| <b>Ppto. Comprometido</b>                                      | 28,633,825.06   | 0.00              | 0.00         | <b>28,633,825.06</b> |
| <b>Planeado - Codificado (2021)</b>                            |                 | 0.00              |              |                      |
| <b>Programado a Devengar</b>                                   | 51,100,301.49   | 3,460,243.90      | 0.00         | <b>54,560,545.39</b> |
| <b>Ppto. Devengado</b>   | 48,126,309.30   | 0.00              | 0.00         | <b>48,126,309.30</b> |
| <b>Pagado Real</b>   | 20,533,187.50   | 0.00              | 0.00         | <b>20,533,187.50</b> |
| <b>Estimado a fin de año</b>                                   | * 48,126,309.30 | 0.00              | 0.00         | <b>48,126,309.30</b> |
| <b>Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)</b> | 2,973,992.19    | 3,460,243.90      | 0.00         | <b>6,434,236.09</b>  |
| <b>% de Programado a Devengar vs. Devengado</b>                | * 94.18 %       | 0.00 %            | 0.00 %       | <b>88.21 %</b>       |
| <b>Ppto. Codificado 998</b>                                    | 1,765,804.87    | 0.00              | 0.00         | <b>1,765,804.87</b>  |
| <b>Ppto. Devengado 998</b>                                     | 1,757,212.08    | 0.00              | 0.00         | <b>1,757,212.08</b>  |

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021**

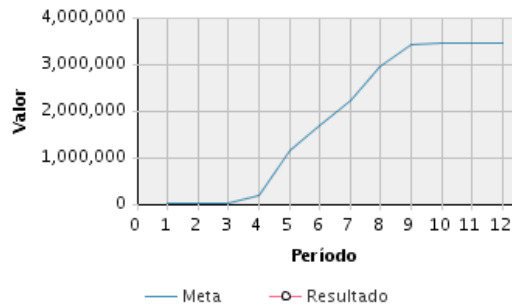

**Presupuesto Mensual 2021**

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 2,778.60                   |                     | 2,778.60                     |                       |                  |        |              |

| Presupuesto Mensual 2021 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 2,778.60                   |                     | 5,557.20                     |                       |                  |        |              |
| Mar                      | 6,578.82                   |                     | 12,136.02                    |                       |                  |        |              |
| Abr                      | 154,553.20                 |                     | 166,689.22                   |                       |                  |        |              |
| May                      | 972,229.07                 |                     | 1,138,918.29                 |                       |                  |        |              |
| Jun                      | 544,733.14                 |                     | 1,683,651.43                 |                       |                  |        |              |
| Jul                      | 542,803.84                 |                     | 2,226,455.27                 |                       |                  |        |              |
| Ago                      | 734,931.76                 |                     | 2,961,387.03                 |                       |                  |        |              |
| Sep                      | 449,934.48                 |                     | 3,411,321.51                 |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 22,438.54                  |                     | 3,433,760.05                 |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 22,438.54                  |                     | 3,456,198.59                 |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 4,045.31                   |                     | 3,460,243.90                 |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>3,460,243.90</b>        |                     |                              |                       |                  |        |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |  |
|----------------------|--|
| 15                   | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada |
| 17                   | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.                     |
| 18                   | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.                                   |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo  | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 1  |   | IMG01998-20120707-1319.jpg                                | 09/07/2012    |
| 2  | 01 -Acta Provisional del asfaltado barrio 24 de Mayo              | Acta_de_recepcion_Prov._24_de_Mayo.pdf                    | 05/07/2013    |
| 3  | A1. INFORME DE SITOP MARZO 2014 AV. COLON                         | A1-INFORME_AV._COLON_SITOP_MARZO_2014.PDF                 | 17/04/2014    |
| 4  | A2. INFORME DE SITOP MARZO 2014 AV. ELOY ALFARO                   | A2-INFORME_AV._ELOY_ALFARO_SITOP_MARZO_2014.PDF           | 17/04/2014    |
| 5  | A3. INFORME DE SITOP ABRIL 2014 AV. ELOY ALFARO                   | A3.INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AV._ELOY_ALFARO_ABRIL_2014.PDF | 05/05/2014    |
| 6  | A4. INFORME DE SITOP ABRIL 2014 AV. COLON                         | A4.INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AV._COLON_ABRIL_2014.PDF       | 06/05/2014    |
| 7  | A5. INFORME DE SITOP MAYO 2014 AV. COLON                          | A5._INFORME_SITOP_MAYO_2014_AV._COLON_-_K037.PDF          | 06/06/2014    |
| 8  | A6. INFORME DE SITOP MAYO 2014 AV. ELOY ALFARO                    | A6._INFORME_SITOP_MAYO_2014_AV._ELOY_ALFARO_-_K037.PDF    | 06/06/2014    |
| 9  | A7. INFORME SITOP AV. COLON 2014                                  | A7._5791_INFORME_SITOP_AV._COLON_JUNIO_2014.pdf           | 16/07/2014    |
| 10 | A8. INFORME SITOP AV. ELOY ALFARO JUNIO 2014                      | A8._5687_INFORME_SITOP_AV._ELOY_ALFARO__JUNIO_2014.pdf    | 16/07/2014    |
| 11 | A9. INFORME EJECUTIVO SITOP AV. COLON JULIO 2014                  | A9._5791_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AV._COLON_JULIO_2014.pdf | 30/07/2014    |
| 12 | aceras Av. Eloy Alfaro  | SAM_1230.JPG  | 12/04/2013    |
| 13 | aceras en av. Colón   | SAM_0199.JPG  | 12/04/2013    |
| 14 | aceras y bordillos barrio 24 de mayo                              | DSC01657.JPG  | 10/01/2013    |
| 15 | archivo Informe ejecutivo desde nov 2011 hasta nov del 2012       | INFORME_EJECUTIVO__NOV_2011_-_NOV_2012.docx               | 10/01/2013    |
| 16 | ascosorios para tuberías de agua potable barrio 24 de mayo        | DSC01741.JPG  | 10/01/2013    |
| 17 | ASOCIACION HITO 30 - ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA AV. ELOY ALFARO | 5687-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2016.pdf                   | 06/05/2016    |
| 18 | B1.INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2014                            | A11._5687_INFORME_EJECUTIVO_ELOY_ALFARO_AGOSTO_2014.pdf   | 09/09/2014    |



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo  | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 19 | B2. INFORME EJECUTIVO SITOP AV. ELOY ALFARO JULIO 2014        | A10._5687_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AV._ELOY_ALFARO_2014.pdf           | 07/07/2014    |
| 20 | B3. INFORME EJECUTIVO AV. COLON AGOSTO 2014                   | A12._INFORME_SITOP_COLON_AGOSTO_2014.pdf                             | 08/09/2014    |
| 21 | B4. INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2014 AV. ELOY ALFARO   | A13.5687_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPTIEMBRE_2014_AV._ELOY_ALFARO.pdf | 06/10/2014    |
| 22 | B5. INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2014 AV. COLON         | A14._5791_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPTIEMBRE_2014_AV._COLON.pdf      | 06/10/2014    |
| 23 | B6. 5687-INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2014 AV. ELOY ALFARO | B6._5687-INFORME_EJECUTIVO_SITOP_OCTUBRE_2014_AV._ELOY_ALFARO.pdf    | 10/11/2014    |
| 24 | B7. 5791-INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2014 AV. COLON       | B7._5791-INFORME_EJECUTIVO_SITOP_OCTUBRE_2014_AV._COLON.pdf          | 10/11/2014    |
| 25 | B8.5687-INFORME EJECUTIVO NOV 2014 AV. ELOY ALFARO            | B8.5687-INFORME_EJECUTIVO_NOV_2014_AV._ELOY_ALFARO.pdf               | 05/12/2014    |
| 26 | B9.5791 INFORME EJECUTIVO NOV 2014 AV. COLON                  | B9.5791_INFORME_EJECUTIVO_NOV_2014_AV._COLON.pdf                     | 05/12/2014    |
| 27 | C1. 5687 INFORME EJECUTIVO SITOP DIC 2014 AV. ELOY ALFARO     | C1._5687_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_DIC_2014.pdf                        | 06/01/2015    |
| 28 | C2. 5791 INFORME EJECUTIVO SITOP DIC 2014 AV. COLON           | C2._5791_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_DIC_2014.pdf                        | 06/01/2015    |
| 29 | C3. 8695 INFORME EJECUTIVO SITOP DIC 2014 - EDME              | C3._8695_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_DIC_2014.pdf                        | 06/01/2015    |
| 30 | C4. 5791 INFORME EJECUTIVO DE SITOP ENE 2015 AV. COLON        | C4._5791_INFORME_EJECUTIVO_DE_SITOP_ENE_2015_AV._COLON.pdf           | 09/02/2015    |
| 31 | C5. 5687 INFORME EJECUTIVO SITOP ENE 2015 AV. ELOY ALFARO     | C5._5687_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ENE_2015_AV._ELOY_ALFARO.pdf        | 09/02/2015    |
| 32 | C6. 8695-ORDEN DE CAMBIO N° 1-2015                            | C6._8695-ORDEN_DE_CAMBIO_N°_1-2015.pdf                               | 09/02/2015    |
| 33 | C7. 8695 INFORME EJECUTIVO ENE 2015                           | C7._8695_INFORME_EJECUTIVO_ENE_2015.pdf                              | 09/02/2015    |
| 34 | C8. 5687 INFORME EJECUTIVO FEB 2015 AV. ELOY ALFARO           | C8._5687_INFORME_EJECUTIVO_FEB_2015.pdf                              | 09/03/2015    |
| 35 | C9. 5791 INFORME EJECUTIVO FEB 2015 AV. COLON                 | C9._5791_INFORME_EJECUTIVO_FEB_2015_AV._COLON.pdf                    | 09/03/2015    |
| 36 | CONTRATO COMPLEMENTARIO AV. COLON                             | COMPLEMENTARIO_COLON.pdf   | 02/12/2013    |
| 37 | CONTRATO COMPLEMENTARIO AV. ELOY ALFARO                       | COMPLEMENTARIO_ELOY_ALFARO.pdf                                       | 02/12/2013    |
| 38 | CONTRATO ORIGINAL AV COLON                                    | CONTRATO_ORIGINAL_AV_COLON.pdf                                       | 03/07/2019    |
| 39 | CONTRATO ORIGINAL AV ELOY ALFARO                              | CONTRATO_ORIGINAL_AV_ELOY_ALFARO.pdf                                 | 03/07/2019    |
| 40 | D1. INFORME SITOP MARZO 2015 - AV. COLON                      | D1._INFORME_SITOP_MARZO_2015_-_AV._COLON.pdf                         | 07/04/2015    |
| 41 | D2. INFORME EJECUTIVO SITOP MAR 2015 - AV. ELOY ALFARO        | D2._INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAR_2015_-_AV._ELOY_ALFARO.pdf           | 07/04/2015    |
| 42 | D3. INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2015 - EDME                 | D3._INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MARZO_2015_-_EDME.pdf                    | 07/04/2015    |
| 43 | D4. 5791-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2015- AV. COLON            | D4._5791-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf                          | 27/04/2015    |
| 44 | D5._8849-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf                   | D5._8849-ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_2015.pdf                       | 08/07/2015    |
| 45 | D6. 8867-ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 2015                    | D6._8867-ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_2015.pdf                       | 08/07/2015    |
| 46 | D7. 8848-ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 2015                    | D7._8848-ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_2015.pdf                       | 08/07/2015    |
| 47 | D7. ORDEN DE COMPRA POR CATA LOGO ID 14232 AÑO - 2016         | ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATA_LOGO_ID_14232_AÑO_2016.pdf                  | 03/02/2017    |
| 48 | D8. 8868-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2015                       | D8._8868-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf                          | 08/07/2015    |
| 49 | D9. 9314-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2015                       | D9._9314-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf                          | 08/07/2015    |
| 50 | E1-5687-ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL-2015 AV. ELOY ALFARO    | E1-5687-ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL-2015.pdf                       | 31/07/2015    |
| 51 | E2. 5687 INFORME EJECUTIVO JUL 2015 AV. ELOY ALFARO           | E2._5687_INFORME_EJECUTIVO_JUL_2015_AV._ELOY_ALFARO.pdf              | 07/07/2015    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo                                  | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 52 | E3. 5687 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2015 AV. ELOY ALFARO  | E3._5687_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2015_AV._ELOY_ALFARO.pdf | 04/09/2015    |
| 53 | E4. 5687 INFORME EJECUTIVO OCT 2015 AV. ELOY ALFARO.pdf | E4._5687_INFORME_EJECUTIVO_OCT_2015_AV._ELOY_ALFARO.pdf    | 10/11/2015    |
| 54 | E5. 8695-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2015                 | E5._8695-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2015.pdf                | 26/11/2015    |
| 55 | E6. ORDEN DE COMPRA POR CATA LOGO ID 14423 - AÑO 2016   | ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATA_LOGO_ID_14423_-_AÑO_2016.pdf      | 03/02/2017    |
| 56 | E7. ORDEN DE COMPRA POR CATA LOGO ID 14231 - AÑO 2016   | ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATA_LOGO_ID_14231_-_AÑO_2016.pdf      | 03/02/2017    |
| 57 | E8. ORDEN DE COMPRA POR CATA LOGO ID 14232 AÑO - 2016   | ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATA_LOGO_ID_14232_-_AÑO_2016.pdf      | 03/02/2017    |
| 58 | E9. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17639                     | E9._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17639.pdf                    | 03/08/2017    |
| 59 | EJECUCION DE GASTOS ENERO - JUNIO 2013                  | EJECUCION_DE_GASTOS_ENERO_-_JUNIO_2013.pdf                 | 05/07/2013    |
| 60 | excavación barrio Unidos Somos Más                      | 2012-10-29_10.18.31.jpg                                    | 05/12/2012    |
| 61 | F1. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17640                     | F1._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17640.pdf                    | 03/08/2017    |
| 62 | F2. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17641                     | F2._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17641.pdf                    | 03/08/2017    |
| 63 | F3. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17642                     | F3._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17642.pdf                    | 03/08/2017    |
| 64 | F4. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17644                     | F4._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17644.pdf                    | 03/08/2017    |
| 65 | F5. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17645                     | F5._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17645.pdf                    | 03/08/2017    |
| 66 | F6. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17646                     | F6._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17646.pdf                    | 03/08/2017    |
| 67 | F7. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17647                     | F7._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17647.pdf                    | 03/08/2017    |
| 68 | F8. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17648                     | F8._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17648.pdf                    | 03/08/2017    |
| 69 | F9. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17649                     | F9._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17649.pdf                    | 03/08/2017    |
| 70 | FOTO ASFALTADO DE CALLE COLON                           | IMG00016-20130605-1803.jpg                                 | 05/06/2013    |
| 71 | foto señalización paso lateral de atacames              | DSCN1014.JPG   | 09/10/2012    |
| 72 | fotos puente tululbi ejecución trabajos                 | DSC00149.JPG   | 10/01/2013    |
| 73 | fotos asfaltado av. Olmedo                              | IMG01999-20120707-1319.jpg                                 | 09/07/2012    |
| 74 | G1. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17650                     | G1._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17650.pdf                    | 03/08/2017    |
| 75 | G2. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17651                     | G2._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17651.pdf                    | 03/08/2017    |
| 76 | G3. ACTA RECEPCION DEFINITIVA_17652                     | G3._ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_17652.pdf                    | 03/08/2017    |
| 77 | G4. 19447_ACTA RECEPCION DEFINITIVA                     | G4._19447_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                    | 05/01/2018    |
| 78 | G5.19717_ACTA RECEPCION DEFINITIVA                      | G5.19717_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                     | 05/01/2018    |
| 79 | G6.19718_ACTA RECEPCION DEFINITIVA                      | G6.19718_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                     | 05/01/2018    |
| 80 | G7.19720_ACTA RECEPCION DEFINITIVA                      | G7.19720_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                     | 05/01/2018    |
| 81 | G8.19721_ACTA RECEPCION DEFINITIVA                      | G8.19721_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                     | 05/01/2018    |
| 82 | G9.19723_ACTA RECEPCION DEFINITIVA                      | G9.19723_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                     | 05/01/2018    |
| 83 | H1.19724_ACTA RECEPCION DEFINITIVA                      | H1.19724_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                     | 05/01/2018    |
| 84 | H2.19727_ACTA RECEPCION DEFINITIVA                      | H2.19727_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                     | 05/01/2018    |
| 85 | H3.19729_ACTA RECEPCION DEFINITIVA                      | H3.19729_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                     | 05/01/2018    |
| 86 | H4.19732_ACTA RECEPCION DEFINITIVA                      | H4.19732_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                     | 05/01/2018    |
| 87 | H5.19734_ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA                   | H5.19734_ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                  | 05/01/2018    |
| 88 | H6.19736_ACTA ENTREGA RECEPCION                         | H6.19736_ACTA_ENTREGA_RECEPCION.pdf                        | 05/01/2018    |
| 89 | H7.19737_ACTA RECEPCION DEFINITIVA                      | H7.19737_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                     | 05/01/2018    |
| 90 | H8.19738_ACTA RECEPCION DEFINITIVA                      | H8.19738_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                     | 05/01/2018    |
| 91 | H9.19740_ACTA RECEPCION DEFINITIVA                      | H9.19740_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                     | 05/01/2018    |
| 92 | I1.19739_ACTA RECEPCION UNICA                           | I1.19739_ACTA_RECEPCION_UNICA.pdf                          | 05/01/2018    |
| 93 | I2.19745_ACTA RECEPCION DEFINITIVA                      | I2.19745_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf                     | 05/01/2018    |
| 94 | I3. DEVENGADO ESIGEF ENERO 2018                         | I3._DEVENGADO_ESIGEF_ENERO_2018.pdf                        | 28/09/2018    |
| 95 | I4. DEVENGADO ESIGEF FEBRERO 2018                       | I4._DEVENGADO_ESIGEF_FEBRERO_2018.pdf                      | 28/09/2018    |
| 96 | I5. DEVENGADO ESIGEF MARZO 2018                         | I5._DEVENGADO_ESIGEF_MARZO_2018.pdf                        | 28/09/2018    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo  | Archivo  | Fecha de Alta |
|-----|---|--|---------------|
| 97  | I6. DEVENGADO ESIGEF ABRIL 2018   | I6._DEVENGADO_ESIGEF_ABRIL_2018.pdf  | 28/09/2018    |
| 98  | I7. DEVENGADO ESIGEF MAYO 2018  | I7._DEVENGADO_ESIGEF_MAYO_2018.pdf   | 28/09/2018    |
| 99  | I8. DEVENGADO ESIGEF JUNIO 2018   | I8._DEVENGADO_ESIGEF_JUNIO_2018.pdf  | 28/09/2018    |
| 100 | I9. DEVENGADO ESIGEF JULIO 2018   | I9._DEVENGADO_ESIGEF_JULIO_2018.pdf  | 28/09/2018    |
| 101 | INFORME ARCHIVO EJECUTIVO DEL NOV 2011 AL NOV 2012                                      | RESUMEN_EJECUTIVO_____nov_2011_a_nov_2012.docx   | 08/01/2013    |
| 102 | informe de gasto enero - diciembre 2013   | informe_de_gasto_enero-_diciembre.pdf  | 08/01/2014    |
| 103 | informe de gasto enero - noviembre 2013   | informe_de_gasto_enero_-_noviembre_2013.pdf  | 09/12/2013    |
| 104 | informe de gasto enero - septiembre 2013  | informe_de_gasto_enero_-_septiembre_2013.pdf   | 07/10/2013    |
| 105 | informe sitop octubre 2013 av. Eloy Alfaro  | GestionReporteFN_elyo_alfaro.pdf   | 05/11/2013    |
| 106 | INFORME TECNICO DEL ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO 15 DE MARZO                      | INFORME_TECNICO_15_DE_MARZO_MTOP-CON_ESM-2013-177-ME.pdf                                     | 30/08/2013    |
| 107 | informe tecnico sitop octubre 2013 av. Colón  | GestionReporteF_Colon.pdf  | 05/11/2013    |
| 108 | informe tecnico sitop septiembre 2013 av. Eloy Alfaro                                   | informe_sitop_septiembre_2013_av._Eloy_Alfaro.pdf  | 07/10/2013    |
| 109 | informe tecnico sitop septiembre 2013 av. Colón   | informe_sitop_septiembre_2013_av._colón.pdf  | 07/10/2013    |
| 110 | J1. DEVENGADO ESIGEF AGOSTO 2018  | J1._DEVENGADO_ESIGEF_AGOSTO_2018.pdf   | 28/09/2018    |
| 111 | J2. DEVENGADO ESIGEF SEPTIEMBRE 2018  | J2._DEVENGADO_ESIGEF_SEPTIEMBRE_2018.pdf   | 02/10/2018    |
| 112 | J3. DEVENGADO ESIGEF OCTUBRE 2018   | J3._DEVENGADO_ESIGEF_OCTUBRE_2018.pdf  | 05/11/2018    |
| 113 | J4-ALINEADA HITO 44-20810-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2019.pdf                            | J4-ALINEADA_HITO_44-20810-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2019.pdf                                 | 01/03/2019    |
| 114 | J5-ALINEADA HITO 44-20820-ACTA RECEPCION DEFINITIVA-2019                                | J5-ALINEADA_HITO_44-20820-ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA-2019.pdf                                 | 01/03/2019    |
| 115 | J6-Reporte pago esigef febrero 2019   | J6-Reporte_pago_esigef_febrero_2019.pdf  | 01/03/2019    |
| 116 | J7-Alineado al Hito 47 - Reporte pago esigef marzo 2019                                 | J7-Alineado_al_Hito_47_-_Reporte_pago_esigef_marzo_2019.pdf                                  | 03/04/2019    |
| 117 | J8-Alineado al Hito 48 - Reporte pago esigef abril 2019                                 | J8-Alineado_al_Hito_48_-_Reporte_pago_esigef_abril_2019.pdf                                  | 02/05/2019    |
| 118 | J8. Asociado a Hito 47 -Informe de Acciones Riesgos proyectos en ejecucion - Abril 2019 | J8._Asociado_a_Hito_47_-_Informe_de_Acciones_Riesgos_proyectos_en_ejecucion_-_Abril_2019.pdf | 03/04/2019    |
| 119 | J9. ANEXOS FORMATO SENPLADES 1  | J9._2015-06-22_02-30-47_MANTENIMIENTODEINFRAESTRUC   | 26/07/2019    |
| 120 | K1. ANEXO FORMATO SENPLADES 2   | K1._2015-06-23_03-59-05_INFORMEDE SITUACION.PDF  | 26/06/2019    |
| 121 | K2. ANEXOS FORMATO SENPLADES 3  | K2._2015-11-23_12-43-31_MANTENIMIENTODEESMERALDAS  | 26/06/2019    |
| 122 | K3. ANEXOS FORMATO SENPLADES 4  | K3._2017-09-02_01-43-43_MARCOLGICOMANTENIMIENTOC   | 26/07/2019    |
| 123 | K4. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20825                           | K4._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20825.pdf                            | 03/07/2019    |
| 124 | K5. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20813                           | K5._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20813.pdf                            | 03/07/2019    |
| 125 | K6. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20819                           | K6._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20819.pdf                            | 03/07/2019    |
| 126 | K7. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20816                           | K7._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20816.pdf                            | 03/07/2019    |
| 127 | K8. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20817                           | K8._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20817.pdf                            | 03/07/2019    |
| 128 | K9. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20829                           | K9._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20829.pdf                            | 03/07/2019    |
| 129 | L1. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20824                           | L1._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20824.pdf                            | 03/07/2019    |
| 130 | L2. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20812                           | L2._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20812.pdf                            | 03/07/2019    |
| 131 | L3. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20814                           | L3._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20814.pdf                            | 03/07/2019    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo  | Archivo   | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 132 | L4. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20815   | L4._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20815.pdf   | 03/07/2019    |
| 133 | L5. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20827   | L5._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20827.pdf   | 03/07/2019    |
| 134 | L6. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20820   | L6._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20820.pdf   | 03/07/2019    |
| 135 | L7. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20826   | L7._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20826.pdf   | 03/07/2019    |
| 136 | L8. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20828   | L8._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20828.pdf   | 03/07/2019    |
| 137 | L9. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20810   | L9._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20810.pdf   | 03/07/2019    |
| 138 | M1-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23634  | M1-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23634.pdf  | 04/07/2019    |
| 139 | M2-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23635  | M2-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23635.pdf  | 04/07/2019    |
| 140 | M3-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23644  | M3-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23644.pdf  | 04/07/2019    |
| 141 | M4-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23645  | M4-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23645.pdf  | 04/07/2019    |
| 142 | M5-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23646  | M5-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23646.pdf  | 04/07/2019    |
| 143 | M6-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23647  | M6-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23647.pdf  | 04/07/2019    |
| 144 | M7-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23651  | M7-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23651.pdf  | 04/07/2019    |
| 145 | M8-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23652  | M8-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23652.pdf  | 04/07/2019    |
| 146 | M9-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23653  | M9-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23653.pdf  | 04/07/2019    |
| 147 | MANTENIMIENTO MES DE JUNIO 2013   | MANTENIMIENTO_VIAL_MES_DE_JUNIO.pdf   | 05/07/2013    |
| 148 | Material de mejoramiento barrio 24 de mayo  | DSC01859.JPG  | 05/12/2012    |
| 149 | Material de mejoramiento barrio 24 de mayo  | DSC01865.JPG  | 05/12/2012    |
| 150 | muro gaviones protección puente sobre el rio blanco   | DSC02615.JPG  | 10/01/2013    |
| 151 | N1. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20818   | N1._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20818.pdf   | 03/07/2019    |
| 152 | N2. Alineado al Hito 45-Acta de Recepción Definitiva ID 20811   | N2._Alineado_al_Hito_45-Acta_de_Recepción_Definitiva_ID_20811.pdf   | 03/07/2019    |
| 153 | N3-Alineado al Hito 50 - Reporte pago esigef junio 2019   | N3-Alineado_al_Hito_50_-_Reporte_pago_esigef_junio_2019.pdf   | 03/07/2019    |
| 154 | N4-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23628  | N4-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23628.pdf  | 04/07/2019    |
| 155 | N5-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23629  | N5-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23629.pdf  | 04/07/2019    |
| 156 | N6-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23630  | N6-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23630.pdf  | 04/07/2019    |
| 157 | N7-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23631  | N7-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23631.pdf  | 04/07/2019    |
| 158 | N8-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23632  | N8-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23632.pdf  | 04/07/2019    |
| 159 | N9-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23633  | N9-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23633.pdf  | 04/07/2019    |
| 160 | O1-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23654  | O1-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23654.pdf  | 04/07/2019    |
| 161 | O2-Alineado al Hito 35 - Contrato ID 23655  | O2-Alineado_al_Hito_35_-_Contrato_ID_23655.pdf  | 04/07/2019    |
| 162 | O3-Alineado al Hito 51 - Reporte pago esigef julio 2019   | O3-Alineado_al_Hito_51_-_Reporte_pago_esigef_julio_2019.pdf   | 02/08/2019    |
| 163 | O4. PLAN DE ACCION ESMERALDAS - JULIO 2019  | O4._PLAN_DE_ACCION_ESMERALDAS_-_JULIO_2019.pdf  | 07/08/2019    |
| 164 | O5-Alineado al Hito 52 - Reporte pago esigef agosto 2019  | O5-Alineado_al_Hito_52_-_Reporte_pago_esigef_agosto_2019.pdf  | 05/09/2019    |
| 165 | O6. Memorando MTOP-DDE-2019-875-ME  | O6._Memorando_MTOP-DDE-2019-875-ME.pdf  | 04/10/2019    |
| 166 | O7. Alineado a Hito 53 - Devengado eSIGEF - Septiembre 2019   | O7._Alineado_a_Hito_53_-_Devengado_eSIGEF_-_Septiembre_2019.pdf   | 04/10/2019    |
| 167 | O8. Devengado eSIGEF - Octubre 2019   | O8._Devengado_eSIGEF_-_Octubre_2019.pdf   | 05/11/2019    |
| 168 | O9. COSTO TOTAL PROYECTO 2019 - SENPLADES - SiPeIP - Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública | O9._COSTO_TOTAL_PROYECTO_2019_-_SENPLADES_-_SiPeIP_-_Sistema_Integrado_de_Planificación_e_Inversión_Pública.pdf | 26/11/2019    |
| 169 | P1. Ficha_Proyecto- Mantenimiento vial  | P1._Ficha_Proyecto-_Mantenimiento_vial.pdf  | 26/11/2019    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo  | Archivo   | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 170 | P2. Alineado al Hito 55 -ACTAS RECEPCION DEFINITIVA MANTENIMIENTO VIAL 2019                                   | P2._Alineado_al_Hirto_55_-ACTAS_RECEPCION_DEFINITIVA_MANTENIMIENTO_VIAL_2019.pdf                              | 27/11/2019    |
| 171 | P3. Alineado al Hito 54 - Liquidación y constancia de Pago  | P3._Alineado_al_Hito_54_-Liquidación_y_constancia_de_Pago.pdf   | 27/11/2019    |
| 172 | P4. Alineado al Riesgo -2- NACIONAL. Económico. La falta de recursos CAUSARÍA la terminación de los proyectos | P4._Alineado_al_Riesgo_-2-_NACIONAL._Económico._La_falta_de_recursos_CAUSARÍA_la_terminación_de_los_proyectos | 27/11/2019    |
| 173 | P5. DEVENGADO MANTENIMIENTO - NOVIEMBRE 2019  | P5._DEVENGADO_MANTENIMIENTO_-NOVIEMBRE_2019.pdf   | 05/12/2019    |
| 174 | P6. cedula_presupuestaria_diciembre_2019  | P6._cedula_presupuestaria_diciembre_2019.pdf  | 05/02/2020    |
| 175 | P7. Cédula presupuestaria enero 2020  | P7._Cédula_presupuestaria_enero_2020.pdf  | 05/02/2020    |
| 176 | P8. Asignación Presupuestaria Memorando MTOP-FINAN_ESM-2020-19-ME   | P8._Asignación_Presupuestaria_Memorando_MTOP-FINAN_ESM-2020-19-ME.pdf   | 05/02/2020    |
| 177 | P9. Cedula_marzo_2020   | P9._Cedula_marzo_2020.pdf   | 05/04/2020    |
| 178 | pintura estructura metálica del puente sobre el rio balnco  | DSC02839.JPG  | 10/01/2013    |
| 179 | Q1. Alineado a Hito 52 - Memo de Contratación MTOP-ADM_ESM-2020-126-ME  | Q1._Alineado_a_Hito_52_-Memo_de_Contratación_MTOP-ADM_ESM-2020-126-ME.pdf                                     | 05/05/2020    |
| 180 | Q2. CEDULA_ABRIL 2020   | Q2._CEDULA_ABRIL_2020.pdf   | 05/05/2020    |
| 181 | Q3. CEDULA_PRESUPUESTARIA MAYO 2020   | Q3._CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2020.pdf   | 05/06/2020    |
| 182 | Q4. Alineado a Riesgo - Gestionar Mantenimiento de equipo caminero conforme el cronograma establecido         | Q4._Alineado_a_Riesgo_-_Gestionar_Mantenimiento_de_equipo_caminero_conforme_el_cronograma_establecido.pdf     | 16/06/2020    |
| 183 | Q5. Cedula presupuestaria junio 2020  | Q5._Cedula_presupuestaria_junio_2020.pdf  | 03/07/2020    |
| 184 | Q6. Cedula presupuestaria julio 2020  | Q6._Cedula_presupuestaria_julio_2020.pdf  | 05/08/2020    |
| 185 | Q7. CEDULA AGOSTO 2020  | Q7._CEDULA_AGOSTO.pdf   | 05/09/2020    |
| 186 | Q8. Reporte-Cedula Presupuestaria de Octubre 2020   | Q8._Reporte-Cedula_Presupuestaria_de_Octubre_2020.pdf   | 05/11/2020    |
| 187 | Q9.Cedula Presupuestaria_noviembre2020  | Q9.Cedula_Presupuestaria_noviembre2020.pdf  | 04/12/2020    |
| 188 | R1. CEDULA PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2020  | R1._CEDULA_PRESUPUESTARIA_DICIEMBRE_2020.pdf  | 29/12/2020    |
| 189 | R2. Alineado a Hito 67 - ACTA DE RECEPCION LEGALIZADAS  | R2._Alineado_a_Hito_67_-ACTA_DE_RECEPCION_LEGALIZADAS.pdf   | 06/01/2021    |
| 190 | REINICIO DE LOS TRABAJOS DE LA AV. COLON  | REINICIO_COLON.pdf  | 02/12/2013    |
| 191 | REINICIO DE LOS TRABAJOS EN LA AV. ELOY ALFARO  | REINICIO_DE_ELOY_ALFARO.pdf   | 02/12/2013    |
| 192 | Samblasting estructura metálica   | DSC03998.JPG  | 10/01/2013    |
| 193 | Samblasting estructura metálica puente  | DSC03658.JPG  | 10/01/2013    |
| 194 | Samblasting estructura metálica puente  | DSC03998.JPG  | 10/01/2013    |
| 195 | Samblasting estructura metálica puente viche  | DSC00178.JPG  | 10/01/2013    |
| 196 | señalización 24 mayo  | IMG-20130605-00125.jpg  | 05/06/2013    |
| 197 | tendido y compactación barrio 24 de mayo  | DSC01798.JPG  | 10/01/2013    |
| 198 | tirantes para sumidero  | IMG-20130216-00459.jpg  | 12/04/2013    |
| 199 | trabajos av. colon  | SAM_0148.JPG  | 12/04/2013    |
| 200 | trabajos Av. Colon  | SAM_0008.JPG  | 12/04/2013    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                              | Rol                        | Puesto   | Correo Electrónico    | Teléfono(s)        |
|-------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Quiroz Franco, Mariela Mercedes     | Administrador del Proyecto | Directora Distrital de Transporte y Obras Públicas de Esmeraldas | mquiroz@mtop.gob.ec   | 0980548739         |
| Rezabala Zamora, Maritza Del Carmen | Supervisora Financiera (E) | Supervisora Financiera de Esmeraldas                             | mrezabala@mtop.gob.ec | 0988270005 / 11606 |

| Nombre                         | Rol               | Puesto                                   | Correo Electrónico  | Teléfono(s)        |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------|
| Vivero Cedeño, Cesar Heraclito | Líder de Proyecto | Analista de Infraestructura Provincial 1 | cvivero@mtop.gob.ec | 0987825137 / 11614 |

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

| Archivo     | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 18111_1.jpg | 05/02/2020    |
