

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte
Dirección de Conservación de la Infraestructura del Transporte

PROYECTO: K010 MTOP - Programa de Apoyo al Desarrollo Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Líder del Proyecto:	Enriquez Díaz, Shucela Catherine (scenriquez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Medina Galarza, César Augusto	Programas Relacionados:	
Titular:	Armijo Logroño, Ángel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	55,343,091.94
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	25/05/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2020
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	01/04/2020

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Inicialmente el Gobierno Nacional ha iniciado el mejoramiento de la red vial estatal; así, un alto porcentaje de esta red ha sido intervenida y se encuentra en buenas condiciones.

Esto no sucede con las vías que son competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD's, pues por diversas circunstancias no se encuentran en adecuadas condiciones de transitabilidad, lo que está afectando a un significativo segmento de la población ecuatoriana que se localiza en comunidades rurales que están atravesadas por vías terciarias, caminos vecinales e inter-parroquiales.

En este marco, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, consciente de que es necesario mejorar las condiciones de las redes viales Provinciales y cantonales, se ha propuesto apoyar a los GAD's, para lo cual se presenta el estudio que se desarrolla en este documento.

PRODUCTO O SERVICIO:

Mejoramiento de la infraestructura vial que está a cargo de los GAD's

LINEA BASE:

Al no haber realizado inversiones oportunas en el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías que son competencia de los GAD's, ha llevado a que las mismas se encuentren en peores condiciones y, mientras se continúe con esta misma política, las obras que tengan que realizarse serán más costosas y con mayores tiempos de ejecución, lo que se puede evitar mediante una oportuna intervención en acciones de conservación a un costo mucho menor.

Por tanto, es fundamental que se realicen las inversiones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura vial que está a cargo de los GAD's, considerando en sus planificaciones las fases de pre-inversión (estudios de factibilidad), ejecución, mantenimiento, seguimiento y evaluación, para que sea eficiente y eficaz en el aprovechamiento de las inversiones que se van a realizar; es decir, es importante tener en cuenta en la planificación vial el concepto del ciclo de vida de un proyecto de infraestructura vial.

Al mismo tiempo es indispensable considerar que si los GAD's no cuentan con los recursos económicos suficientes para las acciones previstas anteriormente, es necesaria la intervención del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

OBJETIVO GENEREAL O PROPÓSITO:

En base al problema que esta propuesta se propone apoyar a su solución, el siguiente es el Objetivo General.

DATOS GENERALES

Descripción

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- .Contar con estudios completos de los proyectos viales de las redes cantonal y estatal a ser intervenidas en el marco de este Programa, de acuerdo a la demanda que presenten los GAD's.
- .Firmar los convenios correspondientes con los GAD's a los cuales pertenecen las vías a ser intervenidas.
- .Asignación y transferencia de los recursos económicos para la ejecución de los proyectos viales.
- .Ejecución de los proyectos viales incluidos en el Programa.
- .Seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos viales incorporados al programa.

Beneficios Cualitativos

- .Reducción en el tiempo de traslado de personas y mercancías por las redes viales cantonales y provinciales.
- .Disminución de los costos de operación de los vehículos que transitan por las redes viales cantonales y provinciales.
- .Generación de mayores fuentes de trabajo e incremento del turismo

Tipo de Beneficiario

DIRECTOS: La población en general como conductores, pasajeros, agricultores y otras personas que empleen camiones para transportar bienes por la carretera.
INDIRECTOS: La población aledaña de las comunidades ubicadas en un área cercana a la misma, así como aquéllos que viven a pocos kilómetros a cada lado de la vía.


Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de cinco años
COSTO: El costo total del proyecto es de \$ 340.000.000,00
ALCANCE: Se tiene previsto iniciar con algunos provincias del país, las mismas que pueden variar a las necesidades y tipo de prioridad que den las autoridades
RECURSOS: En cuanto a los recursos humanos, tecnológicos estarán administrados por los GADS
CALIDAD: Estará limitada por los recursos existentes y de acuerdo a la complejidad de los estudios a efectuarse en cada región.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.14 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2021

% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO



Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2021:</p> <p>1.- Según la cédula presupuestaria del mes de abril, se refleja saldos codificados a Cotopaxi \$1 000 000, Azuay \$2 000 000 y, Manabí \$1 377 956,00 correspondientes a convenios suscritos.</p> <p>2.- Se refleja valores pagados para dos provincias:</p> <p>- En la DD Los Ríos un valor de \$16 245 760.90 para la "CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE DE 4 CARRILES SOBRE EL RIO QUEVEDO" y "CONSTRUCCION DE LA</p>	<p>Enriquez Díaz, Shucela Catherine</p>	<p>05/05/2021 - 11:19 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SOLUCION A DESNIVEL Y PASO DEPRIMIDO EN LA AVENIDA WALTER ANDRADE FAJARDO"</p> <p>- En la DD Carchi un valor de \$10 000 000 para la "RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL"</p> <p>3.- En la DD Chimborazo consta un valor por pagar ya devengado por \$850 000 para la "CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO DE 1.1 KM DE LONGITUD"</p> <p>4.- En las Direcciones Distritales de Zamora, Napo, Loja , Esmeraldas y Cañar se han quitado por completo recursos asignados inicialmente quedándose en \$0.</p> <p>5.- En planta central se refleja un valor de 571.535,29 como codificado</p> <p>6.- Respecto al proceso de recopilación y actualización de información correspondiente al programa de los Gads, según lineamientos del Eco. Denis Patiño, Coordinador General de Planificación, se coordinará con Cristina Navas para el acompañamiento respectivo en el proceso de actualización de prioridad senplades.</p> <p>7.- Ya se cuenta con el detalle de los convenios a nivel nacional que se han ejecutado dentro del programa desde el 2012 y los planificados.</p>		
<p>MARZO 2021:</p> <p>1.- Según la cédula presupuestaria con corte al 05/04/2021, se refleja un valor devengado de 10.000.000,00 correspondientes al convenio "RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL, TRAMOS EL ÁNGEL REPRESA GIOVANNI CALLES, CON UNA LONGITUD 28KM, UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI". No consta en el POA 2021 propuesto inicialmente.</p> <p>2.- De los demás valores modificados que se presentan en la cédula presupuestaria, 3 constan en el POA 2021 planificado inicialmente, 2.000.000 para la DD de Azuay, 1.000.000 para la DD Cotopaxi y, 850.000 para la DD de Chimborazo para el cumplimiento de compromisos adquiridos en sus convenios respectivos.</p> <p>3.- Otros 2 valores modificados no constan dentro del POA 2021 inicial. Para la DD Los Ríos un valor de 14.082.911,90 y para la DD de Manabí un valor de 13.77.956.</p> <p>- Los Ríos ejecutará la "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DE 4 CARRILES SOBRE EL RIO QUEVEDO, DESDE LA PARROQUIA NICOLÁS INFANTE DÍAZ HASTA LA PARROQUIA SAN CRISTÓBAL, VÍA VALENCIA, QUE INCLUYE ACCESOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ALTERNA DESDE CALLE GUSTAVO CHONQUI HASTA EL SECTOR PLAYA GRANDE DE LA PARROQUIA NICOLÁS INFANTE DÍAZ". Y LA "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE A DESNIVEL Y PASO DEPRIMIDO EN LA AVENIDA WALTER ANDRADE FAJARDO (TRAMO DE LA VÍA E25)".</p> <p>-Manabí ejecutará la "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES Y SU SISTEMA HIDROSANITARIO, DE LA CIUDADELA SAN ALEJO DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ "</p> <p>4.- En planta central se refleja un valor de 571.535,29</p> <p>5.- Respecto al proceso de recopilación y actualización de información correspondiente al programa de los Gads, se han solicitado directrices específicas a la Dirección de Planificación respecto a la actualización SENPLADES y, se envió memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2021-505-ME solicitando los encargados GPR para la coordinación de la información.</p>	<p>Enriquez Díaz, Shucela Catherine</p>	<p>05/04/2021 - 09:43 PM</p>
<p>FEBRERO 2021:</p> <p>1.- LA CÉDULA PRESUPUESTARIA REFLEJA UN SALDO POR DEVENGAR DE 21.163.814.05 DESTINADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CAÑAR.</p> <p>2.- RESPECTO AL POA, EL FINAL APROBADO POR SR. MINISTRO TUVO VARIACIONES. PARA ESTE AÑO QUEDÓ DESTINADO 39.179.655.13 A PLANTA CENTRAL, CHIMBORAZO, COTOPAXI, LOS RÍOS Y AZUAY.</p>	<p>Enriquez Díaz, Shucela Catherine</p>	<p>05/03/2021 - 06:17 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2021:</p> <p>1.- Actualmente el presupuesto asignado para el MTOP se encuentra en proceso; una vez que el mencionado presupuesto sea definido oficialmente se distribuirá según las necesidades o prioridades realizadas por las autoridades.</p>	<p>Enriquez Díaz, Shucela Catherine</p>	<p>05/02/2021 - 02:59 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2020:</p> <p>1.- Según el POA de diciembre 2020 actualizado al 31/12/2020, en este mes se realizó una transferencia por el valor de 297,07 a la dirección distrital de Cañar cuyo detalle indica que es para la intervención de la vía Ducur. Este monto corresponde al residuo del 1'500.000 que inicialmente se le transfirió para cubrir un convenio marco que abarcaría los proyectos TAMBO - INGAPIRCA - HONORATO VÁZQUEZ Y DUCUR - GUALLETURO. Se procedió a la liberación de recursos para atender la emergencia de Upano de Morona Santiago y, su posterior uso en otros temas financieros pendientes de la zonal. (Se anexa memorandos de solicitud y autorización)</p> <p>2.- Respecto al POA 2021, hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente de la República, se procedió a tomar en cuenta el presupuesto codificado al 31 de diciembre del 2020.</p> <p>3.- Por disposición de VIT, Planificación indicó que para 2021, se incluyó el valor correspondiente al convenio con el GAD parroquial del puerto Misahualli cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y BARRIOS QUE CONFORMAN LA CABECERA PARROQUIAL DEL PUERTO MISAHUALLÍ, DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO ". Al momento se espera alguna acción/ pronunciamiento por parte de SIT/VIT al no pertenecer al área de vialidad.</p>	<p>Enriquez Díaz, Shucela Catherine</p>	<p>05/01/2021 - 10:33 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2020:</p> <p>1.- Mediante memorando MTOP-DNCOIT-2020-1445-ME de 23 de noviembre de 2020, suscrito por el Director Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte se designa un nuevo líder de proyecto. (Arq. Shucela Enriquez)</p> <p>2.- Mediante Oficio Nro. STPE-SPN-2020-1028-OF de 24 de noviembre de 2020 suscrito por el Subsecretario de Planificación Nacional se informa al Ministro de Economía y Finanzas sobre el Dictamen favorable a la modificación presupuestaria de incremento de recursos solicitado para el proyecto Programa de Apoyo al Desarrollo Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por un valor total de \$ 7.356.314,32.</p> <p>3.- En este mes Loja tiene un monto transferido por 5.000.000,00 y Los Ríos tres transferencias por 500.000,00, 513.402,42 y 1.342.911,90. Estos valores se reflejan como disponibles según la cédula presupuestaria.</p> <p>El valor transferido a Los Ríos por 1.342.911,90 presenta una diferencia de \$ 80,17 respecto al monto que consta en el convenio Marco. La DDLR indicó que esta diferencia es porque el convenio se suscribió posterior a la solicitud, misma que reflejaba el monto dispuesto inicialmente por el Sr. Viceministro. El saldo que quede como disponible a fin de año se irá a Finanzas.</p> <p>4.- Según la última actualización POA de noviembre, se refleja valores a Zamora y Carchi por concepto de pago de convenios entre el MTOP y los GADS.</p> <p>Adicionalmente se pueden hacer observaciones respecto a los meses anteriores como:</p> <p>1.- Esmeraldas:Refleja un monto devengado por concepto de un valor pendiente de un convenio modificadorio.</p> <p>2.- Cañar: En el mes de marzo se observan 2 montos por un valor total de 1.500.000,00 , los cuales indicó la Subsecretaria Zonal 5, no se llegaron a transferir a los GADs y se atendieron pagos pendientes de la zonal. Se posterga hasta 2021 la suscripción tentativamente de dos convenios.</p> <p>Actualmente se está realizando el traspaso y actualización de información en razón del cambio de líder del proyecto. Se irá subiendo la información y documentos de respaldo en la medida que se vaya recopilando.</p>	<p>Enriquez Díaz, Shucela Catherine</p>	<p>04/12/2020 - 02:35 PM</p>
<p>OCTUBRE 2020</p> <p>- La Dirección Distrital de Esmeraldas posee un saldo devengado de \$ 594.154,69 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON 69/100), este monto fue asignado a la dirección mediante memorando Nro. MTOP-CGP-2020-278-ME, para liquidar convenio modificadorio No. -2 de cooperación interinstitucional, entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y Gobierno Autónomo descentralizado del municipio del cantón Esmeraldas</p> <p>- La Dirección Distrital de Bolívar posee un saldo por comprometer de \$ 71.861,27 (SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON 27/100)</p>	<p>Muñoz Díaz, Cristian Javier</p>	<p>05/11/2020 - 11:01 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- LA Dirección Distrital de Cañar posee un saldo comprometido de \$ 1'500.000,00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL DÓLARES CON 00/100)</p> <p>Estos montos están considerados dentro del CUP 175200000.0000.373954 Correspondiente Programa de Apoyo al Desarrollo Vial De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los cuales constan en la cédula presupuestaria del mes de enero a octubre del 2020.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2020</p> <p>- La Dirección Distrital de Esmeraldas posee un saldo devengado de \$ 594.154,69 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON 69/100), este monto fue asignado a la dirección mediante memorando Nro. MTOP-CGP-2020-278-ME, para liquidar convenio modificadorio No. -2 de cooperación interinstitucional, entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y Gobierno Autónomo descentralizado del municipio del cantón Esmeraldas</p> <p>- La Dirección Distrital de Bolívar posee un saldo por comprometer de \$ 2'171.861,27 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON 27/100)</p> <p>- LA Dirección Distrital de Cañar posee un saldo comprometido de \$ 1'500.000,00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL DÓLARES CON 00/100)</p> <p>- De las Direcciones de Bolívar y Cañar se a comprometido 2'094.154,69 (DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 69/100) quedando un saldo por comprometer de 71.861,27 (SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 27/100)</p> <p>Estos montos están considerados dentro del CUP 175200000.0000.373954 Correspondiente Programa de Apoyo al Desarrollo Vial De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ITEM 780104 (A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS), los cuales constan en la cédula presupuestaria del mes de enero a septiembre del 2020.</p>	Muñoz Díaz, Cristian Javier	06/10/2020 - 07:47 AM
<p>AGOSTO 2020</p> <p>- La Dirección Distrital de Bolívar posee un saldo por comprometer de \$ 2'171.861,27 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON 27/100)</p> <p>- LA Dirección Distrital de Cañar posee un saldo comprometido de \$ 1'500.000,00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL DÓLARES CON 00/100)</p> <p>- La Dirección Distrital de Esmeraldas posee un saldo devengado de \$ 594.154,69 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON 69/100), este monto fue asignado a la dirección mediante memorando Nro. MTOP-CGP-2020-278-ME, para liquidar convenio modificadorio No. -2 de cooperación interinstitucional, entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y Gobierno Autónomo descentralizado del municipio del cantón Esmeraldas</p> <p>Estos montos están considerados dentro del CUP 175200000.0000.373954 Correspondiente Programa de Apoyo al Desarrollo Vial De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ITEM 780104 (A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS), los cuales constan en la cédula presupuestaria del mes de enero a agosto del 2020.</p>	Muñoz Díaz, Cristian Javier	05/09/2020 - 12:29 PM
<p>JULIO 2020</p> <p>-Al momento la Dirección Distrital de Bolívar posee un saldo por comprometer de \$ 2'171.861,27 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON 27/100), la Dirección Distrital de Esmeraldas posee un saldo por comprometer de \$ 594.154,69 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON 69/100), la Dirección Distrital de Esmeraldas posee un saldo por comprometer de \$ 1'500.000,00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL DÓLARES CON 00/100), estos montos están considerados dentro del CUP 175200000.0000.373954 Correspondiente Programa de Apoyo al Desarrollo Vial De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ITEM 780104 (A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS), los cuales constan en la cédula presupuestaria del mes de enero a julio del 2020.</p>	Muñoz Díaz, Cristian Javier	05/08/2020 - 06:33 PM
<p>JUNIO 2020</p> <p>- Mediante correo Zimbra la Dirección de Bolívar informa que: Los recursos de 2'171.861,27 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON 27/100) están considerados dentro del CUP 175200000.0000.373954 Correspondiente Programa de Apoyo al Desarrollo Vial De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ITEM 780104 (A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS), y estos ya se encuentran comprometidos en el CUR Nro. 35, con las siguiente descripción: GOBIERNO AUTONOMO</p>	Muñoz Díaz, Cristian Javier	05/07/2020 - 07:32 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización																														
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR.-TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Y EL GAD PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZADO CON MEMORANDO MTOP-CGP-2020-165-ME																																
<p>MAYO 2020</p> <p>- Se solicitó mediante correo Zimbra de fecha 30 de mayo, a los Directores Distritales de las provincias de Cañar, Esmeraldas y Bolívar, un informe detallado del PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, CUP 3954, adjunto con la respectiva cédula presupuestaria.</p> <p>- Mediante correo Zimbra la Dirección de Bolívar informa que: con Memorando MTOP-DDB-2020-322-ME de fecha 4 de marzo del 2020 la Directora Distrital entrega la Adenda N° 2 al Convenio y dispone que se realice la transferencia al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Bolívar por el valor de USD.2'171.861,27 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON 27/100)</p> <p>Con fecha 12 de marzo CUR N° 164 el mismo que se encuentra en el sistema esigef en estado solicitado, en virtud que no se puede aprobar ya que el organismo 2001 que se está utilizando se encuentra desfinanciado.</p> <p>Los recursos de 2'171.861,27 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON 27/100) están considerados dentro del CUP 175200000.0000.373954 Correspondiente Programa de Apoyo al Desarrollo Vial De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ITEM 780104 (A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS).</p> <p>Mediante memorando Nro. MTOP-CGP-2020-165-ME, autoriza realizar la Transferencia de Recursos para la Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Bolívar, el 12 de marzo del 2020, se realizó el Devengado Nro. 164, y se encuentra en estado solicitado en espera de autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, ya que en la siguiente Estructura Presupuestaria:</p> <table border="1" data-bbox="121 1018 1068 1123"> <thead> <tr> <th>PG</th> <th>SP</th> <th>PY</th> <th>ACT</th> <th>ITEM</th> <th>UBG</th> <th>FTE</th> <th>ORG</th> <th>N. Prest</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>T</td> <td>O</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>00</td> <td>024</td> <td>001</td> <td>780104</td> <td>0200</td> <td>202</td> <td>2001</td> <td>0001</td> <td>A Gobiernos Autónomos Descentralizados USD: 2.171.861,27</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Mediante correo Zimbra la Dirección de Esmeraldas informa que: Mediante memorando Nro. MTOP-CGP-2020-278-ME se asigno a la Dirección Distrital de Esmeraldas el valor de \$ 594.154,69 para LIQUIDAR CONVENIO MODIFICATORIO NO.-2 DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON ESMERALDAS, dentro del 175200000.0000.373954. Mediante oficio Nro. MTOP-MTOP-20-697-OF de fecha 15 de mayo del 2020 el Mgs. José Gabriel Martínez Castro, MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, solicito al Ministro de Economía y Finanzas AUTORIZACION la emisión del aval y la apertura del ítem 780104 "Transferencia y Donaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados" con la finalidad de proceder a registrar la certificación presupuestaria y posterior CUR de pago en el Sistema e-Sigef, para el registro de la transferencia dentro de los parámetros del Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Esmeraldas, de conformidad al Acuerdo Ministerial Nro. 011 de 16 de enero de 2017. Al momento nos encontramos a esperas de la respuesta por parte del Ministro de Economía y Finanzas para ejecutar el pago de los valores registrados en el POA 2020 con el CUP indicado en el correo que antecede.</p>	PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M	O	N	T	O						57	00	024	001	780104	0200	202	2001	0001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados USD: 2.171.861,27	Muñoz Díaz, Cristian Javier	05/06/2020 - 07:42 PM
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION																							
M	O	N	T	O																												
57	00	024	001	780104	0200	202	2001	0001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados USD: 2.171.861,27																							
<p>ABRIL 2020</p> <p>- Mediante Memorando Nro. MTOP-DCIT-2020-413-ME, se solicito a las Direcciones Distritales remitir toda la documentación elaborada hasta el momento y a su vez se llene la matriz adjunta con información correspondiente al Programa de Apoyo al Desarrollo Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados con el CUP 175200000.0000.379354 para el presente año. Esta información es importante para el programa debido a que servirá para llevar un control de los proyectos a incluirse. Cabe mencionar que esta información es responsabilidad de cada Dirección</p> <p>-Mediante correo zimbra de fecha 21 de abril de 2020, se remite la matriz de cambios en la programación al POA revisada por la Ing. Silvia Cisneros.</p> <p>- Mediante correo zimbra de fecha 24 de abril de 2020, se remite la matriz de reprogramación al POA la cual fue modificada con el apoyo del Ing Enrique Dávila.</p>	Muñoz Díaz, Cristian Javier	06/05/2020 - 12:00 AM																														

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Mediante correo zimbra de fecha 30 de abril de 2020, se solicito al ing. Enrique Davila información desagregada y los valores codificados de los proyectos de Apoyo al Desarrollo Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los años 2017-2018-2019 con el CUP 175200000.0000.373954. Este fue respondido el mismo día indicando que La información corresponde a la planificación del año 2019, la misma que es presentada por el responsable del proyecto. La ejecución o transferencia de recursos realizada, debe ser solicitada al departamento financiero.		
MARZO 2020 - Mediante Memorando Nro. MTOP-DCIT-2020-413-ME, se solicito a las Direcciones Distritales remitir toda la documentación elaborada hasta el momento y a su vez se llene la matriz adjunta con información correspondiente al Programa de Apoyo al Desarrollo Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados con el CUP 175200000.0000.379354 para el presente año. Esta información es importante para el programa debido a que servirá para llevar un control de los proyectos a incluirse.	Muñoz Díaz, Cristian Javier	05/04/2020 - 09:02 PM
FEBRERO 2020 1. Mediante Memorando Nro. MTOP-DVGT-2020-40-ME, de fecha 31 de enero de 2020, la subsecretaria de Delegaciones y Concesiones solicito gestionar la autorización para la modificación presupuestaria del proyecto "Programa de apoyo al desarrollo vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados" a favor del proyecto "Gestión y operación de corredores de la red vial estatal a través de delegación", por el monto de US\$ 20'000,000.00 con el objetivo de que este ultimo sea incluido en el Plan Anual de Inversión 2020 del Ministerio de transporte y Obras Públicas. Para lo cual mediante Memorando Nro. MTOP-DVGT-2020-41-ME, de fecha 31 de enero de 2020, suscrito por el Dr. Jorge Marcelo Loo Sojos VICEMINISTRO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, se solicita autorizar y disponer la modificación presupuestaria al Sr. Ing. Ricardo Paula López, VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. 2. Mediante Oficio Nro. MTOP-MTOP-20-204-OF, de fecha 04 de febrero de 2020 suscrito por el Mgs. José Gabriel Martínez Castro, MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, solicita la inclusión en el PAI 2020 al proyecto "Gestión y operación de corredores de la red vial estatal a través de delegación" al Mgs. José Iván Agosto Briones, PRESIDENTE DEL GABINETE SECTORIAL DE RECURSOS NATURALES, hábitat e infraestructura. Por tal motivo, se espera la respuesta de la solicitud de la inclusión al PAI por parte del MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. 3. El monto programado a devengar para el mes de febrero no se ha podido cumplir debido a que se esperaba la modificación de transferencia de los recursos a la Dirección de Concesiones que como se indica en los ítems anteriores se encuentra en proceso, al momento que se efectivice se volverá a presentar una nueva programación del POA la cual estará exclusivamente estructurada de acuerdo a la ejecución del proyecto.	Muñoz Díaz, Cristian Javier	05/03/2020 - 04:46 PM
ENERO 2020 - A partir del año 2020 este proyecto se lo llevará en la Dirección de Conservación de la Infraestructura , por tanto se solicitará la información que tienen las Direcciones Distritales de todos los contratos que fueron ejecutados bajo este CUP, con la finalidad de tener la información unificada de todo lo desarrollado en el proyecto	Benavides Morillo, Omar Alexander	05/02/2020 - 03:33 PM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	4-Inicio de Trabajo	01/04/2020	01/04/2020		▼	No	0.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	4-Inicio de Trabajo	01/04/2020	01/04/2020		▼	No	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo)	4-Inicio de Trabajo	01/04/2020	01/04/2020		▼	No	0.0
4	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	4-Inicio de Trabajo	01/04/2020	01/04/2020		▼	No	0.0
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	4-Inicio de Trabajo	01/04/2020	01/04/2020		▼	No	0.0
6	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	4-Inicio de Trabajo	01/04/2020	01/04/2020		▼	No	0.0
7	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
8	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
9	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
10	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
11	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
12	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
13	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
14	CIERRE: Liquidación Económica	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
15	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
16	EJECUCIÓN: "Incluir los demás hitos conforme constan en el plan del proyecto aprobado por el Patrocinador Ejecutivo"	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
17	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
18	EJECUCIÓN: Aval aprobado	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
19	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
20	EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
21	EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0
22	EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados	9-Entregables Formales	01/06/2020	01/06/2020		▼	No	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
23	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos al GAD Esmeraldas	9-Entregables Formales	01/09/2020		01/09/2020		Sí	0.0
24	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos al GAD Bolívar	9-Entregables Formales	08/12/2020	08/12/2020			No	0.0
25	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos al GAD de Orellana	9-Entregables Formales	08/12/2020	08/12/2020			No	0.0
26	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos al GAD de Oyacachi	9-Entregables Formales	08/12/2020	08/12/2020			No	0.0
27	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos al GAD el El Oro	9-Entregables Formales	08/12/2020	08/12/2020			No	0.0
28	EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo)	9-Entregables Formales	01/06/2021	01/06/2020			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	55,343,091.94 **
Costo Total:	32,000,784.35
Total Devengado:	21,163,436.81
% Costo Total Devengado:	66.13 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 66.13 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	69,325,459.75	39,179,655.13	0.00	108,505,114.88
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	32,000,784.35	21,163,814.05	0.00	53,164,598.40
Ppto. Codificado	21,163,814.05	39,179,655.13	0.00	60,343,469.18
Ppto. Comprometido	21,163,516.98	0.00	0.00	21,163,516.98
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	77,131,924.04	34,179,655.13	0.00	111,311,579.17
Ppto. Devengado	21,163,436.81	0.00	0.00	21,163,436.81
Pagado Real	6,941,422.25	0.00	0.00	6,941,422.25
Estimado a fin de año	* 21,163,436.81	0.00	0.00	21,163,436.81
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	55,968,487.23	34,179,655.13	0.00	90,148,142.36
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 27.44 %	0.00 %	0.00 %	19.01 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

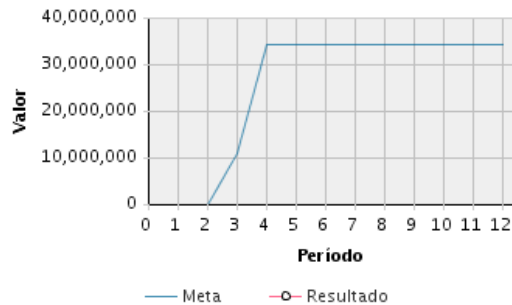

Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	11,000,000.00		11,000,000.00				
Abr	23,179,655.13		34,179,655.13				
May	0.00		34,179,655.13				
Jun	0.00		34,179,655.13				
Jul	0.00		34,179,655.13				
Ago	0.00		34,179,655.13				
Sep	0.00		34,179,655.13				
Oct	0.00		34,179,655.13				
Nov	0.00		34,179,655.13				
Dic	0.00		34,179,655.13				
Total	34,179,655.13						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
18	Incrementar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos en la fase de conservación de los proyectos de infraestructura del transporte MEDIANTE la supervisión de planes, programas y proyectos institucionales para la gestión de conservación en los procesos desconcentrados

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Designación Oficial del Subsecretario a la Dirección de Conservación de la Infraestructura 2020	Zimbra_Designación_Oficial_proyectos_GAD.pdf	05/02/2020
2	A2. Designación de líder 2020	MTOP-DCIT-2020-290-ME_Designación_Líder.pdf	05/03/2020
3	A3. Nueva designación de Líder de proyecto Noviembre 2020	MTOP-DNCOIT-2020-1445-ME_(Nuevo_Líder_Proyecto_GADS).pdf	24/11/2020
4	A4. Cédula Presupuestaria enero - agosto 2020	Ejecución_Presupuestaria_CUP_Nro._175200000.0000.373955_Agosto_2020-.pdf	05/09/2020
5	A5. Hito 1 - DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	2013-06-21_04-36-43_ESTUDIOSGADS(1).PDF	12/12/2020
6	A6. Hito 2- PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	senplades.pdf	12/12/2020
7	A7. Respaldo liberación de recursos DD CAÑAR	LIBERACIÓN_RECursos_CAÑAR_.EMERGENCIA_UPANO.pdf	03/01/2021
8	A8. Rehabilitación, Mantenimiento de Alcantarillado y Construcción de Puente Tipo Bailey en la vía Buenos Aires- Sacachún de 14 Km	Memorando_Nro._MTOP-CGP-2021-189-ME.pdf	03/03/2021
9	A9. Ratificación líderes GPR 2021	RATIFICACIÓN_LÍDERES_GPR_MTOP-DNCOIT-2021-636-ME.pdf	21/04/2021
10	B1. Designación líder 2021	Memorando_Nro._MTOP-DNCOIT-2021-636-ME_(Conservación_Vial).pdf	22/04/2021
