

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 1**  
**Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Imbabura**

**PROYECTO: K010** MTOP - Rectificación y Apertura de la vía E29 tramo Las Golondrinas-Saguangal de 62 Km. de longitud ubicada en la Provincia de Imbabura incluye la construcción de 10 puentes

Líder del Proyecto:	Vásquez Rivera, José Elías (jvasquez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Narvaez Chiriboga, Edison Fernando	Programas Relacionados:	
Titular:	Rea Hinojosa, Luis Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.383591	TIR:	12.80 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	84,298,649.00
Viabilidad Técnica:	Muy Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	12,140,859.83
Localidad de Gestión:	Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona)		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2019 - 28/02/2022
Fecha de última actualización:	30/08/2022	Fecha de Fin Base:	28/02/2022
Modificado por:	Rea Hinojosa, Luis Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2020

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Rectificación y Apertura de la vía E29 tramo Las Golondrinas-Saguangal de 62 Km. de longitud ubicada en la Provincia de Imbabura incluye la construcción de 10 puentes con el fin de interconectar las Provincias de Pichincha -Imbabura y Esmeraldas.

\* Línea Base del Proyecto .- La carretera Las Golondrinas - Saguangal, se desarrolla en sentido Oeste - Este, teniendo su inicio en la comunidad de Las Golondrinas perteneciente a la parroquia García Moreno y concluye en la comunidad de Saguangal, atraviesa la parte oeste del cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura.

\* Objetivo General.- Aperturar, Rehabilitar, Rectificar y Mejorar la vía E29 tramo: Las Golondrinas - Saguangal de 64,2 Km de longitud, ubicada en la provincia de Imbabura, incluye la construcción de 10 puentes vehiculares.

**Beneficios Cualitativos**

Con una inversión de 59.061.587,07 (incluye IVA) se realizará la construcción del tramo vial Saguangal - Las Golondrinas los mismo que beneficiaran al sector productivo y turístico de este sector.

**Tipo de Beneficiario**

DIRECTOS E INDIRECTOS POBLACIÓN DE COTACACHI Y SUR DE ESMERALDAS

**Restricciones**

En la ejecución del Proyecto existen varios factores que limitan la ejecución de la obra, por tanto se establecen prioridades para la normal ejecución de las actividades, el factor económicoes determinante así como la asignación en los tiempos indicados, el retraso en dicho trámite restringe el funcionamiento y ejecución del mantenimiento vial..

Además la obra esta sujeta a efectos ambientales que limita en el avance de la ejecución de la obra.

La demora en la obtención de avales nos limitaría a tener una buena ejecución de acuerdo al cronograma de trabajo.

TIEMPO: ESTE PROYECTO SE EJECUTA HASTA el año 2023 CON CADA UNO DE sus rubros.

COSTO: USD 7174651.63


RECURSOS: SE EJECUTARÁN CON CARGO A RECURSOS EXTERNOS

ALCANCE: ESTE PROYECTO ABARCA TODOS LO QUE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, SEÑALIZACIÓN YEXPROIACIONES QUE SE UTILIZAN EN EL PROYECTO SAGUANGAL- LAS GOLONDRINAS .

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Fin: 28/02/2022

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

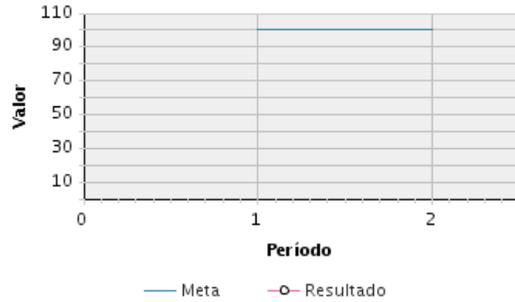

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	0 %									
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO -2022</p> <p>- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, considerando los problemas consabidos que trae el invierno en esta zona, en general la vía se encuentra en condiciones de circulación aceptables.</p> <p>- Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo han sido:</p> <p>- Desalojo de derrumbes, arreglo de cunetas, minado y acarreo de material a la vía, rasanteo y compactación desde el km. 34+000 al 27+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</p> <p>Se avanza 7.00 kilómetros.</p> <p>- En este año, a partir del 05 de abril de 2022, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.</p> <p>."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.</p>	Rea Hinojosa, Luis Fernando	30/08/2022 - 10:02 AM
<p>JULIO -2022</p> <p>- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, considerando los problemas consabidos que trae el invierno en esta zona, en general la vía se encuentra en condiciones de circulación aceptables.</p> <p>- Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo han sido:</p> <p>- Desalojo de derrumbes, arreglo de cunetas, minado y acarreo de material a la vía, rasanteo y compactación desde el km. 34+000 al 27+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</p> <p>Se avanza 7.00 kilómetros.</p> <p>- En este año, a partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.</p> <p>."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.</p> <p>A partir de este mes de octubre, se ha contrato por tres meses más a la Microempresa de Mantenimiento Vial para esta vía, lo que cubrirá hasta el mes de diciembre de 2021.</p>	Rea Hinojosa, Luis Fernando	09/08/2022 - 10:57 AM
<p>JUNIO -2022</p>	Rea Hinojosa, Luis Fernando	09/08/2022 - 10:56 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, considerando los problemas consabidos que trae el invierno en esta zona, en general la vía se encuentra en condiciones de circulación aceptables.</p> <p>- Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo han sido:</p> <p>- Desalojo de derrumbes, arreglo de cunetas, minado y acarreo de material a la vía, rasanteo y compactación desde el km. 34+000 al 27+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</p> <p>Se avanza 7.00 kilómetros.</p> <p>- En este año, a partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.</p> <p>."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.</p> <p>A partir de este mes de octubre, se ha contrato por tres meses más a la Microempresa de Mantenimiento Vial para esta vía, lo que cubrirá hasta el mes de diciembre de 2021.</p>		
<p>MAYO -2022</p> <p>- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, considerando los problemas consabidos que trae el invierno en esta zona, en general la vía se encuentra en condiciones de circulación aceptables.</p> <p>- Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo han sido:</p> <p>- Desalojo de derrumbes, arreglo de cunetas, minado y acarreo de material a la vía, rasanteo y compactación desde el km. 34+000 al 27+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</p> <p>Se avanza 7.00 kilómetros.</p> <p>- En este año, a partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.</p> <p>."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.</p> <p>A partir de este mes de octubre, se ha contrato por tres meses más a la Microempresa de Mantenimiento Vial para esta vía, lo que cubrirá hasta el mes de diciembre de 2021.</p>	<p>Rea Hinojosa, Luis Fernando</p>	<p>09/08/2022 - 10:56 AM</p>
<p>ABRIL -2022</p> <p>- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, considerando los problemas consabidos que trae el invierno en esta zona, en general la vía se encuentra en condiciones de circulación aceptables.</p> <p>- Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo han sido:</p> <p>- Desalojo de derrumbes, arreglo de cunetas, minado y acarreo de material a la vía, rasanteo y compactación desde el km. 34+000 al 27+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</p> <p>Se avanza 7.00 kilómetros.</p> <p>- En este año, a partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.</p> <p>."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.</p> <p>A partir de este mes de octubre, se ha contrato por tres meses más a la Microempresa de Mantenimiento Vial para esta vía, lo que cubrirá hasta el mes de diciembre de 2021.</p>	<p>Rea Hinojosa, Luis Fernando</p>	<p>09/08/2022 - 10:56 AM</p>
<p>MARZO -2022</p> <p>- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, considerando los problemas consabidos que trae el invierno en esta zona, en general la vía se encuentra en condiciones de circulación aceptables.</p> <p>- Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo han sido:</p> <p>- Desalojo de derrumbes, arreglo de cunetas, minado y acarreo de material a la vía, rasanteo y compactación desde el km. 34+000 al 27+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</p>	<p>Rea Hinojosa, Luis Fernando</p>	<p>09/08/2022 - 10:54 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se avanza 7.00 kilómetros.</p> <p>- En este año, a partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.</p> <p>."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.</p> <p>A partir de este mes de octubre, se ha contrato por tres meses más a la Microempresa de Mantenimiento Vial para esta vía, lo que cubrirá hasta el mes de diciembre de 2021.</p>		
<p>FEBRERO -2022</p> <p>- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, considerando los problemas consabidos que trae el invierno en esta zona, en general la vía se encuentra en condiciones de circulación aceptables.</p> <p>- Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo han sido:</p> <p>- Desalojo de derrumbes, arreglo de cunetas, minado y acarreo de material a la vía, rasanteo y compactación desde el km. 34+000 al 27+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</p> <p>Se avanza 7.00 kilómetros.</p> <p>- En este año, a partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.</p> <p>."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.</p> <p>A partir de este mes de octubre, se ha contrato por tres meses más a la Microempresa de Mantenimiento Vial para esta vía, lo que cubrirá hasta el mes de diciembre de 2021.</p>	<p>Rea Hinojosa, Luis Fernando</p>	<p>09/08/2022 - 10:54 AM</p>
<p>ENERO -2022</p> <p>- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, considerando los problemas consabidos que trae el invierno en esta zona, en general la vía se encuentra en condiciones de circulación aceptables.</p> <p>- Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo han sido:</p> <p>- Desalojo de derrumbes, arreglo de cunetas, minado y acarreo de material a la vía, rasanteo y compactación desde el km. 34+000 al 27+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</p> <p>Se avanza 7.00 kilómetros.</p> <p>- En este año, a partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.</p> <p>."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.</p> <p>A partir de este mes de octubre, se ha contrato por tres meses más a la Microempresa de Mantenimiento Vial para esta vía, lo que cubrirá hasta el mes de diciembre de 2021.</p>	<p>Rea Hinojosa, Luis Fernando</p>	<p>28/04/2022 - 11:57 AM</p>
<p>Diciembre -2021</p> <p>- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, considerando los problemas consabidos que trae el invierno en esta zona, en general la vía se encuentra en condiciones de circulación aceptables.</p> <p>- Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo han sido:</p> <p>- Desalojo de derrumbes, arreglo de cunetas, minado y acarreo de material a la vía, rasanteo y compactación desde el km. 34+000 al 27+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</p> <p>Se avanza 7.00 kilómetros.</p> <p>- En este año, a partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.</p> <p>."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.</p> <p>A partir de este mes de octubre, se ha contrato por tres meses más a la Microempresa de Mantenimiento Vial para esta vía, lo que cubrirá hasta el mes de diciembre de 2021.</p>	<p>Rea Hinojosa, Luis Fernando</p>	<p>04/01/2022 - 03:38 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>NOVIEMBRE -2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, considerando los problemas consabidos que trae el invierno en esta zona, en general la vía se encuentra en condiciones de circulación aceptables.</li> <li>- Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo han sido:</li> <li>- Desalojo de derrumbes, arreglo de cunetas, minado y acarreo de material a la vía, rasanteo y compactación desde el km. 34+000 al 27+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</li> </ul> <p>Se avanza 7.00 kilómetros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En este año, a partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.</li> </ul> <p>."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.</p> <p>A partir de este mes de octubre, se ha contrato por tres meses más a la Microempresa de Mantenimiento Vial para esta vía, lo que cubrirá hasta el mes de diciembre de 2021.</p>	<p>Rea Hinojosa, Luis Fernando</p>	<p>03/12/2021 - 05:54 PM</p>
<p><b>OCTUBRE -2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, considerando los problemas consabidos que trae el invierno en esta zona, en general la vía se encuentra en condiciones de circulación aceptables.</li> <li>- Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo han sido:</li> <li>- Desalojo de derrumbes, arreglo de cunetas, minado y acarreo de material a la vía, rasanteo y compactación desde el km. 34+000 al 27+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</li> </ul> <p>Se avanza 7.00 kilómetros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En este año, a partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.</li> </ul> <p>."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.</p> <p>A partir de este mes de octubre, se ha contrato por tres meses más a la Microempresa de Mantenimiento Vial para esta vía, lo que cubrirá hasta el mes de diciembre de 2021.</p>	<p>Rea Hinojosa, Luis Fernando</p>	<p>03/12/2021 - 05:54 PM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE -2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, considerando los problemas consabidos que trae el invierno en esta zona, en general la vía se encuentra en condiciones de circulación aceptables.</li> <li>- Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo han sido:</li> <li>- Desalojo de derrumbes, arreglo de cunetas, minado y acarreo de material a la vía, rasanteo y compactación desde el km. 34+000 al 27+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</li> </ul> <p>Se avanza 7.00 kilómetros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En este año, a partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.</li> </ul> <p>."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.</p> <p>A partir de este mes de octubre, se ha contrato por tres meses más a la Microempresa de Mantenimiento Vial para esta vía, lo que cubrirá hasta el mes de diciembre de 2021.</p>	<p>Rea Hinojosa, Luis Fernando</p>	<p>04/11/2021 - 11:48 AM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE -2021</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos.</li> <li>2.- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, debido a la época invernal, los daños a la vía son considerables.</li> </ol>	<p>Rea Hinojosa, Luis Fernando</p>	<p>05/10/2021 - 08:23 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>A partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.                      ."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.                      Avance mensual de 18 kilómetros, actividad, desbroce desde la abscisa: 0+000 a la 18+000</p>		
<p>AGOSTO -2021</p> <p>1.- El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos.                      2.- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, debido a la época invernal, los daños a la vía son considerables.                      A partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.                      ."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.                      Avance mensual de 18 kilómetros, actividad, desbroce desde la abscisa: 0+000 a la 18+000</p>	<p>Cruz Chicaiza, Rene Alejandro</p>	<p>03/09/2021 - 05:13 PM</p>
<p>JULIO -2021</p> <p>1.- El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos.                      2.- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, debido a la época invernal, los daños a la vía son considerables.                      A partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo.                      ."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros.                      Avance mensual de 18 kilómetros, actividad, desbroce desde la abscisa: 0+000 a la 18+000</p>	<p>Vásquez Rivera, José Elías</p>	<p>03/08/2021 - 01:01 PM</p>
<p>JUNIO - 2021</p> <p>El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, debido a la época invernal, los daños a la vía son considerables.                      1.- Se señalar que el tramo que conecta la Magdalena con Las Golondrinas con una longitud de 64,2 Km. se encuentra en construcción, estos kilómetros están ya incluidos en el total de 331.97 km. de la Red Vial Estatal provincial..                      Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo se lo realiza en lo que es desalojo de derrumbes, limpieza de alcantarillas, arreglo de cunetas, rasanteo y compactación de la mesa desde el km. 41+800 al 28+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</p>	<p>Cruz Chicaiza, Rene Alejandro</p>	<p>02/07/2021 - 10:47 AM</p>
<p>MAYO - 2021</p> <p>El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos.                      1.- Se señalar que el tramo que conecta la Magdalena con Las Golondrinas con una longitud de 64,2 Km. se encuentra en construcción, estos kilómetros están ya incluidos en el total de 331.97 km. de la Red Vial Estatal provincial..                      Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo se lo realiza en lo que es desalojo de derrumbes, limpieza de alcantarillas, arreglo de cunetas, rasanteo y compactación de la mesa desde el km. 41+800 al 28+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</p>	<p>Cruz Chicaiza, Rene Alejandro</p>	<p>08/06/2021 - 02:27 PM</p>
<p>ABRIL - 2021</p> <p>El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos.</p>	<p>Vásquez Rivera, José Elías</p>	<p>03/06/2021 - 04:21 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.- Se señalar que el tramo que conecta la Magdalena con Las Golondrinas con una longitud de 64,2 Km. se encuentra en construcción, estos kilómetros están ya incluidos en el total de 331.97 km. de la Red Vial Estatal provincial..</p> <p>Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo se lo realiza en lo que es desalojo de derrumbes, limpieza de alcantarillas, arreglo de cunetas, rasanteo y compactación de la mesa desde el km. 41+800 al 28+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.</p>		
<p>ABRIL - 2021</p> <p>El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos.</p> <p>1.- Se señalar que el tramo que conecta la Magdalena con Las Golondrinas con una longitud de 64,2 Km. se encuentra en construcción, estos kilómetros están ya incluidos en el total de 331.97 km. de la Red Vial Estatal provincial..</p>	Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	05/05/2021 - 03:27 PM
<p>MARZO - 2021</p> <p>El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos.</p> <p>1.- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, debido a la época invernal y a los daños considerables causados a la vía se ha concentrado los trabajos en esta carretera y al no disponer de maquinaria o equipo suficiente en esta Dirección, la Junta Parroquial de García Moreno colabora con un tractor para el tramo Aguagrú - La Magdalena 37.00, los trabajos de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre durante este periodo se lo realiza en lo que es desalojo de derrumbes y limpieza de alcantarillas.</p>	Vásquez Rivera, José Elías	05/04/2021 - 02:52 PM
<p>FEBRERO - 2021</p> <p>El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos.</p> <p>1.- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, debido a la época invernal y a los daños considerables causados a la vía se ha concentrado los trabajos en esta carretera y al no disponer de maquinaria o equipo suficiente en esta Dirección, la Junta Parroquial de García Moreno colabora con un tractor para el tramo Aguagrú - La Magdalena 37.00, los trabajos de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre durante este periodo se lo realiza en lo que es desalojo de derrumbes y limpieza de alcantarillas.</p>	Vásquez Rivera, José Elías	05/04/2021 - 02:43 PM
<p>FEBRERO - 2021</p> <p>RECTIFICACION Y APERTURA DE LA VIA E-29 TRAMO LAS GOLONDRINAS - SAGUANGAL DE 64.2 KM. DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 10 PUENTES Y UN PASO PEATONAL EN CIELO VERDE.</p> <p>El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos.</p> <p>Cabe señalar que el tramo que conecta la Magdalena con Las Golondrinas con una longitud de 64,2 Km. se encuentra en construcción, estos kilómetros están ya incluidos en el total de 331.97 km. de la Red Vial Estatal provincial</p>	Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	05/03/2021 - 12:19 PM
<p>ENERO - 2021</p> <p>Fecha de firma de contrato: 25/06/2019  Fecha de inicio de obras: 28/12/2019  Fecha de término 25/08/2022  Plazo en días: 990  Constructora: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION  Monto: 48.894.544 monto original sin IVA.</p>	Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	10/02/2021 - 08:33 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos.</p> <p>Cabe señalar que el tramo que conecta la Magdalena con Las Golondrinas con una longitud de 64,2 Km. se encuentra en construcción, estos kilómetros están ya incluidos en el total de 331.97 km. de la Red Vial Estatal provincial</p>		
<p>NOVIEMBRE: 2020</p> <p>Con la suscripción del contrato complementario No. 2, el 15 de agosto del 2020 se continuaron con los trabajos planificados.</p> <p>.Se continúa con armado de acero en cuerpo y pantallas Pte. Manadariyacu Chico y el respectivo encofrado estribo izquierdo Abs: 4+820</p> <p>.Se trabaja en la colocación de mejoramiento en el tramo Abs: 5+950 a 6+100</p> <p>.Se continua con trabajos de cortes de laterales tramo Abs: 6+300 al 7+000</p> <p>.Se realiza el encofrado del 3er nivel de cuerpo y pantallas del estribo derecho del Pte. Río Verde Abs: 8+145</p> <p>.Se realiza figurado y armado de acero de refuerzo, encofrado y fundición de solera de ducto cajón Abs: 11+007</p> <p>.Encofrado, armado de acero y fundición de losa del ducto cajón Abs: 14+681</p> <p>.Se realiza excavación, armado de hierro, encofrado y fundición de cabezal de salida de la alcantarilla Abs: 15+415</p> <p>.Se realizan trabajos de perforación para excavación en roca entre las abscisas 16+130 a 16+290 y su respectiva voladura.</p> <p>.Se realiza excavaciones para rectificación de vía en el tramo Abs:15+600 a 16+000.</p> <p>.Excavación y desalojo en el acceso derecho al puente Mandariyacu Grande entre las abscisas 16+190 a 16+540 y entre las Abs: 17+600 a 17+700</p> <p>.Excavación y mejoramiento subrazante de ducto cajón Abs: 37+500</p> <p>.Se realiza movimiento de tierras entre las Abs: 38+340 - 38+460</p> <p>A la espera de la documentación para la suscripción del contrato complementario No. 3 que permitirá regularizar los rubros</p> <p>Actualmente se han tramitado las planillas por parte de la Dirección Distrital de Imbabura a la espera del pago por Administración Central.</p>	<p>Vásquez Rivera, José Elías</p>	<p>03/12/2020 - 04:25 PM</p>
<p>OCTUBRE: 2020</p> <p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 16.436.311,70, actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se en ejecución el plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, con fecha 25 de Diciembre del 2019, se entrega el anticipo a la contratista, actualmente se ejecutan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y el administrador del contrato se encuentran constatando los trabajos ejecutados en el mes de Febrero en el cual se cuenta con un avance del 8.13%, con fecha 15 de agosto del 2020 se suscribe el contrato complementario y el 17 de agosto se dispone el reinicio de trabajos.</p> <p>Con fecha 15 de agosto del 2020 se firmó el contrato complementario y con fecha 17 de agosto se reiniciaron los trabajos.</p>	<p>Obregón Guadalupe, Ángel Edison</p>	<p>05/11/2020 - 08:48 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE: 2020</p> <p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 16.436.311,70, actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se en ejecución el plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, con fecha 25 de Diciembre del 2019, se entrega el anticipo a la contratista, actualmente se ejecutan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y el administrador del contrato se encuentran constatando los trabajos ejecutados en el mes de Febrero en el cual se cuenta con un avance del 0,50%, con fecha 15 de agosto del 2020 se suscribe el contrato complementario y el 17 de agosto se dispone el reinicio de trabajos.</p> <p>Con fecha 15 de agosto del 2020 se firmó el contrato complementario y con fecha 17 de agosto se reiniciaron los trabajos.</p>	<p>Vásquez Rivera, José Elías</p>	<p>05/10/2020 - 11:45 AM</p>
<p>AGOSTO: 2020</p>	<p>Obregón Guadalupe, Ángel Edison</p>	<p>04/09/2020 - 11:35 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 16.436.311,70, actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se encuentra autorizada la suspensión del plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, con fecha 25 de Diciembre del 2019, se entrega el anticipo a la contratista, actualmente se ejecutan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y el administrador del contrato se encuentran constatando los trabajos ejecutados en el mes de Febrero en el cual se cuenta con un avance del 0,50%, con fecha 15 de agosto del 2020 se suscribe el contrato complementario y el 17 de agosto se dispone el reinicio de trabajos.</p>		
<p><b>JULIO: 2020</b></p> <p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 16.436.311,70, actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se encuentra autorizada la suspensión del plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, con fecha 25 de Diciembre del 2019, se entrega el anticipo a la contratista, actualmente se ejecutan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y el administrador del contrato se encuentran constatando los trabajos ejecutados en el mes de Febrero en el cual se cuenta con un avance del 0,50%, en base a declaratoria de Emergencia Sanitaria los trabajos se encuentran suspendidos a la espera del levantamiento del decreto 1017</p>	<p>Obregón Guadalupe, Ángel Edison</p>	<p>05/08/2020 - 02:28 PM</p>
<p><b>MAYO: 2020</b></p> <p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70, actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se encuentra autorizada la suspensión del plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, con fecha 25 de Diciembre del 2019, se entrega el anticipo a la contratista, actualmente se ejecutan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y el administrador del contrato se encuentran constatando los trabajos ejecutados en el mes de Febrero en el cual se cuenta con un avance del 0,12%, en base a declaratoria de Emergencia Sanitaria los trabajos se encuentran suspendidos a la espera del levantamiento del decreto 1017</p>	<p>Vásquez Rivera, José Elías</p>	<p>24/06/2020 - 03:14 PM</p>
<p>.</p>	<p>Yépez Rivera, Milton Annelio</p>	<p>05/05/2020 - 05:20 PM</p>
<p><b>ENERO: 2020</b></p> <p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70 actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía.</p> <p><b>FEBRERO: 2020</b></p> <p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y admnistrador de contrato se encuentran en revisión de los avances de obra previo a la presentación de la planilla 1.</p> <p><b>MARZO: 2020</b></p> <p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y admnistrador de contrato se encuentran en revisión de los avances de obra previo a la presentación de la planilla 1, con la declaración de Emergencia Sanitaria Decreto 1017, se suspendieron los trabajos a espera del levantamiento del mencionado decreto.</p> <p><b>ABRIL: 2020</b></p>	<p>Vásquez Rivera, José Elías</p>	<p>04/05/2020 - 07:10 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70, actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se encuentra autorizada la suspensión del plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, con fecha 25 de Diciembre del 2019, se entrega el anticipo a la contratista, actualmente se ejecutan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y el administrador del contrato se encuentran constatando los trabajos ejecutados en el mes de Febrero en el cual se cuenta con un avance del 0,12%, en base a declaratoria de Emergencia Sanitaria los trabajos se encuentran suspendidos a la espera del levantamiento del decreto 1017</p>		
<p>ENERO: 2020</p> <p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70 actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía.</p> <p>FEBRERO: 2020</p> <p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y adminisitrador de contrato se encuentran en revisión de los avances de obra previo a la presentación de la planilla 1.</p> <p>MARZO: 2020</p> <p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y adminisitrador de contrato se encuentran en revisión de los avances de obra previo a la presentación de la planilla 1, con la declaración de Emergencia Sanitaria Decreto 1017, se suspendieron los trabajos a espera del levantamiento del mencionado decreto.</p>	<p>Vásquez Rivera, José Elías</p>	<p>05/04/2020 - 03:21 PM</p>
<p>ENERO: 2020</p> <p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70 actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía.</p> <p>FEBRERO: 2020</p> <p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y adminisitrador de contrato se encuentran en revisión de los avances de obra previo a la presentación de la planilla 1.</p>	<p>Vásquez Rivera, José Elías</p>	<p>05/03/2020 - 06:08 PM</p>
<p>DICIEMBRE: 2019</p> <p>El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto.</p>	<p>Vásquez Rivera, José Elías</p>	<p>04/01/2020 - 10:44 AM</p>
<p>NOVIEMBRE: 2019</p>	<p>Vásquez Rivera, José Elías</p>	<p>04/12/2019 - 02:42 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se encuentra autorizada la suspensión del plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, considerando que hasta la fecha no se cancela el anticipo, por lo tanto se encuentran suspendido el inicio de trabajos..		
OCTUBRE: 2019  El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se encuentra autorizada la suspensión del plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, considerando que hasta la fecha no se cancela el anticipo, por lo tanto se encuentran suspendido el inicio de trabajos..	Vásquez Rivera, José Elías	05/11/2019 - 03:17 PM
SEPTIEMBRE: 2019  El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de SEPTIEMBRE se encuentra en definiciones para el inicio de la obra y en trámites para el pago del anticipo.	Vásquez Rivera, José Elías	07/10/2019 - 03:00 PM
JULIO: 2019  El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de julio se encuentra en definiciones para el inicio de la obra y en trámites para el pago del anticipo	Yépez Rivera, Milton Annelio	05/08/2019 - 02:44 PM
JUNIO: 2019  El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Actualmente se encuentra en la etapa de contratación.	Vásquez Rivera, José Elías	03/07/2019 - 03:43 PM
MAYO: 2019  El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Actualmente se encuentra en la etapa de contratación.	Vásquez Rivera, José Elías	04/06/2019 - 03:12 PM
ABRIL: 2019  El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Se encuentra en la fase de pre selección de las Cías Chinas	Vásquez Rivera, José Elías	02/05/2019 - 08:18 AM
MARZO: 2019  El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Se encuentra en la fase de pre selección de las Cías Chinas	Andrade Godoy, Luis Marcelo	03/04/2019 - 11:51 AM
FEBRERO: 2019  El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53	Leyton Ruano, Napoleon Dilon	01/03/2019 - 11:57 AM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Imbabura > Cotacachi

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	15/07/2019		01/01/2019		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	20/07/2019		01/01/2019		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	31/07/2019		14/02/2019		Sí	5.0
4	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	31/07/2019		01/01/2019		Sí	3.0
5	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	31/07/2019		31/07/2019		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Aval aprobado	1-Solicitud de Información	02/08/2019		09/05/2019		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada	1-Solicitud de Información	02/08/2019		02/08/2019		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo)	1-Solicitud de Información	02/08/2019		02/08/2019		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados	1-Solicitud de Información	02/08/2019		02/08/2019		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada	3-Adjudicación	04/08/2019		04/08/2019		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito	3-Adjudicación	04/08/2019		04/08/2019		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito	5-Entregables Intermedios	01/11/2019		31/12/2019		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN :- FISCALIZACIÓN	4-Inicio de Trabajo	31/12/2020	31/12/2020			No	5.0
14	EJECUCIÓN.- AMBIENTAL	4-Inicio de Trabajo	31/12/2020	31/12/2020			No	1.0
15	EJECUCIÓN.- EXPROPIACIONES	4-Inicio de Trabajo	31/12/2020	31/12/2020			No	2.0
16	EJECUCIÓN.- OBRA	4-Inicio de Trabajo	31/12/2020	31/12/2020			No	34.0
17	EJECUCIÓN.- PUENTES	4-Inicio de Trabajo	31/12/2020	31/12/2020			No	18.0
18	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	01/01/2021	01/01/2021			No	1.0
19	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	30/01/2021	30/01/2021			No	1.0
20	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/07/2021	30/07/2021			No	1.0
21	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	27/08/2021	27/08/2021			No	1.0
22	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	30/09/2021	30/09/2021			No	1.5
23	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables	V - Verificación ejecutiva	29/10/2021	29/10/2021			No	1.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF							
24	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	V - Verificación ejecutiva	30/11/2021	30/11/2021		▼	No	2.0
25	CIERRE: Liquidación Económica	V - Verificación ejecutiva	15/12/2021	15/12/2021		▼	No	1.0
26	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021		▼	No	0.5

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	INDICADOR DEL PORCENTAJE DEL AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO GOLONDRINAS SAGUANGAL	—	-	-	-	01/08/2021	-


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	19,557,016.85
Estimado Al Fin Del Proyecto:	12,140,859.83 **
Costo Total:	59,061,587.07
Total Devengado:	12,140,859.83
% Costo Total Devengado:	20.56 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 20.56 %

**Perfil Económico 2022**

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	54,331,351.64	0.00	0.00	54,331,351.64
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	56,128,646.07	18,941,559.69	0.00	75,070,205.76
Ppto. Codificado	51,132,305.82	18,941,559.69	0.00	70,073,865.51
Ppto. Comprometido	34,292,950.83	12,582,397.48	0.00	46,875,348.31
Planeado - Codificado (2022)		-18,941,559.69		
<b>Programado a Devengar</b>	51,132,305.82	0.00	0.00	51,132,305.82
Ppto. Devengado	12,140,859.83	0.00	0.00	12,140,859.83
Pagado Real	12,140,859.83	12,582,397.48	0.00	24,723,257.31
Estimado a fin de año	* 12,140,859.83	0.00	0.00	12,140,859.83
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	38,991,445.99	0.00	0.00	38,991,445.99
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 23.74 %	0.00 %	0.00 %	23.74 %
<b>Ppto. Codificado 998</b>	8,654,335.19	7,000,000.00	0.00	15,654,335.19
Ppto. Devengado 998	4,615,112.35	4,827,308.38	0.00	9,442,420.73

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022**



**Presupuesto Mensual 2022**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>0.00</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
21	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
22	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	2019-02-08_03-40-08_ACUERDOMINISTERIAL 010 Las golondrinas-Saguangal	2019-02-08_03-40-08_ACUERDOMINISTERIAL_010_Las_golondrinas-Saguangal.pdf	05/07/2019
2	2019-02-08_04-14-17_CERT._FINANCIAMIENTO - las Golondrinas Saguangal	2019-02-08_04-14-17_CERT._FINANCIAMIENTO_-_las_Golondrinas_Saguangal.pdf	05/07/2019
3	A.1 Informe Ejecutivo Enero-2022	2022-02_GPR_PLANILLA(20)-signed.pdf	30/08/2022
4	A.2. Informe ejecutivo Febrero 2022	2022-03_GPR_PLANILLA(21)-signed.pdf	30/08/2022
5	A.3. Informe Ejecutivo Marzo-2022	2022-04_GPR_PLANILLA(22)-signed.pdf	30/08/2022
6	A.4. Informe Ejecutivo Abril 2022	2022-05_GPR_PLANILLA(23)-signed.pdf	30/08/2022
7	A.5 Informe Ejecutivo Mayo-2022	2022-06_GPR_PLANILLA(24)-signed.pdf	30/08/2022
8	A.92 INFORME DE TRABAJO MANTENIMIENTO VIAL RVE	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_noviembre_-_2021-signed.pdf	05/07/2019
9	A12. INFORME DE TRABAJO MES DE ABRIL 2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_Abril_-_2021_(1).docx	05/07/2019
10	A12. INFORME MENSUAL DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL RVE- DICIEMBRE2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_diciembre_-_2021-signed.pdf	05/07/2019
11	A14. INFORME DE TRABAJO MANTENIMIENTO VIAL RVE IMBABURA MARZO 2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_Marzo_-_2021-1.docx	05/07/2019
12	A16. INFORME DE TRABAJO MANTENIMIENTO VIAL RVE IMBABURA - MAYO 2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_Mayo_-_2021_-_copia.docx	05/07/2019
13	A17. INFORME DE TRABAJO MANTENIMIENTO VIAL MAYO 2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_Mayo_-_2021_-_copia.docx	05/07/2019
14	A21. INFORME DE TRABAJO MANTENIMIENTO VIAL IMBABURA - JUNIO -2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_junio_-_2021.docx	05/07/2019
15	A7. INFORME DE TRABAJOS MANTENIMIENTO VIAL RVE IMBABURA - enero - 2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_enero_-_2021.docx	05/07/2019
16	A9. INFORME DE TRABAJO MANTENIMIENTO VIAL RVE IMBABURA FEBRERO 2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_febrero_-_2021-1.docx	05/07/2019
17	AGOSTO INFORME DE TRABAJOS SAGUANGAL LAS GOLONDRINAS	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_AGOSTO-2020.docx	04/09/2020

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	Aval Presupuestario Saguangal-Las Golondrinas	Aval_Presupuestario_Saguangal-Las_Golondrinas.pdf	05/07/2019
19	C-PRESUPUESTARIA OCTUBRE-SELVA ALEGRE-SAGUANGAL-2019	C-PRESUPUESTARIA_OCTUBRE-SELVA_ALEGRE-SAGUANGAL-2019.pdf	28/11/2019
20	C-PRESUPUESTARIA SELVA ALEGRE-GOLONDRINAS SEPTIEMBRE-2019	C-PRESUPUESTARIA_SELVA_ALEGRE-GOLONDRINAS_SEPTIEMBRE-2019.pdf	28/11/2019
21	CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2020	CEDULA_SAGUANGAL_LAS_GOLONDRINAS_JULIO.pdf	05/08/2020
22	CEDULA SAGUANGAL LAS GOLONDRINAS NOVIEMBRE	CEDULA_SAGUANGAL_LAS_GOLONDRINAS.pdf	03/12/2020
23	CEDULA SAGUANGAL LAS GOLONDRINAS OCTUBRE	CÉDULA_SAGUANGAL_LAS_GOLONDRINAS.pdf	05/11/2020
24	CEDULA SAGUANGAL LAS GOLONDRINAS SEPTIEMBRE	CEDULA_SAGUANGAL_LAS_GOLONDRINAS_SEPTIEMBRE.pdf	05/11/2020
25	CEDULA-PRESUPUESTARIA-SAGUANGAL-LAS-GOLONDRINAS-ENERO-FEBRERO-2020	CEDULA_PRESUPUESTARIA_SAGUANGAL_LAS_GOLONDRINAS-ENERO-FEBRERO.pdf	03/07/2020
26	CEDULA-PRESUPUESTARIA-SAGUANGAL-LAS-GOLONDRINAS-JUNIO-2020	Cedula_Presupuestaria_Selva_Alegre-Saguangal-Las_Golondrinas_Junio_2020pdf.pdf	03/07/2020
27	CEDULA-PRESUPUESTARIA-SAGUANGAL-LAS-GOLONDRINAS-MAYO-2020	cedula_presupuestaria_Mayo.PDF	24/06/2020
28	CERTIFICACION PLURIANUAL GOLONDRINAS	CERTIFICACION_PLURIANUAL_GOLONDRINAS.pdf	05/07/2019
29	CONTRATO FIRMADO GOLONDRINAS SAGUANGAL	CONTRATO_FIRMADO_GOLONDRINAS_SAGUANGAL.pdf	05/08/2019
30	cédula noviembre-2019 PROYECTOS	cédula_noviembre-2019_PROYECTOS.PDF	04/12/2019
31	CÉDULA SAGUANGAL LAS GOLONDRINAS AGOSTO	AGOSTO_CEDULA_SAGUANGAL_LAS_GOLONDRINAS.pdf	04/09/2020
32	Dictamen de Prioridad SENPLADES LAs Golondrinas - Saguangal	Dictamen_de_Prioridad_SENPLADES_LAs_Golondrinas_-_Saguangal.pdf	05/07/2019
33	ejecucion presupuestaria la 31-12-2019	ejecucion_presupuestaria_la_31-12-2019.pdf	09/01/2020
34	INFORME AGOSTO-2019 LAS GOLONDRINAS	INFORME_AGOSTO-2019_LAS_GOLONDRINAS.pdf	04/09/2019
35	INFORME DE TRABAJOS MANTENIMIENTO VIAL RVE IMBABURA - NOVIEMBRE - 2020-11	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_NOVIEMBRE_-_2020-11.docx	05/12/2020
36	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL ABRIL 2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_ABRIL_2019.docx	02/05/2019
37	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL JULIO-2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_JULIO-2019.docx	05/08/2019
38	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL JUNIO-2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_JUNIO-2019.docx	05/07/2019
39	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL NOVIEMBRE-2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_NOVIEMBRE-2019.docx	05/12/2019
40	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL RESUMEN_ENERO 2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_RESUMEN_ENERO_2019.docx	05/02/2019
41	INFORME SAGUANGAL LAS GOLONDRINAS	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_OCTUBRE_-_2020-10.docx	05/12/2020
42	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_ENERO-2020	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_ENERO-2020.docx	05/03/2020
43	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_FEBRERO-2020	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_FEBRERO-2020.docx	05/03/2020
44	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_FEBRERO_2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_FEBRERO_2019.docx	01/03/2019
45	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_JULIO-2020	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_JULIO-2020.docx	05/08/2020
46	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_MARZO_2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_MARZO_2019.docx	03/04/2019
47	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_MAYO_2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_MAYO_2019.docx	04/06/2019
48	marco lógico- Carretera Las Golondrinas-Saguangal	MARCO_LOGICO_REVISAR.xls	26/03/2019
49	OFICIO MTOP-DDI-19-195-OF, SUSPENSION PLAZO DEL PROYECTO	OFICIO_MTOP-DDI-19-195-OF.pdf	05/11/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
50	SEPTIEMBRE INFORME DE TRABAJOS	INFORME_DE_TRABAJOS_SAGUANGAL_-_SEPTIEMBRE_-_2020-9.pdf	05/10/2020
51	SIPEIP 175200000.0000.383591 RECTIFICACION Y APERTURA DE LA VIA E29 TRAMO LAS GOLONDRINAS - SAGUANGAL DE 62 KM (1)	SIPEIP_175200000.0000.383591__RECTIFICACION_Y_APERTURA_DE_LA_VIA_E29_TRA_MO_LAS_GOLONDRINAS_DE_62_KM_(1).pdf	28/11/2019
52	solicitud de Suspensión de vigencia del indicador "Porcentaje de cumplimiento de cronograma en GPR"	Memorando_Nro._MTOPI-DDI-2021-1433-ME.pdf	04/08/2021

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Rea Hinojosa, Luis Fernando	DIRECTOR	Director/a Distrital de Transporte y Obras Públicas de Imbabura	lrea@mtop.gob.ec	
Velasco Portilla, Miguel Angel	Supervisor Financiero	Supervisor Financiero	mavelasco@mtop.gob.ec	13405
Vásquez Rivera, José Elías	Lider Proyecto	Supervisor de Construcciones	jvasquez@mtop.gob.ec	023974600
