

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas
PROYECTO: K001 Programa de Inversión Ecuador Estratégico 2012

Líder del Proyecto:	Changoluisa Analuisa, Christian Fernando (cchangoluisa@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santamaria Loor, Kiura Ninoska	Programas Relacionados:	
Titular:	Yepez Sevilla, Hernando Vicente	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30440000.0000.374042	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	546,837.35
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/01/2012 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	28/08/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2022
Modificado por:	Becerra Albuja, Carlos Javier	Fecha del siguiente Hito:	31/08/2023

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto de inversión contempla la ejecución de estudios y la realización de obras de infraestructura para alcanzar el desarrollo social en los diferentes sectores, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas en las zonas de influencia directa e indirecta.

PRODUCTO / SERVICIO: Se entregará obras de infraestructura para alcanzar el desarrollo social en los diferentes sectores, para el beneficio de la población.

LÍNEA BASE: Se considera la línea de base como un punto de partida que permitirá comparar objetivamente los impactos reales que genere el Programa con los previstos. Para este aspecto, los responsables del establecimiento de la situación actual corresponden a los organismos rectores.

OBJETIVO GENERAL DEL O PROPÓSITO: Mejorar la calidad de la vida de los habitantes asentados en las zonas de influencia de los proyectos de los sectores estratégicos mediante la dotación y mejora de los servicios de salud, saneamiento ambiental, educación, electricidad, telecomunicaciones, vivienda, desarrollo urbano, desarrollo social, cultura, deportes, turismo, etc. en concordancia con los objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir gracias a los recursos procedentes del aprovechamiento responsable de los recursos naturales estratégicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Mejorar la calidad de la vida de los habitantes asentados en las zonas de influencia, en los siguientes puntos, Saneamiento ambiental, Salud, Educación, Recursos naturales y energía, Multisectorial, Telecomunicaciones, Transporte y vialidad, Cultura, Deportes, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Vivienda, Turismo, Agricultura, ganadería y pesca, Protección del medio ambiente y desastres naturales.

Beneficios Cualitativos

Materializar la Política Pública del Gobierno Nacional para el Buen Vivir de las comunidades en las zonas de influencia de los proyectos de los sectores estratégicos, a través de la ejecución de programas integrales de desarrollo local, redistribuyendo equitativa y planificadamente los ingresos generados por el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos naturales y operando bajo normativa vigente, con eficiencia, eficacia y transparencia.

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Directos: El Programa de Inversión Ecuador Estratégico beneficiará de forma directa a 2'518.984 habitantes

Beneficiarios Indirectos: de forma indirecta se beneficiará a 14'777.367 habitantes de las parroquias en las que se va a implementar los diferentes proyectos de inversión.

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 13 años

COSTO: El monto de inversión del Programa de Inversión Ecuador Estratégico 2012 asciende a USD 567.739.144,00 (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 DÓLARES), todos son recursos fiscales procedentes con base al Artículo 4 del Decreto Ejecutivo 1135

Restricciones

ALCANCE: entrega de obras de infraestructura para alcanzar el desarrollo social en los diferentes sectores a nivel nacional

RECURSOS: Personal Técnico especializado

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 83.38 %

Fecha de Inicio: 02/01/2012

Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

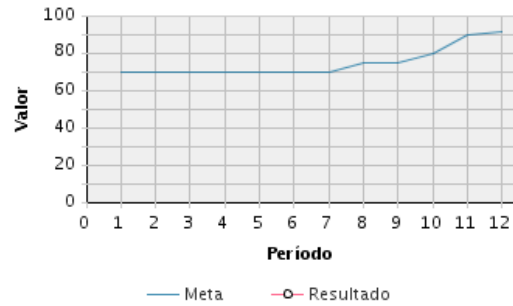

Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	75 %	75 %	80 %	90 %	91 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2023</p> <p>1. El proyecto continua CONGELADO; debido a que no se asignaron recursos para el Plan Operativo Anual POA para el año 2023. Mientras no se cuente con los recursos, el presente proyecto no puede reactivarse tomando en cuenta que se encuentran pendientes las liquidaciones de los contratos de obra y fiscalización.</p>	Changoluisa Analuisa, Christian Fernando	02/08/2023 - 09:55 AM
<p>JUNIO 2023</p> <p>1. El proyecto continua CONGELADO; debido a que no se asignaron recursos para el Plan Operativo Anual POA para el año 2023. Mientras no se cuente con los recursos, el presente proyecto no puede reactivarse tomando en cuenta que se encuentran pendientes las liquidaciones de los contratos de obra y fiscalización.</p>	Changoluisa Analuisa, Christian Fernando	02/08/2023 - 09:55 AM
<p>MAYO 2023</p> <p>1. El proyecto continua CONGELADO; debido a que no se asignaron recursos para el Plan Operativo Anual POA para el año 2023. Mientras no se cuente con los recursos, el presente proyecto no puede reactivarse tomando en cuenta que se encuentran pendientes las liquidaciones de los contratos de obra y fiscalización.</p>	Changoluisa Analuisa, Christian Fernando	02/08/2023 - 09:55 AM
<p>ABRIL 2023</p> <p>1. El proyecto continua CONGELADO; debido a que no se asignaron recursos para el Plan Operativo Anual POA para el año 2023. Mientras no se cuente con los recursos, el presente proyecto no puede reactivarse tomando en cuenta que se encuentran pendientes las liquidaciones de los contratos de obra y fiscalización.</p>	Changoluisa Analuisa, Christian Fernando	02/08/2023 - 09:54 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2023: 1.- La Ficha K001, continua en estado congelado, debido a que no se asignaron recursos en el POA 2023, para continuar con la ejecución del proyecto de inversión Ecuador Estratégico 2012.</p>	Changoluisa Analuisa, Christian Fernando	05/04/2023 - 03:32 PM
<p>FEBRERO 2023: 1.- La Ficha K001, continua en estado congelado, debido a que no se asignaron recursos en el POA 2023, para continuar con la ejecución del proyecto de inversión Ecuador Estratégico 2012.</p>	Changoluisa Analuisa, Christian Fernando	07/03/2023 - 09:09 AM
<p>ENERO 2023: 1.- Se remitió informe para solicitar el cambio de estado de la Ficha K001, ha estado congelado, debido a que no se asignaron recursos en el POA 2023, para continuar con la ejecución del proyecto de inversión Ecuador Estratégico 2012.</p>	Changoluisa Analuisa, Christian Fernando	07/02/2023 - 08:22 AM
<p>DICIEMBRE 2022: 1.- No se pudo cumplir con el Pago de Planilla de Liquidación para la Fiscalización de la Unidad Educativa del Milenio Nuevo los encuentros (Hito 14), debido a problemas en la solicitud de recursos por parte de territorio y el área de planificación matriz con respecto a la fuente 998, se proyecta pagar la planilla en el 2023.</p> <p>2.- Se adjunta Pago de Planilla de Liquidación para la Fiscalización de la Unidad Educativa del Milenio Nuevo el Pangui. (Hito 13).</p> <p>3.- Se adjunta Pago de Planilla No. 1, para los Estudios Preliminares y Definitivos para el Asfaltado de la vía Los Encuentros - Paquisha - San Luis Vergel, provincia de Zamora Chinchipe. (Hito 15).</p> <p>4.- Se adjunta informes para cumplimiento de indicadores correspondientes al trimestre de octubre a diciembre del proyecto de inversión Ecuador Estratégico 2012, ; informe técnico de las unidades educativas del milenio el Pangui y Los Encuentros, Acta definitiva de la Unidad Educativa el Pangui, Acta Definitiva de la Unidad Educativa Los Encuentros, Informe de convenio de pago Unidad de Milenio Nuevo Rocafuerte, Informe de convenio de pago Estudios Asfaltado vía los Encuentros - Paquisha - San Vergel.</p>	Changoluisa Analuisa, Christian Fernando	05/01/2023 - 12:17 PM
<p>NOVIEMBRE 2022: 1.- Mediante correo electrónico se remite Cedula Presupuestaria de 11 de noviembre de 2022, en la que se evidencia que existen montos programados para ser cancelados en el mes de noviembre (Anexo 10).</p> <p>2.- Mediante memorando No. MTOP-DNCFOP-2022-0503-ME, de 17 de noviembre se solicitó a la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos. La apertura de la Ficha K001, con el fin de modificar los Hitos en función de la Ejecución presupuestaria del mes de noviembre (Anexo 11) .</p> <p>3.- Se adjunta Pago de Planilla de Liquidación para la Construcción de Unidad Educativa del Milenio Nuevo Rocafuerte. (Hito 12)</p>	Changoluisa Analuisa, Christian Fernando	05/12/2022 - 08:01 PM
<p>OCTUBRE 2022: 1.- Mediante memorando No. MTOP-SOP-2022-1316-ME de 28 de septiembre de 2022, se solicitó al personal a cargo de las Direcciones que forman parte de la Subsecretaría de Obras Publicas se remita información actualizada de los contratos que se encuentran activos en las Direcciones Distritales y se encuentran a cargo del proyecto de inversión Ecuador Estratégico 2012 (Anexo 4).</p> <p>2.- En atención al requerimiento de la subsecretaría de Obras Publicas se remitió información de los contratos que se encuentran activos en las Direcciones Distritales y de los que se cuenta con documentación, mediante los siguientes memorandos, MTOP-DNPOP-2022-0614-ME; MTOP-DNCFOP-2022-0460-ME; MTOP-DNCFOP-2022-0459-ME; MTOP-DNCFOP-2022-0483-ME; MTOP-DNCFOP-2022-0470-ME.</p> <p>3.- Se adjunta Recopilación de información de los contratos - proyecto de inversión "Ecuador Estratégico 2012" (Hito 11)</p> <p>4.- Mediante memorando No. MTOP-SOP-2022-1360-ME, se solicitó, cambio de estado a CONGELADO de ficha K001, hasta la entrega de la documentación que se encuentra en las bodegas de Calderón a cargo de la Dirección Administrativa a territorio (Anexo 5).</p> <p>5.- Se remitió desde la Coordinación de Planificación la cedula presupuestaria del mes de octubre 2022, correspondiente al Proyecto de Inversión Ecuador Estratégico 2012, en el que se detalla</p>	Changoluisa Analuisa, Christian Fernando	01/11/2022 - 02:10 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>que existe fondos cargados al proyecto de inversión, se adjunta cedula presupuestaria OCT 2022 (Anexo 6).</p> <p>6.- Mediante memorando No. MTOP-SOP-2022-1423-ME, se solicitó a territorio poner en disponibilidad los fondos asignados al proyecto de inversión Ecuador Estratégico 2012, debido a que durante todo el año no existió ejecución presupuestaria, esto con el fin de proceder al cambio de estado de la ficha a congelado (Anexo 7).</p> <p>7.- Se adjunta como acción al problema para el mes de octubre, la solicitud de información de los contratos de obra pública, a las direcciones a cargo de la Subsecretaria de Obras Públicas. (Anexo 5).</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2022:</p> <p>1.- Mediante memorando No. MTOP-SOP-2022-1211-ME de 06 de septiembre de 2022, se designa como líder del proyecto para proyectos inversión Ex-SECOB y Ecuador Estratégico E.P. en la herramienta GPR, al Arq. Fernando CHANGOLUISA quien se hará cargo del proyecto de inversión, "Programa de Inversión Ecuador Estratégico 2012", a partir de la fecha de designación (Anexo 1).</p> <p>2.- Se adjunta Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado (Hito1)</p> <p>3.- Se adjunta Dictamen de prioridad (Hito 2)</p> <p>4.- Se adjunta Proyecto en SIPeIP postulado (Hito 3)</p> <p>5.- Se adjunta recursos presupuestarios asignados (Hito 4)</p> <p>6.- Se adjunta Aval aprobado. (Hito 5)</p> <p>7.- Se adjunta Términos de Referencia aprobados. (Hito 6)</p> <p>8.- Se adjunta Certificación presupuestaria aprobada. (Hito 7)</p> <p>9.- Se adjunta Adjudicación realizada. (Hito 8)</p> <p>10.- Se adjunta contrato Nro. GG-020-2013 suscrito (Hito 9)</p> <p>11.- Se adjunta Solicitud de información de los contratos - proyecto de inversión "Ecuador Estratégico 2012", a las áreas correspondientes (Hito 10)</p> <p>11.- Para la recopilación de la información de los contratos de Obra, Fiscalización y Estudios de Obra Pública, correspondientes al proyecto de inversión "Ecuador Estratégico 2012", se debe considerar, que desde el cierre de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, hasta el 17 de febrero de 2021 fecha establecida por Decreto Presidencial, para cierre de la EEEP, la Subsecretaria de Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas, recibió 23 contratos (Obra , Fiscalización y Estudios de Obra Pública), de un total de 261, contratos de Obra Pública, los contratos que no fueron recibidos por la Subsecretaria de Obras Públicas se encuentran bajo custodia de la Dirección Administrativa en las bodegas de Calderón MTOP.</p> <p>12.- Por parte de la Subsecretaria de Obras Públicas, se informa que se han realizado varias solicitudes para la entrega de información a territorio esto con el fin poder cerrar los contratos activos y establecer una realidad de los contratos manejados por la extinta Empresa Pública Ecuador Estratégico, adicionalmente se informa que hasta la presente fecha no se han entregado los saldos contables por parte del actual liquidador de EEEP. Se adjunta documentación de respaldo de las gestiones realizadas. (Hito 6).</p> <p>13.- Se adjunta como acción al problema para el mes de septiembre, la solicitud de información de los contratos de obra pública, a las áreas correspondientes. (Anexo 2).</p> <p>14.- Se Adjunta acción al Riesgo para el mes de septiembre, se adjunta solicitud de personal para el manejo del menaje documental que se encuentra en las bodegas de calderón MTOP, para entrega de expedientes a territorio. (Anexo 3).</p>	<p>Changoluisa Analuisa, Christian Fernando</p>	<p>05/10/2022 - 03:45 PM</p>

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
2	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
3	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
4	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
5	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
6	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
7	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
8	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
9	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
10	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
11	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	02/01/2012		02/01/2012		Sí	4.0
2	DEFINICIÓN: Dictamen de prioridad "Programa de Inversión Ecuador Estratégico 2012"	1-Solicitud de Información	15/06/2012		15/06/2012		Sí	4.0
3	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	4-Inicio de Trabajo	05/07/2012		05/07/2012		Sí	2.0
4	PLANEACIÓN: Recursos presupuestarios asignados.	5-Entregables Intermedios	01/08/2012		01/08/2012		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Aval aprobado.	5-Entregables Intermedios	01/11/2012		01/11/2012		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados.	5-Entregables Intermedios	13/12/2012		13/12/2012		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada.	5-Entregables Intermedios	27/12/2012		27/12/2012		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada.	5-Entregables Intermedios	28/12/2012		28/12/2012		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Contrato Nro. GG-020-2013 suscrito.	5-Entregables Intermedios	04/02/2013		04/02/2013		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Solicitud de información de los contratos - proyecto de inversión "Ecuador Estratégico 2012".	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Recopilación de información de los contratos - proyecto de inversión "Ecuador Estratégico 2012".	5-Entregables Intermedios	28/10/2022		28/10/2022		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Pago de Planilla de Liquidación para la Construcción de Unidad Educativa del Milenio Nuevo Rocafuerte.	9-Entregables Formales	30/11/2022		30/11/2022		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Pago de Planilla de Liquidación para la Fiscalización de la Unidad Educativa del Milenio Nuevo el Pangui.	9-Entregables Formales	30/12/2022		30/12/2022		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Pago de Planilla No. 1, para los Estudios Preliminares y Definitivos para el Asfaltado de la vía	9-Entregables Formales	30/12/2022		30/12/2022		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Los Encuentros - Paquisha - San Luis Vergel, provincia de Zamora Chinchipe.							
15	EJECUCIÓN: Pago de sentencia judicial Nro. 17811-2019-01296, para la construcción, ampliación y asfaltado de la vía Guayzimi - Zurmi, provincia de Zamora Chinchipe, cantón Nangaritza, parroquias Guayzimi - Zurmi.	9-Entregables Formales	31/08/2023	31/08/2023			No	5.0
16	EJECUCIÓN: Pago de Planilla de Liquidación para la Fiscalización de la Unidad Educativa del Milenio Nuevo Los Encuentros.	9-Entregables Formales	31/10/2023	31/10/2023			No	5.0
17	EJECUCIÓN: Pago de Planilla de Liquidación, para los Estudios Preliminares y Definitivos para el Asfaltado de la vía Los Encuentros - Paquisha - San Luis Vergel, provincia de Zamora	9-Entregables Formales	30/11/2023	30/11/2023			No	5.0
18	EJECUCIÓN: Pago de Planilla No. 2, para los Estudios Preliminares y Definitivos para el Asfaltado de la vía Los Encuentros - Paquisha - San Luis Vergel, provincia de Zamora Chinchipe.	9-Entregables Formales	30/11/2023	30/11/2023			No	5.0
19	CIERRE: Cambio de estado de proyecto de inversión.	9-Entregables Formales	29/12/2023	29/12/2023			No	1.0
20	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2024	31/05/2024			No	1.0
21	CIERRE: Acta de entrega recepción provisional de contratos suscritos.	5-Entregables Intermedios	31/10/2024	31/10/2024			No	1.0
22	CIERRE: Acta de entrega recepción definitiva de contratos suscritos.	5-Entregables Intermedios	29/11/2024	29/11/2024			No	1.0
23	CIERRE: Liquidación Económica.	5-Entregables Intermedios	30/04/2025	30/04/2025			No	1.0
24	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado.	9-Entregables Formales	30/06/2025	30/06/2025			No	1.0
25	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno.	9-Entregables Formales	30/09/2025	30/09/2025			No	1.0
26	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito.	9-Entregables Formales	31/10/2025	31/10/2025			No	1.0
27	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF.	9-Entregables Formales	28/11/2025	28/11/2025			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
28	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado.	9-Entregables Formales	31/12/2025	31/12/2025			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	546,837.35 **
Costo Total:	577,811.74
Total Devengado:	546,837.35
% Costo Total Devengado:	94.64 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 94.64 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	577,811.74	140,412.09	0.00	718,223.83
Ppto. Externo Planeado	577,811.74	0.00	0.00	577,811.74
Ppto. Aprobado Inicial	721,479.79	0.00	0.00	721,479.79
Ppto. Codificado	721,479.79	140,412.09	0.00	861,891.88
Ppto. Comprometido	413,779.56	140,412.09	0.00	554,191.65
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	721,479.79	140,412.09	0.00	861,891.88
Ppto. Devengado	406,425.26	140,412.09	0.00	546,837.35
Pagado Real	406,425.26	140,412.09	0.00	546,837.35
Estimado a fin de año	* 406,425.26	0.00	0.00	406,425.26
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	315,054.53	140,412.09	0.00	455,466.62
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 56.33 %	100.00 %	0.00 %	63.45 %
Ppto. Codificado 998	143,668.05	143,668.05	0.00	287,336.10
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023

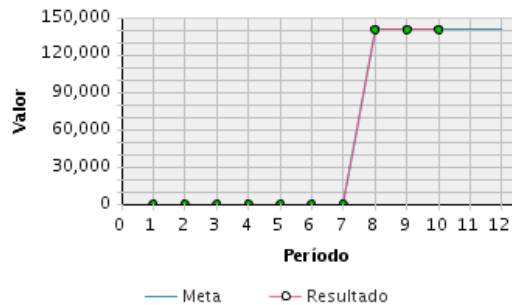

Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	140,412.09	140,412.09	140,412.09	140,412.09	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	140,412.09	140,412.09	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	140,412.09	140,412.09	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00		140,412.09				
Dic	0.00		140,412.09				
Total	140,412.09	140,412.09					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la fiscalización de los planes y proyectos de obra pública, MEDIANTE la implementación de procesos de control del cumplimiento del marco legal, normativo y cláusulas del contrato.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 1 - Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	documento_del_programa.pdf	23/09/2022
2	A.2 - Hito 2 - Dictamen de prioridad	SENPLADES-SGPBV-2014-1238-OF.pdf	23/09/2022
3	A.3 - Hito 3 - Proyecto en SIPeIP postulado	SENPLADES-SIP-2012-0393-OF.pdf	23/09/2022
4	A.4 - Hito 4 - Recursos presupuestarios asignados.	SENPLADES-SGPBV-2014-1238-OF.pdf	26/09/2022
5	A.5 - Hito 5 - Aval aprobado.	CONTRATO_GG-020-2013.pdf	28/09/2022
6	A.6 - Hito 6 - Términos de referencia aprobados.	PLIEGOS_CONTRATO_No._GG-020-2013.pdf	28/09/2022
7	A.7 - Hito 7 - Certificación presupuestaria aprobada.	CERTIFICACIÓN_PRESUPUESTARIA_CONTRATO_No._GG-020-2013.pdf	28/09/2022
8	A.8 - Hito 8 - Adjudicación realizada.	RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_CONTRATO_No._GG-020-2013.pdf	28/09/2022
9	A.9 - Hito 9 - Contrato Nro. GG-020-2013 suscrito.	CONTRATO_GG-020-2013.pdf	26/09/2022
10	B.1 - Hito 10 - Solicitud de información de los contratos - proyecto de inversión "Ecuador Estratégico 2012".	Solicitud_de_información_de_los_contratos.pdf	05/10/2022
11	B.2 - Anexo 1 - Designación líder de proyecto	MTOP-SOP-2022-1211-ME.pdf	08/09/2022
12	B.3 - Anexo 2 - Acción 1. Problema 1 septiembre 2022	MTOP-DNCFOP-2022-0448-ME.pdf	29/09/2022
13	B.4 - Anexo 3 - Acción para solventar riesgo septiembre 2022	MTOP-SOP-2022-0557-ME_-_solicitud_de_personal_a_administrativo.pdf	05/10/2022
14	B.5 - Anexo 4 - Solicitud de información contratos activos en territorio	MTOP-SOP-2022-1316-ME.pdf	31/10/2022
15	B.6 - Hito 11 - Recopilación de información de los contratos - proyecto de inversión "Ecuador Estratégico 2012".	recopilación_de_informacion_ecuador_estrategico_2012.pdf	31/10/2022
16	B.7 - Anexo 5 - solicitud de cambio de estado de ficha K001	MTOP-SOP-2022-1360-ME.pdf	31/10/2022
17	B.8 - Anexo 6 - Cedula presupuestaria octubre 2022	cedula_presupuestaria_oct_2022.pdf	31/10/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	B.9 - Anexo 7 - Solicitud de disponibilidad de recursos asignados, debido a ejecución presupuestaria nula durante el 2022	MTOP-SOP-2022-1423-ME.pdf	31/10/2022
19	C.1 - Anexo 8 - Recopilación de información de los contratos activos en territorio.	recopilación_de_informacion_ecuador_estrategico_2012.pdf	31/10/2022
20	C.2 - Hito 12 - Pago de Planilla de Liquidación para la Construcción de Unidad Educativa del Milenio Nuevo Rocafuerte.	CONVENIO_DE_PAGO_UEM_AGUARICO.PDF	02/12/2022
21	C.3 - Anexo 10 - Cedula presupuestaria mes de noviembre.	CEDULA_PRESUPUESTARIA_NOV_2022_-_Ecuador_Estrategico_2012.pdf	05/12/2022
22	C.4 - Anexo 11 - Memorando No. MTOP-DNCFOP-2022-0503-ME.	MTOP-DNCFOP-2022-0503-ME.pdf	05/12/2022
23	C.5 - Hito 13 - Pago de Planilla de Liquidación para la Fiscalización de la Unidad Educativa del Milenio Nuevo el Pangui.	Pago_planilla_de_liquidacion_UEM_el_Pangui.pdf	05/01/2023
24	C.6 - Hito 15 - Pago de Planilla No. 1, para los Estudios Preliminares y Definitivos para el Asfaltado de la vía Los Encuentros - Paquisha - San Luis Vergel, provincia de Zamora Chinchipe.	CC-GG-040-2019_convenio_de_cooperación_interinstitucional_mtop_-_gadpzh.pdf	05/01/2023
25	C.7 - Anexo 12 - Informe de solicitud de cambio de estado de ficha K001 ha Estado Congelado.	INFORME_CAMBIO_DE_ESTADO_FICHA_K001-signed-1-signed.pdf	30/01/2023
26	Designación de Líder	MTOP-DNCFOP-2023-0003-ME.pdf	21/06/2023

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Changoluisa Analuisa, Christian Fernando	Lider de proyecto	Analista de Transporte Terrestre 2	cchangoluisa@mtop.gob.ec	
Santamaria Loor, Kiura Ninoska	Subsecretaria de Obras Publicas	Subsecretaria de Obras Publicas / Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte, Encargada	ksantamaria@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
150613_1.jpg	27/09/2022
