

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de Delegaciones de los Servicios del Transporte y Obras Públicas**  
**Dirección Nacional de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad de Delegaciones**

**PROYECTO: K002 MTOP.- Estructuración de proyectos de delegaciones**

Líder del Proyecto:	Arellano Veloz, Gabriela Catalina (garellano@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cañizares Jaramillo, Ana Katherin	Programas Relacionados:	
Titular:	Marín Bravo, María Gabriela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.387864.	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,235,403.93
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/05/2023 - 31/12/2024
Fecha de última actualización:	04/09/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2024
Modificado por:	Arellano Veloz, Gabriela Catalina	Fecha del siguiente Hito:	30/08/2023

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Se orienta a desarrollar estudios a nivel de prefactibilidad y de profesionales con el expertis en el ámbito de delegación de proyectos; esto le permitirá al MTOP contar con información actualizada para evaluar la conveniencia de desarrollar los proyectos bajo un esquema de Asociación Público-Privadas (APP), y de este modo planificar el diseño, el financiamiento, la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura vial de forma ágil y oportuna que garantice a la optimización de recursos del estado con la delegación de proyectos.

Bajo este contexto, se pretende intervenir mediante un esquema de Asociaciones Público-Privadas, en los siguientes corredores viales:

1. Loja - Catamayo.
2. Quito - Guayaquil.
3. Cuenca - Guayaquil.
4. Bahía - Jama - Pedernales - Cojimíes.
5. Ambato-Baños-Puyo.

Adicionalmente, Dada la magnitud de las consultorías que se requiere contratar para las vías antes indicadas, es necesario contar con un equipo multidisciplinario de profesionales para el seguimiento del desarrollo de las consultorías.

**Beneficios Cualitativos**

La ejecución del proyecto se orienta a:

Disponer de estudios a nivel de prefactibilidad, que permita identificar las alternativas para delegar proyectos viales cuyo objeto sea el diseño, el financiamiento, la rehabilitación, el mejoramiento, la construcción, la ejecución de obras complementarias, la operación y el mantenimiento de los corredores viales bajo un esquema de Asociación Público-Privadas.

Realizar la supervisión y administración de los estudios, y la estructuración a nivel de prefactibilidad de los proyectos de infraestructura en los cinco corredores viales mediante un modelo de gestión por delegación bajo un esquema de Asociación Público-Privadas.

**Tipo de Beneficiario**

Información sólida que permita al MTOP orientar las decisiones para delegar o no proyectos viales.


**Restricciones**

Estudios y estructuración de los proyectos para el diseño, el financiamiento, la rehabilitación, el mejoramiento, la construcción, la ejecución de obras complementarias, la operación y el mantenimiento de los corredores viales orientados a evaluar la mejor alternativa de ejecutarlos bajo un esquema de asociación público-privada o contratación de obra pública tradicional. Y su supervisión.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 20.62 %  
 Fecha de Inicio: 01/05/2023 Fecha de Fin: 31/12/2024

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

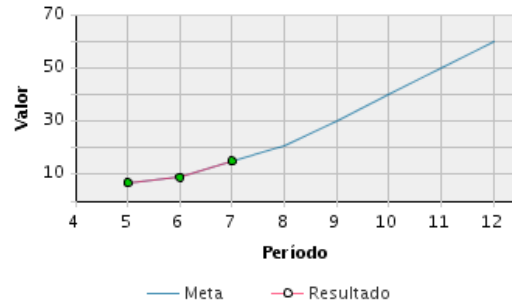

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
					7 %	9 %	15 %	21 %	30 %	40 %	50 %	60 %
	Avance real acumulado											
					7 %	9 %	15 %					
Estado												
					●	●	●					

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<b>AGOSTO 2023</b> En el mes de Agosto 2023 se contrató al equipo de supervisión que se encargará de realizar el monitoreo y control de los estudios programados, mismos que se encuentran desempeñando sus tareas.	Arellano Veloz, Gabriela Catalina	04/09/2023 - 09:42 AM
<b>JULIO 2023</b> En el mes de Julio 2023 se realizaron las gestiones para contratar al equipo de supervisión que se encargará de realizar el monitoreo y control de los estudios programados.	Arellano Veloz, Gabriela Catalina	04/08/2023 - 03:37 PM
<b>JUNIO 2023</b> Mediante el Oficio Nro. SNP-SPN-2023-0472-OF, la Secretaría Nacional de Planificación emite dictamen favorable a la modificación presupuestaria y transferencia de recursos para el proyecto. Sobre la base de este documento, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas incorporó al persupeusto institucional al proyecto Estructuración de Proyectos de Delegaciones.  En el mes se comprometió US \$ 482,223.47, para la contratación del equipo de supervisión.	Arellano Veloz, Gabriela Catalina	05/07/2023 - 11:50 AM
<b>MAYO 2023</b> El proyecto contó con el dictamende prioridad por parte de la SNP, mediante el Oficio No. SNP-SNP-SGP-2023-0082-O de 5 de mayo de 2023.	Arellano Veloz, Gabriela Catalina	05/07/2023 - 11:43 AM

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Recursos.</b> La falta de recursos del prroyecto CAUSARIA incumplimiento de las metas	26/07/2023	Gabriela Catalina Arellano Veloz	80 %	80	64	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito


**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SNP elaborado	9-Entregables Formales	02/05/2023		02/05/2023		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	9-Entregables Formales	02/05/2023		02/05/2023		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SNP emitida	9-Entregables Formales	05/05/2023		05/05/2023		Sí	2.0
4	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	9-Entregables Formales	29/06/2023		29/06/2023		Sí	2.0
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados PAI 2023	9-Entregables Formales	29/07/2023		29/07/2023		Sí	2.0
6	PLANEACIÓN: Certificación presupuestaria para la contratación del equipo de supervisión emitida	9-Entregables Formales	30/07/2023		30/07/2023		Sí	2.0
7	PLANEACIÓN: Documentos para la contratación del equipo de supervisión aprobados	9-Entregables Formales	31/07/2023		31/07/2023		Sí	2.0
8	PLANEACIÓN: Documentos para la adquisición de los equipos aprobados	9-Entregables Formales	30/08/2023	30/08/2023			No	2.0
9	PLANEACIÓN: Documentos precontractuales para la contratación consultoría para los estudios elaborados	9-Entregables Formales	30/08/2023	30/08/2023			No	2.0
10	PLANEACIÓN: Certificación presupuestaria para la contratación de la consultoría para la elaboración de los estudios emitida	9-Entregables Formales	31/08/2023	31/08/2023			No	2.0
11	PLANEACIÓN: Documentos para la contratación de la consultoría para la elaboración de los estudios aprobados por la autoridad correspondiente	9-Entregables Formales	29/09/2023	29/09/2023			No	2.0
12	PLANEACIÓN: Documentos para la contratación de la consultoría para la elaboración de los estudios aprobados por la autoridad correspondiente	5-Entregables Intermedios	29/09/2023	29/09/2023			No	2.0
13	PLANEACIÓN: Documentos para la contratación de la consultoría para la elaboración de los estudios publicada	9-Entregables Formales	30/09/2023	30/09/2023			No	5.0
14	EJECUCIÓN: Acta de adjudicación para la compra de equipos suscrita	9-Entregables Formales	30/10/2023	30/10/2023			No	5.0
15	EJECUCIÓN: Contratos equipo de supervisión suscritos	9-Entregables Formales	31/10/2023	31/10/2023			No	5.0
16	EJECUCIÓN: Informe de la Comisión Técnica relacionada	2-Publicación de Pliegos	29/11/2023	29/11/2023			No	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	con la adjudicación para la contratación de la consultoría para la elaboración de los estudios publicada							
17	EJECUCIÓN: Informe de aprobación a los productos de supervisión aprobados	9-Entregables Formales	30/11/2023	30/11/2023			No	5.0
18	EJECUCIÓN: Informe de aprobación a los productos de supervisión aprobados	9-Entregables Formales	28/12/2023	28/12/2023			No	5.0
19	EJECUCIÓN: Acta de adjudicación para la contratación de la firma consultora que elaborará los estudios, suscrita	9-Entregables Formales	29/12/2023	29/12/2023			No	5.0
20	EJECUCIÓN: Contrato para la consultoría para la elaboración de los estudios suscrito	3-Adjudicación	30/01/2024	30/01/2024			No	5.0
21	EJECUCIÓN: Informe de aprobación a los productos de supervisión aprobados	2-Publicación de Pliegos	30/01/2024	30/01/2024			No	5.0
22	EJECUCIÓN: Informe a los productos de la consultoría para la elaboración de los estudios aprobados	9-Entregables Formales	28/02/2024	28/02/2024			No	2.0
23	EJECUCIÓN: Informes de los productos de supervisión aprobados	9-Entregables Formales	28/02/2024	28/02/2024			No	5.0
24	EJECUCIÓN : Informe a los productos Finales de la consultoría para la elaboración de los estudios aprobados	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	29/12/2024	29/12/2024			No	2.0
25	EJECUCIÓN: Informes de supervisión finales aprobados	9-Entregables Formales	29/12/2024	29/12/2024			No	2.0
26	EJECUCION: Liquidación Económica aprobada	9-Entregables Formales	30/12/2024	30/12/2024			No	2.0
27	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	9-Entregables Formales	31/12/2024	29/12/2024			No	3.0
28	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	31/12/2024	31/12/2024			No	3.0
29	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	31/12/2024	31/12/2024			No	3.0
30	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	31/12/2024	31/12/2024			No	5.0
31	CIERRE: Cierre de proyecto según Informe Formato SNP aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2024	31/12/2024			No	3.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	En el año 2024 se contará con 5 estudios de prefactibilidad aprobados en su componente técnico.		-	-	-	01/10/2023	-


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,235,403.93 **
Costo Total:	694,148,787.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 0.00 %

**Perfil Económico 2023**

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	3,235,403.93	0.00	3,235,403.93
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	3,235,403.93	0.00	3,235,403.93
Ppto. Codificado	0.00	3,235,403.93	0.00	3,235,403.93
Ppto. Comprometido	0.00	482,223.47	0.00	482,223.47
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	3,235,403.93	0.00	3,235,403.93
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	3,235,403.93	0.00	3,235,403.93
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023**

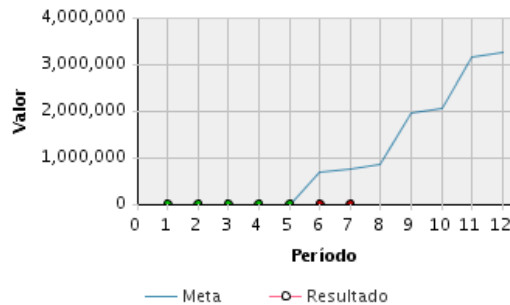

**Presupuesto Mensual 2023**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr							
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	677,168.46	0.00	677,168.46	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	78,198.40	0.00	755,366.86	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	78,198.40		833,565.26				
Sep	1,122,720.94		1,956,286.20				
Oct	78,198.40		2,034,484.60				
Nov	1,122,720.93		3,157,205.53				
Dic	78,198.40		3,235,403.93				
<b>Total</b>	<b>3,235,403.93</b>	<b>0.00</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar la estructuración de la participación del sector privado en infraestructura (operación y mantenimiento en la Red Vial Estatal) y de gestión del transporte MEDIANTE modelos de gestión sostenibles.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Designación de Líder	MTOP-SDSTOP-2023-524-ME.pdf	06/06/2023
2	A10. CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2023	387864_(2).pdf	04/08/2023
3	A2. HITO 1. Documento del proyecto, miodelo SNP elaborado	2023-05-02_08-37-19_1.ESTRUCTURACIONPROYECTOS	05/07/2023
4	A3. HITO 2. Proyecto postulado en la herramienta SIPeIP	SOLICITUD_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD_PROYECTO_EST	08/07/2023
5	A4. HITO 3 Dictamen de Prioridad	snp-snp-sgp-2023-0082-o0724572001685986262.pdf	06/06/2023
6	A5. HITO 4. Dictamen favorable de inclusión al PAI 2023 y modificación presupuestaria	snp-sgp-spn-2023-0472-of._inclusiÓn_pai_2023_estructuraciÓn.pdf	06/06/2023
7	A6. Cédula presupuestaria junio 2023	CUP_387864_Estructuración._Junio_2023.pdf	05/07/2023
8	A7. HITO 5. Proyecto con recursos económicos asignados PAI 2023	MTOP-DF-2023-1104-ME._Notificación_presupuesto_Proyecto_387864.pdf	04/08/2023
9	A8. HITO 6. Certificación presupuestaria para la contratación del equipo de supervisión emitida	MTOP-DF-2023-1162-ME._CERTIFICACIONES_PRESUPUESTARIAS._PROY_387864.pdf	04/08/2023
10	A9. HITO 7. Documentos para la contratación del equipo de supervisión aprobados	MTOP-CGJ-2023-593-ME._CONTRATOS_PERSONAL.pdf	04/08/2023

### EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Arellano Veloz, Gabriela Catalina	lider del proyecto	Especialista de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad de Delegaciones y Concesiones	garellano@mtop.gob.ec	
Marin Bravo, Maria Gabriela	Dirección	Directora Nacional de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad de Delegaciones	mgmarin@mtop.gob.ec	
