

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Tungurahua

PROYECTO: K017 MTOP - Mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua.

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto: | González Chávez, Alexandra del Rocio (argonzalez@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Gamboa López, Enma Katherine | Programas Relacionados: | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, Provincia - Tungurahua, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular: | Galarza García, Diego Fernando | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.506.3799 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 3 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 3,107,007.00 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2012 - 31/12/2018 |
| Fecha de última actualización: | 02/08/2018 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2013 |
| Modificado por: | Galarza García, Diego Fernando | Fecha del siguiente Hito: | 31/12/2018 |

DATOS GENERALES

Descripción

Producto: Mantener la red vial estatal provincial en óptimas condiciones de servicio, mediante el mantenimiento vial con la contratación de microempresas y la utilización de maquinaria de la Dirección Provincial de Tungurahua, contratación de obras de mejoramiento, señalización vial que aporten a tener un alto nivel de seguridad.

Contratistas:
 Asociación de Conservación Vial Ramo de Girasoles
 Asociación de Conservación Vial Nuevo día

Beneficios Cualitativos

El tiempo de desplazamiento se reducirá.
 El comercio va a mejorar en la provincia.
 Se va a contar con mayor seguridad vial en las carreteras.
 Se contribuye con la interconexión provincial y nacional.

Tipo de Beneficiario

- Turístico
- Industrial
- Agrícola
- Ganadero


Restricciones

La caída de ceniza volcán Tungurahua causa un mantenimiento permanente de calzada y cunetas

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.09 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

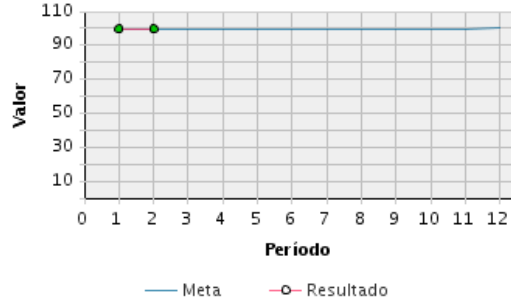

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2018 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 100 % | 100 % | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <p>JUNIO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el cuarto mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p> | Galarza García, Diego Fernando | 02/08/2018 - 10:00 PM |
| <p>JUNIO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Microempresas, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT. Está pagado el trabajo de las Asociaciones de Conservación, con planillas hasta el segundo mes, cumpliendo con le cronograma establecido.</p> | Galarza García, Diego Fernando | 05/07/2018 - 05:52 PM |
| <p>MAYO 2018:</p> <p>Actualmente se encuentran 9 Asociaciones de Conservación Vial, ejecutando trabajos demantenimiento en toda la RVE de la DDT.</p> | Galarza García, Diego Fernando | 05/06/2018 - 11:34 AM |
| <p>ABRIL 2018:</p> <p>1. Se realizó la contratación de microempresas para atender la RVE de Tungurahua en los tramos corrspondientes. 2. Los trabajos de las asociaciones de Conservación Vial, iniciaron el 2 de abril del 2018.</p> | Galarza García, Diego Fernando | 04/05/2018 - 05:19 PM |
| <p>FEBRERO 2018:</p> <p>1. Se realizó la contratación de microempresas para atender la RVE de Tungurahua en los tramos corrspondientes. 2. Lo strabajos iniciaron el 2 de abril del 2018</p> | Galarza García, Diego Fernando | 05/04/2018 - 12:38 PM |
| <p>FEBRERO 2018:</p> <p>1. El manteneiminto selo esta realizando con lepersonal del MTOP. 2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018</p> | Galarza García, Diego Fernando | 05/03/2018 - 07:23 PM |
| <p>ENERO 2018:</p> <p>1. El manteneiminto selo esta realizando con lepersonal del MTOP. 2. Se están espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018</p> | Galarza García, Diego Fernando | 05/03/2018 - 07:22 PM |
| <p>ENERO 2018:</p> <p>1. El manteneiminto selo esta realizando con lepersonal del MTOP. 2. Se están en espera de generacion de avales para proceder con la contratación de las microempresas para el 2018</p> | Galarza García, Diego Fernando | 28/02/2018 - 05:54 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>DICIEMBRE 2017: Las microempresas contratadas trabajaron en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), hasta el 29 de Diciembre del 2017.</p> | Galarza García, Diego Fernando | 05/01/2018 - 05:09 PM |
| <p>NOVIEMBRE 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza),.</p> | Galarza García, Diego Fernando | 05/12/2017 - 04:31 PM |
| <p>OCTUBRE 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p> | Galarza García, Diego Fernando | 01/11/2017 - 01:31 PM |
| <p>SEPTIEMBRE 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p> | Valencia Vasconez, Jairo David | 05/10/2017 - 06:40 PM |
| <p>AGOSTO 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p> | Valencia Vasconez, Jairo David | 05/09/2017 - 05:23 PM |
| <p>JULIO 2017: Las microempresas contratadas se encuentran trabajando en la red estatal realizando actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas.</p> | Valencia Vasconez, Jairo David | 04/08/2017 - 07:54 PM |
| <p>JUNIO 2017: Se realizó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017, y actualmente se encuentran trabajando en la red estatal.</p> | Gamboa López, Enma Katherine | 05/07/2017 - 04:38 PM |
| <p>MAYO 2017: Se realizó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017, y actualmente se encuentran trabajando en la red estatal.</p> | Gamboa López, Enma Katherine | 05/06/2017 - 04:09 PM |
| <p>ABRIL 2017: Se realizó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017</p> | Gamboa López, Enma Katherine | 05/05/2017 - 10:02 AM |
| <p>MARZO 2017: Se comenzó el proceso de contrato de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras PELILEO). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-PELILEO-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas a través del catálogo electrónico del portal de compras públicas, e iniciaran sus trabajos a partir del 3 de abril de 2017.</p> | Gamboa López, Enma Katherine | 05/04/2017 - 06:50 PM |
| <p>FEBRERO 2017:</p> | Gamboa López, Enma Katherine | 05/03/2017 - 10:18 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|----------------------------------|
| <p>No se han contratado Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que se contrataran por catalogo electrónico del portal de compras publicas, una vez que se cuente con el aval del ministerio de finanzas.</p> | | |
| <p>ENERO 2017: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas, y concluyeron sus trabajos el 15 de Enero del 2017, actualmente en recepción de los trabajos</p> | <p>Gamboa López, Enma Katherine</p> | <p>06/02/2017 - 10:16 AM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2016: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas, y concluyen sus trabajos el 15 de Enero del 2017.</p> | <p>Gamboa López, Enma Katherine</p> | <p>04/01/2017 - 06:28 PM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2016: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas, y concluyeron sus trabajos el 02 de Noviembre, actualmente en tramite de recepción de trabajos y a la espera de recursos para proceder a contratar mas microempresas</p> | <p>Gamboa López, Enma Katherine</p> | <p>05/12/2016 - 06:55 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2016: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas.</p> | <p>Sánchez Arévalo, Luis Rosendo</p> | <p>05/11/2016 - 04:30 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2016: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotaló-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas.</p> | <p>Sánchez Arévalo, Luis Rosendo</p> | <p>01/10/2016 - 02:23 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2016: Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Límite Provincial con Chimborazo- Pillate-Cotalo-Chambag y Ambato-Pelileo-Baños-Límite Provincial con Pastaza), mismas que fueron contratadas por catalogo electrónico por el portal de compras publicas.</p> | <p>Sánchez Arévalo, Luis Rosendo</p> | <p>04/09/2016 - 11:36 AM</p> |
| <p>JULIO 2016: Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Cahuaji- Pillate Cotalo), mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 01 de Junio del 2016 y rigen hasta el 30 de Junio del 2016, adicional a ello se procedio a realizar la contratación de la misma forma de dos microempresas para el trámo Pelileo- Baños- Limite provincial con Pastaza, misma que rigen hasta finales de Julio del 2016, luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado, el 15 de Julio se procedio a la compra por catalogo electronico de la microempresa Ramo de Girasol, misma que concluye su trabajo el 15 de Agosto del 2016</p> | <p>Moya Medina, Dilon German</p> | <p>03/08/2016 - 04:24 PM</p> |
| <p>JUNIO 2016: Se procedio con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). (Cahuaji- Pillate Cotalo), mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 01 de Junio del 2016 y rigen hasta el 30 de Junio del 2016, adicional a ello se procedio a realizar la contratación de la misma forma de dos microempresas para el trámo Pelileo- Baños- Limite provincial con Pastaza, misma que rigen hasta finales de Julio del 2016, luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p> | <p>Moya Medina, Dilon German</p> | <p>05/07/2016 - 05:51 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| <p>MAYO 2016: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo)., mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 22 de Abril del 2016 y rigen hasta el 24 de Mayo del 2016 Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p> | Moya Medina, Dilon German | 05/06/2016 - 05:01 PM |
| <p>ABRIL 2016: Se procedió con la contratación de Microempresas para realizar actividades de mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo)., mismas que fueron contratadas por catalogo electronico por el portal de compras publicas el 22 de Abril del 2016 y rigen hasta el 24 de Mayo del 2016 Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p> | Moya Medina, Dilon German | 05/05/2016 - 07:35 PM |
| <p>MARZO 2016: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p> | Moya Medina, Dilon German | 10/04/2016 - 08:41 PM |
| <p>FEBRERO 2016: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p> | Moya Medina, Dilon German | 04/03/2016 - 01:53 PM |
| <p>ENERO 2016: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p> | Moya Medina, Dilon German | 11/02/2016 - 04:22 PM |
| <p>DICIEMBRE 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p> | Moya Medina, Dilon German | 11/02/2016 - 04:21 PM |
| <p>NOVIEMBRE 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p> | Moya Medina, Dilon German | 06/11/2015 - 03:51 PM |
| <p>SEPTIEMBRE 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p> | Moya Medina, Dilon German | 06/11/2015 - 03:51 PM |
| <p>AGOSTO 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado.</p> | Moya Medina, Dilon German | 09/09/2015 - 03:32 PM |
| <p>JULIO 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo). Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado</p> | Moya Medina, Dilon German | 07/08/2015 - 03:40 PM |
| <p>JUNIO 2015: Se encuentra en proceso de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo).</p> | Moya Medina, Dilon German | 09/07/2015 - 02:35 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la solicitud del interesado | | |
| <p>MAYO 2015:</p> <p>Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo).</p> <p>Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la soicitud del interesado</p> <p>ABRIL 2015:</p> <p>Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo).</p> <p>Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la soicitud del interesado</p> <p>Marzo 2015:</p> <p>Se encuentra de contratación de Microempresas para mantenimiento vial de la provincia de Tungurahua. (Paso Lateral de Ambato - Redondel de Terremoto Totoras Pelileo).</p> <p>Luego de la atención del Ministerio los caminos vecinales se mantienen en buen estado previo a la soicitud del interesado</p> | Moya Medina, Dilon German | 03/06/2015 - 03:20 PM |
| DICIEMBRE 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas de coronación, roza a mano, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato, limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo | Valencia Vasconez, Jairo David | 07/01/2015 - 04:58 PM |
| NOVIEMBRE 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas de coronación, roza a mano, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato, limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo. | Valencia Vasconez, Jairo David | 05/12/2014 - 08:31 AM |
| AGOSTO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo. | Valencia Vasconez, Jairo David | 03/09/2014 - 12:16 PM |
| JULIO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo. | Valencia Vasconez, Jairo David | 08/08/2014 - 12:05 PM |
| JUNIO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo. | Sánchez Arévalo, Luis Rosendo | 09/07/2014 - 05:17 PM |
| <p>MAYO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.</p> <p>JUNIO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos, en la vía: Redondel de Terremoto a Pelileo.</p> | Sánchez Arévalo, Luis Rosendo | 08/07/2014 - 07:41 PM |
| ABRIL 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos. | Guevara Rodriguez, Luis | 30/04/2014 - 03:36 PM |
| MARZO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, | Guevara Rodriguez, Luis | 01/04/2014 - 09:13 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo | | |
| FEBRERO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo | Guevara Rodríguez, Luis | 05/03/2014 - 03:55 PM |
| ENERO 2014: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo | Guevara Rodríguez, Luis | 06/02/2014 - 09:10 AM |
| DICIEMBRE 2013: Se continua con el trabajo de dos microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo | Guevara Rodríguez, Luis | 06/02/2014 - 09:09 AM |
| Noviembre 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo | Guevara Rodríguez, Luis | 28/11/2013 - 01:45 PM |
| Octubre 2013: Se trabaja con personal y equipo de la Dirección Provincial de Tungurahua en el mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; se procedio adjudicar los procesos en el portal de compras públicas a dos Asociaciones de Conservación vial para el mantenimiento rutinario del paso lateral de Ambato y del tramo desde el redondel de Terremoto hasta Pelileo. Estos contratos inician el 1 de noviembre de 2013, el plazo es de un año. | Guevara Rodríguez, Luis | 05/11/2013 - 02:54 PM |
| Septiembre 2013: Se trabaja con personal y equipo de la Dirección Provincial de Tungurahua en el mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; se ha elevado al portal de compras públicas dos procesos para contratar Asociaciones de Conservación vial para el mantenimiento rutinario de el paso lateral de ambato y del tramo desde el redondel de terremoto hasta Pelileo. | Guevara Rodríguez, Luis | 05/11/2013 - 02:51 PM |
| Agosto 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo | Proaño Paredes, Marco Antonio | 05/09/2013 - 03:33 PM |
| Julio 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo | Proaño Paredes, Marco Antonio | 07/08/2013 - 08:58 AM |
| Julio 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo | Proaño Paredes, Marco Antonio | 07/08/2013 - 08:58 AM |
| Mayo 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo | Proaño Paredes, Marco Antonio | 04/06/2013 - 05:24 PM |
| Abril 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo | Proaño Paredes, Marco Antonio | 02/05/2013 - 11:55 AM |
| Marzo 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a | Proaño Paredes, Marco Antonio | 02/05/2013 - 11:55 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo | | |
| <p>Febrero 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo</p> | Proaño Paredes, Marco Antonio | 06/03/2013 - 03:53 PM |
| <p>Enero 2013: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo</p> | Proaño Paredes, Marco Antonio | 06/03/2013 - 03:52 PM |
| <p>Diciembre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillo</p> | Proaño Paredes, Marco Antonio | 06/03/2013 - 03:51 PM |
| <p>Noviembre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos.</p> | Proaño Paredes, Marco Antonio | 07/12/2012 - 02:25 PM |
| <p>Octubre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos.</p> <p>Septiembre 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para: la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes a mano limpieza de sumideros aceras y bordillos en el tramo Redondo de Terremoto Pelileo.</p> <p>Agosto 2012: Se trabaja con personal y Equipo de DPT en la limpieza de cunetas, , limpieza de alcantarillas, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo. Se ha contratado a través del Portal de Compras Públicas dos Asociaciones de Conservación Vial para em mantenimiento rutinario y atención de emergencias en dos tramos de la Red Vial Estatal. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta via.</p> <p>Julio 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo y culmina el contrato el 31 de julio de 2012, actualmente se elaborán los pliegos para la contratación de las microempresas por un año. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta via.</p> <p>Junio 2012: Se trabaja con 2 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo. La carretera Ambato-Guaranda a entrado en etapa de construcción a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, actualmente se da atención a esta via.</p> <p>Mayo 2012: Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a</p> | Proaño Paredes, Marco Antonio | 21/11/2012 - 09:27 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------|-------------------------------|
| <p>máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo: en la carretera Ambato - Guaranda.</p> <p>Abril 2012: Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina en el Paso lateral de Ambato; en la carretera Ambato-Pelileo: en la carretera Ambato - Guaranda.</p> <p>Marzo 2012: Se trabaja con 5 microempresas contratadas para la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Se concluye la señalización de las vías; Paso lateral de Ambato;Redondel de terremoto - Totoras;Totoras - Pelileo Tisaleo-Cevallos-Totoras y Rita Vincés.</p> <p>Febrero 2012: Se trabaja con las microempresas en la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Atención de emergencias. Se contrata señalización para las vías; Paso lateral de Ambato;Redondel de terremoto - Totoras;Totoras - Pelileo Tisaleo-Cevallos-Totoras y Rita Vincés.</p> <p>Enero 2012: Se trabaja con las microempresas en la limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, bacheo asfáltico, mantenimiento de puentes, limpieza de derrumbes a mano y a máquina. Atención de emergencias.</p> | | |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema | Fecha de última actualización | Responsable | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| Temporada Invernal | 02/08/2018 | Alexandra del Rocio González Chávez | 50 | 50 | 25 | 0/1 |

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5- PROYECTO. * General. Deslaves y derrumbes CAUSARÍA la interrupción y posible destrucción de la vía. | 02/08/2018 | Alexandra del Rocio González Chávez | 20 % | 10 | 2 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 1 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2012 | | 31/01/2012 |  | Sí | 2.0 |
| 2 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2012 | | 29/02/2012 |  | Sí | 1.0 |
| 3 | EJECUCION: Señalización vial de Tungurahua ejecutado. | 9-Entregables Formales | 15/03/2012 | | 15/03/2012 |  | Sí | 1.0 |
| 4 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2012 | | 31/03/2012 |  | Sí | 1.0 |
| 5 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2012 | | 30/04/2012 |  | Sí | 1.0 |
| 6 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2012 | | 31/05/2012 |  | Sí | 1.0 |
| 7 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2012 | | 30/06/2012 |  | Sí | 1.0 |
| 8 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2012 | | 30/07/2012 |  | Sí | 2.0 |
| 9 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2012 | | 31/08/2012 |  | Sí | 2.0 |
| 10 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2012 | | 30/09/2012 |  | Sí | 2.0 |
| 11 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2012 | | 31/10/2012 |  | Sí | 4.0 |
| 12 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2012 | | 30/11/2012 |  | Sí | 4.0 |
| 13 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2012 | | 30/12/2012 |  | Sí | 4.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 14 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2013 | | 31/01/2013 |  | Sí | 2.0 |
| 15 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2013 | | 28/02/2013 |  | Sí | 2.0 |
| 16 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2013 | | 31/03/2013 |  | Sí | 2.0 |
| 17 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2013 | | 30/04/2013 |  | Sí | 2.0 |
| 18 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2013 | | 31/05/2013 |  | Sí | 2.0 |
| 19 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2013 | | 30/06/2013 |  | Sí | 2.0 |
| 20 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 1-Solicitud de Información | 30/07/2013 | | 30/07/2013 |  | Sí | 2.0 |
| 21 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 1-Solicitud de Información | 30/08/2013 | | 30/08/2013 |  | Sí | 2.0 |
| 22 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2013 | | 30/09/2013 |  | Sí | 2.0 |
| 23 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2013 | | 30/10/2013 |  | Sí | 2.0 |
| 24 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2013 | | 30/11/2013 |  | Sí | 2.0 |
| 25 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2013 | | 30/12/2013 |  | Sí | 2.0 |
| 26 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2014 | | 31/01/2014 |  | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | | | | | | | |
| 27 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2014 | | 28/02/2014 |  | Sí | 1.0 |
| 28 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014 | | 31/03/2014 |  | Sí | 1.0 |
| 29 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014 | | 30/04/2014 |  | Sí | 1.0 |
| 30 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2014 | | 31/05/2014 |  | Sí | 1.0 |
| 31 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2014 | | 30/06/2014 |  | Sí | 1.0 |
| 32 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014 | | 31/07/2014 |  | Sí | 1.0 |
| 33 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2014 | | 31/08/2014 |  | Sí | 1.0 |
| 34 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2014 | | 30/09/2014 |  | Sí | 1.0 |
| 35 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014 | | 31/10/2014 |  | Sí | 1.0 |
| 36 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2014 | | 30/11/2014 |  | Sí | 1.0 |
| 37 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 |  | Sí | 1.0 |
| 38 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015 | | 31/01/2015 |  | Sí | 2.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | estatal de Tungurahua ejecutado. | | | | | | | |
| 39 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015 | | 28/02/2015 |  | Sí | 2.0 |
| 40 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015 | | 31/03/2015 |  | Sí | 1.0 |
| 41 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015 | | 30/04/2015 |  | Sí | 1.0 |
| 42 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2015 | | 31/05/2015 |  | Sí | 1.0 |
| 43 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | | 30/06/2015 |  | Sí | 1.0 |
| 44 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2015 | | 31/07/2015 |  | Sí | 1.0 |
| 45 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2015 | | 31/08/2015 |  | Sí | 1.0 |
| 46 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015 | | 30/09/2015 |  | Sí | 1.0 |
| 47 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2015 | | 31/10/2015 |  | Sí | 1.0 |
| 48 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015 | | 30/11/2015 |  | Sí | 1.0 |
| 49 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 31/12/2015 |  | Sí | 1.0 |
| 50 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2016 | | 31/01/2016 |  | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 51 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2016 | | 29/02/2016 |  | Sí | 1.0 |
| 52 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2016 | | 31/03/2016 |  | Sí | 1.0 |
| 53 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2016 | | 30/04/2016 |  | Sí | 1.0 |
| 54 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2016 | | 31/05/2016 |  | Sí | 1.0 |
| 55 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016 | | 30/06/2016 |  | Sí | 1.0 |
| 56 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2016 | | 31/07/2016 |  | Sí | 1.0 |
| 57 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016 | | 31/08/2016 |  | Sí | 1.0 |
| 58 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 30/09/2016 |  | Sí | 1.0 |
| 59 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016 | | 31/10/2016 |  | Sí | 1.0 |
| 60 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016 | | 30/11/2016 |  | Sí | 1.0 |
| 61 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2016 | | 31/12/2016 |  | Sí | 1.0 |
| 62 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2017 | | 31/01/2017 |  | Sí | 1.0 |
| 63 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2017 | | 28/02/2017 |  | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | | | | | | | |
| 64 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017 | | 31/03/2017 | | Sí | 1.0 |
| 65 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2017 | | 30/04/2017 | | Sí | 1.0 |
| 66 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2017 | | 31/05/2017 | | Sí | 1.0 |
| 67 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017 | | 30/06/2017 | | Sí | 1.0 |
| 68 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017 | | 31/07/2017 | | Sí | 1.0 |
| 69 | EJECUCION: El informe anual respecto al Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua elaborado. | 1-Solicitud de Información | 29/12/2017 | | 29/12/2017 | | Sí | 0.39 |
| 70 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. Fase I | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017 | | 29/12/2017 | | Sí | 0.3 |
| 71 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017 | | 29/12/2017 | | Sí | 1.0 |
| 72 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017 | | 29/12/2017 | | Sí | 1.0 |
| 73 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017 | | 29/12/2017 | | Sí | 1.0 |
| 74 | EJECUCION: Mantenimiento rutinario y atención de emergencias de la red vial estatal de Tungurahua ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017 | | 29/12/2017 | | Sí | 1.0 |
| 75 | Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I | 5-Entregables Intermedios | 15/03/2018 | | 28/02/2018 | | Sí | 0.1 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 76 | Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase II | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 0.02 |
| 77 | EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II | 9-Entregables Formales | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 0.1 |
| 78 | EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 0.01 |
| 79 | EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 0.01 |
| 80 | EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 0.01 |
| 81 | EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 0.01 |
| 82 | EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 0.01 |
| 83 | EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 0.01 |
| 84 | EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 0.01 |
| 85 | EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 0.01 |
| 86 | EJECUCION: Mantenimiento a través de microempresas, Fase II | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 0.01 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | TRABAJO EN EJECUCIÓN | Villalva Miranda, Lira De La Paz | {PR} - Provincia - TUNGURAHUA | 29/09/2014 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de mantenimiento vial tungurahua. | | 100.00 % | 44 | 44 | 01/01/2012 | Julio |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 3,107,007.00 ** |
| Costo Total: | 2,396,994.24 |
| Total Devengado: | 4,381,104.35 |
| % Costo Total Devengado: | 182.77 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 182.77 %

Perfil Económico 2018

| | Años Previos | Año Actual (2018) | Años Futuros | Total |
|---|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado | 1,832,389.62 | 0.00 | 0.00 | 1,832,389.62 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 4,040,358.42 | 2,575,000.00 | 0.00 | 6,615,358.42 |
| Ppto. Codificado | 3,671,049.49 | 3,576,484.96 | 0.00 | 7,247,534.45 |
| Ppto. Comprometido | 3,121,847.41 | 1,281,917.50 | 0.00 | 4,403,764.91 |
| Planeado - Codificado (2018) | | -3,576,484.96 | | |
| Programado a Devengar | 2,541,126.42 | 0.00 | 0.00 | 2,541,126.42 |
| Ppto. Devengado | 3,107,007.00 | 1,274,097.35 | 0.00 | 4,381,104.35 |
| Pagado Real | 1,739,420.68 | 208,654.09 | 0.00 | 1,948,074.77 |
| Estimado a fin de año | * 3,107,007.00 | 0.00 | 0.00 | 3,107,007.00 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | -565,880.58 | 0.00 | 0.00 | -565,880.58 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 122.27 % | - | 0.00 % | 172.41 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

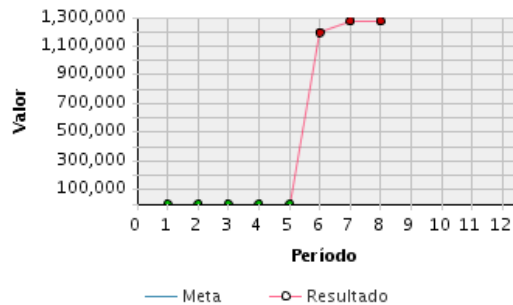

Presupuesto Mensual 2018

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 100.00 % |

| Presupuesto Mensual 2018 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 100.00 % |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 100.00 % |
| Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 100.00 % |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 100.00 % |
| Jun | 0.00 | 1,196,773.12 | 0.00 | 1,196,773.12 | 115.00 % | | 115.00 % |
| Jul | 0.00 | 77,324.23 | 0.00 | 1,274,097.35 | 115.00 % | | 115.00 % |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,097.35 | 115.00 % | | 115.00 % |
| Sep | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Total | 0.00 | 1,274,097.35 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 16 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 18 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |
| 19 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---------------------|---------------|
| 1 | A1 informe ejecutivo enero | nuevo_dia_enero.pdf | 08/01/2014 |
| 2 | A2 informe ejecutivo enero | girasoles_enero.pdf | 08/01/2014 |
| 3 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA NUEVO DÍA MAYO 2016 | A6.pdf | 05/06/2016 |
| 4 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2016 | A7.pdf | 05/06/2016 |
| 5 | Asociación de Conservación Vial Nuevo Dia Informe Ejecutivo Septiembre | nuevoDia.pdf | 10/10/2012 |
| 6 | Asociación de Conservación Vial Ramo de Girasoles Informe Ejecutivo Septiembre | GIRASOLES.pdf | 10/10/2012 |
| 7 | ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL PASO LATERAL DE AMBATO | DSC00598.JPG | 16/01/2012 |
| 8 | ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL PASO LATERAL DE AMBATO | DSC00595.JPG | 16/01/2012 |
| 9 | AYUDA MEMORIA ABRIL 2016 | A2.pdf | 11/05/2016 |
| 10 | AYUDA MEMORIA CHAUPI DICIEMBRE 2016 | D2.pdf | 04/01/2017 |
| 11 | AYUDA MEMORIA CHAUPI ENERO 2017 | D7.pdf | 06/02/2017 |
| 12 | AYUDA MEMORIA CHAUPI FEBRERO 2017 | D8.pdf | 05/03/2017 |
| 13 | AYUDA MEMORIA CHAUPI JULIO 2016 | B2.pdf | 03/08/2016 |
| 14 | AYUDA MEMORIA CHAUPI JUNIO 2017 | F3.pdf | 05/07/2017 |
| 15 | AYUDA MEMORIA CHAUPI MAYO2017 | E4.pdf | 05/06/2017 |
| 16 | AYUDA MEMORIA CHAUPI NOVIEMBRE 2016 | C8.pdf | 05/12/2016 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|-----------------------|---------------|
| 17 | AYUDA MEMORIA CHAUPI OCTUBRE 2016 | C1.pdf | 05/11/2016 |
| 18 | AYUDA MEMORIA CHAUPI SEPTIEMBRE 2016 | B9.pdf | 05/10/2016 |
| 19 | AYUDA MEMORIA NUEVO AMANECER QUISAPINCHA JUNIO 2017 | F4.pdf | 05/07/2017 |
| 20 | AYUDA MEMORIA NUEVO AMANECER QUISAPINCHA MAYO 2017 | E5.pdf | 05/06/2017 |
| 21 | AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA DICIEMBRE 2016 | D1_(2).pdf | 04/01/2017 |
| 22 | AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA ENERO 2017 | D4.pdf | 06/02/2017 |
| 23 | AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA FEBRERO 2017 | E2.pdf | 05/03/2017 |
| 24 | AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JULIO 2016 | B1.pdf | 03/08/2016 |
| 25 | AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JUNIO 2016 | A7.pdf | 05/07/2016 |
| 26 | AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA JUNIO 2017 | F1.pdf | 05/07/2017 |
| 27 | AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA MAYO 2016 | A5.pdf | 05/06/2016 |
| 28 | AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA MAYO 2017 | E6.pdf | 05/06/2017 |
| 29 | AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA NOVIEMBRE 2016 | C7.pdf | 05/12/2016 |
| 30 | AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA OCTUBRE 2016 | C2.pdf | 05/11/2016 |
| 31 | AYUDA MEMORIA NUEVO DÍA S'PTIEMBRE 2016 | B8.pdf | 05/10/2016 |
| 32 | AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES ABRIL 2017 | RAMO_DE_GIRASOLES.pdf | 05/05/2017 |
| 33 | AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES AGOSTO 2016 | B4.pdf | 05/09/2016 |
| 34 | AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES DICIEMBRE 2016 | C9.pdf | 04/01/2017 |
| 35 | AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES ENERO 2017 | D5.pdf | 06/02/2017 |
| 36 | AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES FEBRERO 2017 | D9.pdf | 05/03/2017 |
| 37 | AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JULIO 2016 | A9.pdf | 03/08/2016 |
| 38 | AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JUNIO 2016 | A8.pdf | 05/07/2016 |
| 39 | AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES JUNIO 2017 | F5.pdf | 05/07/2017 |
| 40 | AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MARZO 2017 | E3.pdf | 05/04/2017 |
| 41 | AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2016 | A6.pdf | 05/06/2016 |
| 42 | AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES MAYO 2017 | E7.pdf | 05/06/2017 |
| 43 | AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES NOVIEMBRE 2016 | C6.pdf | 05/12/2016 |
| 44 | AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES OCTUBRE 2016 | C4.pdf | 05/11/2016 |
| 45 | AYUDA MEMORIA RAMO DE GIRASOLES SEPTIEMBRE 2016 | B7.pdf | 05/10/2016 |
| 46 | AYUDA MEMORIA RIO NEGRO DICIEMBRE 2016 | D3.pdf | 04/01/2017 |
| 47 | AYUDA MEMORIA RIO NEGRO ENERO 2017 | D6.pdf | 06/02/2017 |
| 48 | AYUDA MEMORIA RIO NEGRO FEBRERO 2017 | E1.pdf | 05/03/2017 |
| 49 | AYUDA MEMORIA RIO NEGRO JULIO 2016 | B3.pdf | 03/08/2016 |
| 50 | AYUDA MEMORIA RIO NEGRO JUNIO 2017 | F6.pdf | 05/07/2017 |
| 51 | AYUDA MEMORIA RIO NEGRO MAYO 2017 | E8.pdf | 05/06/2017 |
| 52 | AYUDA MEMORIA RIO NEGRO NOVIEMBRE 2016 | C5.pdf | 05/12/2016 |
| 53 | AYUDA MEMORIA RIO NEGRO OCTUBRE 2016 | C3.pdf | 05/11/2016 |
| 54 | AYUDA MEMORIA RIO NEGRO SEPTIEMBRE 2016 | F1.pdf | 05/10/2016 |
| 55 | AYUDA MEMORIA SAHUATO A MAYO 2017 | E9.pdf | 05/06/2017 |
| 56 | AYUDA MEMORIA SAHUATO A JUNIO 2017 | F2.pdf | 05/07/2017 |
| 57 | B1 INFORME EJECUTIVO ENERO 2013 | NUEVO_DIA_ENERO.pdf | 07/03/2013 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 58 | B2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013 | nuevo_dia_febrero.pdf | 12/03/2013 |
| 59 | B3 Informe ejecutivo Abril 2013 | PASO_LATERAL_ABRIL.pdf | 02/05/2013 |
| 60 | B4 Informe ejecutivo Abril 2013 | TOTORAS-PELILEO.pdf | 02/05/2013 |
| 61 | B5 Informe ejecutivo Mayo 2013 | NUEVO_DIA_MAYO.pdf | 04/06/2013 |
| 62 | B6 Informe ejecutivo Mayo 2013 | GIRASOLES_MAYO.pdf | 04/06/2013 |
| 63 | B7 INFORME EJECUTIVO JUN 2014 Nuevo día | B7_GestiónReporte_JUN_2014.pdf | 10/07/2014 |
| 64 | B7 INFORME EJECUTIVO JUN 2014 Ramo Girasoles | B7_GestiónReporte_JUN_2014.pdf | 10/07/2014 |
| 65 | BACHEO REALIZADO EN EL PASO LATERAL DE AMBATO | DSC00505.JPG | 16/01/2012 |
| 66 | BACHEO REALIZADO EN EL PASO LATERAL DE AMBATO | DSC00508.JPG | 16/01/2012 |
| 67 | C1 Informe Ejecutivo Enero 2015 | InformeEjecutivoEnero2015.pdf | 14/04/2015 |
| 68 | C10_Informe_Ejecutivo_Octubre_2015 | C10_Informe_Ejecutivo_Octubre_2015.pdf | 06/11/2015 |
| 69 | C2 Informe Ejecutivo Febrero 2015 | InformeEjecutivoFebrero2015.pdf | 14/04/2015 |
| 70 | C6 Informe Ejecutivo JUNIO 2015 | Informe_Ejecutivo_JUNIO_2015_.pdf | 09/07/2015 |
| 71 | C7 Informe Ejecutivo JULIO 2015 | C7_Informe_Ejecutivo_JULIO_2015.pdf | 05/08/2015 |
| 72 | C7 Informe Ejecutivo JULIO 2015 | C8_Informe_Ejecutivo_AGOSTO_2015.pdf | 11/09/2015 |
| 73 | C9 Informe Ejecutivo SEPTIEMBRE 2015 | C9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2015.pdf | 07/10/2015 |
| 74 | D02_Informe_Ejecutivo_Febrero_2016 | FEBRERO_2016_.pdf | 04/03/2016 |
| 75 | HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017 | INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAN_JOSE.pdf | 05/01/2018 |
| 76 | HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017 | INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_LOS_CAMINANTES.pdf | 05/01/2018 |
| 77 | HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017 | INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_KAUSAY.pdf | 05/01/2018 |
| 78 | HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017 | INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf | 05/01/2018 |
| 79 | HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017 | INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_CHAUPI.pdf | 05/01/2018 |
| 80 | HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017 | INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_NUEVO_AMANECER_QUISAPINCHA.pdf | 05/01/2018 |
| 81 | HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017 | INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_RIO_NEGRO.pdf | 05/01/2018 |
| 82 | HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017 | INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAHUATO.A.pdf | 05/01/2018 |
| 83 | HITO 73 SITOP DICIEMBRE 2017 | INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_SAN_ANTONIO_DE_COTALO.pdf | 05/01/2018 |
| 84 | HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017 | ACV_Los_Caminates_2017.PDF | 05/12/2017 |
| 85 | HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017 | ACV_Nuevo_Amanecer_Quisapincha2017.PDF | 05/12/2017 |
| 86 | HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017 | ACV_Nuevo_Dia2017.PDF | 05/12/2017 |
| 87 | HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017 | ACV_Ramo_de_Girasoles_2017.PDF | 05/12/2017 |
| 88 | HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017 | ACV_Rio_Negro_2017.PDF | 05/12/2017 |
| 89 | HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017 | ACV_Sahuatoa_2017.PDF | 05/12/2017 |
| 90 | HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017 | ACV_San_Antonio_de_Cotalo_2017.PDF | 05/12/2017 |
| 91 | HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017 | ACV_San_Jose_2017.PDF | 05/12/2017 |
| 92 | HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017 | INFORME_EJECUTIVO_DIC-MICROEMPRESA_NUEVO_DÍA.pdf | 05/01/2018 |
| 93 | HITO 73 SITOP NOVIEMBRE 2017 | ACV_Chaupi_abril_2017.PDF | 05/12/2017 |
| 94 | HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017 | ACV_Chaupi.PDF | 05/11/2017 |
| 95 | HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017 | ACV_Nuevo_Día_.PDF | 05/11/2017 |
| 96 | HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017 | ACV_Ñukanchik_Kawsay.PDF | 05/11/2017 |
| 97 | HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017 | ACV_Ramo_de_Girasoles.PDF | 05/11/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 98 | HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017 | ACV_Río_Negro.PDF | 05/11/2017 |
| 99 | HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017 | ACV_Sahuatoa.PDF | 05/11/2017 |
| 100 | HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017 | ACV_San_Antonio_de_Cotaló.PDF | 05/11/2017 |
| 101 | HITO 73 SITOP OCTUBRE 2017 | ACV_San_José.PDF | 05/11/2017 |
| 102 | HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (CHAUPI) | Acta_entrega_recepcion_Chaupi.pdf | 05/04/2018 |
| 103 | HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (LOS CAMINANTES) | Acta_entrega_recepcion_Los_Caminantes.pdf | 05/04/2018 |
| 104 | HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (NUEVO AMANECER QUISAPINCHA) | Acta_entrega_recepcion_Nuevo_Amanecer_Quisapincha.pdf | 05/04/2018 |
| 105 | HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (NUEVO DIA) | Acta_entrega_recepcion_Nuevo_Dia.pdf | 05/04/2018 |
| 106 | HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (Ramo de Girasoles) | Acta_entrega_recepcion_Ramo_de_Girasoles.pdf | 05/04/2018 |
| 107 | HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (RIO NEGRO) | Acta_entrega_recepcion__Rio_Negro.pdf | 05/04/2018 |
| 108 | HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (SAHUATOA) | Acta_entrega_recepcion_Sahuatoa.pdf | 05/04/2018 |
| 109 | HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (San Antonio de Cotalo) | Acta_entrega_recepcion_San_Antonio_de_Cotalo.pdf | 05/04/2018 |
| 110 | HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (SAN JOSE) | Acta_entrega_recepcion_San_Jose.pdf | 05/04/2018 |
| 111 | HITO 75 Cierre: Acta d entrega de Recepción Definitiva, Realizado Fase I (Ñukanchik Kawsay) | Acta_entrega_recepcion_Ñukanchik_Kawsay.pdf | 05/04/2018 |
| 112 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013 | GestionReporteFN(24).pdf | 05/09/2013 |
| 113 | Informe ejecutivo abril 2014 | B3.-_Informe_ejecutivo.pdf | 30/04/2014 |
| 114 | Informe Ejecutivo correspondiente al mes de Julio 2013 | IE_RamoGirasoles_Julio_2013.pdf | 07/08/2013 |
| 115 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2014 | A.1.1.pdf | 11/03/2014 |
| 116 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013 | girasoles_febrero.pdf | 12/03/2013 |
| 117 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014 | A.2.1.pdf | 11/03/2014 |
| 118 | Informe Ejecutivo julio 2014 | InformeEjecutivo_julio_2014.pdf | 01/08/2014 |
| 119 | INFORME EJECUTIVO JUNIO PASO LATERAL | paso_junio.pdf | 08/07/2013 |
| 120 | Informe ejecutivo marzo 14 | A3._Informe_ejecutivo_marzo14.pdf | 07/04/2014 |
| 121 | Informe ejecutivo microempresas abril 2012. | INforme_ejecutivo_micro_abril.pdf | 08/06/2012 |
| 122 | INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESAS ENERO 2012 | INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_ENE-2012.pdf | 16/03/2012 |
| 123 | INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESAS FEBRERO 2012 | INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_FEB-2012.pdf | 16/03/2012 |
| 124 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE | conse_novie.pdf | 10/12/2012 |
| 125 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2 | conv_nuev.pdf | 10/12/2012 |
| 126 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE | informe_octu_gi.pdf | 22/11/2012 |
| 127 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE NUEVO DIA | informe_octubre_nuevo.pdf | 22/11/2012 |
| 128 | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESTATAL REALIZADO EN EL MES AGOSTOO 2015 | PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_AGOSTO_2015_GPR_17092015 | 07/08/2015 |
| 129 | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESTATAL REALIZADO PARA EN EL MES JULIO 2015. | PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_JULIO_2015_GPR_17082015 | 07/08/2015 |
| 130 | MICROEMPRESA CHAUPI JULIO 2017 | MICRO_CHAUPI_JULIO_201718220.pdf | 30/08/2017 |
| 131 | MICROEMPRESA NUEVO AMANECER JULIO 2017 | NUEVO_AMANECER_JULIO_2017_-_18235.pdf | 30/08/2017 |
| 132 | MICROEMPRESA NUEVO DIA JULIO 2017 | MICRO_NUEVO_DIA_JULIO_2017_-_17932.pdf | 30/08/2017 |
| 133 | MICROEMPRESA RAMO DE GIRASOLES JULIO 2017 | RAMO_DE_GIRASOLES_JULIO_2017_-_18216.pdf | 30/08/2017 |
| 134 | MICROEMPRESA RIO NEGRO JULIO 2017 | RIO_NEGRO_JULIO_2017-_18237.pdf | 30/08/2017 |
| 135 | MICROEMPRESA SAHUATOA JULIO 2017 | SAHUATOA_JULIO_2017_-_18238.pdf | 30/08/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| 136 | NUEVO DIA JULIO 2017 | 17932.pdf | 04/08/2017 |
| 137 | ORDEN DE COMPRA NUEVO DIA | A3.pdf | 11/05/2016 |
| 138 | ORDEN DE COMPRA NUEVO DIA | A9.pdf | 05/07/2016 |
| 139 | ORDEN DE COMPRA RAMO DE GIRASOL | A4.pdf | 11/05/2016 |
| 140 | ORDEN DE COMPRA RAMO DE GIRASOLES | B1.pdf | 05/07/2016 |
| 141 | REPORTE ESIGEF JULIO 2016 | B6.pdf | 05/08/2016 |
| 142 | REPORTE ESIGEF JUNIO 2016 | B5.pdf | 05/08/2016 |
| 143 | REPORTE ESIGEF MAYO 2016 | B4.pdf | 05/08/2016 |
| 144 | SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 1 | SAN_JOSE.pdf | 05/10/2017 |
| 145 | SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 10 | NUEVO_DIA.pdf | 05/10/2017 |
| 146 | SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 2 | ÑUKANCHIK_KAWSAY.pdf | 05/10/2017 |
| 147 | SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 3 | LOS_CAMINANTES.pdf | 05/10/2017 |
| 148 | SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 4 | COTALO.pdf | 05/10/2017 |
| 149 | SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 5 | SAHUATOA.pdf | 05/10/2017 |
| 150 | SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 6 | RIO_NEGRO.pdf | 05/10/2017 |
| 151 | SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 8 | CHAUPI.pdf | 05/10/2017 |
| 152 | SITOP SEPTIEMBRE 2017 MICRO 9 | RAMO_DE_GIRASOLES.pdf | 05/10/2017 |
| 153 | T- INFORME EJECUTIVO MES DE AGOSTO RAMO DE GIRASOL | INFORME_EJECUTIVO-planilla_10.GIRASOLES.pdf | 01/09/2014 |
| 154 | T2- INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE MICROEMPRESA RAMO DE GIRASOLES | INF._EJECUTIVO._11.SEPT.girasoles.pdf | 06/10/2014 |
| 155 | T3- microempresa ramo de girasoles, septiembre 2014 | INF._EJECUTIVO._11.SEPT.girasoles.pdf | 06/10/2014 |
| 156 | T4- Informe Ejecutivo de la Microempresa del mes de Octubre 2014 | INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_microempresa_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf | 05/10/2014 |
| 157 | T5- Mantenimiento Vial de la Microempresa Ramo de Girasoles-Noviembre 2014 | Noviembre_Microempresas_RAMO_DE_GIRASOLES.pdf | 05/12/2014 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-------------|
| Valencia Vásquez, Jairo David | Director Provincial | Director | jvalencia@mtop.gob.ec | |
| GAMBOA LÓPEZ, ENMA KATHERINE | Lider técnico | Coordinadora de Infraestructura Provincial (E) | egambo@mtop.gob.ec | 0992606859 |
| Paula López, Ricardo Octavio | Subsecretario Regional 3 | Subsecretario de Infraestructura del Transporte | rpaula@mtop.gob.ec | 023974600 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 30442_1.jpg | 04/09/2016 |
