

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Loja

PROYECTO: K013 MTOP.- Mantenimiento vial de la Provincia de Loja

Líder del Proyecto:	Ochoa Cueva, Santiago Fernando (sochoa@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA, Provincia - Loja, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Rojas Cazar, Walter Emilio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3855	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	29,763,591.34
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2011 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	27/08/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: Bajo esta partida se detallara todas aquellas obras que sirven para dar el mantenimiento a todas las obras de la red vial estatal de la provincia asi como aquellas instalaciones que son parte del MTOP - Loja..

Microempresa CAMINOS DEL SUR, encargada del mantenimiento rutinario de la carretera Loja-Malacatos-Vilcabamba

Microempresa EL PORVENIR, encargada del mantenimiento rutinario de la carretera Loja-Catamayo-Aeropuerto.

Microempresa ASOCENEN, encargada del mantenimiento rutinario de la carretera Loja-Oña, Tramo Loja-Santiago

Microempresa ACAMINOS, encargada del mantenimiento rutinario de la carretera Loja-Oña, Tramo Santiago-Saraguro

Microempresa URDANETA, encargada del mantenimiento rutinario de la carretera Loja-Oña, Tramo Saraguro-Oña

Microempresa América

Microempresa San Roque

Microempresa Los Tigres del Camino

Microempresa Sabiango

Mantenimiento Emergente de la carretera Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará. Ing Pio Cueva

Senalización de la carretera Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará. PEXSOT

Mantenimiento y Obras Emergentes de la Carretera Loja-Malcatos-Vilcabamba

Plan emergente para la transitabilidad de la Red Vial Rural de la provincia de Loja (VIALSUR).

LINEA BASE: Este programa permite dar mantenimiento a las diferentes vías de la Red Vial estatal de la Provincia de Loja, por administración directa y bajo la contratación de microempresas, así mismo permito intervenir en emergencias, se ejecutan trabajos de limpieza de derrumbos, alcantarillas, roza a mano, bacheo con mezcla asfáltica, tre otros, reposición de señalización (colocación de tachas).

PRODUCTO/SERVICIO: Garantizar una red de Transporte seguro y competitivo.

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado en una red de Transporte con estándares internacionales de calidad, alineados con las directrices económicas, sociales, medioambientales y el plan nacional de desarrollo.


OBJETIVO ESPECIFICOS: Mejorar la calidad en la vialidad, en beneficio de las diferentes comunidades, ofreciendo un mejor servicio en la transportación y movilidad, así como la seguridad en la transportación, beneficios en el desarrollo de las comunidades y por ende del País, permitir la comunicación interprovincial, regional e internacional.

Beneficios Cualitativos
Conservación de la red vial estatal de la provincia de Loja, lo cual mejorar la transitabilidad para los usuarios de la red vial.
Tipo de Beneficiario
Agrícola, ganadero, turístico y comercial.
Restricciones
Contratos Legalizados de Microempresas. Para la ejecución de este programa se planifica el presupuesto y cronograma de las actividades a realizarse anualmente, a fin de brindar una mejor transitabilidad, disminución en el tiempo de traslado y seguridad a lo usuarios que transitan en la Red Vial Estatal.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 76.70 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

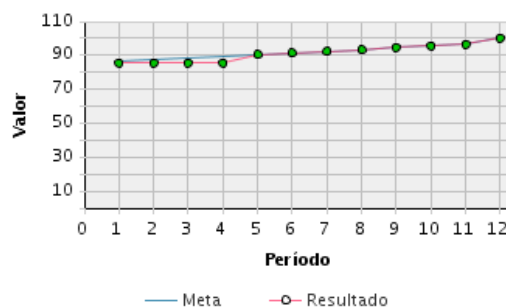

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	86 %	88 %	88 %	90 %	90 %	92 %	92 %	94 %	94 %	96 %	96 %	100 %
	Avance real acumulado											
	86 %	86 %	86 %	86 %	90 %	92 %	92 %	94 %	94 %	96 %	96 %	100 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro. Continúan los trabajos con 13 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías. Se realizó atención emergente por estación invernal de limpieza en deslizamiento en vía Yangana - Limite Provincial. Se realizó mantenimiento con lastrado de fallas (puntos críticos) y bacheo asfáltico en las siguientes vías: Loja - Vilcabamba, Loja, Saraguro, Paso lateral de Loja.	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	03/08/2018 - 12:03 PM
Junio 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro. Se inician trabajos con 11 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	05/07/2018 - 12:35 PM
Mayo 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro. Se inician trabajos con 11 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.	Ortega Pardo, Jorge Alberto	05/06/2018 - 09:01 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Por administración directa se realiza el desalojo del material de derrumbo en la el tramo de vía Vilcabamba-Yangana-Sabanilla, sector Lambonuna. Se realizó bacheo menor en la vía Loja-Catamayo, a lo largo del eje.		
Abril 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro, Se inician trabajos con 11 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías. Por administración directa se realiza el desalojo del material de derrumbo en la el tramo de vía Vilcabamba-Yangana-Sabanilla, sector Lambonuna. Se realizó bacheo mayor en la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, sector San Predo de Vilcabamba.	Ortega Pardo, Jorge Alberto	04/05/2018 - 02:52 PM
Marzo 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes se contrataron 11 Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	13/04/2018 - 10:31 PM
Marzo 2017 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	02/04/2018 - 10:07 PM
Diciembre 2017 Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	12/01/2018 - 02:25 PM
Noviembre 2017 Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	04/12/2017 - 08:36 PM
Octubre 2017 Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	01/11/2017 - 08:52 AM
Septiembre 2017 Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	03/10/2017 - 08:38 PM
Septiembre 2017 Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	18/09/2017 - 09:21 PM
julio 2017 Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Vega Silva, Andrea Karla	08/08/2017 - 01:04 PM
junio 2017 Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto,	Vega Silva, Andrea Karla	08/08/2017 - 01:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.		
mayo 2017 Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Vega Silva, Andrea Karla	08/08/2017 - 01:01 PM
abril 2017 Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación	Ocampo Veintimilla, Danny Andrei	05/05/2017 - 10:04 AM
MARZO 2017 Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación FEBRERO 2017 Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación	Ocampo Veintimilla, Danny Andrei	05/05/2017 - 10:04 AM
Enero 2017.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación	Aguilar Cárdenas, Diego Fabián	08/02/2017 - 10:27 AM
Diciembre 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Con fecha 08 de Noviembre de 2016 se contrató la Asociación de Conservación vial Virgen de los Remedios; Caminos del Sur; Asocenen, y con fecha 14 de Noviembre de 2016, se contrata la Asociación "El Porvenir" para la vía Loja-Catamayo-Aeropuerto.	Aguilar Cárdenas, Diego Fabián	31/01/2017 - 08:03 AM
Noviembre 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Con fecha 08 de Noviembre de 2016 se contrató la Asociación de Conservación vial Virgen de los Remedios; Caminos del Sur; Asocenen, y con fecha 14 de Noviembre de 2016, se contrata la Asociación "El Porvenir" para la vía Loja-Catamayo-Aeropuerto.	Aguilar Cárdenas, Diego Fabián	07/12/2016 - 10:43 AM
Agosto 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Con fecha 02 de Agosto de 2016 se contrató la Asociación de Conservación vial EL PORVENIR, y con fecha 26 de Agosto se contrata las Asociaciones "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.	Aguilar Cárdenas, Diego Fabián	09/09/2016 - 11:38 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Julio 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Con fecha 20 de julio de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Camino del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.</p>	Aguilar Cárdenas, Diego Fabián	04/08/2016 - 03:13 PM
<p>Junio 2016.- Con escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Con fecha 10 de junio de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Camino del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.</p>	Aguilar Cárdenas, Diego Fabián	12/07/2016 - 05:25 PM
<p>Mayo 2016.- Con escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Con fecha 09 de mayo de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Camino del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "El Porvenir" para la vía Loja - Catamayo - Aeropuerto, Asociación "Divino Niño" para la vía Puente P'layas - Empalme y Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.</p>	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	03/06/2016 - 04:34 PM
<p>Abril 2016.- Con escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Con fecha 04 de abril de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Camino del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba y la Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor.</p>	Bustamante Criollo, Lider Efrain	05/05/2016 - 11:25 AM
<p>Marzo 2016.- Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña. Es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas.</p>	Bustamante Criollo, Lider Efrain	05/05/2016 - 11:12 AM
<p>Febrero 2016.- Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña. Es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas.</p> <p>Enero 2016.- Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña. Es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas.</p>	Bustamante Criollo, Lider Efrain	06/03/2016 - 11:09 AM
<p>Diciembre 2015.-Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. Se continúa con el mantenimiento rutinario y emergente con el apoyo la la Microempresa URDANETA de la vía Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro-Oña.</p>	Bustamante Criollo, Lider Efrain	05/01/2016 - 03:55 PM
<p>Noviembre 2015.-Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes, con el apoyo de las tres asociaciones de conservación vial de la vía Loja-Saraguro-Oña.</p>	Bustamante Criollo, Lider Efrain	10/12/2015 - 09:24 AM
<p>Octubre 2015.-Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes, con el apoyo de las tres asociaciones de conservación vial de la vía Loja-Saraguro-Oña.</p>	Bustamante Criollo, Lider Efrain	10/12/2015 - 09:23 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Septiembre 2015.- Con fecha 22 de septiembre de 2015 se concluyó el contrato con las Asociaciones de Conservación de microempresas de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes, con personal y equipo del MTOP-Loja , distribuidas en las vías antes señaladas. Se realiza el mantenimiento rutinario con el apoyo de las tres asociaciones de conservación vial de la vía Loja-Saraguro-Oña.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	07/10/2015 - 02:16 PM
AGOSTO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas. Con fecha 23 de agosto de 2015 se suscribe un contrato complementario con la Asociación de Conservación Vial "URDANETA", encargada del mantenimiento de la vía Loja-Oña, tramo Saraguro-Oña	Bustamante Criollo, Lider Efrain	07/09/2015 - 10:40 AM
JULIO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	11/08/2015 - 09:25 AM
JUNIO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	16/07/2015 - 11:02 AM
MAYO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas. La rigurosa estación invernal que soporta el país y en especial la provincia de Loja trae como consecuencia la desestabilización de los taludes, ocasionando grandes derrumbos los mismos que se acumulan en la calzada de la vía lo que dificulta el tránsito vehicular, ante ello el MTOP-Loja atiende con la celeridad del caso los diferentes eventos adversos que se presentan en las carreteras a cargo de la Dirección Provincial de Loja.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	01/07/2015 - 09:56 AM
ABRIL 2015.- La fuerte temporal invernal que soporta el país y en especial la provincia de Loja, ha incidido para que las vías de la RVE sufran deterioro ocasionando la desestabilización de taludes con presencia de grandes flujos de lodo, desprendimiento de piedras, taponamiento de alcantarillas y cunetas. El MTOP de Loja con su personal, maquinaria y microempresas ha estado interviniendo en las vías Loja-Malacatos-Vilcabamba; Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Saraguro-Oña y Loja-Limite Provincial con Zamora, durante este mes se ha trabajado en forma ininterrumpida con la finalidad de mantener las vías en condiciones aceptables para el libre tránsito vehicular.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	08/06/2015 - 02:29 PM
MARZO 2015.- La fuerte temporal invernal que soporta el país y en especial la provincia de Loja, ha incidido para que las vías de la RVE sufran deterioro ocasionando la desestabilización de taludes con presencia de grandes flujos de lodo, desprendimiento de piedras, taponamiento de alcantarillas y cunetas. El MTOP de Loja con su personal y maquinaria ha estado interviniendo en las vías Loja-Malacatos-Vilcabamba; Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Saraguro-Oña y Loja-Limite Provincial con Zamora, durante este mes se ha trabajado en forma ininterrumpida con la finalidad de mantener las vías en condiciones aceptables para el libre tránsito vehicular.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	06/05/2015 - 01:53 PM
Febrero 2015.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. y con las 3 Asociaciones de Conservación Vial para realizar el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. Con fecha 15 de enero de 2015, se suscribe los contratos con las Asociaciones Social de Protección Mantenimiento y Mejoramiento Vial ASOCENEN y ABRIENDO CAMINOS, cuya finalidad es realizar el mantenimiento rutinario y emergentes de la carretera Loja-Saraguro-Oña, tramo Loja-Santiago; y Santiago-Saraguro respectivamente, que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	07/04/2015 - 10:12 AM
Diciembre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. y con las 3 Asociaciones de Conservación Vial para realizar el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	10/02/2015 - 03:42 PM
Noviembre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. Con fecha 22 de septiembre de 2014, se suscribe un nuevo contrato con 3 Asociaciones de Conservación Vial para dar continuidad con el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	08/12/2014 - 08:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.		
Octubre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. Con fecha 22 de septiembre de 2014, se suscribe un nuevo contrato con 3 Asociaciones de Conservación Vial para dar continuidad con el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	08/12/2014 - 08:56 AM
Septiembre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. Con fecha 22 de septiembre de 2014, se suscribe un nuevo contrato con 3 Asociaciones de Conservación Vial para dar continuidad con el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	09/10/2014 - 09:38 AM
Agost 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 2 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; la vía Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga- Macará, está contratada con al Empresa Sinohydro Cia. Ltda. Esta en proceso de contratación las microempresas necesarias para el mantenimiento rutinario y emergente de la carretera Loja-Saraguro-Oña, que mediante memorando MTOP-DPL-2014-1389.ME , del 31 de julio de 2014, suscrito por el Ing. Angel Paredes Ex Director Provincial dispone asumir el mantenimiento de la carretera Loja-Saraguro-Oña que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	08/09/2014 - 04:11 PM
Julio 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	05/08/2014 - 02:27 PM
Junio 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/07/2014 - 10:43 PM
Mayo 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/07/2014 - 10:42 PM
Mayo 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará. No se asignan los recursos solicitados con la debida oportunidad para la adquisición de filtros y repuestos que son necesarios para el buen funcionamiento de volquetes y maquinaria del MTOP-Loja. Adicionalmente se ha solicitado los recursos para un nuevo proceso de contratación de las Asociaciones de Conservación Vial cuyo plazo finaliza el 04 de junio del 2014 sin tener hasta la presente fecha respuesta favorable.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	03/06/2014 - 10:23 PM
Abril 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	07/05/2014 - 09:05 AM
Marzo 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/04/2014 - 04:42 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará.		
Febrero 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	08/03/2014 - 01:28 PM
Enero 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará.	Ramon Bustamante, Victor Manuel	09/02/2014 - 12:35 PM
DICIEMBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, bacheo de lastre a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto.	Villavicencio Garcia, Israel Vinicio	06/01/2014 - 11:01 PM
NOVIEMBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, bacheo de lastre a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	06/12/2013 - 09:29 AM
OCTUBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto.	Carrión Rojas, Hernán	04/11/2013 - 04:00 PM
SEPTIEMBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto.	Carrión Rojas, Hernán	05/10/2013 - 10:10 PM
AGOSTO 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo.	Carrión Rojas, Hernán	10/09/2013 - 09:07 PM
JULIO 2013.- Se incorpora una microempresa en la vía Loja-Catamayo. Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará, y Loja-Catamayo.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	04/09/2013 - 02:17 PM
Junio 2013: Se incorpora una microempresa en el tramo Loja-Catamayo. Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Macará, y Loja-Catamayo. Mayo 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Macará. Abril 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Macará.	Carrión Rojas, Hernán	06/07/2013 - 11:31 AM
Marzo 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico,	Carrión Rojas, Hernán	16/04/2013 - 11:03 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará. Además se realizan trabajos emergentes en la vía Loja-Catamayo km. 23+600 construyendo una variante en una longitud de 300m que permitio dar transitabilidad a los vehículos que transitan por la vía. (mov. de tierras, colocacion de material de sub base y trabajos preliminares de base). Febrero 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará. Enero 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará. Julio-Diciembre 2012 Se carga respaldo de resúmenes ejecutivos meses Julio - Diciembre 2012, en archivos anexos Enero - Junio 2012 Se carga respaldo de resúmenes ejecutivos meses enero - junio 2012, en archivos anexos</p>		

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
2	Zona 7 - Sur > Loja > Calvas
3	Zona 7 - Sur > Loja > Catamayo
4	Zona 7 - Sur > Loja > Gonzanama
5	Zona 7 - Sur > Loja > Sozoranga

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), enero a diciembre 2011, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2011		31/12/2011		Sí	2.0
2	CIERRE: Actas de recepción de trabajos de microempresas por periodo marzo-2011 a febrero 2012	9-Entregables Formales	15/04/2012		15/04/2012		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), primer cuatrimestre 2012 ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2012		30/04/2012		Sí	1.0
4	Ejecución: Contratos suscritos con microempresas periodo junio 2012-junio 2013	4-Inicio de Trabajo	05/06/2012		05/06/2012		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), segundo cuatrimestre 2012 ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2012		31/08/2012		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), tercer cuatrimestre 2012 ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), primer trimestre 2013 ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), segundo trimestre 2013, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.5
9	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), tercer trimestre 2013, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.5
10	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), cuarto trimestre 2013, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.5
11	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de enero 2014, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de febrero 2014, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de marzo 2014, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de abril 2014, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de mayo 2014, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de junio 2014, ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de julio 2014, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de agosto 2014, ejecutado.							
19	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), el mes de septiembre 2014, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de octubre 2014, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de noviembre 2014, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de diciembre 2014, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario ejecutado (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de enero 2015.	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de febrero 2015, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de marzo 2015, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de abril 2015, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de mayo 2015, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de junio 2015, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de julio 2015, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	derrumbos), en el mes de agosto 2015, ejecutado.							
31	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de septiembre 2015, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	2.0
32	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de octubre 2015, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	2.0
33	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de noviembre 2015, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	2.0
34	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de diciembre 2015, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
35	CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo enero-diciembre 2015	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/01/2016		31/01/2016		Sí	2.0
36	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de enero 2016, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	12.0
37	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de febrero 2016, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	2.0
38	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de marzo 2016, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de abril 2016, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de mayo 2016, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de junio 2016, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.0
42	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de julio 2016, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
43	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de agosto 2016, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	2.0
44	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de septiembre 2016, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	2.0
45	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de octubre 2016, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	2.0
46	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de noviembre 2016, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	2.0
47	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de diciembre 2016, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	2.0
48	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de enero 2017, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		30/05/2017		Sí	1.0
49	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de febrero 2017, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		30/05/2017		Sí	1.0
50	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de marzo 2017, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		30/05/2017		Sí	1.0
51	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de abril 2017, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/05/2017		Sí	1.0
52	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de mayo 2017, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/05/2017		30/05/2017		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de junio 2017, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	1.0
54	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de julio 2017, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	1.0
55	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de agosto 2017, ejecutado.							
56	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de septiembre 2017, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	1.0
57	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de octubre 2017, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	1.0
58	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de noviembre 2017, ejecutado.	4-Inicio de Trabajo	30/11/2017		30/11/2017		Sí	1.0
59	CIERRE : Pago liquidación realizado	9-Entregables Formales	31/12/2017		31/12/2017		Sí	2.5
60	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de diciembre 2017, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Mantenimiento vial avanza	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/12/2016
2	Mantenimiento vial avanza	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/10/2016
3	Mantenimiento vial avanza con dificultades	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/07/2016
4	Mantenimiento vial avanza con dificultades	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/03/2016
5	Mantenimiento vial avanza satisfactoriamente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	23/11/2015
6	Mantenimiento vial avance del 90,33%, supervisión positiva	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/08/2015
7	Supervisión positiva, 42% de avance de conservación vial.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	15/06/2015
8	Recorrido vía Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga, Sozoranga-Macará	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	29/07/2014
9	Mantenimiento vial de la Provincia de Loja	Torres Paz, Marcelo Vinicio	{PR} - Provincia - LOJA	26/09/2013
10	Historico - El avance físico es del 3%, mientras que el económico no se reporta por el MTOP. Muestra un amplio retraso puesto que de 6 meses de plazo han transcurrido 2 meses y no muestra un avan	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	03/08/2012
11	Historico - El avance físico es del 3%, mientras que el económico no se reporta por el MTOP.	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	17/07/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Pocentaje de trabajos de mantenimiento vial ejecutado		112.50 %	0.8	0.9	01/01/2011	Diciembre

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	29,763,591.34 **
Costo Total:	10,794,343.67
Total Devengado:	15,445,523.76
% Costo Total Devengado:	143.09 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 143.09 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	10,240,497.44	1,225,597.57	15,851,217.10	27,317,312.11
Ppto. Externo Planeado	1,976,046.36	0.00	0.00	1,976,046.36
Ppto. Aprobado Inicial	13,891,350.09	1,796,876.04	4,470,373.70	20,158,599.83
Ppto. Codificado	19,267,988.61	1,675,780.79	15,929,685.00	36,873,454.40
Ppto. Comprometido	16,555,448.39	1,016,489.51	1,624,172.31	19,196,110.21
Planeado - Codificado (2017)		-450,183.22		
Programado a Devengar	12,020,492.81	869,803.28	15,562,883.31	28,453,179.40
Ppto. Devengado	13,042,570.96	1,009,207.35	1,393,745.45	15,445,523.76
Pagado Real	4,619,766.60	970,158.49	910,750.63	6,500,675.72
Estimado a fin de año	* 13,042,570.96	0.00	0.00	13,042,570.96
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-1,022,078.15	869,803.28	15,562,883.31	15,410,608.44
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 108.50 %	116.03 %	8.96 %	54.28 %
Ppto. Codificado 998	1,984,766.96	16,357.60	0.00	2,001,124.56
Ppto. Devengado 998	1,942,999.50	16,357.60	0.00	1,959,357.10

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

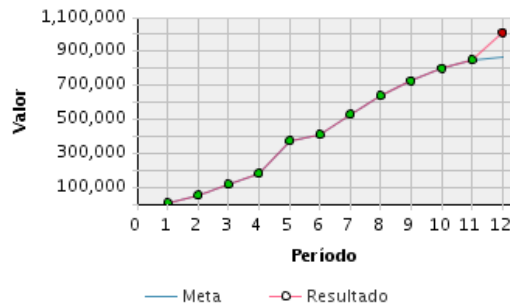

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	4,826.52	4,826.52	4,826.52	4,826.52	100.00 %	●	0.55 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	47,509.24	47,509.24	52,335.76	52,335.76	100.00 %		6.02 %
Mar	62,363.41	62,363.41	114,699.17	114,699.17	100.00 %		13.19 %
Abr	67,588.81	67,588.81	182,287.98	182,287.98	100.00 %		20.96 %
May	192,104.37	192,104.37	374,392.35	374,392.35	100.00 %		43.04 %
Jun	36,528.36	36,528.36	410,920.71	410,920.71	100.00 %		47.24 %
Jul	118,805.97	118,805.97	529,726.68	529,726.68	100.00 %		60.90 %
Ago	108,042.78	108,042.78	637,769.46	637,769.46	100.00 %		73.32 %
Sep	88,670.10	88,670.10	726,439.56	726,439.56	100.00 %		83.52 %
Oct	74,254.55	74,254.55	800,694.11	800,694.11	100.00 %		92.05 %
Nov	51,590.59	51,590.59	852,284.70	852,284.70	100.00 %		97.99 %
Dic	17,518.58	156,922.65	869,803.28	1,009,207.35	116.03 %		116.03 %
Total	869,803.28	1,009,207.35					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
10	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
11	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Informe ejecutivo microempresas junio 2012	Infor-ejecutivo_Microempresas_Junio-2012.zip	15/09/2014
2	A.2 Informe ejecutivo microempresas julio 2012	Infor-ejecutivo_Microempresas_Julio-2012.zip	15/09/2014
3	A.3 Informe ejecutivo microempresas agosto-2012	Infor-ejecutivo_Microempresas_Agosto-2012.zip	15/09/2014
4	A.4 Informe ejecutivo microempresas septiembre 2012	Infor-ejecutivo_Microempresas_Septiembre-2012.zip	15/09/2014
5	A.5 Informe ejecutivo microempresas Octubre-2012	Infor-ejecutivo_Microempresas_Octubre-2012.zip	17/09/2014
6	A.6 Informe ejecutivo microempresas nov-2012	Infor-ejecutivo_microempresas_nov-2012.zip	17/09/2014
7	A.7 Informe ejecutivo microempresas dic-2012	Infor-ejecutivo_microempresas_dic-2012.zip	17/09/2014
8	Actas Microempresas período 2013-2014	ACTAS_Microempresas.zip	06/10/2014
9	Actas Recepción definitiva microempresas período 2014-2015	Actas_Recepción_definitiva_Microempresas.zip	23/02/2016
10	B.1 Informe ejecutivo microempresas enero-2013	Infor-ejecutivo_microempresas_enero-2013.zip	17/09/2014
11	B.2 Informe ejecutivo microempresas feb-2013	Infor-ejecutivo_microempresas_feb-2013.zip	17/09/2014
12	B.3 Informe ejecutivo microempresas marzo-2013	Infor-ejecutivo_microempresas_marzo-2013.zip	17/09/2014
13	B.4 Informe ejecutivo microempresas abril-2013	Infor-ejecutivo_microempresas_abril-2013.zip	17/09/2014
14	B.5 Informe ejecutivo microempresas mayo 2013	Infor-ejecutivo_microempresas_mayo-2013.zip	17/09/2014
15	B.6 Informe ejecutivo microempresas junio-2013	Infor-ejecutivo_microempresas_junio-2013.zip	17/09/2014
16	B.7 Informe ejecutivo microempresas julio-2013	Infor-ejecutivo_microempresas_julio-2013.zip	17/09/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
17	B.8 Informe ejecutivo microempresas agosto-2013	infor-ejecutivo_microempresa_agosto-2013.zip	17/09/2014
18	B.9 Informe ejecutivo microempresas sept-2013	Infor-ejecutivo_microempresas_sept-2013.zip	17/09/2014
19	B10 Informe ejecutivo microempresas octubre 2013	Infor-ejecutivo_microempresas_octubre-2013.zip	17/09/2014
20	B11 Informe ejecutivo microempresas noviembre 2013	infor-ejecutivo_microempresas_nov-2013.zip	17/09/2014
21	B12 Informe ejecutivo microempresas diciembre 2013	Infor-ejecutivo_microempresas_dic-2013.zip	17/09/2014
22	C.1 Informe ejecutivo microempresas enero-2014	Infor-Eje-Microem_Enero-14.zip	15/09/2014
23	C.2 Informe ejecutivo microempresas febrero-2012	Infor-Eje-Microem_Febrero-14.zip	15/09/2014
24	C.3 Informe ejecutivo microempresas marzo 2014	Infor-Eje-Microem_Marzo-14.zip	15/09/2014
25	C.4 Informe ejecutivo microempresas abril 2014	Infor-Eje-Microem_Abril-14.zip	15/09/2014
26	C.5 Informe ejecutivo microempresas mayo 2014	Infor-Eje-Microem_Mayo-14.zip	15/09/2014
27	C.6 Informe ejecutivo microempresas junio 2014	Infor-Eje-Microem_Junio-14.zip	15/09/2014
28	C.7 Informe ejecutivo julio microempresas 2014	Infor-Eje_Microem_Julio-14.zip	15/09/2014
29	C.9 Informe ejecutivo microempresas sept-2014	Infor-Ejecutivo_Microempresa_Sep-2014.zip	09/10/2014
30	C10 Informe ejecutivo microempresas octubre 2014	Infor-Ejecutivo_Microempresa_Oct-2014.zip	12/11/2014
31	C11 Informe ejecutivo microempresas noviembre 2014	Infor-Ejecutivo_Microemp-nov-2014.zip	08/12/2014
32	C12 Informe ejecutivo diciembre 2014	Inf-Ejecutivo_Microempresas_Dic-2014.zip	06/01/2015
33	D.1 Informe ejecutivo enero-2015	Inform-ejecutivos_Microempresas_Ene-2015.zip	06/03/2015
34	D.2 Informe ejecutivo feb-2015	Inform-ejecutivos_Microempresas_Feb-2015.zip	06/03/2015
35	D.3 Informe ejecutivo microempresas marzo-2015	Infor-ejecutivo_microempresa_marzo-2015.zip	08/04/2015
36	D.4 Informe ejecutivo Microempresas abril-2015	Infor-ejecutivo_microempresa_abril-2015.zip	06/05/2015
37	D.5 Informe ejecutivo microempresas mayo 2015	Infor-ejecutivo_microempresa_mayo-2015.zip	09/06/2015
38	D.6 Informe ejecutivo Microempresas jun-2015	Infor_ejecutivos_Microempresas_Junio-2015.zip	09/07/2015
39	D.7 Informe Ejecutivo Microempresas Jul-2015	Informe_ejecutivo_Microempresa_Julio_2015.zip	14/09/2015
40	D.8 Informe ejecutivo Ago-2015	Informe_ejecutivo_Microempresas_Agosto-2015.zip	15/09/2015
41	D.9 Informe ejeecutivo microempresas Sep-2015	Infor-ejecutivo_microempresas_sept-2015.zip	09/12/2015
42	D10 Informe ejecutivo Microempresas octubre-2015	Infor-ejecutivo_microempresas_Oct-2015.zip	09/12/2015
43	D11 Informe ejecutivo Microempresas noviembre-2015	Infor-ejecutivo_microempresas_Nov-2015.zip	09/12/2015
44	E. 1 Informe Ejecutivo Microempresas Abril-2016	microempresas_informes_ejecutivos_abril_2016.rar	14/07/2016
45	E.2 Informe Ejecutivo Microempresas Mayo-2016	microempresas_informes_ejecutivos_mayo_2016.rar	14/07/2016
46	E.3 Informe Ejecutivo Microempresas Junio-2016	microempresas_informes_ejecutivos_junio_2016.rar	14/07/2016
47	E.4 Informe Ejecutivo Microempresas Julio-2016	Informe_Ejecutivo_Microempresas_Julio-2016.rar	04/08/2016
48	E.5 Informe Ejecutivo Microempresas Agosto-2016	E.5_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Agosto-2016.rar	09/09/2016
49	E.6 Informe Ejecutivo Microempresas Septiembre-2016	E.6_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Septiembre_-2016.rar	07/12/2016
50	E.7 Informe Ejecutivo Microempresas Octubre -2016	E.7_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Octubre_-2016.rar	07/12/2016
51	E.8 Informe Ejecutivo Microempresas Noviembre -2016	E.8_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Noviembre_-2016.rar	31/01/2017
52	E.9 Informe Ejecutivo Microempresas Diciembre -2016	E.9_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Diciembre_-2016.rar	31/01/2017
53	F.1 Informe Ejecutivo Conservación Vial Enero-2017	F.1_Informe_Ejecutivo_Conservación_Vial_Enero-2017.rar	08/02/2017
54	FOTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EMERGENTE DE LA PROVINCIA DE LOJA	fotos_de_mantenimiento_c-g-c-s-m..docx	10/05/2012
55	Informe de microempresa Divino Niño Tramo Puente Playas - El Empalme	divino_nino.pdf	05/06/2018
56	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012, SEÑALIZACIÓN LOJA - VILCABAMBA	ABRIL.pdf	13/08/2012
57	INFORME EJECUTIVO AGOSTO/2012 SEÑALIZACIÓN LOJA-VILCABAMBA	INFORME_EJECUTIVO_DE_SEÑALIZACIÓN_LOJA-VILCABAMBA.pdf	08/10/2012
58	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012, SEÑALIZACIÓN LOJA - VILCABAMBA	MAYO.pdf	13/08/2012
59	Informe ejecutivo microempresas julio 2018	microempresas_julio_2018.rar	03/08/2018
60	INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESAS SEPTIEMBRE 2013	INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_SEPTIEMBRE_2013.rar	07/12/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
61	microempresas abril 2018	microempresas_abril_2018.rar	04/05/2018
62	RESPALDO RESUMEN EJECUTIVOS ENE12 - JUN12	RESPALDO_RESUMEN_EJECUTIVOS_ENE12_-_JUN12.docx	07/11/2012
63	Resumen Ejecutivo Julio a Diciembre de 2012	Resumen_Ejecutivo_desde_Julio_a_Diciembre_2012.docx	25/03/2013
64	Trabajos de bacheo con apoyo de microempresas	IMG-20120629-00265.jpg	07/08/2012

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Supervisor de Proyecto			
Ocampo Veintimilla, Danny Andrei	Director Provincial Loja	Especialista en Geología Zonal	docampo@mtop.gob.ec	023974600
Paredes Ortega, Ángel Alberto	Coordinador Técnico de Infraestructura Provincial	Experto de Infraestructura Provincial	aparedes@mtop.gob.ec	023974600
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Coordinadora de Planificación Zonal 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600
Villavicencio Garcia, Israel Vinicio	Subsecretario Regional 7		salio@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
29908_1.jpg	03/08/2018
