

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 6**  
**Dirección Provincial Cañar**

**PROYECTO: K029 MTOP-Mantenimiento Vial de la Provincia del Cañar**

Líder del Proyecto:	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo (eencalda@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Pesantez Urgilez, Fernando	Programas Relacionados:	Provincia - Cañar
Titular:	Dután Sanango, Italo Medardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3657	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,976,526.09
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2011 - 31/12/2013
Fecha de última actualización:	06/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Calle Bravo, Oscar Leonardo	Fecha del siguiente Hito:	

**Nota:** Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Se realiza mantenimiento y rehabilitación de la Red Vial Estatal Provincial de la Provincia del Cañar que cuenta con 271 kilómetros de longitud. Este trabajo es realizado con Microempresas contratadas y maquinaria propia de la Dirección Provincial.

Microempresas:

- \* Microempresa Sageo
- \* Microempresa Cantera Chauca
- \* Microempresa Primavera
- \* Microempresa Taday
- \* Microempresa Zhoray

**Beneficios Cualitativos**

Mediante el mantenimiento vial se reduce el costo de transporte, los tiempos de traslado, se mejorará el estado vial, se brinda seguridad al conductor y peatón.

**Tipo de Beneficiario**

Comerciantes  
 Agricultores  
 Sector Turístico  
 Población en general

**Restricciones**

Tiempo: se debe cumplir con los plazos contractuales para fin del proyecto

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2013

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

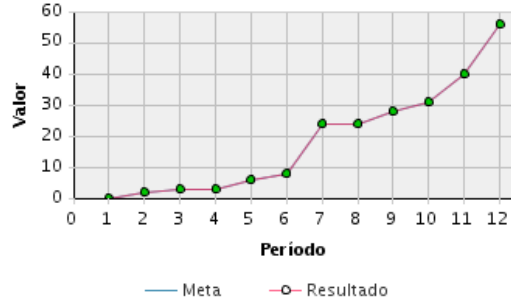

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2012	Avance programado acumulado											
	0 %	2 %	3 %	3 %	6 %	8 %	24 %	24 %	28 %	31 %	40 %	56 %
	Avance real acumulado											
	0 %	2 %	3 %	3 %	6 %	8 %	24 %	24 %	28 %	31 %	40 %	56 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>En la carretera Matrama-Mazar se continua realizando el mantenimiento de la via, personal de la microempresa esta colocando balizas en el tramo entre Pindilig y Zhoray.</p>	Calle Bravo, Oscar Leonardo	06/01/2014 - 12:05 PM
<p>NOVIEMBRE 2013</p> <p>En la carretera Matrama-Mazar se continua realizando el mantenimiento de la via, limpiando los derrumbes que se presentan con maquinaria y personal del Ministerio de Transporte y Obras Publicas. Se esta recuperando la calzada desde el Km 56+000 hasta el 57+000.</p>	Calle Bravo, Oscar Leonardo	05/12/2013 - 02:52 PM
<p>OCTUBRE 2013</p> <p>En la carretera Matrama-Mazar se continua realizando el mantenimiento de la via, limpiando los derrumbes que se presentan con maquinaria y personal del Ministerio de Transporte y Obras Publicas. Se esta recuperando la calzada desde el Km 57+000 hasta el 58+000.</p>	Calle Bravo, Oscar Leonardo	06/11/2013 - 02:10 PM
<p>SEPTIEMBRE 2013</p> <p>En la carretera Matrama-Mazar se continua realizando el mantenimiento de la via, limpiando los derrumbes que se presentan con maquinaria y personal del Ministerio de Transporte y Obras Publicas. Se esta recuperando la calzada en el Km 57+000.</p>	Calle Bravo, Oscar Leonardo	04/10/2013 - 10:35 AM
<p>AGOSTO 2013</p> <p>En la carretera Matrama-Mazar se continua realizando el mantenimiento de la via, limpiando los derrumbes que se presentan con maquinaria y personal del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.</p>	Calle Bravo, Oscar Leonardo	04/09/2013 - 11:22 AM
<p>JULIO 2013</p> <p>En la carretera Matrama-Mazar se termino de desalojar el material del derrumbe en el sector de Zhal, Existen derrumbes en la via que se estan limpiando constantemente con maquinaria y personal del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.</p>	Calle Bravo, Oscar Leonardo	05/08/2013 - 10:09 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JUNIO 2013</b></p> <p>En la carretera Biblian-Azogues-Descanso( panamericana), se esta complementando la señalizacion,                      En la carretera Matrama-Mazar se tiene un derrumbe en el sector de Zhal, por lo que se realizo una variante en el sitio, mientras se continua con el desalojo de material.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>01/07/2013 - 03:29 PM</p>
<p><b>MAYO 2013</b></p> <p>En la carretera Biblian-Azogues-Descanso( panamericana), se esta bachando en la via y comlementando la señalizacion,                      En la carretera Matrama-Mazar se esta realizando el bacheo entre Matrama y Pindilig.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>06/06/2013 - 07:01 AM</p>
<p><b>ABRIL 2013</b></p> <p>En la carretera Biblian-Azogues-Descanso( panamericana), se esta bachando en la via y comlementando la señalizacion,                      En la Via Rapida y La carretera Matrama-Mazar el mantenimiento se lo realiza sin inconvenientes.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>03/05/2013 - 01:11 PM</p>
<p><b>MARZO DEL 2013</b></p> <p>Se esta realizando sin inconvenientes los mantenimientos de las vias Biblian-Azogues-Descanso(Rapida y panamericana) como tambien de la carretera Matrama-mazar.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>08/04/2013 - 09:06 AM</p>
<p><b>FEBRERO</b></p> <p>Se continua con el mantenimiento de las carreteras Biblian-Azogues-Descanso(Rapida y Panamericana) y de la carretera Matrama Mazar, el transito ha sido normal en las vias</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>05/04/2013 - 04:29 PM</p>
<p><b>FEBRERO DEL 2013</b></p> <p>El mantenimiento de las carreteras: Via Rapiday panbamericana Biblian-Azogues-Descanso, se esta ejecutando sin problemas, igualmente se esta dando mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>12/03/2013 - 09:05 AM</p>
<p><b>ENERO 2013</b></p> <p>Se esta dnado el mantenimiento a las carreteras: Biblian-Azogues-Descanso (Rapida y Panamericana) y de la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>07/02/2013 - 02:14 PM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2012</b></p> <p>Se terminaron los trabajos de reconfomacion en la via rapida Biblian-Azogues-Descanso en el sector de Quimandel.                      Los trabajos de mantenimiento con las microempresas se desarrollaron como se tenia previsto.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>27/12/2012 - 09:49 AM</p>
<p><b>NOVIEMBRE 2012</b></p> <p>En el sector de Quimadel en la via rapida Biblian-Azogues-Descanso se esta realizado la recinformacion de la via</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>27/12/2012 - 09:46 AM</p>
<p><b>OCTUBRE 2012</b></p> <p>Se terminaron los trabajos de estabilizacion en el Km 6+500 en la Via Rapida Biblian-Azogues-Descanso, Se continua con la limpieza de alcantarillas y cunetas en la carretera Matrama-Mazar</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>07/12/2012 - 01:58 PM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2012</b></p> <p>Estan terminandose los trabajos de estabilizacion en el Km 6+500 en la via rapida Biblian-Azogues-Descanso, se esta realizando la limpieza de alcantarillas y cunetas de coronacion en la carretera Matrama-mazar.</p>		
<p><b>AGOSTO 2012</b></p>		

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>los trabajos de estabilizacion del talud en la via Rapida en el sector de Molinohuico estan terminandose. en el Km 6+500 se estan realizandose trabajos complementarios al muro de gaviones para recuperar la calzada.</p> <p>JULIO 2012.</p> <p>En la vía rápida Biblian- Azogues-Descanso en el sector de Molinohuico se esta realizando la Estabilizacion del Talud por lo que en esta zona no hay trafico vehicular y se esta utilizando la via antigua panamericana.</p> <p>JUNIO 2012</p> <p>Los muros de gaviones del Km 6+500 y del 5+300 estan concluidos en la via Rapida, Biblian-Azogues-Descanso Se esta realizando la complementacion de la señalizacion de la Via rapida y panamericana Biblian-Azogues-Descanso</p> <p>MAYO 2012.</p> <p>Se termino de construir el Muro de Gaviones en el Km 6+500 ny se conmenzo a construir el Muro de Gaviones en el Km. 5+300 en la Vía Rapida Biblian-Azogues-El Descanso. Tambien se esta realizando un bacheo extensivo en la carretera La Troncal-Puerto Inca.</p> <p>ABRIL 2012</p> <p>Esta realizando la construcción del muro de gaviones en el Km 6+500, y están en el portal los arreglos en el 5+300 y en molinohuico de la Vía Rápida Biblian-Azogues-Descanso. Esta en el portal de compras publicas el bacheo para la carretera la Troncal-Puerto Inca.</p> <p>MARZO 2012:</p> <p>En la Vía Rápida Biblian-Azogues-Descanso se encuentra en el Portal de Compras Publicas el Muro de Gaviones que se va a realizar en el Kilometro 6+500. La Carretera La Troncal-Puerto Inca presenta varios baches, en los proximos meses se realizará un bacheo general cuando mejore el temporal.</p> <p>FEBRERO 2012:</p> <p>El mantenimiento continua realizandose, se ha tenido problemas de deslizamientos en la Vía rapida Biblian-Azogues-Descanso, se esta realizando los terminos de referencia para realizar la contratacion de muros de gaviones y estabilizacion de taludes</p> <p>ENERO 2012:</p> <p>El mantenimiento se ha realizado con normalidad, se ha tenido derrumbes y deslizamientos en la Vía Rapida Biblian-Azogues-Descanso que estan siendo solucionados oportunamente.</p> <p>JULIO - DICIEMBRE 2011</p> <p>Los mantenimientos se han realizado con normalidad, en la Vía Rapida Descanso-Biblian se realizo un Baden en el Km 4+000, se termino la señalizacion en la panamericana Biblian-Descanso.</p> <p>ENERO - JUNIO 2011</p> <p>Se comenzo a realizar la señalizacion en la Vía panamericana Biblian-Descanso. En la carretera Gun-Cochancay (antigua) se realizaron limpieza de derrumbes. Se realizaron la construccion de muro de Gaviones en la Vía Rapida Biblian-Azogues-Descanso en el sector de la entrada a Pampa Vintimilla.</p>		

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Ambiental.	08/02/2012	Efrain Eduardo Encalada Clavijo	30 %	70	21	0/0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Temporada Invernal causaría derrumbes, deslizamientos que no se ejecute la obra tiempo.						

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Contrato con microempresa firmado, para realizar el mantenimiento de la Via Rapida Biblian-Azogues-Descanso	5-Entregables Intermedios	05/02/2012		05/02/2012		Sí	1.0
2	Contrato con microempresa firmado, para realizar el mantenimiento de la Carretera La Troncal-Puerto Inca	5-Entregables Intermedios	28/02/2012		28/02/2012		Sí	1.0
3	Contrato con microempresa firmado, para realizar el mantenimiento de la Carretera Biblian-Descanso panamericana	5-Entregables Intermedios	25/03/2012		25/03/2012		Sí	1.0
4	Bacheo asfáltico realizado desde el Km 0+000 al 22+000 en la Via rapida Biblian-Azogues-Descanso	5-Entregables Intermedios	15/05/2012		15/05/2012		Sí	3.0
5	Bacheo asfáltico realizado del Km 0+000 al Km 19+000 en la carretera Biblian-Descanso (Panamericana)	5-Entregables Intermedios	05/06/2012		05/06/2012		Sí	2.0
6	Mantenimiento rutinario y emergente realizado desde Enero hasta junio a satisfaccion del MTOP, en la Via Rapida Biblian-Azogues-Descanso.	5-Entregables Intermedios	05/07/2012		05/07/2012		Sí	4.0
7	Mantenimiento rutinario y emergente realizado desde Enero hasta junio a satisfaccion del MTOP, en la carretera La Troncal - Puerto Inca.	1-Solicitud de Información	15/07/2012		15/07/2012		Sí	4.0
8	Mantenimiento rutinario y emergente realizado desde Enero hasta junio a satisfaccion del MTOP, en la carretera Biblian-Descanso (Panamericana)	5-Entregables Intermedios	18/07/2012		18/07/2012		Sí	4.0
9	Mantenimiento rutinario y emergente realizado desde Enero hasta junio a satisfaccion del MTOP, en	5-Entregables Intermedios	20/07/2012		20/07/2012		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	la carretera Gun-Cochancay (antigua)							
10	Reconformación de la vía Antigua Gun - Cochancay	5-Entregables Intermedios	15/09/2012		15/09/2012		Sí	4.0
11	Colocación de Alcantarillas en la vía antigua Gun-Cochancay	5-Entregables Intermedios	25/10/2012		25/10/2012		Sí	3.0
12	Bacheo asfáltico realizado desde el Km 0+000 al 27 +000 en la carretera La Troncal-Puerto Inca	5-Entregables Intermedios	09/11/2012		09/11/2012		Sí	2.0
13	Bacheo Asfáltico realizado desde el Km 0+000 al 19+000 en la carretera Biblian-Descanso (Panamericana)	5-Entregables Intermedios	12/11/2012		12/11/2012		Sí	2.0
14	Bacheo asfáltico realizado desde el Km 0+000 al 22+000 en la Vía Rápida Biblian-Azogues-Descanso	5-Entregables Intermedios	14/11/2012		14/11/2012		Sí	2.0
15	Construcción de Gaviones terminado en la vía antigua Gun - Cochancay	5-Entregables Intermedios	25/11/2012		25/11/2012		Sí	3.0
16	Mantenimiento rutinario y emergente realizado desde Julio hasta Diciembre a satisfacción del MTOP, en la carretera Biblian-Azogues-Descanso (panamericana).	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	4.0
17	Mantenimiento rutinario y emergente realizado desde Julio hasta Diciembre a satisfacción del MTOP, en la carretera Gun - Cochancay (antigua).	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	4.0
18	Mantenimiento rutinario y emergente realizado desde Julio hasta Diciembre a satisfacción del MTOP, en la carretera La Troncal - Puerto Inca.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	4.0
19	Mantenimiento rutinario y emergente realizado desde Julio hasta Diciembre a satisfacción del MTOP, en la Vía Rápida Biblian-Azogues-Descanso.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	4.0
20	Estabilización de sitios críticos realizados desde el Km 0+000 al 15+000 de la carretera Azogues-Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	01/04/2013		01/04/2013		Sí	4.0
21	Bacheo Asfáltico realizado desde el Km 0+000 al 20+000 de la carretera Azogues-Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	01/05/2013		01/05/2013		Sí	3.0
22	Limpieza de Alcantarillas efectuado desde el Km 0+000 al 30 +000 de la carretera Azogues-Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	01/05/2013		01/05/2013		Sí	3.0
23	Estabilización de sitios críticos realizados desde el Km 15+000 al 30+000 de la carretera Azogues-Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	01/07/2013		01/07/2013		Sí	4.0



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
24	Mantenimiento Rutinario y Atencion de Emergencias realizados desde Enero a Junio del 2013, a satisfaccion del MTOP, del Km 0+000 al 30+000 de la carretera Azogues-Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	01/07/2013		01/07/2013		Sí	2.0
25	Mantenimiento Rutinario y Atencion de Emergencias realizados desde Enero a Junio del 2013, a satisfaccion del MTOP, del Km 0+000 al 30+000 de la Via Rapida Biblian-Azogues-Descanso	5-Entregables Intermedios	01/07/2013		01/07/2013		Sí	2.0
26	Mantenimiento Rutinario y Atencion de Emergencias realizados desde Enero a Junio del 2013, a satisfaccion del MTOP, del Km 30+000 al 69+000 de la carretera Azogues-Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	01/07/2013		01/07/2013		Sí	2.0
27	Bacheo Asfaltico realizado desde el Km 20+000 al 40+000 de la carretera Azogues-Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	01/09/2013		01/09/2013		Sí	3.0
28	Estabilizacion de sitios criticos realizados desde el Km 30+000 al 45+000 de la carretera Azogues-Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	01/10/2013		01/10/2013		Sí	4.0
29	Limpieza de Alcantarillas efectuado desde el Km 30+000 al 69 +000 de la carretera Azogues-Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	01/10/2013		01/10/2013		Sí	3.0
30	Bacheo Asfaltico realizado desde el Km 40+000 al 69+000 de la carretera Azogues-Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	3.0
31	Estabilizacion de sitios criticos realizados desde el Km 30+000 al 45+000 de la carretera Azogues-Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	4.0
32	Mantenimiento Rutinario y Atencion de Emergencias realizados desde Julio a Diciembre del 2013, a satisfaccion del MTOP, del Km 0+000 al 30+000 de la carretera Azogues-Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	3.0
33	Mantenimiento Rutinario y Atencion de Emergencias realizados desde Julio a Diciembre del 2013, a satisfaccion del MTOP, del Km 30+000 al 69+000 de la carretera Azogues-Matrama-Mazar	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	4.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Limpieza de la vía	Molina Loyola, Bertha Elizabeth	{PR} - Provincia - CAÑAR	15/10/2013

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Km de la Red Vial en buen Estado		100.00 %	60	60	01/01/2012	Diciembre
2	Porcentaje del cumplimiento económico en el cronograma.		134.76 %	100	134.76	01/01/2012	Diciembre



AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,976,526.09 **
Costo Total:	2,077,069.40
Total Devengado:	2,071,042.40
% Costo Total Devengado:	99.71 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 99.71 %

Perfil Económico 2012

	Años Previos	Año Actual (2012)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,259,666.00	414,860.09	302,000.00	1,976,526.09
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	302,000.00	302,000.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,259,666.00	414,860.09	302,000.00	1,976,526.09
Ppto. Codificado	1,259,666.00	414,860.09	302,000.00	1,976,526.09
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2012)		0.00		
Programado a Devengar	1,259,666.00	414,860.09	302,000.00	1,976,526.09
Ppto. Devengado	1,259,666.00	515,403.40	295,973.00	2,071,042.40
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 1,259,666.00	414,860.09	302,000.00	1,976,526.09
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	124.24 %	98.00 %	104.78 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2012

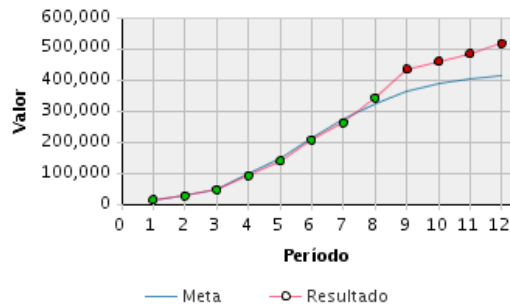

Presupuesto Mensual 2012

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	14,495.00	14,090.00	14,495.00	14,090.00	97.21 %	<span style="color: green;">●</span>	3.40 %

Presupuesto Mensual 2012							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	14,495.00	12,572.00	28,990.00	26,662.00	91.97 %		6.43 %
Mar	20,440.00	19,850.00	49,430.00	46,512.00	94.10 %		11.21 %
Abr	49,600.00	44,575.00	99,030.00	91,087.00	91.98 %		21.96 %
May	50,400.00	48,792.00	149,430.00	139,879.00	93.61 %		33.72 %
Jun	63,000.00	65,247.00	212,430.00	205,126.00	96.56 %		49.44 %
Jul	57,640.09	56,500.00	270,070.09	261,626.00	96.87 %		63.06 %
Ago	52,600.00	78,709.52	322,670.09	340,335.52	105.47 %		82.04 %
Sep	42,160.00	92,256.23	364,830.09	432,591.75	118.57 %		104.27 %
Oct	21,040.00	26,958.65	385,870.09	459,550.40	119.09 %		110.77 %
Nov	14,495.00	23,306.00	400,365.09	482,856.40	120.60 %		116.39 %
Dic	14,495.00	32,547.00	414,860.09	515,403.40	124.24 %		124.24 %
<b>Total</b>	<b>414,860.09</b>	<b>515,403.40</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		INFORME-GXR-cumplimiento_del_cronograma_8-octubre-2012.pdf	09/10/2012
2		INFORME-GXR-Porcentaje-kms-en-buen.-estado_8-octubre-2012.pdf	09/10/2012
3		Foto0703.jpg	02/08/2012
4		Foto0722.jpg	02/08/2012
5		IMG.pdf	03/08/2012
6		IMG_0001.pdf	03/08/2012
7		INFORME-GXR-cumplimiento_del_cronograma_24-sept-2012.pdf	24/09/2012
8		INFORME-GXR-Porcentaje-kms-en-buen.-estado_24-sept-2012.pdf	24/09/2012

### EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Calle Bravo, Oscar Leonardo	DIRECTOR			
Encalada Clavijo, Efraín Eduardo	SUPERVISOR CONSERVACION VIAL	Miembro de Equipo del Cañar	eencalda@mtop.gob.ec	
Ortega Ortega, Jairo Fabián	JEFE DE TALLERES		salio@mtop.gob.ec	
Verdugo Rivas, Valery Tatiana	ASISTENTE ADMINISTRATIVA-TECNICA	Asistente Tecnica	tverdugo@mtop.gob.ec	
