

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Zamora Chinchipe

PROYECTO: K026 MTOP - Mantenimiento de Infraestructura de la provincia de Zamora Chinchipe

Líder del Proyecto:	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne (xtoledo@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA CARRETERA ZAMORA CHUCHUMBLETZA, Provincia - Zamora Chinchipe, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Agreda Orellana, Néstor Alexander	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3861	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,732,142.97
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/01/2012 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	03/09/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	Fecha del siguiente Hito:	30/09/2018

DATOS GENERALES

<p>Descripción</p> <p>DESCRIPCIÓN GENERAL: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de Zamora Chinchipe, ya sea por Administración Directa, contratos con empresas particulares y/o convenios Interinstitucionales.</p> <p>OBJETO: Mantener la RVE transitable y en buenas condiciones, con la finalidad de brindar un mejor servicio y seguridad al usuario.</p> <p>LONGITUD: RVE E50 tramo Límite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora de 43.735 km RVE E45 tramo Límite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora de 91.75 RVE E682 tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa de 113.89 km RVE E45-1 tramo Chumchumbletza- Pte. El Quimi-Tundayme-Valle Del Quimi de 19.05 km RVE E45-1 tramo Pte. El Quimi-Machinatza-Proy. Hidroelectrico Sta. Cruz (Casa de Maq.) de 7.95 km</p> <p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto General del Estado</p> <p>CONTRATISTA: Dirección Distrital de Zamora Chinchipe</p> <p>SUPERVISOR: Ing. German Álvarez - Supervisor de Conservación Vial</p> <p>DESCRIPCIÓN GENERAL: El mantenimiento de la RVE es de gran importancia, ya que manteniendo las vías en buenas condiciones de transitabilidad se disminuyen los tiempos de movilización, incrementando el nivel de seguridad vial y contribuyendo al desarrollo de la Región Amazónica.</p> <p>PRODUCTO Se tendrá vías en buen estado, permitiendo un mejor servicio al usuario y mejores condiciones cuales prestarán excelentes condiciones para el tráfico provincial e interprovincial</p> <p>LÍNEA BASE</p>


DATOS GENERALES

<p>Descripción</p> <p>- Para la programación de los indicadores se tomará los rubros de mayor ejecución dentro del mantenimiento vial que se ejecuta, considerando el promedio de lo ejecutado el cuatrimestre del año anterior en cada uno de ellos, que son:</p> <p>Volumen de material desalojado de la vía Kilómetros de reconfiguración de la rasante de la vía Kilómetros de mantenimiento rutinario de la RVE.</p> <p>ESTRATEGIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supervisión permanente - Comprobación de trabajos de mantenimiento ejecutados, mismos que son informados por los Encargados del mantenimiento Vial.
<p>Beneficios Cualitativos</p> <ul style="list-style-type: none"> * Contribuir al desarrollo agrícola, ganadero, minero, comercial y turístico de los cantones: Zamora, Palanda y Chinchipe * Aumentar el tiempo de vida útil de la vía * Mantener en buen estado la vía para el tráfico vehicular durante todo el año * Contribuir a la disminución del tiempo de recorrido de los vehículos en el tramo * Contribuir a la disminución del costo operativo del transporte vehicular
<p>Tipo de Beneficiario</p> <p>Los habitantes de los cantones de: Zamora , El Pangui, Palanda y Chinchipe en los sectores agrícola, ganadero, minero, comercial y turístico.</p>
<p>Restricciones</p> <p>Calidad: No se cuenta con suficiente personal de operadores y conductores (volquetas), así como no se cuenta con el equipo necesario (rodillo, cama baja) que influyen en el rendimiento o avance de los trabajos.</p>

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.40 %
 Fecha de Inicio: 03/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

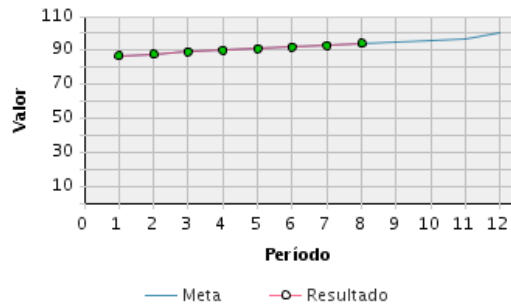

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	87 %	88 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	95 %	96 %	97 %	100 %
	Avance real acumulado											
	87 %	88 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %				
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●				

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza de derrumbes 15+700, 17+650, 37+650, 55+035	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	03/09/2018 - 03:54 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Limpieza de alcantarillas a máquina: cajón de entrada 14+300, 14+320, 14+620, 14+980, 15+250, 15+300, 15+810, 15+850, 16+330, 17+020, 17+900, 19+670, 21+100, 21+450, 22+010, 22+365, 22+435, 23+125, 24+125, 24+230, 24+600, 25+900, 26+436, 29+550, 30+835, 33+660, 34+070, 35+565, 35+715, 38+010, 47+895, 48+250, 52+220, 53+700, 54+800, 55+100, encauzamiento de salida de alcantarilla 17+900, canal 25+220-22+250.</p> <p>.Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora:</p> <p>.Limpieza de derrumbe en las abscisas 73+740.</p> <p>.Reconformación de rasante a máquina - Sector Quiríngue 40+340-40+610 (subtramos en lastre l= 200m)</p> <p>.Limpieza de alcantarillas y zanjas de drenaje con excavadora alquilada.</p> <p>.Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa:</p> <p>.Limpieza de cunetas con máquina tramo 99+390-95+690 El Chorro-El Tablón</p> <p>.Reposición de material de la calzada tramo 99+390-95+690 El Chorro-El Tablón</p> <p>.Limpieza de derrumbes varios sectores y desalojo de material</p> <p>.Movimiento de tierras sin transporte, ampliación de curva 112+290</p> <p>.Limpieza de alcantarillas a máquina (alquilada), varias abscisas.</p> <p>.Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona</p>		
<p>JULIO 2018.</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora:</p> <p>.Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora:</p> <p>.Limpieza de derrumbe en las abscisas Piedra Liza, La Saquea, Panguintza, San Pablo.</p> <p>.Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa:</p> <p>.Reconformación de la rasante tramo 99+390-113+890 El Chorro-La Balsa</p> <p>.Limpieza de cunetas con máquina tramo 99+390-113+890 El Chorro-La Balsa</p> <p>.Reposición de material de la calzada tramo 99+390-113+890 El Chorro-La Balsa</p> <p>.Movimiento de tierras tramo 113+590-113+790 ampliación de curva</p> <p>.Rellenos 1604 m3</p> <p>.Explotación de material 6.584 tres canteras</p> <p>.Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>03/08/2018 - 12:04 PM</p>
<p>JUNIO 2018.</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora:</p> <p>.Limpieza y pintado de muros ubicados al filo de calzada y en curva km. 55</p> <p>.Limpieza de derrumbes a máquina km. 38.15, 44.38.</p> <p>.Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresa de la zona</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora:</p> <p>.Limpieza de derrumbe en las abscisas 59+490, 61+986, 62+785, 63+280, 69+915, 73+740 .</p> <p>.Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa:</p> <p>.Reconformación de la rasante tramo 51+200-52+000 Palanuma</p> <p>.Limpieza de derrumbes a máquina y transporte en las abscisas 16+116, 23+460, 24+460, 36+100, 50+290, 51+800, 52+700, 53+000, 63+990, 67+100.</p> <p>.Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>03/07/2018 - 04:11 PM</p>
<p>MAYO 2018.</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora:</p> <p>.Reencauzamiento de quebrada La Zurita km. 25.74</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>05/06/2018 - 09:51 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresa de la zona</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 73+740 La Saquea .Pintura de resaltos y puentes varias abscisas .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación y reposición de material en by pass km. 36.1 .Limpieza de derrumbes a máquina en las abscisas 11+400, 42+300, 48+780, 50+290, 52+700, 56+100, 63+600, 63+990, 64+400. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona</p>		
<p>ABRIL 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Reencauzamiento de quebrada La Zurita km. 25.74 .Pintado de los puentes 25+300 Qda. Navidades, 25+740 La Zurita, 32+515 San Francisco, 32+840 El Tambo, 33+840 Pte. Cruzado, 45+190 La Rapida. .Limpieza y pintado de muros ubicados al filo de calzada y en curva km. 25+300, 30+580, 40+050, 40+600, 50+920 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresa de la zona</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 73+740 La Saquea .Pintura de resalto abscisa 90+450 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante tramo 67+300-71+800 San Antonio-El progreso .Limpieza de cunetas con máquina 67+300-71+800 San Antonio-El progreso .Reposición de material en la calzada tramo 65+800-69+500 sector Qda. de los muertos .Limpieza de derrumbes a máquina y transporte en las abscisas 43+390, 50+290, 52+700, 63+990, 64+400. .Movimiento de tierras abscisa 65+400, 68+300, 68+900 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>02/05/2018 - 03:31 PM</p>
<p>MARZO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Colocación de carpeta asfáltica en el tramo 38+506-39+225, 44+410-44+580 .Nivelación con mezcla asfáltica de la calzada (tramos asentados del pavimento rígido) .Limpieza a máquina del encauzamiento de entrada en la abscisas 29+245 .Pintado de los puentes Sabanilla 48+940 , Soñaderos 50+920, Chorrillos 51+645 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresa de la zona</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 73+740 La Saquea y reconformación del bypass .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante tramo 62+900-66+900 .Limpieza de cunetas con máquina 62+900-66+900 .Limpieza de derrumbes a máquina y transporte en las abscisas 19+430, 22+950, 29+000, 29+410, 34+900, 34+950, 35+100, 35+400, 42+850, 46+000, 50+290, 51+200, 52+000, 52+700, 54+200. .Movimiento de tierras abscisa 66+500 . Transporte de material movimiento de tierras desde la abscisa 22+600 a la abscisa 46+000 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>03/04/2018 - 03:43 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2018.</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Colocación de material de sub base, base y carpeta asfáltica en el tramo 38+506-39+225 .Limpieza de derrumbes en las abscisas 17+770, 45+330, 49+870, 51+940, 55+010. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con microempresa de la zona en el tramo Loja-El Tambo de 28.6 km.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: .Limpieza de derrumbes en las abscisas 73+740, 88+720, 95+520</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reposición de material de la calzada en el tramo 51+500-52+200 .Limpieza de derrumbes en las abscisas 10+560, 43+320, 44+306, 49+600, 50+290, 51+360, 52+700, 53+100, 53+890, 54+205, 56+100, 57+500, 63+990 .Transporte de material (limpieza de derrumbes) desde las abscisas 51+360, 53+100, 53+890, 54+205, 56+100, 57+500, 63+990 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con microempresas de la zona en el tramo Santa Ana-Bellavista de 30 km.</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>05/03/2018 - 11:08 AM</p>
<p>ENERO 2018.</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Obras de protección en Puente La Zurita km. 25.76, calce de estribo, construcción de muro gavión. .Construcción de cabezales de alcantarillas abs. 38+652, 38+824, 39+023, 39+148 .Construcción de subdren lateral derecho tramo: 38+652-39+024 .Reconformación de rasante en tramos a lastre 38+506-39+225, 41+300-41+450, 43+340-43+400, 44+380-44+510 .Reemplazo y re compactación del material de la estructura del pavimento (base) en el tramo 41+300-41+450 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con una microempresas de la zona.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona.</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>01/02/2018 - 02:43 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2017.</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Obras de protección en Puente La Zurita km. 25.76, construcción de muro. .Reemplazo de alcantarilla abs. 38+650 y construcción de cabezales .Reconformación de rasante en tramos a lastre 38+506-39+225, 43+340-43+400, 44+380-44+510 .Reemplazo y re compactación del material de la estructura del pavimento (subbase, base) en el tramo 41+300-41+450 .Construcción de cabezales de alc. 44+380 .Colocación de base tramo 44+380-44+510 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresas de la zona.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Limpieza de derrumbes a máquina abs. 52+700, 54+390 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona.</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>04/01/2018 - 11:01 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2017</p> <p>En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Limpieza de alcantarillas a máquina entre el km. 40 al 50 Construcción de subdren longitudinal km. 50+450-50+520 Reconformación de rasante en tramos a lastre km. 38.5-39.225, 41.4-41.635, 43.34-43.4, 44.3-44.51 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mto. de resaltos, etc. (2 microempresas)</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>05/12/2017 - 04:27 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: Limpieza de derrumbe km. 73.85 sector La Saquea Tendido de material escombrera km. 73.85 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mtto. de resaltos, etc. (4 microempresas)</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes a máquina km. 50.29, 50.7 Mantenimiento rutinario: en los tramos Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Santa Ana, Santa Ana-Bellavista, Bellavista-Zumba y Zumba-La Balsa (3 microempresas)</p>		
<p>OCTUBRE 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Calce de muro km. 40.41 y 40.43 Reencauzamiento de cauce en Pte. La Zurita km. 25.74 Reposición de pavimento rígido en tramo 54.96-54.98 Reconformacion de rasante en tramos a lastre km. 38.5-39.225, 41.4-41.635, 43.34-43.4, 44.3-44.51 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mtto. de resaltos, etc. (2 microempresas)</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: Limpieza de derrumbe km. 72.75 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mtto. de resaltos, etc. (4 microempresas)</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reconformación de rasante con motoniveladora en el tramo 93+990-94+490 Reposición de material en la calzada en el tramo 69+250-94+490 varios sectores. Limpieza de derrumbes a máquina km. 63.990 Explotacion de material para lastrar km. 93+990 Mantenimiento rutinario: en los tramos Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Santa Ana, Santa Ana-Bellavista, Bellavista-Zumba y Zumba-La Balsa (4 microempresas)</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>01/11/2017 - 09:51 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Calce de muro km. 40.1 Reparacion de resaltos sectr El Retorno, La Fragancia y El Limon Reconformacion de rasante en tramos a lastre km. 38.5-39.225, 41.4-41.635, 43.34-43.4, 44.3-44.51 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mtto. de resaltos, etc., en el tramo Límite Prov. Loja (El Tiro)-El Tambo</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: Reparación de resaltos sector Cumbaratza. Limpieza de derrumbe km. 72.75 sector La Saquea</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reconformación de rasante con motoniveladora en el tramo 105+890-113+890. Limpieza de cunetas con motoniveladora en varios sectores del tramo 105+890-113+890. Reposición de material en la calzada en el tramo 105+890-113+890 Zumba-Pucapamba. Limpieza de derrumbes a máquina km. 5.710 Mantenimiento rutinario: en los tramos Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Santa Ana, Santa Ana-Bellavista, Bellavista-Zumba y Zumba-La Balsa</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>03/10/2017 - 10:34 AM</p>
<p>AGOSTO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconformacion de rasante en tramos a lastre km. 38.5-39.225, 41.4-41.635, 44.3-44.51 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mtto. de resaltos, etc., en el tramo Límite Prov. Loja (El Tiro)-El Tambo</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora: Limpieza de derrumbe km. 72.75 y km. 73.85 sector La Saquea</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>01/09/2017 - 03:50 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reposición de material en la calzada y reconfiguración de la calzada en el tramo Zumba-Pucapamba. Mantenimiento rutinario: en los tramos Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Santa Ana, Santa Ana-Bellavista, Bellavista-Zumba y Zumba-La Balsa</p>		
<p>JULIO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconfiguración de rasante en tramos a lastre km. 38.6-39.225, 41.4-41.635, 44.3-44.51 Limpieza de derrumbes a máquina km. 14+960 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes a mano km 14+960, 25+050, 29+150, 30+650, limpieza de calzada en el tramo Límite Prov. Loja (El Tiro)-El Tambo</p> <p>Tramo Límite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Limpieza de derrumbe km. 73.85 sector La Saquea Reconfiguración de rasante en bypass km. 73.85 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización en todo el tramo hasta el 22 de julio de 2017.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Mejoramiento de vía - ampliación de curvas km. 60.89-71.00 tramo Bellavista-El Progreso. Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de derrumbes a mano km. 54.205, 56.1</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>01/08/2017 - 11:05 AM</p>
<p>JUNIO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconfiguración de rasante en tramos a lastre km. 38.6-39.225, 41.4-41.635, 44.3-44.51 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalización en el tramo Límite Prov. Loja (El Tiro)-El Tambo</p> <p>Tramo Límite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Estabilización de talud km. 73.85 sector La Saquea, el 16 de junio se concluye el terrazo se encuentra pendiente culminar el desalojo de material Reconfiguración de rasante en bypass km. 73.85 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reconfiguración de la calzada con motoniveladora km. 78.29-85.89 Limpieza de cunetas con motoniveladora Km. 78.29-85.89 Reposición de material en calzada km. 78.29-85.89 tramo Isimanchi-Zumba Limpieza de derrumbes km 52.7-63.99. Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>04/07/2017 - 09:53 AM</p>
<p>MAYO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Limpieza de derrumbe km. 44.4 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalización.</p> <p>Tramo Límite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Estabilización de talud km. 22.15 sector La Saquea, desalojo de material Reconfiguración de rasante km. 22.15 sector La Saquea by-pass Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reconfiguración de la calzada con motoniveladora Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>02/06/2017 - 10:40 PM</p>
<p>ABRIL 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora:</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>03/05/2017 - 02:34 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Reconformación de la rasante con motoniveladora, km. 38.506-39.225, 41+4-41.635, 44.38-44.51 Limpieza derrumbe km. 45.35 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalización.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Estabilización de talud km. 22.15 sector La Saquea, desalojo de material Reconformación de rasante km. 22.15 sector La Saquea by-pass Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes km. 10.56, 63.51, 63.89, 63.99. Reposición de material de la calzada km. 62.11 Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.</p>		
<p>MARZO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Remoción y desalojo de rocas km. 41.38 sector Velo de Novia Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalización.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Estabilización de talud km. 22.15 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes km. 10.56, 52.7, 53.89. Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas y alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a mano.</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>04/04/2017 - 08:28 AM</p>
<p>FEBRERO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconformación de la rasante km. 38.5-39.225 sector El Retorno, km. 41.4-41.635, 44.38-44.51 sector Velo de Novia Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalización.</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Limpieza de deslizamientos km. 22.15 sector La Saquea Estabilización de Talud km. 22.15 sector La Saquea Reconformación de rasante km. 22.1-22.15 sector La Saquea y km. 61.67-61.8 sector Quiringue</p> <p>Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes km. 50.268, 52.7, 56.1, 63.99 Reconformación de rasante km. 10.1-11.5 Limpieza de cunetas con motoniveladora 10.1-11.5 Explotación de material 410 m3</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>06/03/2017 - 01:27 PM</p>
<p>ENERO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconformación de la rasante km. 38.5-39.225 sector El Retorno, km. 41.4-41.635, 44.38-44.51 sector Velo de Novia Limpieza de calzada y colocación de puente Bailey km. 45.4 sector Velo de Novia Limpieza y desalojo de material sobre la calzada (alud) km. 46.6</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Limpieza de deslizamiento km. 19.24 sector Chamico Estabilización de Talud km. 22.1 sector La Saquea Limpieza de derrumbe y estabilización talud km. 22.15 sector La Saquea</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes km. 31.6, 33.2, 39.5, 50.268, 50.818, 51.440, 52.7, 56.1, 63.99 Reposición de material en la calzada km. 42.6-82.4</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>03/03/2017 - 01:39 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Limpieza de deslizamiento km. 63.99 sector Bellavista</p> <p>DICIEMBRE 2016 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora Reconformacion de la rasante km. 38.5-39.225 sector El Retorno, km. 41.4-41.635, 44.38-44.51 sector Velo de Novia</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Sntiago (Chuchumbletza)-Zamora Estabilizacion de Talud km. 22.1 sector La Saquea</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa Limpieza de deslizamiento km. 56.1. Limpieza de calzada km. 54.256-54.424 Reposicion de material en calzada Km. 52.6</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>02/02/2017 - 02:52 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2016 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos:</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (sabanilla)-Zamora Estabilizacion de talud mediante conformacion de terrazas km. 30.6 sector San Francisco Estabilizacion de talud mediante la descarga de material suelto km. 35.8 sector Santa Rita Reconformacion de la rasante km. 38.5-39.225 sector El Retorno, km. 41.4-41.635 sector Velo de Novia</p> <p>Tramo Limite Provincial Morona Sntiago (chuchumbletza)-Zamora Reconformacion de rasante km. 61.67-61.8 sector Quiringue Estabilizacion de Talud km. 22.1 sector La Saquea</p> <p>Tramo Limite Provincial Loja (sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa Limpieza de cauce y reconformacion de acceso de entrada y salida a Qda. de los Muertos km. 6 Limpieza de derrumbes km. 18.94 Mantenimiento del Puente Agua Dulce km. 43.2</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>05/12/2016 - 01:42 PM</p>
<p>OCTUBRE 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Chuchumbletza Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 2 kilómetros. Se realizó Reposición de material en calzada 1008 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 15480 m3 sector El Limón, La Saquea, km 38 vía Loja - Zamora y varios deslizamientos a lo largo de la vía Bellavista Zumba.</p> <p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Chuchumbletza Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 6 kilómetros. Se realizó Reposición de material en calzada 2078 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 3008 m3 sector La Saquea y otros derrumbes a lo largo de la vía.</p>	<p>Toledo Vásquez, Ximena del Cisne</p>	<p>05/12/2016 - 01:42 PM</p>
<p>JULIO 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Yantzatzá Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 3 kilómetros. Se realizó Reposición de material en calzada 600 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 10000 m3 ABS 30+600, 44+000 y otros derrumbes a lo largo de la vía.</p>	<p>Arevalo Maldonado, Diego Fernando</p>	<p>03/08/2016 - 12:57 PM</p>
<p>MAYO 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Yantzatzá Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 1 kilómetros. Se realizó Reposición de material en calzada 500 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 14500 m3 ABS 30+600, 44+000 y otros derrumbes a lo largo de la vía.</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa</p>	<p>Arevalo Maldonado, Diego Fernando</p>	<p>06/06/2016 - 10:25 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se realizó trabajos de Reconfiguración de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 2 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 26,50 km, Se realizó Reposición de material en calzada 6118 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 2000 m3 a lo largo de la vía.</p>		
<p>ABRIL 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Yantzata Se realizó trabajos de Reconfiguración de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 8 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 16 km Se realizó Reposición de material en calzada 500 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 30980 m3 ABS 30+600 y otros derrumbes a lo largo de la vía.</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Se realizó trabajos de Reconfiguración de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 15 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 15 km, Se realizó Reposición de material en calzada 5330 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 1150 m3 a lo largo de la vía.</p>	<p>Arevalo Maldonado, Diego Fernando</p>	<p>05/05/2016 - 04:52 PM</p>
<p>MARZO 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora Se realizó trabajos de Reconfiguración de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 1,2 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 1,2 km Se realizó Reposición de material en calzada 240 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 8.944 m3 ABS 38+600.</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Se realizó trabajos de Reconfiguración de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 0,8 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 0,8 km, Se realizó Reposición de material en calzada 504 m3</p>	<p>Arevalo Maldonado, Diego Fernando</p>	<p>06/04/2016 - 08:25 AM</p>
<p>FEBRERO 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora Se realizó trabajos de Reconfiguración de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 12 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 4 km Se realizó Reposición de material en calzada 608 m3.</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Se realizó trabajos de Reconfiguración de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 12 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 4 km</p>	<p>Arevalo Maldonado, Diego Fernando</p>	<p>05/04/2016 - 05:05 PM</p>
<p>ENERO 2016</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora Reconfiguración de rasante con motoniveladora 2 Km Otros mantenimientos rutinarios 1 CD Otros mejoramientos 1 CD Reposición de material en calzada 320 m3</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconfiguración de rasante con motoniveladora 3.6 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 1,7 Km</p>	<p>Arevalo Maldonado, Diego Fernando</p>	<p>05/04/2016 - 04:35 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2015</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora Reconfiguración de rasante con motoniveladora 2 Km Otros mantenimientos rutinarios 1 CD Otros mejoramientos 1 CD</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconfiguración de rasante con motoniveladora 9.6 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 3,7 Km Reposición de material en calzada 488 m3</p>	<p>Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo</p>	<p>05/01/2016 - 04:38 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora Limpieza de cunetas con motoniveladora 24,00 km Otros mantenimientos rutinarios 2 CD Otros mejoramientos 3 CD</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 10.90 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 5.30 Km Reposición de material en calzada 1328 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 200 m3 Reposición de rellenos 672 m3 Movimiento de tierras sin transporte 600 m3 Explotación de material 1320 m3</p>	<p>Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo</p>	<p>07/12/2015 - 10:43 AM</p>
<p>OCTUBRE 2015</p> <p>Carretera: Loja El Tiro - Zamora Reconformación de rasante con motoniveladora 4,00 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 18,00 km Otros mantenimientos rutinarios 4 CD Reposición de material en calzada 480,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 540,00 m3 Supervisión de campo 22 CD Transporte de material 250,00 m3</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 48 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 Km Otros mantenimientos rutinarios 12 CD Reposición de material en calzada 2.810,00 m3 Reposición de rellenos 320,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 3.150,00 m3 Explotación de material 3.160,00 m3</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>05/11/2015 - 09:37 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>Carretera: Loja - El Tiro - Zamora Reconformación de rasante con motoniveladora 3,00 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 3,00 km Otros mantenimientos rutinarios 15 CD. Reposición de material en calzada 320,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 600,00 m3 Supervisión de campo 22 CD Transporte de material 320,00 m3 Explotación de material 320,00 m3</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 26,00 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 26,00 km Reposición de material en calzada 1.300,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 1.800,00 m3 Transporte de material 1.10,00 m3 Explotación de material 1.830,00 m3</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>05/10/2015 - 12:02 PM</p>
<p>AGOSTO 2015</p> <p>El mantenimiento de las vías de la red Vial Estatal de la provincia de Zamora Chinchipe se realiza por Administración Directa, en el mes de agosto no se pudo realizar todas las actividades programadas debido a los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de operadores de motoniveladora y de cargadora - Falta de recursos económicos para la adquisición de combustibles, lubricantes y repuestos para el equipo caminero. - Falta de maquinaria operativa, la mayoría se encuentra dañada y otras ya han cumplido su periodo de vida útil. - Falta de asignación de recursos económicos para la contratación de las microempresas - por estas razones el mantenimiento se ha realizado en un 54% de lo programado <p>Carretera: Loja - El Tiro - Zamora</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>02/09/2015 - 05:53 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Otros mantenimientos rutinarios 15 CD Limpieza de cunetas a máquina 2 km Reposición de material en calzada 800 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2000 m3 Transporte de material 800 m3</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 21 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 21 km Reposición de material en calzada 1456 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2400 m3 Movimiento de tierras sin transporte 750 m3 Transporte de material 1456 m3 Explotación de material 2260 m3</p>		
<p>JULIO 2015 El mantenimiento de las vías de la RVE que se la realiza por Administración Directa, en el presente mes no se ha logrado realizar todas las actividades programadas debido a los siguientes factores negativos: -Situación invernal fuerte en la región, que ha provocado continuos deslizamientos y derrumbos. -Falta de asignación de recursos para la contratación de microempresas -Falta de asignación de recursos para la adquisición de combustibles y repuestos -Falta de personal de operadores -Falta de maquinaria operativa, se cuenta con la mayoría de la maquinaria dañada. Por estas razones el mantenimiento rutinario en las vías se ha logrado cubrir únicamente en un 76% de lo programado para este mes de julio.</p> <p>Carretera : Loja - El Tiro Zamora Limpieza de cunetas a máquina (con minicargadora) 5,00 km Otros mantenimientos rutinarios 10 CD Reposición de material en calzada 600,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 4.000,00 m3</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 24,00 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24,00 km Reposición de material en calzada 1.474,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 6.700,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4.550,00 m3 Otros mejoramientos 6 CD Transporte de material 1.474,00 m3 Explotación de material 1.474,00 m3</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>07/08/2015 - 11:29 AM</p>
<p>Carretera: Loja - Zamora Otros mantenimientos rutinarios 8 Cd. Reposición de material en calzada 250 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 3000 m3 Supervisión de campo 22 Cd Explotación de material 250 m3 Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 37 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 37 km Otros mantenimientos rutinarios 8 Cd. Reposición de material en calzada 560 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 8280 m3 Otros mejoramientos 6 CD. Transporte de material 3710 m3 Explotación de material 560 m3</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>06/07/2015 - 08:17 PM</p>
<p>MAYO 2015 Carretera: Loja - Zamora Limpieza de cunetas con motoniveladora 18 km Otros mantenimientos rutinarios 10 cd. Reposición de material en calzada 60 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 4500 m3 Supervisión de campo 20 cd Transporte de material 60 m3 Explotación de material 60 m3</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>04/06/2015 - 01:50 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Carretera: El Retorno La Fragancia Via Antigua Reposición de material en calzada 64 m3 Transporte de material 64 m3 Explotación de material 64 m3 Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 37 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 12 km Reposición de material en calzada 1956 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 6470 m3 Movimiento de tierras sin transporte 17950 m3 Transporte de material 1956 m3 Explotación de material 1956 m3</p>		
<p>ABRIL 2015 Carretera Loja - Zamora Bacheo de lastre a mano 24 m3 Limpieza de cunetas con motoniveladora 12 km Limpieza de cunetas a mano 6.3 km Limpieza de alcantarillas 126.8 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 7 und Roza a mano 5.2 hás Otros mantenimiento rutinarios 6 cd Limpieza de derrumbes a máquina 8400 m3 Otros mejoramientos (colocación de señales verticales) 34 und Supervisión d ecampo 22 cd Mantenimiento de instalaciones 10 cd Carretera Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 166 m3 Reconformación d erasante con motoniveladora 30 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 30 km Limpieza de cunetas a mano 0.50 km Limpieza de alcanatrillas 136 m3 Roza a mano 4.3 hás Otros mantenimientos rutinarios 6 cd Reposición de material en calzada 1008 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 10102 m3 reposición d erellenos 150 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4000 m3 Transporte de material 1000 m3 Explotación d ematerial 1000 m3</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>06/05/2015 - 10:58 AM</p>
<p>MARZO 2015 Carretera: Loja Zamora Bacheo de lastre a mano 10 m3 Limpieza de cunetas a mano 12,75 km Limpieza de alcantarillas 99,00 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 4 Und. Roza a mano 11,13 hás Limpieza de derrumbes a maquina 2100,00 m3 Reposición de rellenos 150 m3 Supervisión de campo 22 CD Mantenimiento de instalaciones 10 CD Transporte de material 150,00 m3 Explotan de material 150,00 m3 Carretera : Bellavista - Zumba - La Balsa Bacheo de lastre a mano 468,00 m3 Reconformación de rasante con motoniveladora 30,00 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 30,00 km Limpieza de cuentas a mano 1,75 km Limpieza de alcantarillas 142,00 m3 Roza a mano 4,87 hás Otros mantenimientos rutinarios 1 CD Reposición de material en calzada 1050,00 m3 Limpieza de derrumbes a maquina 6300,00 m3 Reposición de rellenos 450,00 m3 Transporte de material 1500,00 m3 Explotación de material 1500,00 m3</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>05/04/2015 - 07:21 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2015 Carretera : Loja - Zamora Bacheo de lastre a mano 10 m3 Limpieza de cunetas a mano 6.20 km Limpieza de alcantarillas 115.40 m3 Roza a mano 5.40 hás Otros mantenimientos rutinarios 1 cd. Reposición de material en calzada 300 m3 Limpieza de derrumbes a maquina 2400 m3 Reposición de rellenos 520 m3 Supervisión de campo 20 cd. Mantenimiento de instalaciones 4 dc. Explotación de material 300 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Bacheo de lastre a mano 60 m3 Reconformación d erasante con motoniveldora 38 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 38 km Limpieza de cunetas a mano 5,65 km Limpieza de alcantarillas 10 m3 Roza a mano 10,35 hás Otros mantenimientos rutinarios 3 cd. Reposición de material en calzada 976 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4000 m3 Transporte de material 2264 m3 Explotación de material 976 m3</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>06/03/2015 - 11:37 AM</p>
<p>ENERO 2015 Carretera: Loja - Zamora Limpieza de cunetas a mano 9 km Limpieza de alcanatrillas 88.5 m3 Roza a mano 12.22 Hás Otros mantenimiento rutinarios 1 CD Limpieza de derrumbes a máquina 2000 m3 Reposición d erellenos 640 m3 Supervisión d ecampo 21 CD Mantenimiento de instalaciones 6 CD Trnsporte de material 640 m3 Explotación d ematerial 640 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Bacheo de lastre a mano 60 m3 Reconformación de rasante con Motoniveladora 24 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Limpieza de cunetas a mano 6.8 km Limpieza de alcantarillas 28 m3 Roza a mano 9.11 hás Reposición d ematerial en calzada 1650 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2200 m3 Trasnporte de materiales 1108 m3 Expltación de material 1108 m3</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>05/02/2015 - 11:23 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2014 Carretera: Loja - Zamora Bacheo de lastre a mano 10 m3 Limpieza de cunetas a mano 12 km Limpieza de alcantarillas 53,70 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 1 und Roza a mano 6,69 hás Reposición de material en calzada 1.081,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 6.500,00 m3 Transporte de material 6.500 m3 Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveldora 24 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Bacheo de lastre a mano 40 m3 Limpieza de cunetas a mano 4,10 km Limpieza de alcantarillas 91,00 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 1 und Roza a mano 15,50 hás</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Reposición de material en calzada 2.452,00 m3 Explotación de material 3.221,00 m3		
NOVIEMBRE 2014 Carretera: Loja Zamora Limpieza de cuentas a mano 12.0 km Limpieza de alcantarillas 54.00 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 1 Und. Roza a mano 6.75 hás Otros mantenimientos rutinarios 20 CD Reposición de material en calzada 120.00 m3 Limpieza de derrumbes a mano 13.50 m3 Movimiento de tierras sin Transporte 11400.00 m3 Supervisión de campo 19 CD Mantenimiento de instalaciones 5 CD Transporte de materiales 11400.00 m3 Explotación de material 120.00 m3 Limpieza de señales verticales 1295.00 Und Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 65.00 m3 Reconformacion de rasante con motoniveladora 54.00 km Limpieza de cuentas con motoniveladora 54.00 km Limpieza de cunetas a mano 4.0 km Limpieza de alcantarillas 91.00 m3 Roza a mano 15.50 Hás Otros mantenimientos rutinarios 3 CD Limpieza de derrumbes a máquina 4750.00 m3 Transporte de material 2852.00 m3 Explotación de material 432 m3	Román Carrión, Carlos Anibal	02/12/2014 - 11:31 AM
OCTUBRE 2014 carretera Loja - Zamora Limpieza de cunetas a mano 13.60 km Limpieza de alcantarillas 196.40 m3 Roza a mano 6.95 hás Reposición de material en calzada 480,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 12000,00 m3 Supervisión de campo 22 cd Mantenimiento de instalaciones 10 cd. Transporte de materiales 12000,00 m3 Explotación de material 480,00 m3 Carretera Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 60,00 m3 Reconformación de rasante con motoniveladora 54,00 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 54,00 km Limpieza de cunetas a mano 10,40 km Limpieza de alcantarillas 19,50 m3 Roza a mano 13,20 hás Reposición de material en calzada 785,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2500 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4250,00 m3 Transporte de materiales 785,00 m3 Explotación de material 785,00 m3	Román Carrión, Carlos Anibal	06/11/2014 - 04:33 PM
SEPTIEMBRE 2014 Carretera: Loja - Zamora Limpieza de cunetas a mano 22.00 km Limpieza de alcantarillas 153 m3 Roza a mano 9.48 hás Otros mantenimientos rutinarios 1 CD Movimiento de tierras sin transporte 13200 m3 Mantenimiento de instalaciones 7 CD Transporte de material 13200 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa	Román Carrión, Carlos Anibal	06/11/2014 - 04:18 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Bacheo de lastre a mano 50 m3 Reconformación de rasante con motoniveladora 21 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 21 km Limpieza de cunetas a mano 2.5 km Limpieza de alcantarillas 12 m3 Roza a mano 13.89 há Reposición de material en calzada 2300 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2400 m3 Reposición de rellenos 900 m3 Movimiento de tierras sin transporte 600 m3 Otros mejoramientos 24 m3 Explotación de material 3200 m3		
AGOSTO 2014 Carretera: Loja - Zamora Limpieza de alcantarillas 3.060,00 m3 Roza a mano 1.17 Há Limpieza de derrumbes a máquina 17.940 m3 Supervisión de campo 21 cd. Mantenimiento de instalaciones 5 cd Carretera: El Retorno La Fragancia vía Antigua Reconformación de rasante con motoniveladora 9 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Limpieza de derrumbes a máquina 3.900,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4.200,00 m3 Carretera: Chuchumbletza - El Quimi - Campamento Mirador y El Quimi Manchinatza Santa Cruz Reconformación de rasante con motoniveladora 18 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 18 km Carretera : Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 30 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 60 km Otros mantenimientos rutinarios 4 cd Reposición de material en calzada 1.760,00 m3 Transporte de material 1.760 m3 Explotación de material 1.760,00 m3	Román Carrión, Carlos Anibal	03/09/2014 - 04:04 PM
JULIO 2014 Carretera : El Tiro Zamora Limpieza de alcantarillas 1560 m3 Reposición de material en calzada 240 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 15900 m3 Movimiento de tierras sin transporte 600 m3 Supervisión de campo 23 CD Transporte de materiales 240 m3 Explotación de material 200 m3 Carretera :El Retorno La Fragancia Limpieza de cunetas con motoniveladora 9 km Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 13 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 26 km Otros mantenimientos rutinarios 19 CD Reposición de material en calzada 1640 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 1350 m3 Transporte de materiales 1640 m3 Explotación de material 1640 m3	Román Carrión, Carlos Anibal	05/08/2014 - 02:45 PM
JUNIO 2014 carretera: Loja - Zamora Limpieza de derrumbes a máquina 11.160,00 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con Motoniveladora 16 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 km Otros mantenimientos rutinarios 26 CD Reposición de material en calzada 200 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 4.100 m3 Transporte de material 200 m3 Explotación de material 200 m3	Román Carrión, Carlos Anibal	05/08/2014 - 02:37 PM
MAYO 2014 Carretera Loja Zamora	Román Carrión, Carlos Anibal	03/06/2014 - 03:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Limpieza de derrumbes a máquina 14.600,00 m3 Carretera El Retorno La Fragancia Reconformación de rasante con motoniveladora 40 km Limpieza de cunetas con Motoniveladora 40 km Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reposición de material en calzada 2.160,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 730 m3 Colocación de nueva tubería 10 ml Movimiento de tierras sin transporte 1.790 m3 Transporte de material 2.160,00 m3 Explotación de material 1.500,00 m3		
ABRIL 2014 Carretera Loja Zamora Limpieza de derrumbes a máquina 6900 m3 Supervisión de campo 21 CD Apoyo a otras instituciones 294 E/h (Municipio de Yanzatza, encausamiento del río Chicaña sector la Unión) Carretera El Retorno La Fragancia Reconformación de rasante econ mtooniveladora 3 km Limpieza de cunetas con motoniveladora Carretera Bellavista Zumba La Balsa Reconformación d erasante con motoniveladora 6 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 6 km Reposición d e material en calzada 1680 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2910 m3 Movimiento d etierras sin transporte 2150 m3 Transporte de materiales 1680 m3 Explotación d ematerial 2150 m3	Román Carrión, Carlos Anibal	29/05/2014 - 02:21 PM
MARZO 2014 Carretera: Loja Zamora Limpieza de cunetas a mano 2.5 km Limpieza de derrumbes a máquina 11200 m3 Supervisión de campo 21 CD. Carretera: El Retorno La Fragancia Reposición de material en calzada 700 m3 Reposición de rellenos 1200 m3 Transporte de material 700 m3 Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación d erasante con motoniveladora 20 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 20 km Reposición d ematerial en calzada 2730 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 6150 m3 Movimiento de tierras sin transporte 2730 m3 Transporte de material 2730 m3 Explotación de material 3350 m3	Dávila Cadena, Christian Roberto	23/04/2014 - 02:28 PM
FEBRERO 2014 Carretera: Loja Zamora Limpieza de derrumbes a máquina 7500 m3 Carretera: El Retorno la Fragancia Reconformación d erasante con motoniveladora 16 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 km Reposición de material en calzada 1420 m3 Reposición de rellenos 3200 m3 Movimiento de tierras sin trasnporte 3000 m3 Transporte de material 3000 m3 Carretera : Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 24 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Reposición de material en calzada 2380 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 600 m3 Movimiento de tierras sin transporte 1840 m3 Explotación de material 1840 m3	Román Carrión, Carlos Anibal	25/03/2014 - 02:14 PM
ENERO 2014 Carretera: Loja Zamora Limpieza de derrumbes a máquina 1800 m3 Carretera: El Retorno la Fragancia	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	11/03/2014 - 04:32 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Reposición de material en calzada 1000 m3 Transporte de material 300 m3 Carretera: Chuchumbleta El Quimi- Tundayme Mirador , El Quimi Manchinatza Santa Cruz Reconformación de rasante con motoniveladora 24 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Carretera : Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 18 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 18 km Reposición de material en calzada 740 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 7250 m3 Movimiento de tierras sin transporte 2050 m3 Explotación de material 2310 m3</p> <p>DICIEMBRE 2013 carretera Loja Zamora Limpieza de alcañatillas 245 m3 Roza a mano 2.5 has Carretera El Retorno La Fragancia Reposición de material en calzada 2000 m3 Reposición de rellenos 2000 m3 Carretera Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 168 m3 reconformación d erasante con motoniveladora 17 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 17 km Limpieza de cunetas a mano 4.8 km Limpieza de alcañatillas 48 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 3 Und. Roza a mano 24 has Reposición de material en calzada 2056 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 120 m3 Movimiento de tierras sin transporte 1620 m3 Explotación de material 1740 m3</p>		
<p>NOVIEMBRE 2013 Carretera El Tiro Zamora Bacheo de lastre a mano 24 m3 Roza a mano 2.45 Has Otros mejoramientos colocación de tachas 2341 und Carretera El Retorno la Fragancia via Antigua Reconformación de rasante con Motoniv. 15 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 15 km Reposición de material en calzada 430 m3 Reposición de rellenos 1490 m3 Carretera Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 102 m3 Reconformacion de rasante con motoniveladora 19 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 18 km Limpieza de cuentas a mano 1.48 km Limpieza de alcantarillas 48 m3 Roza amano 23.8 has Reposición de material en calzada 1990 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 920 m3 Otros mejoramientos. construcción de 6 muros de piedra 64 m3 Explotación de material 2100 m3</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>04/12/2013 - 09:01 AM</p>
<p>OCTUBRE 2013 Carretera: El Tiro zamora - Roza a mano 4.5 has - Reposición de rellenos 260 m3 Carretera: El Retorno La Fragancia - Bacheo de lastre a mano 30 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 12 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km - Limpieza de cunetas a mano 3 km - Limpieza de alcantarillas 59.59 m3 - Otros mantenimientos rutinarios 12 CD - Supervisión de campo 22 CD Carretera: Bellavista Zumba La Balsa</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>06/11/2013 - 02:18 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Bacheo de lastre a mano 293 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 24.5 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 24. 5 km - Limpieza de cunetas a mano 8.25 km - Limpieza de alcantarillas 15.00 m3 - Roza a mano 18.4 has - Reposición de material en calzada 1650 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 310 m3 - Movimiento de tierras sin transporte 950 m3 - Otros mejoramientos (construcción de muros secos) 34 m3 - Explotación de material 1270 m3 		
<p>SEPTIEMBRE 2013</p> <p>carretera : Chuchumbletza - Tundayme San Marcos y El Quimi Manchinatza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconformación d erasante con motoniveladora 10 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 20 km - Reposición d ematerial en calzada 750 m3 <p>Carretera El Retorno La Fragancia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bacheo de lastre a mano 60 m3 - Reconformación d erasnte con motoniveladora 15 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 20 km - Limpieza de cunetas a mano 3 km - Limpieza de alcantarillas 59,59 m3 - Reposición d e material en calzada 650 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 550 m3 - Inspección y mantenimiento d epuentes 1 und. - Roza a mano 4.26 has - Mantenimiento d instalaciones 10 CD - Explotación de material 650 m3 <p>Carretera Bellavista Zumba La Balsa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bacheo de lastre a mano 233 m3 - Reconformación de rasnte con motoniveladora 36 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 36 - Limpieza de cunetas a mano 8,20 km - Limpieza de alcantarillas 10 m3 - Reposición de material en calzada 2510 m3 -Roza a mano 4.26 has - Reparación y mantenimiento de señales verticales 150 und. - Movimiento de tierras sin transporte 4880 m3 - Explotación de material 4380 m3 	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>02/10/2013 - 11:46 AM</p>
<p>AGOSTO 2013</p> <p>Carretera El Tiro - Zamora</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bacheo de lastre a mano 63 m3 - Limpieza de cunetas a mano 3,1 km - Inspección y mantenimiento de puentes 1 Und. - Limpieza de alcantarilla 4 Und. 24 m3 - Roza a mano 2,94 has - Limpieza de derrumbes a mano 30 m3 <p>Carretera Chuchumbletza Tundayme San Marcos Campamento Mirador</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reconformación d e rasante con motoniveladora 16 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 km -Limpieza de alcantarillas 12 m3 -Servicio de gabarra 96 E/h -Reposición d e material en calzada 1090 m3 - Explotación de material 1090 m3 <p>Carretera Bellavista Zumba - La Balsa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bacheo de lastre a mano 239 m3 -Reconformación d e rasante con motoniveladora 20 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 20 km - Limpieza de cuentas a mano 1,3 km -Limpieza de alcantarillas 60 m3 -Inspección y mantenimiento de puentes 1 Und. - Roza a mano 24,35 has -Reposición de material en calzada 2030 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 200 m3 - Movimiento d etieras sin transporte 1950 m3 	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>17/09/2013 - 08:42 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- Explotación de material 2070 m3</p> <p>JULIO 2013 Carretera El Tiro - Zamora - Reposición de material en calzada 100 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 2700 m3</p> <p>Carretera El Retorno - La Fragancia - Limpieza de cunetas a mano 4,7 km km 561 m3 - Limpieza de alcantarillas 45 m3 - Roza a mano 4,56 hás -Inspección y mantenimiento de puentes 1 Und. Carrtera Chuchumbletza El Quimi - Tundayme San Marcos - Reconformación de rasante con motoniveladora 7km Carretera Bellavista Zumba La Balsa - Bacheo de lastre a mano 187 m3 -Reconformación de rasante con moto 37,8,80 km -Limpieza de cunetas con moto 22,80 km -Limpieza de cunetas a mano 19,1 km -Roza a mano 17,85 hás -Reposición de material en calzada 2620 m3 -Movimiento de tierras sin transporte 1320 m3 -Explotación de material 1320 m3 - Inspección y arreglo de señales verticales 42 Und.</p> <p>JUNIO 2013 Carretera El Tiro - Zamora - Otros mantenimiento rutinarios 32 H/h - Reposición de material en calzada 220 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 12450 m3 - Explotación de material 220 m3 Carretera El Retorno - La Fragancia - Bacheo de lastre a mano 60 m3 - Limpieza de cunetas a mano 3.5 km 418 m3 - Limpieza de alcantarillas 60 m3 - Roza a mano 5.52 hás Carretera Bellavista Zumba La Balsa - Bacheo de lastre a mano -Limpieza de cunetas a mano 0.60 km -Roza a mano 19.40 hás -Reposición de material en calzada 1550 m3 -Movimiento de tierras sin transporte 1020 m3 -Explotación de material 1020 m3</p>		
<p>MAYO 2013 Carrterea: Loja - Zamora - Limpieza de derrumbes a máquina 3850 m3 -Supervisión de campo 176H/h Carretera: El Retorno - La Fragancia - Bacheo d elastre a mano 120 m3 -Reconformacion de rasante con motoniveladora 4 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 7 km - Limnpieza de alcantarillas 48 m3 - Roza a mano 9.0 hás - Reposición de material en calzada 1925 m3 -Supervisión de campo 176 H/h - Explotación de material 1925 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa - Bacheo de lastre a mano 75 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 11.2 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 11.2 km - Roza a mano 19.00 hás -Reposición de material en calzda 515 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 1920 m3 - Explotación d ematerial 515 m3</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>02/07/2013 - 04:15 PM</p>
<p>ABRIL 2013</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Carrterea: Loja - Zamora - Limpieza de derrumbes a máquina 5735 m3 -Supervisión de campo 176 H/h Carretera: El Retorno - La Fragancia - Bacheo d elastre a mano 324 m3 -Reconformacion de rasante con motoniveladora 6 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 12 km - Limpieza de cunetas a mano 547.50 m3 - Roza a mano 4.0 há s - Reposición de material en calzada 56 m3 -Supervisión de campo 176 H/h</p> <p>Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa - Bacheo de lastre a mano 167 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 9.6 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 9.6 km - Roza a mano 11.53 há s -Reposición de material en calzda 444 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 630 m3 - Explotación d ematerial 680 m3</p> <p>MARZO 2013 Carrterea: Loja - Zamora - Limpieza de derrumbes a máquina 11050 m3 Carretera: El Retorno - La Fragancia -Reconformacion de rasante con motoniveladora 17 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 17 km - Roza a mano 2.3 há s - Reposición de material en calzada 1000 m3 -Supervisión de campo 168 H/h - Explotación de material 1000 m3 Carretera: Bellavist - Zumba - La Balsa - Reconformación de rasante con motoniveladora 19.7 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 19.7 km - Roza a mano 6.4 há s -Reposición de material en calzda 800 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 1160 m3 - Explotación d ematerial 800 m3</p>		
<p>FEBRERO 2013 Carretera Loja - Zamora * Limpieza de derrumbes a máquina 21600 m3 * Supervisión de campo 152 H/h Carretera : El Retorno - la Fragancia * Reconformación de rasante con motoniveladora 15 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 15 km * Reposición de material en calzada 1605 m3 * Explotación d ematerial 1605 m3 Carretera Bellavista Zumba - La Balsa * Reconformación derasante con motoniveladora 17.8 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 17.8 km * Reposición de material en calzada 970 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 880 m3 * Movimiento de tierras sin transporte 420 m3 m3 * Explotación de material 970 m3 Carrterea Chuchumbletza El Quimi Tundayme * Servicio de gabarra 152 E/h</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>25/03/2013 - 03:29 PM</p>
<p>ENERO 2013 Carretera Loja - Zamora * Limpieza de derrumbes a máquina 20400 m3 * Supervisión de campo 176 H/h Carrterea : El Retorno - la Fragancia * Reposición de material en calzada 440 m3 Carretera Bellavista Zumba - La Balsa * Reconformación d erasante con motoniveladora 6.2 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 6.2 km</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>25/03/2013 - 03:28 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
* Reposición de material en calzada 830 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 1100 m3 * Explotación de material 830 m3 Carrterea Chuchumbletza El Quimi Tundayme * Servicio de gabarra 176 E/h		
DICIEMBRE 2012 Carretera El Retorno - la Fragancia * Reconformación de rasante con moto 16 km * Limpieza de cunetas con moto 16 km * Limpieza de alcantarillas 31 m3 * Roza a mano 2,25 has * Reposición de material en calzada 600 m3 * Transporte de material 600 m3 Carretera Chuchumbletza Tundayme * Otros mantenimiento rutinarios 20 CD (Servicio de gabarra) carretera Bellavista Zumba - La Balsa *Bacheo de lastre a mano 150 m3 * Reconformación de rasante con moto 5,3 km * Limpieza de cunetas con moto 5,3 km * Inspección y mantenimiento de puentes 2 Und * Roza a mano 15,00 has * Reposición de material en calzada 2770 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 160 m3 * Movimiento de tierras siun transporte 950 m3 * Explotación de material 2770 m3	Román Carrión, Carlos Anibal	25/03/2013 - 03:27 PM
NOVIEMBRE 2012 Carretera El Retorno - la Fragancia * Reconformación de rasante con moto 17 km * Limpieza de cunetas con moto 17 km * Limpieza de alcantarillas 24 m3 * Roza a mano 1,71 has * Reposición de material en calzada 200 m3 * Transporte de material 200 m3 Carretera Chuchumbletza Tundayme * Otros mantenimiento rutinarios 21 CD (Servicio de gabarra) carretera Bellavista Zumba - La Balsa *Bacheo de lastre a mano 80 m3 * Limpieza de alcantarillas 8 m3 * Inspección y Mantetenimiento de puentes 2 Und. * Roza a mano 15,00 has * Reposición de material en calzada 3060 m3 * Explotación de material 3060 m3	Román Carrión, Carlos Anibal	25/03/2013 - 03:27 PM
OCTUBRE 2012 Carretera El Retorno - la Fragancia * Reconformación de rasante con moto 28 km * Limpieza de cunetas con moto 20 km * Limpieza de alcantarillas 32 m3 * Roza a mano 2,49 has * reposición de material en calzada 305 m3 Carretera Chuchumbletza Tundayme * Otros mantenimiento rutinarios 20 CD (Servicio de gabarra) carretera Bellavista Zumba - La Balsa *Bacheo de lastre a mano 55 m3 * Limpieza de alcantarillas 8 m3 * Inspección y Mantenimiento de puentes 2 Und. * Roza a mano 19,00 has *Reposición de material en calzada 4380 m3 *Explotación de material 4380 m3	Román Carrión, Carlos Anibal	25/03/2013 - 03:26 PM
ACTIVIDADES REALIZADAS: SEPTIEMBRE 2012 Carretera El Retorno - La Fragancia *Reconformacion de rasante con moto 39 km * Limpieza de cunetas con moto 43 km * Limpieza de alcantarillas 36 m3 * Roza mano 3,9 Has	Román Carrión, Carlos Anibal	10/01/2013 - 11:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* Inspección y mantenimiento de puentes 2 Und *Reposición de material en calzada 750 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 1440 m3 Carretera Bellavista Zumba - La Balsa * bacheo de elastre a mano 105 m3 * Reconformación de rasante con moto 8 km *Limpieza de cunetas con moto 8 km * Roza a mano 22,1 has *Reposición de material en calzada 1020 m3 *Limpieza de derrumbes a máquina 1050 m3 * Mantenimiento de instalaciones 3 Cd</p> <p>AGOSTO 2012 Carretera El Retorno - La Fragancia *Reconformación de rasante con moto 15 km * Limpieza de cunetas con moto 25 km *Reposición de material en calzada 1380 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 1200 m3 * Apoyo a otras instituciones 8 E/H Carretera Bellavista Zumba - La Balsa * Reconformación de rasante con moto 26 km *Limpieza de cunetas con moto 48 km *Reposición de material en calzada 3282 m3 *Limpieza de derrumbes a máquina 5000 m3 * reposición de rellenos 1050 m3 * Movimientos de tierras sin transporte 4000 m3 * Mantenimiento de instalaciones 16 Cd</p> <p>JULIO 2012 Carretera El Retorno - La Fragancia * Otros mantenimiento rutinarios 12 CD *Trasporte de materiales 120 m3 * Explotación de material 120 m3 Carretera Bellavista - Zumba - La Balsa *Bacheo de elastre a mano 80 m3 *Reconformación de rasante con moto 20 km * Limpieza de cunetas con moto 40 km * Reposición de material en calzada 4000 m3 *Limpieza de derrumbes a máquina 10850 m3</p> <p>JUNIO 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reposición de material en calzada 1000 M3 * Transporte de materiales 2000 m3 * Explotación de material 2000 m3 Carretera Bellavista - Zumba - La Balsa * Reconformación de rasante con motoniveladora 16 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 km * Reposición de material en calzada 1000 M3 * Limpieza de derrumbes a máquina 11000 M3 * Transporte de materiales 2000 m3 * Explotación de material 2000 m3</p> <p>MAYO 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reconformación de rasante con motoniveladora 48 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 48 km * Reposición de material en calzada 1000 M3 * Reposición de rellenos 1500 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 3300 M3 * Transporte de materiales 2000 m3 * Explotación de material 1000 m3 * Apoyo a otras Instituciones 672 E/H carretera Chuchumbletza Tundayme *Reposición de material en calzada 1000 m3 * Explotación de material 1000 m3</p> <p>ABRIL 2012 Carretera : El retorno la Francia</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* Reconformación de rasante con motoniveladora 10 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 10 km * Reposición de material en calzada 1000 M3 * Limpieza de derrumbes a máquina 1400 M3 * Transporte de materiales 600 m3 * Explotación de material 1000 m3 * Apoyo a otras Instituciones 480 E/H</p> <p>MARZO 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reconformación de rasante con motoniveladora 4 km * Reposición de material en calzada 5000 M3 * Limpieza de derrumbes a máquina 7400 M3 * Movimiento de tierras sin transporte 7500 m3</p> <p>FEBRERO 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reconformación de rasante con motoniveladora 17 km * Limpieza de cunetas con Motoniveladora 17 km * Reposición de material en calzada 900 m3 * Reposición de rellenos 600 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 7400</p> <p>ENERO: 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reconformación de rasante con motoniveladora 15 km * Limpieza de cunetas con Motoniveladora 15 km * Reposición de material en calzada 900 m3 * Reposición de rellenos 600 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 3100 m3 * Explotación de material 1500 m3 * transporte de material 600 m3</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de contratación de microempresas para el mtto. rutinario de las vías, ocasiona el incumplimiento de las metas programadas	03/07/2018	Ximena del Cisne Toledo Vásquez	100	50	50	2/2
Falta operadores de maquinaria provoca el incumplimiento de metas programadas	05/06/2018	Ximena del Cisne Toledo Vásquez	100	50	50	3/3
Falta de operadores de equipo caminero	02/05/2018	Ximena del Cisne Toledo Vásquez	50	30	15	3/3
Equipo caminero de la Dirección Distrital en mal estado	03/09/2018	Ximena del Cisne Toledo Vásquez	50	20	10	1/2

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 4

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Tiempo. Fuerte temporal invernal CAUSARIA retraso en los trabajos de mantenimiento	03/09/2018	Ximena del Cisne Toledo Vásquez	10 %	10	1	0/2

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Chinchipe
2	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > El Pangui
3	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Palanda
4	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Zamora

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en la vía antigua: Zamora-Loja, tramo: La Fragancia-El Retorno, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2012		31/03/2012		Sí	0.5
2	EJECUCIÓN: Reconfiguración de rasante y limpieza de cunetas con motoniveladora en la vía antigua: Zamora-Loja, tramo: La Fragancia-El Retorno, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2012		31/03/2012		Sí	0.5
3	EJECUCIÓN: Reconfiguración de rasante y limpieza de cunetas con motoniveladora en la vía Chuchumbleta-Tundayme-Condor Mirador. Fase 1, terminado	5-Entregables Intermedios	31/05/2012		31/05/2012		Sí	0.5
4	EJECUCIÓN: Reconfiguración de rasante y limpieza de cunetas con motoniveladora en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa. Fase 1, terminado	5-Entregables Intermedios	31/07/2012		31/07/2012		Sí	0.5
5	EJECUCIÓN. Explotación y reposición de material en calzada en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa. Fase 1, terminado	5-Entregables Intermedios	30/08/2012		30/08/2012		Sí	0.5
6	EJECUCIÓN: Explotación y reposición de material en calzada en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa. Fase 2, terminado	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.5
7	EJECUCIÓN: Explotación y reposición de material en calzada en la vía Chuchumbleta-Tundayme-Condor Mirador, terminado	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.5
8	EJECUCIÓN: Reconfiguración de rasante y limpieza de cunetas con motoniveladora	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa. Fase 2, terminado							
9	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en la vía Bellavista - Zumba - la Balsa, terminado	5-Entregables Intermedios	31/10/2012		31/10/2012		Sí	3.0
10	EJECUCIÓN: Reconfiguración de rasante y limpieza de cunetas con motoniveladora en la vía Bellavista - Zumba - La Balsa Fase 2, terminado	5-Entregables Intermedios	31/10/2012		31/10/2012		Sí	3.0
11	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa, terminado	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	3.0
12	EJECUCIÓN: Roza a mano, limpieza de alcantarillas en todas las vías, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	3.0
13	EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento normalmente en año 2013, terminado	5-Entregables Intermedios	02/01/2013		02/01/2013		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Explotación y reposición de material en calzada en la vía antigua: Zamora-Loja, tramo: La Fragancia-El Retorno, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2012		Sí	3.0
15	EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal , terminado	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		31/07/2013		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/08/2013		31/08/2013		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN: Reconfiguración de rasante con motoniveladora en las vías de la Red Estatal, terminado	1-Solicitud de Información	31/12/2013		31/12/2013		Sí	3.0
19	EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.0
20	Ejecución: Inicio de trabajos de mantenimiento para el año 2014, terminado	4-Inicio de Trabajo	02/01/2014		02/01/2014		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Explotación de material vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	3.0
22	EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	3.0
23	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	EJECUCIÓN: Reconfiguración de rasante con motoniveladora en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
30	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal mes de Mayo 2015	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	1.0
31	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Junio 2015	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
35	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Julio 2015	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.0
36	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Agosto 2015	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	1.0
37	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Septiembre 2015	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
41	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Octubre 2015	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	1.0
42	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Noviembre 2015	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
43	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Diciembre 2015	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
46	EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
47	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Enero 2016	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	1.0
48	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Febrero 2016	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	1.0
49	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Marzo 2016	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.0
50	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Abril 2016	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	1.0
51	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Mayo 2016	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	1.0
52	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Junio 2016	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.0
53	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Julio 2016	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	1.0
54	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Agosto 2016	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	1.0
55	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Septiembre 2016	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	1.0
56	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Octubre 2016	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	1.0
57	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Noviembre 2016	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	1.0
58	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Diciembre 2016	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		30/12/2016		Sí	1.0
59	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Enero 2017	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	1.0
60	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Febrero 2017	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	1.0
61	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Marzo 2017	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
62	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Abril 2017	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	1.0
63	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Mayo 2017	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	1.0
64	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Junio 2017	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	1.0
65	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Julio 2017	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	1.0
66	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Agosto 2017	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	1.0
67	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Septiembre 2017	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	1.0
68	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Octubre 2017	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	1.0
69	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Noviembre 2017	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	1.0
70	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Diciembre 2017	5-Entregables Intermedios	28/12/2017		28/12/2017		Sí	1.0
71	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Enero 2018.	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	1.0
72	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Febrero 2018.	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	1.0
73	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Marzo 2018.	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	1.0
74	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Abril 2018.	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	1.0
75	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Mayo 2018.	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	1.0
76	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Junio 2018.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	1.0
77	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	emergente de la RVE en el mes de Julio 2018.							
78	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Agosto 2018.	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	1.0
79	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Septiembre 2018.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018	30/09/2018			No	1.0
80	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Octubre 2018.	5-Entregables Intermedios	31/10/2018	31/10/2018			No	1.0
81	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Noviembre 2018.	5-Entregables Intermedios	30/11/2018	30/11/2018			No	1.0
82	CIERRE: Liquidación económica realizada	9-Entregables Formales	31/12/2018	31/12/2018			No	1.0
83	CIERRE: Liquidación económica realizada	9-Entregables Formales	31/12/2018	31/12/2018			No	1.0
84	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Diciembre 2018.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	1.0




SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Proyecto se desarrolla de acuerdo a la planificación	Gudiño Mena, Zobeida Guisela	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	30/06/2017
2	Se cumplen actividades planificadas en el proyecto"	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	21/07/2016
3	"Limitado mantenimiento en la red estatal, carretera: BELLAVISTA-ZUMBA-LA Balsa"	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	24/12/2015
4	"Limitado mantenimiento en la red estatal, carretera: Zamora-Loja"	Guamán Cajas, Victor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	28/07/2015
5	Se realizan trabajos de mantenimiento en la red estatal Zamora-Loja"	Guamán Cajas, Victor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	18/03/2015
6	"Verificación de trabajos realizados en el mes de septiembre en las vías de la red estatal: Carretera Bellavista-Zumba-La Balsa"	Esparza Aguirre, Diego Fernando	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	14/10/2014
7	Seguimiento del proyecto	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	28/03/2014
8	ZAMORA 2: Proyecto se encuentra en curso	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	19/08/2013
9	Seguimiento de cumplimiento y avance del proyecto mantenimiento Red Vial Estatal	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	23/02/2013
10	Historico - Se ejecutan trabajos de mantenimiento.	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	09/08/2012
11	Historico - Conforme a la visita realizada el 20 de junio de 2012, en el tramo: La Fragancia- El Retorno, se evidenció que los trabajos de mantenimiento de la vía aún no se han llevado a cabo en	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	20/06/2012
12	Historico - En ejecución	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	10/06/2012

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
13	Historico - Proyecto en ejecución.	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	10/05/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	volumen de material desalojado de la vía		238.24 %	15,800	37,642	03/01/2012	Agosto
2	Kilómetros de reconfirmación de rasante de la vía		85.67 %	21	17.99	03/01/2012	Agosto
3	Kilómetros de Mantenimiento Rutinario de la RVE		88.09 %	920.33	810.72	01/01/2018	Agosto

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,732,142.97 **
Costo Total:	13,544,464.89
Total Devengado:	14,935,113.68
% Costo Total Devengado:	110.27 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 110.27 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	14,318,295.00	3,439,884.98	0.00	17,758,179.98
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	5,570,192.17	2,261,586.37	0.00	7,831,778.54
Ppto. Codificado	16,677,230.24	3,627,964.96	0.00	20,305,195.20
Ppto. Comprometido	15,097,955.62	1,724,740.52	0.00	16,822,696.14
Planeado - Codificado (2018)		-188,079.98		
Programado a Devengar	9,429,064.11	0.00	0.00	9,429,064.11
Ppto. Devengado	13,732,142.97	1,202,970.71	0.00	14,935,113.68
Pagado Real	10,561,347.16	1,202,970.71	0.00	11,764,317.87
Estimado a fin de año	* 13,732,142.97	0.00	0.00	13,732,142.97
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-4,303,078.86	0.00	0.00	-4,303,078.86
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 145.64 %	-	0.00 %	158.39 %
Ppto. Codificado 998	1,777,587.74	188,079.98	0.00	1,965,667.72
Ppto. Devengado 998	1,777,587.74	156,257.43	0.00	1,933,845.17

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

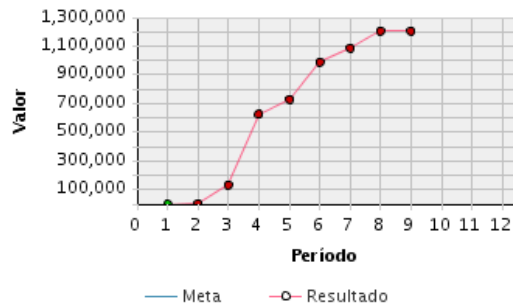

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	1,298.55	0.00	1,298.55	115.00 %		115.00 %
Mar	0.00	130,377.86	0.00	131,676.41	115.00 %		115.00 %
Abr	0.00	495,608.78	0.00	627,285.19	115.00 %		115.00 %
May	0.00	102,753.59	0.00	730,038.78	115.00 %		115.00 %
Jun	0.00	258,043.17	0.00	988,081.95	115.00 %		115.00 %
Jul	0.00	98,775.43	0.00	1,086,857.38	115.00 %		115.00 %
Ago	0.00	115,966.72	0.00	1,202,824.10	115.00 %		115.00 %
Sep	0.00	146.61	0.00	1,202,970.71	115.00 %		115.00 %
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00	1,202,970.71					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos
15	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		E.6_Estado_Gráfico_-_Septiembre_2014.xls	06/10/2014
2	A.1 Informe Mensual de Conservación - Enero 2012	A.1_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
3	A.2 Informe Mensual de Conservación - Febrero 2012	A.2_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
4	A.3 Informe Mensual de Conservación - Marzo 2012	A.3_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
5	A.4 Informe Mensual de Conservación - Abril 2012	A.4_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
6	A.5 Informe Mensual de Conservación - Mayo 2012	A.5_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
7	A.6 Trabajos de Conservacion Vial	A.6_Fotos_09mayo2012.pdf	18/03/2014
8	A.7 Informe Mensual de Conservación - Junio 2012	A.7_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
9	A.8 Informe Mensual de Conservación - Julio 2012	A.8_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
10	A.9 Trabajos de Conservacion Vial	A.9_Fotos_11jul2012.pdf	18/03/2014
11	AA.4. Informe_de_Conservación_ABRIL_2016 DIEGO AREVALO	Informe_de_Conservación_ABRIL_2016_DIEGO_AREVALO.06/09/2016	06/09/2016
12	AA.5. Informe_de_Conservación_MAYO_2016 DIEGO AREVALO	Informe_de_Conservación_MAYO_2016_DIEGO_AREVALO.06/09/2016	06/09/2016
13	AA.6 Informe_de_Conservación_JUNIO_2016 DIEGO AREVALO	Informe_de_Conservación_JUNIO_2016_DIEGO_AREVALO.06/09/2016	06/09/2016
14	AA.7. Informe_de_Conservación_JULIO_2016 DIEGO AREVALO	Informe_de_Conservación_JULIO_2016_DIEGO_AREVALO.06/09/2016	06/09/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	AA7. Informe_de_Conservación_AGOSTO_2016 DIEGO AREVALO	AA7._Informe_de_Conservación_AGOSTO_2016_DIEGO_AREVALO.xls	05/10/2016
16	AA8. INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2016	AA8._INFORME_MENSUAL_SEPTIEMBRE_2016.pdf	05/10/2016
17	AA8. Informe_de_Conservación_SEPTIEMBRE_2016 DIEGO AREVALO	AA8._Informe_de_Conservación_SEPTIEMBRE_2016_DIEGO_AREVALO.xls	05/10/2016
18	AA9. Informe_de_Conservación_OCTUBRE_2016 DIEGO AREVALO	AA9._Informe_de_Conservación_OCTUBRE_2016_DIEGO_AREVALO.xls	05/10/2016
19	B.1 Informe Mensual de Conservación - Agosto 2012	B.1_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
20	B.2 Ficha Informativa de Proyecto 2012	B.2_Reporte_GPR.pdf	18/03/2014
21	B.3 Informe Mensual de Conservación - Septiembre 2012	B.3_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
22	B.4 Aclaratoria a observaciones del Sr. Gobernador	B.4_Oficio_Nro._MTOB-DPZCH-12-329-OF_08oct2012.pdf	18/03/2014
23	B.5 Informe Mensual de Conservación - Octubre 2012	B.5_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
24	B.6 Informe Mensual Conservación - Noviembre 2012	B.6_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
25	B.7 Informe Mensual Conservación Diciembre 2012	B.7_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
26	B.8 Informe Mensual Conservación Enero 2013	B.8_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
27	B.9 Informe Mensual Conservación - Febrero 2013	B.9_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
28	C.1 Informe Mensual de Conservación - Abril 2013	C.1_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
29	C.2 Informe Mensual de Conservación - Mayo 2013	C.2_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
30	C.3 Informe Mensual de Conservación - Junio 2013	C.3_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
31	C.4 Informe Mensual Conservación - Julio 2013	C.4_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
32	C.5 Informe Mensual de Conservación -Agosto 2013	C.5_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
33	C.6 Informe Mensual Conservación - Septiembre 2013	C.6_informe_Mensual.xls	24/03/2014
34	C.7 Informe Mensual Conservación - Octubre 2013	C.7_Informe_mensual.xls	24/03/2014
35	C.8 Informe Mensual de Conservación - Noviembre 2013	C.8_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
36	C.9 Informe Mensual Conservación - Diciembre 2013	C.9_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
37	D.1 Informe Mensual de Conservación - Enero 2014	D.1_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
38	D.2 Informe Mensual Conservación - Febrero 2014	D.2__Informe_Mensual.xls	25/03/2014
39	D.3 Informe Mensual de Conservación - Marzo 2014	D.3_Informe_Mensual.xls	04/04/2014
40	D.4 Informe Mensual de Conservación - Abril 2014	D.4_Informe_Mensual.xls	08/05/2014
41	D.5 Estado Gráfico de Equipo - Abril 2014	D.5_Estado_Grafico_de_Equipos.xls	08/05/2014
42	D.6 Informe Mensual Conservación - Mayo 2014	D.6_Informe_Mensual.xls	04/06/2014
43	D.7 Estado Gráfico de Equipo - Mayo 2014	D.7_Estado_Gráfico_Equipo_-_Mayo_2014.xls	04/06/2014
44	D.8 Informe Mensual de Conservación - Junio 2014	D.8__Informe_Mensual.xls	02/07/2014
45	D.9 Estado Gráfico Equipo - Junio 2014	D.9_Estado_gráfico.xls	02/07/2014
46	E. 3 Informe Mensual de Conservación - Agosto 2014	E.3_Informe_de_Conservación_-_Agosto_2014.xls	08/09/2014
47	E.1 Informe Mensual de Conservación - Julio 2014	E.1_Informe_Mensual_Julio_2014.xls	05/08/2014
48	E.2 Estado gráfico Equipo - Julio 2014	E.2_Estado_Gráfico_Equipo_-_julio_2014.xls	05/08/2014
49	E.4 Estado Gráfico Equipo - Agosto 2014	E.4_Estado_Gráfico_Equipo_-_Agosto_2014.xls	08/09/2014
50	E.5 Informe Mensual de Conservación - Septiembre 2014	E.5_Informe_Mensual_de_Conservación_-_Septiembre_2014.xls	06/10/2014
51	E.6 Informe Mensual Conservación - Octubre 2014	E.6_Informe_Mensual_Conservación_-_Octubre_2014.xls	07/11/2014
52	E.7 Estado Gráfico Equipo - Octubre 2014	E.7__Estado_Gráfico_Equipo_-_Octubre_2014.xls	07/11/2014
53	E.8 Informe Mensual de Conservación - Noviembre 2014	E.8_Informe_Mensual_de_Conservación_-_Noviembre_2014.xls	02/12/2014
54	E.9 Estado Gráfico Equipo - Noviembre 2014	E.9_Estado_Gráfico_Equipo_-_Noviembre_2014.xls	02/12/2014
55	F.1 Informe Mensual de Conservación - Diciembre 2014	F.1_Informe_Mensual_de_Conservación_-_Diciembre_2014.xls	31/12/2014
56	F.2 Estado Gráfico Equipo - Diciembre 2014	F.2_Estado_Grafico_Equipo_-_Diciembre_2014.xls	31/12/2014
57	F.3 Informe Mensual de Conservación - Enero 2015	F.3_Informe_Mensual_Conservación_-_Enero_2015.xls	05/02/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
58	F.4 Estado Gráfico - Enero 2015	F.4_Estado_Gráfico_Enero_2015.xls	05/02/2015
59	F.5 Informe Mensual Conservación - Febrero 2015	F.5_Informe_Mensual_Conservación_-_Febrero_2015.xls	06/03/2015
60	F.6 Estado Gráfico de Equipo - Febrero 2015	F.6_Estado_Gráfico_de_Equipo_-_Febrero_2015.xls	06/03/2015
61	F.7 Informe de Conservación - Marzo 2015	F.7_Informe_de_Conservación_-_Marzo_2015.xls	05/04/2015
62	F.8 Estado Gráfico Equipo - Marzo 2015	F.8_Estado_Grafico_Equipo_-_Marzo_2015.xls	05/04/2015
63	F.9 Informe de Conservación - Abril 2015	F.9_Informe_de_Conservación_-_Abril_2015.xls	06/05/2015
64	G.1 Estado Gráfico Equipo - Abril 2015	G.1_Estado_Gráfico_Equipo_-_Abril_2015.xls	06/05/2015
65	G.2 Solicitud para contratar operador de motoniveladora	G.2_Solicitud_para_contratar_operador_de_motoniveladora.pdf	04/06/2015
66	G.3 Informe de Conservación - Mayo 2015	G.3_Informe_de_Conservación_-_Mayo_2015.xls	04/06/2015
67	G.4 Estado Gráfico Equipo - Mayo 2015	G.4_Estado_Gráfico_-_Equipo_-_Mayo_2015.xls	04/06/2015
68	G.5 Informe de Conservación - Junio 2015	G.5_Informe_de_Conservación_-_Junio_2015.xls	07/07/2015
69	G.6 Estado Gráfico - Junio 2015	G.6_Estado_Gráfico_-_Junio_2015.xls	07/07/2015
70	G.7 Informe de Conservación - Julio 2015	G.7_Informe_de_Conservación_-_Julio_2015.xls	04/08/2015
71	G.8 Estado Gráfico Equipo Julio 2015	G.8_Estado_Gráfico_Equipo_-_Julio_2015.xls	04/08/2015
72	G.9 Informe de Conservación - Agosto 2015	G.9_Informe_de_Conservación_-_Agosto_2015.xls	02/09/2015
73	H.1 Estado Gráfico Equipo - Agosto 2015	H.1_Estado_Gráfico_Equipo_-_Agosto_2015.xls	02/09/2015
74	H.2 Informe de Conservación - Septiembre 2015	H.2_Informe_de_Conservación_-_Septiembre_2015.xls	05/10/2015
75	H.3 Estado Gráfico Equipo - Septiembre 2015	H.3_Estado_Gráfico_Equipo_-_Septiembre_2015_2015.xls	05/10/2015
76	H.4 Informe de Conservación - Octubre 2015	H.4_Informe_de_Conservación_-_Octubre_2015.xls	04/11/2015
77	H.5 Estado Gráfico Equipo - Octubre 2015	ESTADO_GRAFICO_OCTUBRE_2015.xls	04/11/2015
78	H.6 Informe de Conservación - Noviembre 2015	H.6_Informe_de_Conservación_-_Noviembre_2015..xls	07/12/2015
79	H.7 Estado Gráfico Equipo - Noviembre 2015	H.7_Estado_Gráfico_Equipo_-_Noviembre_2015..xls	07/12/2015
80	H.8 Informe de Conservación - Diciembre 2015	H.8_Informe_de_Conservación_Diciembre_2015..xls	11/01/2016
81	H.9 Estado Gráfico Equipo - Diciembre 2015	H.9_Estado_Gráfico_Equipo_Diciembre_2015.xls	11/01/2016
82	I. 5 informe mensual de trabajos octubre del 2016	informe_mensual_de_trabajos_octubre_del_2016.pdf	08/11/2016
83	I.1 Estado Gráfico Equipo - Enero 2016	I.1_ESTADO_GRAFICO_ENERO_2016.xls	05/02/2016
84	I.2 Estado Gráfico Equipo Febrero 2016	I.2_ESTADO_GRAFICO_FEBRERO.2016.xls	18/03/2016
85	I.3 Informe de Conservación Febrero 2016	I.3_Informe_de_Conservación_Febrero_2016.xls	18/03/2016
86	I.4 Informe de Conservación MARZO 2016 DIEGO AREVALO	Informe_de_Conservación_MARZO_2016_DIEGO_AREVALO.pdf	05/05/2016
87	I.5 Informe de Conservación Noviembre 2016	Inf._mensual_conservacion_nov2016.pdf	03/02/2017
88	I.6 Informe de Conservación Diciembre 2016	Inf._mensual_Dic2016.pdf	03/02/2017
89	I.7 Plan anual de conservacion 2017	Doc._Inf.anual_de_conservacion_2017.pdf	03/02/2017
90	I.8 Requerimiento de contratacion de personal	MTOP-CON_ZAM-2017-127-ME.pdf	03/02/2017
91	I.9 Informe de Conservación Enero 2017	Inf._mensual_Enero2017.pdf	03/03/2017
92	J.1 Informe de Inversión Enero 2017	Inf._inversiones_ene2017.pdf	03/03/2017
93	J.2 Informe de Conservación Febrero 2017	Inf._mensual_Febrero2017.pdf	04/04/2017
94	J.3 Memorando solicitando personal	MTOP-DDZCH-2017-759-ME.pdf	03/05/2017
95	J.4 Informe inversion Mayo 2017	inf.inversiÓN.mayo.pdf	04/07/2017
96	J.5 Informe Conservación Mayo 2017	inf_conservacion_utltimo_mayo2017.xls	04/07/2017
97	J.6 Solicitando asignación presupuestaria pra contratación de personal	MTOP-DDZCH-2017-931-ME.pdf	03/10/2017
98	J.7 Informe Conservación Junio 2017	inf.conservacion_junio2017.pdf	03/10/2017
99	J.8 Informe inversion Junio 2017	inf.conservacion_junio2017b.pdf	03/10/2017
100	J.9 Informe Conservación Julio 2017	inf.conservacion_julio2017.pdf	03/10/2017
101	K.1 Informe Conservación Agosto 2017	inf.conservacion_agosto2017.xls	03/10/2017
102	K.2 Informe trabajos rve E682 septiembre 2017	inf._trabajos_septiembre2017_RVE682.pdf	03/10/2017
103	K.3 Informe Conservación Septiembre 2017	inf.conservacion_septiembre2017.pdf	01/11/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
104	K.4 Informe_trabajos rve E682_octubre2017	inf._trabajos_octubre2017_RVE682.pdf	01/11/2017
105	K.5 Informe_Conservación_Octubre2017	Informe_conservacion_octubre2017.xls	05/12/2017
106	K.6 Informe_trabajos rve E682_noviembre2017	inf._trabajos_noviembre2017_RVE682.pdf	05/12/2017
107	K.8 Informe_trabajos rve E682_diciembre2017	inf._trabajos_diciembre2017_RVE682.pdf	04/01/2018
108	K.9 Informe_Conservación_Diciembre2017	inf.conservacion_diciembre2017.pdf	04/01/2018
109	L.1 Informe_trabajos rve E682_enero2018	inf._trabajos_RVE682_ene2018.pdf	05/02/2018
110	L.2 Memorando No. MTOP-SUBZ7-2018-0227-ME solicitando contratación de operadores.	MTOP-SUBZ7-2018-0227-ME.pdf	05/03/2018
111	L.3 Informe_Conservación	Informe_conserv.enero.2018.pdf	05/03/2018
112	L.4 Informe_Inversión	Informe_inversión_enero_2018.pdf	05/03/2018
113	L.5 Informe_trabajos RVE E682	inf._trabajos_RVE682_febrero2018.pdf	05/03/2018
114	L.6 Informe_trabajos RVE E682 marzo 2018	inf._trabajos_RVE682_marzo2018.pdf	03/04/2018
115	L.7 Informe_trabajos RVE E682 abril2018	inf._trabajos_RVE682_abr2018.pdf	05/06/2018
116	L.8 Informe_trabajos RVE E682 mayo2018	inf._trabajos_RVE682_may2018.pdf	05/06/2018
117	L.9 Informe_trabajos RVE E682 junio2018	inf._trabajos_RVE682_jun2018.pdf	03/07/2018
118	M.1 Informe_trabajos RVE E45 junio2018	inf._trabajos_RVE45_jun2018.pdf	03/07/2018
119	M.2 Informe_trabajos RVE E50 junio2018	TRABAJOS_EJECUTADOS_E50_junio2018.pdf	03/07/2018
120	M.3 Informe_Conservación	Informe_conservación_febrero2018.pdf	02/08/2018
121	M.4 Informe_Conservación RVE	Informe_conservación_marzo2018.pdf	02/08/2018
122	M.5 Informe_Conservación RVE	Informe_conservación_abril2018.pdf	02/08/2018
123	M.6 Informe_Conservación RVE	Informe_conservación_mayo2018.pdf	02/08/2018
124	M.6 Informe_Conservación RVE	Informe_conservación_junio2018.pdf	02/08/2018
125	M.7 Informe_trabajos RVE E45 julio2018	inf._trabajos_RVE45_jul2018.pdf	02/08/2018
126	M.8 Informe_trabajos RVE E50 julio2018	TRABAJOS_EJECUTADOS_E50_julio2018.pdf	02/08/2018
127	M.9 Informe_trabajos RVE E682 julio2018	inf._trabajos_RVE682_jul2018.pdf	02/08/2018
128	N.1 Informe_Conservación RVE	Informe_conservación_julio2018.pdf	03/09/2018
129	N.2 Informe_trabajos RVE E50 agosto2018	TRABAJOS_EJECUTADOS_E50_agosto2018.pdf	03/09/2018
130	N.3 Informe_trabajos RVE E45 agosto2018	inf._trabajos_RVE45_ago2018.pdf	03/09/2018
131	N.4 Informe_trabajos RVE E682 agosto2018	inf._trabajos_RVE682_ago2018.pdf	03/09/2018

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	SITOP
	http://sitop.mtop.gob.ec:8080/mtop/

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Coordinador de Infraestructura de Zamora			
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Observadora GPR, Subsecretaría Zonal 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600
Romero Arciniega, Franz Hernan	Director Distrital, Encargado del MTOP Zamora Chinchipe	Experto de Infraestructura Provincial	fromero@mtop.gob.ec	07-3060538
Romero Jimenez, Alexandra Rocío	Supervisora Financiera	Cordinadora Administrativa Financiera	aromero@mtop.gob.ec	
Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	Supervisora de Obra, Lider del proyecto	Analista de Infraestructura Distrital 2	xtoledo@mtop.gob.ec	023974600

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Villavicencio Garcia, Israel Vinicio	Subsecretario Zonal 7		salio@mtop.gob.ec	
