

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Cañar

PROYECTO: K023 MTOP-Mantenimiento Vial de la Provincia del Cañar

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Líder del Proyecto: | Dután Sanango, Italo Medardo (imдутan@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Quezada Jara, Mónica Fabiola | Programas Relacionados: | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, Provincia - Cañar, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular: | Izquierdo Campoverde, Galo Fernando | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.506.3657 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 4 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,621,399.05 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2014 - 31/12/2018 |
| Fecha de última actualización: | 28/12/2018 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2017 |
| Modificado por: | Izquierdo Campoverde, Galo Fernando | Fecha del siguiente Hito: | 31/12/2018 |

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION:

MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR

EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA MTOP

SERVICIO: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las poblaciones que se encuentran en las vías que se dan mantenimiento vial permanente.

LINEA BASE: A lo largo del proyecto, Las viviendas están concentradas en las cercanías de los centros comunales y otras dispersas. Para la construcción de las viviendas se usa principalmente el cemento, ladrillo, bloque, techos de eternit, ardex, teja vidriada de fibra plástica. Las casas son de variados modelos y colores, en algunos casos modelos adoptados de las ciudades con espacios de parqueaderos, corredores amplios.

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la capacidad de circulación en la vía, imagen y seguridad, de las poblaciones que se encuentran en la vía con la dotación de infraestructura vial en buen estado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- 1.1 Limpieza de cunetas.
- 1.2 Limpieza de bordillos
- 1.3 Limpieza de Alcantarillas
- 1.4 limpieza de derrumbes.
- 1.5 Bacheo Asfáltico.
- 1.6 Estabilización de sitios críticos.

MICROEMPRESAS:

- Cantera Chauca
- Matapin
- Zhoray

Beneficios Cualitativos

Mediante el mantenimiento vial se reduce el costo del transporte, los tiempos de traslado, se extiende el tiempo de vida útil de la vía y se brinda seguridad al conductor y peaton.

Tipo de Beneficiario

Comerciantes
Agricultores
Sector Turístico
Población en general


Restricciones

Tiempo: El plazo para el mantenimiento es anual.
Costo: El valor total para el mantenimiento es aproximadamente de USD \$500.000,00 por año.
Alcance Se espera contar con la red vial estatal de la provincia del Cañar en condiciones óptimas para el Tránsito vehicular y peatonal.
Recursos: Personal y maquinaria del MTOP- Cañar, así como contratación de Asociación de Microempresarios.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

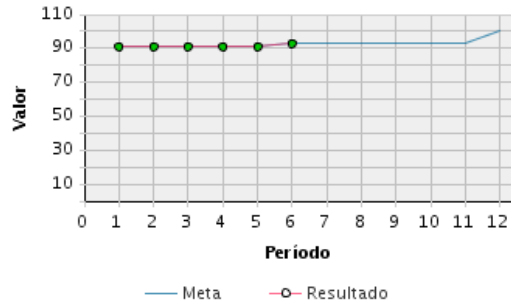

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2018 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 93 % | | | | | | |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| NOVIEMBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; Y Zhud - Río Angas. | Dután Sanango, Italo Medardo | 05/12/2018 - 05:07 PM |
| OCTUBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; Y Zhud - Río Angas. | Dután Sanango, Italo Medardo | 05/11/2018 - 04:09 PM |
| SEPTIEMBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las | Dután Sanango, Italo Medardo | 05/10/2018 - 12:31 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales. | | |
| AGOSTO 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales. | Buestan Toral, José Remigio | 05/09/2018 - 05:30 PM |
| JULIO 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales. | Dután Sanango, Italo Medardo | 03/08/2018 - 10:45 AM |
| JUNIO 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales. | Dután Sanango, Italo Medardo | 05/07/2018 - 12:31 PM |
| Mayo2018 Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales. | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 05/06/2018 - 04:46 PM |
| Abril 2018 Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 4 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso. | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 04/05/2018 - 02:08 PM |
| Marzo 2018 Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 4 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso. | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 05/04/2018 - 04:18 PM |
| Febrero 2018 Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Descanso - Azogues, y Troncal - Puerto Inca. No se ha logrado contratar a las microempresas por falta de aprobación del aval para el servicio de voluntariado. | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 23/03/2018 - 10:52 AM |
| ENERO 2018 Se realiza mantenimiento de la vía matrama - Mazar por administración directa, puesto que no se ha podido contratar a las microempresas. | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 23/03/2018 - 10:50 AM |
| DICIEMBRE 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, con el propósito de mantener la vía en condiciones de transitabilidad confiable para los usuarios. | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 05/01/2018 - 04:48 PM |
| NOVIEMBRE 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, con el propósito de mantener la vía en condiciones de transitabilidad confiable para los usuarios. | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 05/12/2017 - 04:15 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| <p>OCTUBRE 2017</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano. Además se coloca tachas en la vía Azogues - Matrama con la ayuda de los microempresarios.</p> | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 01/11/2017 - 11:48 AM |
| <p>SEPTIEMBRE 2017</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano</p> | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 05/10/2017 - 03:38 PM |
| <p>AGOSTO 2017</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano</p> | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 05/09/2017 - 05:53 PM |
| <p>JULIO 2017</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano</p> | García González, Mariana Alexandra | 05/08/2017 - 09:29 AM |
| <p>JUNIO 2017</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante la limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal.. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano.</p> | García González, Mariana Alexandra | 05/07/2017 - 10:29 AM |
| <p>MAYO 2017</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal.. Se realiza mentenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar con tres microempresas de conservación vial contratadas</p> | Guillen Luna, Andrés Ismael | 01/06/2017 - 11:28 AM |
| <p>ABRIL 2017</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal.. Se realiza mentenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar con tres microempresas de conservación vial contratadas</p> | García González, Mariana Alexandra | 05/05/2017 - 12:37 PM |
| <p>MARZO 2017</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal. Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.</p> | Guillen Luna, Andrés Ismael | 04/04/2017 - 02:13 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| <p>FEBRERO 2017</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.</p> | <p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p> | <p>04/04/2017 - 02:12 PM</p> |
| <p>FEBRERO 2017</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.</p> | <p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p> | <p>05/03/2017 - 01:35 PM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2016</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes y bacheo en la carretera Matrama-Mazar, en la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana) Y en la carretera Zhud-Biblián se encuentran realizando limpieza de cunetas, bordillos y roza a mano</p> | <p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p> | <p>05/01/2017 - 07:03 PM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes y bacheo en la carretera Matrama-Mazar, en la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana) Y en la carretera Zhud-Biblián se encuentran realizando limpieza de cunetas, bordillos y roza a mano</p> | <p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p> | <p>05/12/2016 - 03:07 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2016</p> <p>los contratos de las microempresas culmino por falta de recursos . Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazary la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana)</p> | <p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p> | <p>05/11/2016 - 06:33 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de alcantarillas desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p> | <p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p> | <p>04/10/2016 - 07:46 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de alcantarillas desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>01/09/2016 - 07:51 AM</p> |
| <p>JULIO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 5+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>04/08/2016 - 12:30 PM</p> |
| <p>JUNIO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 10+000 al 19+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>04/07/2016 - 02:32 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| <p>MAYO 2016:</p> <p>La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 05/06/2016 - 08:12 PM |
| <p>ABRIL 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 30+000 al Km 60+000 de la carretera Matrama-Mazar</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 05/05/2016 - 07:43 AM |
| <p>MARZO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 00+000 al Km 30+000 de la carretera Matrama-Mazar</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 04/04/2016 - 09:32 PM |
| <p>FEBRERO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 30+000 al Km 50+000 de la carretera Matrama-Mazar</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 06/03/2016 - 05:26 PM |
| <p>ENERO 2016:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 20+000 al Km 50+000 de la carretera Matrama-Mazar</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 05/02/2016 - 10:45 AM |
| <p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 30+000 al Km 69+000 de la carretera Matrama-Mazar</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 06/01/2016 - 07:38 AM |
| <p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 30+000 al Km 69+000.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 07/12/2015 - 10:21 AM |
| <p>OCTUBRE 2015:</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP continua con la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 04/11/2015 - 10:25 PM |
| <p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP continua con la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 07/10/2015 - 04:22 PM |
| <p>AGOSTO 2015</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 07/09/2015 - 10:24 AM |
| <p>JULIO 2015</p> <p>Por la fuerte temporada invernal En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiando la limpieza de derrumbes y alcantarillas con personal y maquinaria del MTOP Km 30 +000 al 69+000..</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 05/08/2015 - 09:28 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>JUNIO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños desde el Km 40 +000 al 69+000..</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>07/07/2015 - 03:42 PM</p> |
| <p>MAYO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 10+000 al 19+000.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>08/06/2015 - 02:17 PM</p> |
| <p>ABRIL 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 00+000 al 10+000.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>08/05/2015 - 07:48 AM</p> |
| <p>MARZO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 10+000 al 19+000.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>07/04/2015 - 03:35 PM</p> |
| <p>FEBRERO 2015</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos. E la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>09/03/2015 - 09:41 AM</p> |
| <p>ENERO 2014</p> <p>En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y limpieza del derecho de via. en la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando el bacheo asfaltico desde el Km 6+000 al 19+000.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>06/02/2015 - 03:21 PM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2014</p> <p>Se esta realizando el bacheo asfaltico en la carretera Biblian-Azogues-Descanso, antigua panamericana, tambien la limoieza de cunetas y bordillos en la carretera Azogues-Matrama-Mazar</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>06/01/2015 - 11:49 AM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos.</p> <p>Tambien se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos del tramo Azogues a Matrama.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>05/12/2014 - 03:21 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2014</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos.</p> <p>Tambien se esta realizando la limpieza de derrumbes pequeños en el tramo comprendido entre el Km 50 + 000 al 60 +000.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>09/11/2014 - 09:31 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>06/10/2014 - 12:09 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de derrumbes pequeños. | | |
| AGOSTO 2014 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta restituyendo una alcantarilla en el sector de Buenos Aires en la carretera Matrama-Mazar | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 07/09/2014 - 08:44 PM |
| JULIO 2014 En la carretera Matrama-mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos, como tambien de derrumbes pequeños con personal y maquinaria del MTOP y la microempresa. | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 05/08/2014 - 10:39 PM |
| JUNIO 2014 En la carretera Matrama-mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos, como tambine de derrumbes pequeños. | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 10/07/2014 - 08:31 AM |
| MAYO 2014 En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos y tambien alcantarillas. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos como tambien la limpieza de derrumbes pequeños. | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 03/06/2014 - 02:34 PM |
| ABRIL 2014 En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos como tambien la limpieza de alcantarillas. | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 04/05/2014 - 08:05 PM |
| MARZO 2014 En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando el sellado de fisuras. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos. Se esta limpiando alcantarillas con ayuda de la excavadora 320 en el sector de Buenos Aires. | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 07/04/2014 - 07:40 AM |
| FEBRERO 2014 En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando mla limpieza de cunetas, En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de Alcantarillas. | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 28/02/2014 - 09:31 AM |
| ENERO 2014 En la carrtera Matrama-Mazar, en el tramo entre Buenos Aires y Rivera se esta realizando el bacheo con mezcla asfaltica. | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 05/02/2014 - 07:27 AM |

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5- PROYECTO. Recursos. Falta de recursos CAUSARÍA el retraso del mantenimiento de la vía | 05/12/2018 | Ivan Patricio Chaca Álvarez | 60 % | 80 | 48 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|---|
| 1 | Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2014 | 3-Adjudicación | 10/01/2014 | | 10/01/2014 | | Sí | 2.0 |
| 2 | PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2014 | 3-Adjudicación | 10/01/2014 | | 10/01/2014 | | Sí | 2.0 |
| 3 | EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 30+000 al 60+000 en la carretera Matrama-Mazar | 5-Entregables Intermedios | 15/05/2014 | | 15/05/2014 | | Sí | 2.0 |
| 4 | EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 00+000 al 19+000 en la carretera Descanso-Biblian | 5-Entregables Intermedios | 15/06/2014 | | 15/06/2014 | | Sí | 2.0 |
| 5 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2014 | | 15/07/2014 | | Sí | 2.0 |
| 6 | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2014 | | 15/07/2014 | | Sí | 2.0 |
| 7 | EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera Azogues-Matrama-Mazar Realizado | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2014 | | 15/08/2014 | | Sí | 3.0 |
| 8 | EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera biblian-Azogues-Descanso Realizado | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2014 | | 15/09/2014 | | Sí | 3.0 |
| 9 | EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 00+000 al 30+000 en la carretera Matrama-Mazar | 5-Entregables Intermedios | 15/10/2014 | | 15/10/2014 | | Sí | 2.0 |
| 10 | EJECUCION: Limpieza de derrumbes en la carretera matrama-mazar | 5-Entregables Intermedios | 15/11/2014 | | 15/11/2014 | | Sí | 3.0 |
| 11 | EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 | | Sí | 2.0 |
| 12 | EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 | | Sí | 2.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP | | | | | | | |
| 13 | PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2015 | 3-Adjudicación | 10/01/2015 | | 10/01/2015 | | Sí | 2.0 |
| 14 | PLANEACION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2015 | 3-Adjudicación | 10/01/2015 | | 10/01/2015 | | Sí | 2.0 |
| 15 | EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 30+000 al 60+000 en la carretera Matrama-Mazar | 5-Entregables Intermedios | 15/05/2015 | | 15/05/2015 | | Sí | 2.0 |
| 16 | EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 00+000 al 19+000 en la carretera Descanso-Biblian | 5-Entregables Intermedios | 15/06/2015 | | 15/06/2015 | | Sí | 2.0 |
| 17 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2015 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2015 | | 15/07/2015 | | Sí | 3.0 |
| 18 | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2015 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2015 | | 15/07/2015 | | Sí | 4.0 |
| 19 | EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera Azogues-Matrama-Mazar Realizado | 5-Entregables Intermedios | 15/08/2015 | | 15/08/2015 | | Sí | 4.0 |
| 20 | EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera biblian-Azogues-Descanso Realizado | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2015 | | 15/09/2015 | | Sí | 4.0 |
| 21 | EJECUCION: Bacheo asfaltico realizado desde el Km 00+000 al 30+000 en la carretera Matrama-Mazar | 5-Entregables Intermedios | 15/10/2015 | | 15/10/2015 | | Sí | 4.0 |
| 22 | EJECUCION: Limpieza de derrumbes en la carretera matrama-mazar | 5-Entregables Intermedios | 15/11/2015 | | 15/11/2015 | | Sí | 4.0 |
| 23 | EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2015 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 31/12/2015 | | Sí | 4.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 24 | EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2014 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 31/12/2015 |  | Sí | 4.0 |
| 25 | EJECUCION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2016 | 5-Entregables Intermedios | 29/04/2016 | | 16/05/2016 |  | Sí | 2.0 |
| 26 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Junio del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 19/07/2016 | | 19/07/2016 |  | Sí | 2.0 |
| 27 | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a Junio del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 19/07/2016 | | 19/07/2016 |  | Sí | 2.0 |
| 28 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2016 | | 31/12/2016 |  | Sí | 2.0 |
| 29 | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2016 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2016 | | 31/12/2016 |  | Sí | 2.0 |
| 30 | EJECUCION: Contratacion con Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2017 | 5-Entregables Intermedios | 28/04/2017 | | 28/02/2017 |  | Sí | 2.0 |
| 31 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de enero a junio 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 24/07/2017 | | 31/12/2017 |  | Sí | 3.0 |
| 32 | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo | 5-Entregables Intermedios | 24/07/2017 | | 31/12/2017 |  | Sí | 3.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | de Enero a Junio del 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP | | | | | | | |
| 33 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Julio a Diciembre del 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017 | | 29/12/2017 | | Sí | 3.0 |
| 34 | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio a Diciembre del 2017 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 29/12/2017 | | 29/12/2017 | | Sí | 3.0 |
| 35 | CIERRE: Terminación del proyecto, elaboracion de actas | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2017 | | 31/12/2017 | | Sí | 1.0 |
| 36 | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Enero a junio 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2018 | | 30/06/2018 | | Sí | 2.0 |
| 37 | CIERRE: Terminación del proyecto, elaboracion de actas | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 1.0 |
| 38 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el periodo de Enero a Diciembre del 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 2.0 |
| 39 | EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Troncal - Puerto Inca en el periodo de Enero a Diciembre del 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 2.0 |
| 40 | EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente realizado en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el periodo de Julio - diciembre 2018 Realizado a satisfaccion del MTOP | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | | | No | 2.0 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Supervisión Positiva: Limpieza de cunetas y bordillos | Quishpi Vélez, Luis Manuel | {PR} - Provincia - CAÑAR | 31/08/2017 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2 | Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza y mantenimiento | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 20/07/2016 |
| 3 | Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza en la vía. | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 24/04/2016 |
| 4 | Supervisión Positiva- Se realizan mantenimientos en diferentes vías | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 25/11/2015 |
| 5 | Limpieza de cunetas y lastrado de las vías en las Parroquias | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 25/05/2015 |
| 6 | Verificación de la terminación del Proyecto | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 22/01/2015 |
| 7 | Verificación del desarrollo del proyecto | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 24/10/2014 |
| 8 | Mantenimiento vial, limpieza de derrumbes | González Zhinin, Víctor Stalin | {PR} - Provincia - CAÑAR | 21/05/2014 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de Km de la Red Vial en buen estado | ▼ | 96.94 % | 0.85 | 0.824 | 01/01/2014 | Noviembre |
| 2 | Porcentaje de cumplimiento economico del cronograma | ▼ | 96.94 % | 0.85 | 0.824 | 01/01/2014 | Noviembre |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,621,399.05 ** |
| Costo Total: | 830,000.00 |
| Total Devengado: | 1,621,399.05 |
| % Costo Total Devengado: | 195.35 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 195.35 %

Perfil Económico 2018

| | Años Previos | Año Actual (2018) | Años Futuros | Total |
|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Ppto. Planeado | 1,628,872.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628,872.00 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 2,401,029.99 | 0.00 | 0.00 | 2,401,029.99 |
| Ppto. Codificado | 2,091,963.90 | 0.00 | 0.00 | 2,091,963.90 |
| Ppto. Comprometido | 1,643,552.68 | 0.00 | 0.00 | 1,643,552.68 |
| Planeado - Codificado (2018) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 1,704,274.25 | 0.00 | 0.00 | 1,704,274.25 |
| Ppto. Devengado | 1,621,399.05 | 0.00 | 0.00 | 1,621,399.05 |
| Pagado Real | 1,576,194.53 | 0.00 | 0.00 | 1,576,194.53 |
| Estimado a fin de año | * 1,621,399.05 | 0.00 | 0.00 | 1,621,399.05 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 82,875.20 | 0.00 | 0.00 | 82,875.20 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 95.14 % | 0.00 % | 0.00 % | 95.14 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

| | |
|----|--|
| 12 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 13 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. (Mejorar e incrementar la señalización horizontal y vertical en toda RVE. Identificando puntos críticos) |
| 14 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |
| 15 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|---|------------------------|--|---------------|
| 1 | | Planilla_microempresa_Sageo_marzo_2017.pdf | 05/05/2017 |
| 2 | | Planilla_microempresa_Matapin_marzo_2017.pdf | 05/05/2017 |
| 3 | | Planilla_microempresa_Zhoray_marzo_2017.pdf | 05/05/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 4 | | Orden_de_compra_La_Primavera_-_Septiembre.pdf | 01/11/2017 |
| 5 | A1-Informe sitop-mayo-05-micro-Matapin | Inf-sitop-mayo05--micro-Matapin.pdf | 09/06/2015 |
| 6 | A10-Inf-sitop-junio-2017 | informe_ejecutivo_El_Descanso.pdf | 05/07/2017 |
| 7 | A11-Inf-sitop-junio-2017 | Matrama_Mazar_tramo_1.pdf | 05/07/2017 |
| 8 | A12-Inf-sitop-junio-2017 | Matrama_Mazar_tramo_2.pdf | 05/07/2017 |
| 9 | A13-Inf-sitop-junio-2017 | Informe_Troncal_Puerto_Inca.pdf | 05/07/2017 |
| 10 | A2-Informe-sitop-mayo-05-micro-Zhoray | Inf-sitop-mayo-05-micro-Zhoray.pdf | 09/06/2015 |
| 11 | A3-Informe sitop-junio-05-micro-Sageo | Informe_sitop_junio-05_micro-Sageo.pdf | 08/07/2015 |
| 12 | A4-Informe sitop junio-05-micro-Matapin | Informe_sitop_junio-05_micro-Matapin.pdf | 08/07/2015 |
| 13 | A5-Informe-sitop-junio-05-micro-Zhoray | Informe_sitop_junio-05-micro-zhoray.pdf | 08/07/2015 |
| 14 | A6-Informe-sitop-micro-matapin-agos-05 | Inf-sitop-matapin-agos-05.pdf | 07/09/2015 |
| 15 | A7-Inf-micro-sageo-junio-06 | A7-Inf-micro-sageo-junio-06.pdf | 04/07/2016 |
| 16 | A8-Inf-sitop-julio-06-Matapin | A8-Inf-sitop-julio-06-Matapin.pdf | 04/08/2016 |
| 17 | A9-Inf-sitop-julio-06-Zhoray | A9-Inf-sitop-julio-06-Zhoray.pdf | 04/08/2016 |
| 18 | Acta de planilla 4 | ACTA.pdf | 05/07/2018 |
| 19 | Acta de recepcion parcial Chontamarca | 22348_Chontamarca_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 20 | Acta de recepcion parcial Chontamarca septiembre | 22348_Chontamarca_Acta_recepción_parcial_Septiembre_2018.pdf | 05/11/2018 |
| 21 | Acta de recepcion parcial LA PRIMAVERA | 21009_La_Primavera_Acta_Recepción_Parcial_Octubre_2018.pdf | 05/12/2018 |
| 22 | Acta de recepcion parcial NUEVO JAVIN | 21450_Nuevo_Javin_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf | 05/12/2018 |
| 23 | Acta de recepcion parcial PANCHO NEGRO | 21453_Américas_Pancho_Negro_Acta_recepción_parcial_Octubre_2018.pdf | 05/12/2018 |
| 24 | Acta de recepción definitiva | Acta_de_trabajos_microempresa_primavera.pdf | 05/08/2017 |
| 25 | Acta de recepción definitiva | Acta_de_trabajos_microempresa_primavera.pdf | 05/08/2017 |
| 26 | Acta de recepción microempresa AMERICAS | _actalas_americas.pdf | 05/09/2018 |
| 27 | Acta de recepción microempresa AMERICAS | 21453_Américas_Pancho_Negro_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf | 05/10/2018 |
| 28 | Acta de recepción microempresa AMERICAS | 21453_Américas_Pancho_Negro_Acta_recepción_parcial_Septiembre_2018.pdf | 05/12/2018 |
| 29 | Acta de recepción microempresa matapin | Acta_de_recepción_parcial_Matrama_mazar_T1.pdf | 05/10/2017 |
| 30 | Acta de recepción microempresa matapin | Acta_Microempresa_Matapin_-_Sep.pdf | 01/11/2017 |
| 31 | Acta de recepción microempresa matapin | 19561_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf | 05/12/2017 |
| 32 | Acta de recepción microempresa matapin | 19561_Acta_de_recepción_parcial_2.pdf | 05/01/2018 |
| 33 | Acta de recepción microempresa MATAPIN | acta_matapin.pdf | 05/09/2018 |
| 34 | Acta de recepción microempresa MATAPIN | 21007_Acta_recepción_parcial_Matapin_Agosto_2018.pdf | 05/10/2018 |
| 35 | Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN | _actanuevo_javin.pdf | 05/09/2018 |
| 36 | Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN | 21450_Nuevo_Javin_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf | 05/10/2018 |
| 37 | Acta de recepción microempresa NUEVO JAVIN | 21450_Nuevo_Javin_Acta_recepción_parcial_Septiembre_2018.pdf | 05/12/2018 |
| 38 | Acta de recepción microempresa PRIMAVERA | Acta_de_recepción_parcial_Truncal_P.Inca.pdf | 05/10/2017 |
| 39 | Acta de recepción microempresa PRIMAVERA | Acta_Microempresa_La_Primavera_-_Sep.pdf | 01/11/2017 |
| 40 | Acta de recepción microempresa PRIMAVERA | 19558_-_Acta_Definitiva.pdf | 05/12/2017 |
| 41 | Acta de recepción microempresa Primavera | 20489_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf | 05/01/2018 |
| 42 | Acta de recepción microempresa PRIMAVERA | acta_primavera.pdf | 05/09/2018 |
| 43 | Acta de recepción microempresa PRIMAVERA | 21009_La_Primavera_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf | 05/10/2018 |
| 44 | Acta de recepción microempresa sageo | Acta_de_recepción_parcial_Descaso_Biblián.pdf | 05/10/2017 |
| 45 | Acta de recepción microempresa sageo | Acta_Microempresa_Sageo_-_Sep.pdf | 01/11/2017 |
| 46 | Acta de recepción microempresa sageo | 19559_-Acta_Definitiva.pdf | 05/12/2017 |
| 47 | Acta de recepción microempresa sageo | 20488_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf | 05/01/2018 |
| 48 | Acta de recepción microempresa SAGEO | acta_sageo.pdf | 05/09/2018 |
| 49 | Acta de recepción microempresa SAGEO | 21008_Acta_recepción_parcial_Sageo_Agosto_2018.pdf | 05/10/2018 |
| 50 | Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO | acta_s@n_antonio_de_paguacay.pdf | 05/09/2018 |
| 51 | Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO | 21451_San_Antonio_Paguacay_Acta_recepción_parcial_Agosto_2018.pdf | 05/10/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 52 | Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO | 21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_recepción_parcial_Sep05/11/2018.pdf | 05/11/2018 |
| 53 | Acta de recepción microempresa SAN ANTONIO | 21451_San_Antonio_Paguancay_Acta_recepción_parcial_Oct05/11/2018.pdf | 05/11/2018 |
| 54 | Acta de recepción microempresa zhoray | Acta_de_recepción_parcial_Matrama_Mazar_T2.pdf | 05/10/2017 |
| 55 | Acta de recepción microempresa zhoray | Acta_Microempresa_Zhoray_-_Sep.pdf | 01/11/2017 |
| 56 | Acta de recepción microempresa zhoray | 19562_-_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf | 05/12/2017 |
| 57 | Acta de recepción microempresa zhoray | 19562_-_Acta_de_recepción_parcial_2.pdf | 05/01/2018 |
| 58 | Acta de recepción microempresa ZHORAY | acta_zhoray.pdf | 05/09/2018 |
| 59 | Acta de recepción microempresa ZHORAY | 21006_Acta_recepción_Zhoray_Agosto_2018.pdf | 05/10/2018 |
| 60 | INFOMRE SITOP SEPTIEMBRE 2016 | MICRO_ZHORAY.pdf | 04/10/2016 |
| 61 | INFOMRME SITOP SEPTIEMBRE 2016 | MICRO_MATAPIN.pdf | 04/10/2016 |
| 62 | Informe ejecutivo mes de agosto 2017 | MICROEMPRESA_PRIMAVERA.pdf | 05/09/2017 |
| 63 | Informe ejecutivo mes de agosto 2017 | INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESA_MATAPIN.pdf | 05/09/2017 |
| 64 | Informe ejecutivo mes de agosto 2017 | INFORME_EJECUTIVOMICROEMPRESA_SAGEO.pdf | 05/09/2017 |
| 65 | Informe ejecutivo mes de agosto 2017 | INFORME_EJECUTIVO_MICRO_ZHORAY.pdf | 05/09/2017 |
| 66 | Informe ejecutivo mes de julio 2018 | INFORME_EJEC_ZHUD_-_CHILCHIL.pdf | 03/08/2018 |
| 67 | Informe ejecutivo mes de julio 2018 | INFORME_EJEC_MATRAMA_MAZAR_T2.pdf | 03/08/2018 |
| 68 | Informe ejecutivo mes de julio 2018 | INFORME_EJEC_TRONCAL_PUERTO_INCA.pdf | 03/08/2018 |
| 69 | Informe ejecutivo mes de julio 2018 | INFORME_EJEC_EL_CHORRO-_EL_TRIUNFO.pdf | 03/08/2018 |
| 70 | Informe ejecutivo mes de julio 2018 | INFORME_EJEC_CHILCHIL_-_EL_CHORRO.pdf | 03/08/2018 |
| 71 | Informe ejecutivo mes de julio 2018 | INFORME_EJEC_MATRAMA_-_MAZAR_T1.pdf | 03/08/2018 |
| 72 | Informe ejecutivo mes de julio 2018 | INFORME_EJECT_DESCANSO_-_AZOG-_BI.pdf | 03/08/2018 |
| 73 | Informe ejecutivo mes de junio 2018 | Informe_ejecutivo_mantenimiento_Chorro_el_Triunfo.pdf | 05/07/2018 |
| 74 | Informe ejecutivo mes de junio 2018 | informe_ejecutivo_ZHUD-COCHANCAJ.pdf | 05/07/2018 |
| 75 | Informe ejecutivo mes de junio 2018 | informe_ejecutivo_SAN_ANTONIO.pdf | 05/07/2018 |
| 76 | Informe ejecutivo mes de junio 2018 | informe_ejecutivo_Primavera.pdf | 05/07/2018 |
| 77 | Informe ejecutivo mes de junio 2018 | informe_ejecutivo_matrama_mazar_t2.pdf | 05/07/2018 |
| 78 | Informe ejecutivo mes de junio 2018 | informe_ejecutivo_descanso.pdf | 05/07/2018 |
| 79 | Informe ejecutivo mes de junio 2018 | informe_ejecutivo_matrama_mazar_T1.pdf | 05/07/2018 |
| 80 | Informe ejecutivo mes de Marzo 2018 Descanso Biblián | informe_ejecutivo_sageo.pdf | 05/04/2018 |
| 81 | Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Matrama Mazar 1 | Informe_ejecutivo_matapin.pdf | 05/04/2018 |
| 82 | Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Matrama Mazar 2 | Informe_ejecutivo_zhoray.pdf | 05/04/2018 |
| 83 | Informe ejecutivo mes de marzo 2018 Troncal Puerto Inca | informe_ejecutivo_PRIMAVERA.pdf | 05/04/2018 |
| 84 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018 | Informe_ejecutivo_Zhud_-_Chilchil.pdf | 05/06/2018 |
| 85 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018 | Informe_ejecutivo_Chilchil_-_El_Chorro.pdf | 05/06/2018 |
| 86 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018 | Informe_ejecutivo_El_Chorro_-_El_Triunfo.pdf | 05/06/2018 |
| 87 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018 | Informe_ejecutivo_tramo_1.pdf | 05/06/2018 |
| 88 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018 | informe_ejecutivo_Troncal_Puerto.pdf | 05/06/2018 |
| 89 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018 | informe_ejecutivo_zhoray_tramo_2.pdf | 05/06/2018 |
| 90 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018 | informe_ejecutivo_Azogues_-_Descanso.pdf | 05/06/2018 |
| 91 | Informe ejecutivo mes de octubre 2017 | Informe_Mensual_Microempresa_La_Primavera_-_Sep.pdf | 01/11/2017 |
| 92 | Informe ejecutivo mes de octubre 2017 | Informe_Mensual_Microempresa_Matapin_-_Sep.pdf | 01/11/2017 |
| 93 | Informe ejecutivo mes de octubre 2017 | Informe_Mensual_Microempresa_Sageo_-_Sep.pdf | 01/11/2017 |
| 94 | Informe ejecutivo mes de octubre 2017 | Informe_Mensual_Microempresa_Zhoray_-_Sep.pdf | 01/11/2017 |
| 95 | Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Descanso Biblián | Informe_Ejecutivo_Sageo.pdf | 05/10/2017 |
| 96 | Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Matrama Mazar 1 | Informe_ejecutivo_Matapin.pdf | 05/10/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|-------------------------------------|---------------|
| 97 | Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Matrama Mazar 2 | Informe_ejecutivo_Zhoray.pdf | 05/10/2017 |
| 98 | Informe ejecutivo mes de septiembre 2017 Troncal Puerto Inca | Informe_Ejecutivo_Primavera.pdf | 05/10/2017 |
| 99 | informe sitop matapin octubre | microempresa_matapin.pdf | 05/11/2016 |
| 100 | informe sitop octubre sageo | miroempresa_sageo.pdf | 05/11/2016 |
| 101 | INFORME SITOP SEPTIEMBRE 2016 | MICRO_SAGEO.pdf | 04/10/2016 |
| 102 | Informe-sitop-micro-sageo-agos-05 | Inf-sitop-sageo-agos-05.pdf | 07/09/2015 |
| 103 | informese sitop octubre zhoray | miroempresa_zhoray.pdf | 05/11/2016 |
| 104 | Orden de Compra Microempresa Matapin | 19561_Orden_de_compra.pdf | 05/12/2017 |
| 105 | Planilla mes de junio de 2017 Troncal Puerto Inca | PLANILLA_MICROEMPRESA_PRIMAVERA.pdf | 05/07/2017 |
| 106 | Planilla mes de mayo de 2017 Tramo 1 | PLANILLA_MICROEMPRESA_MATAPIN.pdf | 05/07/2017 |
| 107 | Planilla mes de mayo de 2017 Tramo 2 | PLANILLA_MICROEMPRESA_ZHORAY.pdf | 05/07/2017 |
| 108 | Planilla mes de mayo el Descanso | PLANILLA_MICROEMPRESA_SAGEO.pdf | 05/07/2017 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|------------------------------|------------------------|---|----------------------|-------------|
| Chaca Álvarez, Ivan Patricio | Titular | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar | ichaca@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Chaca Álvarez, Ivan Patricio | Lider de Proyecto | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar | ichaca@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Quezada Jara, Mónica Fabiola | Patrocinador Ejecutivo | Subsecretaria Zonal 6 | mquezada@mtop.gob.ec | 023974600 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 75724_1.jpg | 05/04/2018 |
