

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 7**  
**Dirección Provincial El Oro**

**PROYECTO: K038 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de El Oro**

Líder del Proyecto:	Barriga Loaiza, Jorge Antonio (jbarriga@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Programas Relacionados:	
Titular:	Bazurto Orellana, Pedro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	3.14
CUP:	175200000.506.3851	TIR:	24.46 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	29,492,789.07
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,931,841.24
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2018 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	28/01/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/01/2019

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Mantenimiento General de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro, comprende trabajos por administración directa, y trabajos realizados por Asociaciones de Conservación Vial - Microempresas: Bacheo asfáltico común, limpieza de cunetas a mano y a máquina, limpieza de alacantarillas, encausamientos, limpieza de derrumbes, sellos asfálticos, reconfiguración de rasantes, rellenos, mantenimiento de señalización vertical y horizontal. Se incluyen obras de mantenimiento a contratar, señalización, mantenimiento de puentes, obras de emergencia.

**Beneficios Cualitativos**

Mantener y mejorar los niveles de servicio de todos los componentes de la vía: pavimento, drenaje, señalización, obras de arte, con la finalidad de facilitar el intercambio comercial de los pobladores de las áreas circundantes, mejorando la conectividad del transporte

**Tipo de Beneficiario**

Todos los usuarios de la red Vial Estatal de la Provincia de El Oro; sectores: agrícola, ganadero, minero, pesquero, acuícola, turístico


**Restricciones**

Disponibilidad de equipo, efectos colaterales de estación invernal, transporte de materia prima, abastecimiento de mezcla asfáltica

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 27.10 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2018      Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

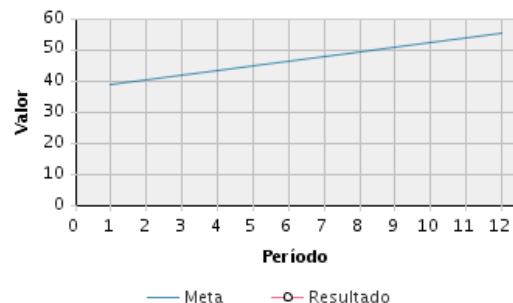

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	39 %	40 %	42 %	43 %	45 %	46 %	48 %	49 %	51 %	52 %	54 %	55 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores y cunetas en la carretera Saracay - Piñas y Piñas - Portovelo, Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas - La Victoria - Pte. Puyango, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/01/2019 - 04:05 PM
Noviembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores y cunetas en la carretera Saracay - Piñas, Desmontaje y traslado de puente Bailey desde la carretera Buenavista - Paccha hasta el Campamento Piñas, Reconstrucción de talud inferior en los km 38+300 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/12/2018 - 12:08 PM
Octubre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Reconstrucción de talud inferior en los km 38+300 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/11/2018 - 03:01 PM
Septiembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Reconstrucción de talud inferior en los km 15+500 y 25+750 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/10/2018 - 10:24 AM
Agosto 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de alcantarillas y derrumbes menores a máquina en las carretera La Avanzada - Saracay; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reconstrucción de talud inferior en el km 15+500 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/09/2018 - 11:21 AM
Julio 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reposición de señalización vertical en las carretera La Avanzada - Saracay, Reconstrucción de talud inferior en el km 15+500 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/08/2018 - 08:47 AM
Junio 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reposición de señalización vertical en las carreteras: Corralitos - Pasaje, Piñas - Zaruma, Arenillas - La Victoria.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/07/2018 - 08:50 AM
Mayo 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/06/2018 - 11:19 AM
Abril 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras: La Avanzada - Saracay, Saracay - Piñas, Piñas - Portovelo - Zaruma.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/05/2018 - 01:24 PM
Marzo 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/04/2018 - 09:58 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras: Corralitos - Pasaje, Yee del Enano - Buenavista - Pasaje.		
Febrero 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Río Pindo, Arenillas - La Victoria - Pte. Puyango.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	02/03/2018 - 03:48 PM
Enero 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reconfirmación de rasante con material de mejoramiento en el km 33+500 de la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango, Limpieza de espaldones, Bacheo asfáltico común, Limpieza de derrumbes a máquina.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	19/02/2018 - 04:37 PM

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>3- REGIONAL. Ambiental.</b> Presencia del Fenómeno del niño CAUSARIA retraso en la ejecución de obra	15/01/2019	Jorge Antonio Barriga Loaiza	30 %	40	12	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Proyecto definido	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	10.0
2	PLANEACION: Justificativos-técnicos-económicos elaborados y aprobados	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	10.0
3	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	1.46
4	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	1.46
5	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	1.46
6	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	1.46
7	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	1.46
8	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	1.46


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Provincia de El Oro (Junio 2018) realizado							
9	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	1.46
10	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	1.46
11	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.46
12	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	1.46
13	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.46
14	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.46
15	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2019	31/01/2019			No	1.46
16	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2019	28/02/2019			No	1.46
17	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2019	31/03/2019			No	1.46
18	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019	30/04/2019			No	1.46
19	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019	31/05/2019			No	1.46
20	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2019	30/06/2019			No	1.46
21	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	31/07/2019			No	1.46
22	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2019	31/08/2019			No	1.46
23	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019			No	1.46

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	la Provincia de El Oro (Septiembre 2019) realizado							
24	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2019	31/10/2019			No	1.46
25	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	1.46
26	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	1.46
27	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro Año 2020	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	17.5
28	CIERRE:Acta de terminación de trabajos	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	10.0
29	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro Año 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	17.46

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Kilómetros mantenidos		-	-	-	01/01/2018	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,931,841.24 **
Costo Total:	4,564,536.38
Total Devengado:	2,779,008.78
% Costo Total Devengado:	60.88 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 60.88 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	4,564,536.38	6,759,026.95	0.00	11,323,563.33
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	4,564,536.38	3,152,832.46	0.00	7,717,368.84
Ppto. Codificado	5,733,596.53	3,152,832.46	0.00	8,886,428.99
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		3,606,194.49		
Programado a Devengar	5,733,596.53	3,152,832.46	0.00	8,886,428.99
Ppto. Devengado	2,779,008.78	0.00	0.00	2,779,008.78
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 2,779,008.78	3,152,832.46	0.00	5,931,841.24
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	2,954,587.75	0.00	0.00	2,954,587.75
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 48.47 %	0.00 %	0.00 %	31.27 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	14,729.33		14,729.33				

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	125,454.34		140,183.67				
Mar	1,168,049.67		1,308,233.34				
Abr	169,855.04		1,478,088.38				
May	160,499.48		1,638,587.86				
Jun	185,210.44		1,823,798.30				
Jul	414,400.08		2,238,198.38				
Ago	221,602.05		2,459,800.43				
Sep	165,999.48		2,625,799.91				
Oct	160,499.48		2,786,299.39				
Nov	160,499.49		2,946,798.88				
Dic	206,033.58		3,152,832.46				
<b>Total</b>	<b>3,152,832.46</b>						

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
20	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
21	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
22	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
23	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	EJECUCION PRESUPUESTARIA ESIGEF MANTENIMIENTO VIAL DICIEMBRE 2018	B_6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_2018	05/12/2018
2	EJECUCION PRESUPUESTARIA ESIGEF MANTENIMIENTO VIAL NOVIEMBRE 2018	B_5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_2018	05/11/2018
3	EJECUCION PRESUPUESTARIA ESIGEF MANTENIMIENTO VIAL OCTUBRE 2018	B_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_2018	05/10/2018
4	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	A_6_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO_EL_ORO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
5	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	B_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO_EL_ORO_AGOSTO_2018.pdf	05/10/2018
6	INFORME EJECUTIVO ENERO 2018	A_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO_EL_ORO_ENERO_2018.pdf	02/03/2018
7	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2018	A_2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO_EL_ORO_FEBRERO_2018.pdf	05/04/2018
8	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	A_8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO_EL_ORO_JUNIO_2018.pdf	04/08/2018
9	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	A_9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO_EL_ORO_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
10	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	A_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO_EL_ORO_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
11	INFORME EJECUTIVO MAYO 2018	A_7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO_EL_ORO_MAYO_2018.pdf	04/07/2018
12	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	B_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO_EL_ORO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018
13	INFORME ESIGEF GASTOS OPERATIVOS ABRIL 2018 MANTENIMIENTO VIAL	A_5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_2018	05/04/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	INFORME ESIGEF GASTOS OPERATIVOS MARZO 2018 MANTENIMIENTO VIAL	A_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MARZO_2018_MANTENIMIENTO_VIAL	03/04/2018
15	INFORME ESIGEF GASTOS OPERATIVOS SEPTIEMBRE 2018 MANTENIMIENTO VIAL	B_2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_SEPTIEMBRE_2018_MANTENIMIENTO_VIAL	05/10/2018

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Barriga Loaiza, Jorge Antonio	LIDER DEL PROYECTO	Analista de Infraestructura Provincial	jbarriga@mtop.gob.ec	023974600
Bazurto Orellana, Pedro	DIRECTOR DISTRITAL	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro	pbazurto@mtop.gob.ec	
Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	SUBSECRETARIO REGION 7	Subsecretario Regional 7	jcalderon@mtop.gob.ec	023974600
González Villavicencio, Volter Hernel	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	Analista de Infraestructura Provincial 1	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
125216_1.jpg	02/03/2018
